	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. **4** **DEL** **24 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo dd-mm-aa dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022**

(Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022**

(Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

""CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2022.""

(Indique el objeto del contrato de interventoría suscrito)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA DE OBRA: **GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ** **NIT** 900.372.215-7

(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: **S Y C INGENIERIA S.A.S** **NIT** 830.509.427-9

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	431,990,875.00
Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	431,990,875.00
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

(Escriba el nombre del Supervisor de Hábitat)

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 4 (Consecutivo) **DEL** 24 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)


CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

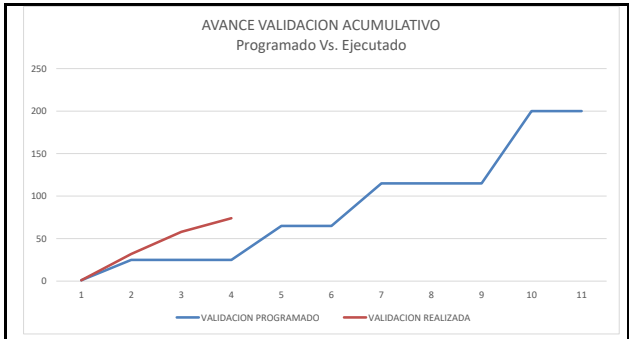

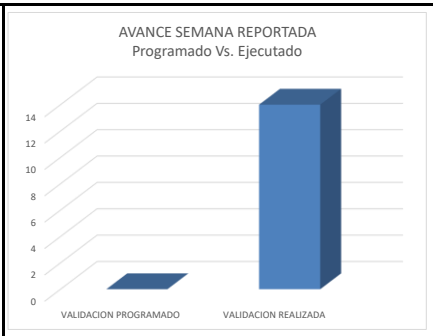

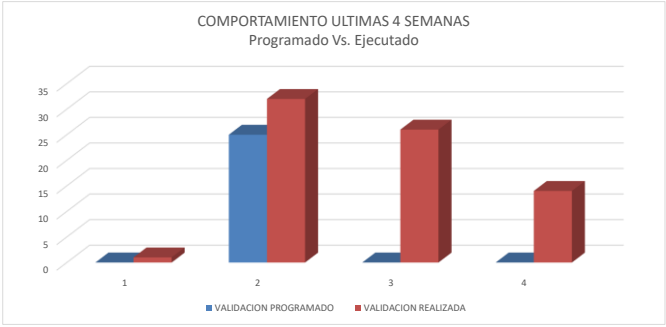

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

Cantidad Validaciones	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo
	25	12,50	74	37,0	49	0

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo
0	14	14	0

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

Semana 1	Prog.	Ejecutado	Semana 2	Prog.	Ejecutado	Semana 3	Prog.	Ejecutado	Semana 4	Prog.	Ejecutado
	0	1		25	33		0	26		0	14

OBSERVACIONES:

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. **4** (Consecutivo) **DEL** **24 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa) **AL** **30 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))


	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 4 **DEL** 24 de septiembre de 2022 **AL** 30 de septiembre de 2022


Consecutivo dd-mm-aa dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 993 del 2022

(Número de Contrato) (Número de Contrato)

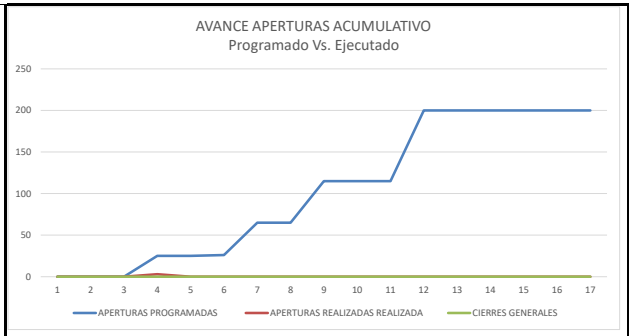



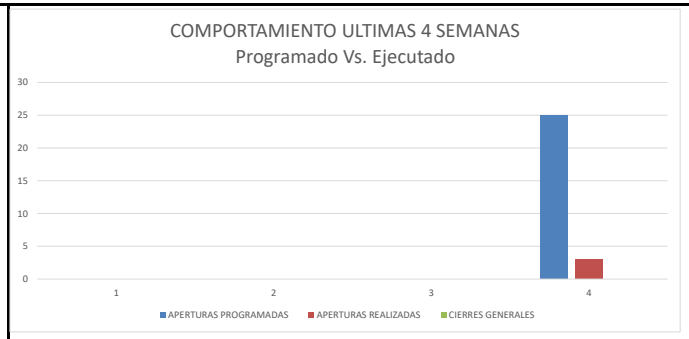

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo
Cantidad de Aperturas	**25**	**0%**	**3**	**0%**	**0**	**22**

Avnace semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo
25	**3**	**0**	**22**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

	Prog.	Ejecutado		Prog.	Ejecutado		Prog.	Ejecutado		Prog.	Ejecutado
Semana 1	**0**	**0**	**Semana 2**	**0**	**0**	**Semana 3**	**0**	**0**	**Semana 4**	**25**	**3**

OBSERVACIONES: **A LA FECHA SE TIENE UN ATRAZO EN 22 VIVIENDAS QUE NO SE HAN APERTURADO PUESTO QUE SE DEBERIAN TENER 25 PERO SOLO SE APERTURARON 3 LAS VIVIENDAS POR APERTURAR SON LAS SIGUIENTES:**

MVAL_02252, MVAL_02253, MVAL_02339, MVAL_02347, MVAL_02356, MVAL_02363, MVAL_02403, MVAL_02408, MVAL_02410, MVAL_02422, MVAL_02436, MVAL_02470, MVAL_02506, MVAL_02511, MVAL_02527, MVAL_02530, MVAL_02569, MVAL_02572, MVAL_02575, MVAL_02585, MVAL_02589, MVAL_02590

VIVIENDAS QUE SE HAN APERTURADO SON: el 26 de septiembre del 2022 se aperturaron las siguientes viviendas : MVAL_02409, MVAL_02466, MVAL_02493

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. **4** **DEL** **24 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo | dd-mm-aa | dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. **4** **DEL** **24 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo dd-mm-aa dd-mm-aa


CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **993 del 2022**

(Número de Contrato) (Número de Contrato)

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJCUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

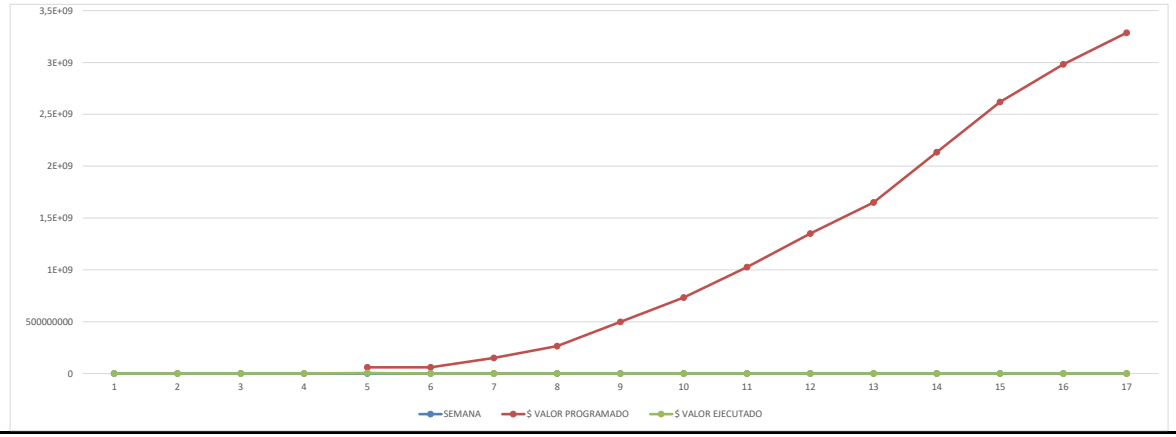

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 26,470,588,23		**$ 5,292,830,7**
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0,73%		**0,14%**

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 26,470,588,23		$ 5,292,830,7
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0,73%		0,14%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): **$ 21177757,53% ATRAZO**

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **0,59% ATRAZO**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atrazo indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

El porcentaje de avance de las siguientes viviendas aperturadas el 26 de septiembre del 2022 es el siguiente: MVAL_02409 (15%), MVAL_02466 (20%), MVAL_02493 (0%)

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 4 (Consecutivo) **DEL** 24 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				
SEMANA 2	MVAL_02589	Beneficiario: William González Llano Descripción caso: La mitad del predio fue vendido y solamente existe un poder notariado y autenticado en el que se estipula la compra y venta de esta parte. La prioridad dentro de la intervención en el mejoramiento de la vivienda es el cambio de cubierta por sus condiciones y porque el material de la teja es asbesto, por cuánto se requiere definir si existe la posibilidad de que se cambie solo el área de la cubierta de la cual es propietario el beneficiario con el fin de que se pueda invertir el resto del presupuesto en la parte interna de la vivienda y no exista ningún inconveniente durante la ejecución y la entrega de obra.	Se realiza verificación en comité del 22 de septiembre del 2022, donde se evidencia un solo chip catastral , por lo cual , se indica al contratista la verificación de cubierta para todo el predio , realizando la gestión pertinente con las personas que viven en dicho predio y el beneficiario.	
	MVAL_01977	Beneficiario: Victor Hernán Rodriguez Al realizar la visita de validación se encontró que la vivienda está separada por un muro, el beneficiario no es el dueño del predio, ya que manifiesta que el predio está sin desenglobar pero la vecina que hace parte de la otra parte acepta el mejoramiento. Es caso especial por esta razón y por qué las actividades de mejora se comparten, ya q la prioridad es cambio de cubierta. Se avalará que el muro ya estaba levantado para la asignación del subsidio	Se realiza verificación en comité del 22 de septiembre del 2022, donde se evidencia un solo chip catastral , por lo cual , se indica al contratista la verificación de cubierta para todo el predio , realizando la gestión pertinente con las personas que viven en dicho predio y el beneficiario.	
ANA 1				

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 4 (Consecutivo) **DEL** 24 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 993 del 2022 (Número de Contrato)

SEMA				

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizandoce a medida que se vayan realizado actividades frente a caso caso (ir adicionando semanalmente)

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO			
SEMANA X	MVJE_807	El 19 de septiembre del 2022 el señor Ariel Quintana del sector de Jerusalén del la Localidad de Ciudad Bolívar firma la renuncia, el día 22 de septiembre del 2022 por medio del comunicado HÁBITAT-S&C INTER-ADMI-011 remisión de una renuncia , la en mención. Por motivo "No le gustan los materiales "	El 22 de septiembre se realiza radicación por medio del Numero : 1-2022-40057 donde se adjunta la renuncia y respectiva justificación puesto que el propietario y padre del beneficiario manifestaron obtener el recurso económico (subsidio en efectivo), por lo cual , desde el contratista e interventoría se realiza dos visitas de seguimiento donde se explica el detalle de la regulación y la realización del mismo.
SEMANA X			

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizandoce a medida que se vayan realizado actividades frente a caso caso (ir adicionando semanalmente)

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 4 (Consecutivo) **DEL** 24 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

SEMANA X				
SEMANA X				

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizandoce a medida que se vayan realizado actividades frente a caso caso (ir adicionando semanalmente)
En todo caso se deberá adjuntar el documento "Matriz Seguimiento PQRS - por interventoria."

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:	
Gestión Administrativa	El 28 de septiembre del 2022 , se realiza radicacion a SDHT, por medio del comunicado 1HABITAT-S&CINTER-TEC-017 Remisión Cronograma de obra del grupo 3.
	El 28 de septiembre del 2022 , se realiza radicacion a SDHT, por medio del comunicado 1HABITAT-S&CINTER-ADMI-016 Remisión de informe semanal de interventoria No 3.
	el 29 de septiembre se envio al contratsita el comunicado HABITAT-S&CINTER-TEC-018 ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR NO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA -GRUPO 3.

5. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 4 (Consecutivo) **DEL** 24 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

DISPOSICIÓN RCD M3		**ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorizació)**	**No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA**
SEMANA 4	**0 M3**	Por el momento no se han generados escombros	
MES	**1**		
SECTOR			

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**0 M3**

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		**CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA**
SEMANA 4	**0 M3**	Por el momento no se han generado residuos peligrosos
MES	**1**	
SECTOR		

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**0 M3**

6. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	**6**	**CAPACITACONES REALIZADAS**	**13**	**ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS**	**0**
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			**31**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**12**
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA		**PERSONAL OBRERO**	**9**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**N/A**
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA		**PERSONAL OBRERO**	**N/A**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**N/A**

INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	**3**	**CAPACIONES REALIZADAS**	**3**	**ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS**	**0**
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					**12**

7. ANEXOS

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA 4	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. **4** **DEL** **24 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo dd-mm-aa dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **993 del 2022**

(Número de Contrato) (Número de Contrato)

Registro Fotografico

								
Apertura de obra #25 MVAL_02493 Héctor Julio Vargas Niño	Apertura de obra #24 MVAL_02466 Sara Ávila Bohórquez	Validación efectivo MVAL_1701 Cesar Gordo Barrero						

3. XXXXXXXX

4. XXXXXXXX

5. XXXXXX

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los treinta (Día en letras) 30 (Día en números) días del mes del septiembre (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Nombre: (Nombre) ING.Pedro Beltran

Cargo: Director de Interventoría

INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA 4

CONSULTORÍA

INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA GRUPO 3

No.	ID MV	ESTADO	VALIDACION				APERTURA				CIERRE		DIRECCION	NOMBRE
			PROG	DURACION	REAL	DURO	PROG	DURACION	REAL	DURO	PROG	REAL		
1	MVAL_02252	VALIDADA	16-sep	12	15-sep	-1	28-sep	34			1-nov		KR 7B ESTE 108 53 SUR	ORLINDA JURADO GARZON
2	MVAL_02253	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		KR 7A BIS ESTE 108 54 SUR	ARGELIA ORTEGON ORTEGON
3	MVAL_02339	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7F ESTE 108 27 SUR MJ	LAURA PATRICIA QUIMBAYO GAITAN
4	MVAL_02347	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7F ESTE 108 53 SUR	PEDRO ALBERTO GUARNIZO CRUZ
5	MVAL_02356	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7G ESTE 108 52 SUR	GRACIELA MARTINEZ CAÑON
6	MVAL_02363	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		1	ANA HILDA BUSTOS GAONA
7	MVAL_02403	VALIDADA	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 108 41 SUR	MARIA INES BONILLA MORALES
8	MVAL_02408	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 108 63 SUR	JORGE ELIECER VERNAZA RESTREPO
9	MVAL_02409	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	26-sep	2	1-nov		CL 109 SUR 7I 22 ESTE	MARY SANCE RODRIGUEZ
10	MVAL_02410	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		CL 109 SUR 7I 18 ESTE	JUAN BAUDILIO UYAZA BELTRAN
11	MVAL_02422	VALIDADA	16-sep	12	19-sep	3	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 108 36 SUR	JUDITH IBAGUE VILLALBA
12	MVAL_02436	VALIDADA	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34			1-nov		KR 8 ESTE 108 29 SUR	BLANCA FLOR RAMIREZ SOSA
13	MVAL_02466	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	26-sep	2	1-nov		KR 8A ESTE 108 45 SUR	SARA AVILA BOHORQUEZ
14	MVAL_02470	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 8A ESTE 108 63 SUR MJ	ORVEIN QUINTERO
15	MVAL_02493	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	26-sep	2	1-nov		KR 8A BIS ESTE 108 13 SUR MJ	HECTOR JULIO VARGAS NIÑO
16	MVAL_02506	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		CL 109 SUR 7B 09 ESTE	OLGA EDIT MORENO MORENO
17	MVAL_02511	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		KR 7C ESTE 109 31 SUR IN 1 MJ 1	VICTOR GABRIEL CONTRERAS
18	MVAL_02527	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		KR 7D ESTE 109 15 SUR	JORGE ELIECER HILARION CLAVIJO
19	MVAL_02530	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		KR 7D ESTE 109 29 SUR	JORGE ELIAS OLARTE DIAZ
20	MVAL_02569	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7H ESTE 109 13 SUR	NURIAN RUTH BALLEN SALCEDO
21	MVAL_02572	VALIDADA	16-sep	12	15-sep	-1	28-sep	34			1-nov		CL 109 SUR 7H 23 ESTE	FABIO ANDRES VILLALBA BUITRAGO
22	MVAL_02575	VALIDADA	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34			1-nov		KR 7H ESTE 109 18 SUR	BLANCA LEONOR PINTO BUENO
23	MVAL_02585	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 109 24 SUR	ANA BERTILDA BELLAIZAN PEÑA
24	MVAL_02589	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 8 ESTE 109 31 SUR	WILIAN GONZALEZ LLANO
25	MVAL_02590	VALIDADA	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34			1-nov		KR 8 ESTE 109 37 SUR	LUZ YAMILE MARIN
26	MVAL_02484	VALIDADA	3-oct	11	12-sep	-21	14-oct	34			17-nov		KR 8A ESTE 108 20 SUR MJ 1	LUIS EDUARDO MORA
27	MV_1595	VALIDADA	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34			18-nov		CL 105A SUR 7B 54 ESTE	CARLOS DIAZ SEPULVEDA
28	MV_1598	VALIDADA	4-oct	11	28-sep	-6	15-oct	34			18-nov		CL 105 SUR 7B 05 ESTE	GILBERTO JUNCO CICUA
29	MVAL_01739	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		CL 108 SUR 7B 16 ESTE	MARIA IRENE MALAVER SANCHEZ
30	MVAL_01767	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7C ESTE 107 35 SUR MJ	ALFONSO BOGOTA MORENO
31	MVAL_01768	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7C ESTE 107 39 ESTE	HERMENCIA MONSALVE MEJIA
32	MVAL_01787	VALIDADA	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 105A 09 SUR	EVELIO CAICEDO ROBAYO
33	MVAL_01876	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		CL 107 SUR 7H 08 ESTE MJ	CLARA INES HERNANDEZ TORRES
34	MVAL_01879	VALIDADA	4-oct	11	23-sep	-11	15-oct	34			18-nov		KR 7H ESTE 106 62 SUR	ANDREA JOHANNA GARCIA VELASQUEZ
35	MVAL_01890	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 106 47 SUR	ROSA ELENA CAMACHO CELIS
36	MVAL_01894	VALIDADA	4-oct	11	23-sep	-11	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 106 63 SUR	HERMELINDA BARBOSA PINZON
37	MVAL_01902	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 106 44 SUR	BLANCA YANETH ANZOLA
38	MVAL_01913	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 8 ESTE 106 53 SUR	MARIA AMPARO MOLANO SALDAÑA
39	MVAL_01914	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 8 ESTE 106 57 SUR	VICTOR MANUEL YATE YATE
40	MVAL_01915	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 8 ESTE 106 61 ESTE	CESAR AUGUSTO ROCHA RODRIGUEZ
41	MVAL_01957	VALIDADA	4-oct	11	19-sep	-15	15-oct	34			18-nov		KR 8A ESTE 107 17 SUR	LUZ DARI VASQUEZ LONDOÑO
42	MVAL_01959	VALIDADA	4-oct	11	19-sep	-15	15-oct	34			18-nov		KR 8A ESTE 107 29 SUR	JOSE MIGUEL MORENO PARADO
43	MVAL_01977	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 54 SUR	VICTOR HERNAN RODRIGUEZ CALDERON

44	MVAL_01990	VALIDADA	4-oct	11	23-sep	-11	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 08 SUR	BLANCA OLINDA ESCARRAGA ESCARRAGA
45	MVAL_01998	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 8 ESTE 107 43 SUR MJ	MARLENI LADINO DE LOPEZ
46	MVAL_02015	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7H ESTE 107 54 SUR	PAOLA CONSTANZA CELIS RODRIGUEZ
47	MVAL_02017	VALIDADA	4-oct	11	19-sep	-15	15-oct	34			18-nov		KR 7H ESTE 107 44 SUR	BLANCA CECILIA LARA SUAREZ
48	MVAL_02034	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 13 SUR	JOSE ARISTIDES CHAVEZ YEPES
50	MVAL_02043	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 55 SUR	CAROLINA CARRILLO
51	MVAL_02066	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		CL 107 SUR 7G 13 ESTE MJ	YAZMIN GARCIA VARGAS
52	MVAL_02079	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7H ESTE 107 55 ESTE	EUSEBIO JHAIR RODRIGUEZ GONZALEZ
54	MVAL_02089	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7F ESTE 107 46 SUR	FROILAN RUIZ BELTRAN
56	MVAL_02098	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		CL 107 SUR 7F 13 ESTE	OVIDIO ANTONIO BETANCUR ARIAS
58	MVAL_02113	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 64 SUR	JOSE ALIRIO GARZON SUAREZ
59	MVAL_02114	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 60 SUR	GLADYS MIREYA ANZOLA VASQUEZ
60	MVAL_02115	VALIDADA	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 54 SUR	ERLY YOLANDA GORDILLO RODRIGUEZ
61	MVAL_02121	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 30 SUR	ENRIQUE FUENTES SEPULVEDA
62	MVAL_02165	VALIDADA	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 23 SUR	ROMULO LOZANO
63	MVAL_02166	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 27 SUR MJ	ARGELIA GUTIERREZ DURAN
64	MVAL_02169	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 43 SUR	LUIS EDUARDO ARCINIEGAS ARCINIEGAS
65	MVAL_02366	VALIDADA	4-oct	11	14-sep	-20	15-oct	34			18-nov		KR 7G ESTE 108 14 SUR MJ 1	MARINA MOTTA MEDRANO
75	MV_1301	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 105 03 SUR	MARCO TULIO FANDIÑO VASQUEZ
87	MV_1611	VALIDADA	21-oct	12	26-sep	-25	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7B 77 ESTE	DORA YANET ROJAS SEPULVEDA
88	MV_1612	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7B 70 ESTE	NEYLA VARGAS
89	MV_1614	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7B 58 ESTE	ANA MARIA BAQUERO PEREZ
105	MV_1697	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 48 ESTE	GONZALO JIMENEZ ANZOLA
106	MV_1698	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 42 ESTE	EVANGELINA AMAYA ALEY
107	MV_1699	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 36 ESTE	MARIA EMPERATRIZ TORRES HORTUA
108	MV_1701	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 24 ESTE	CESAR GORDO BARRERO
113	MV_1724	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105A SUR 7F 06 ESTE	JOSE ALEJANDRO SANTA LUNA
114	MV_1733	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 23 ESTE	ELCIRA SANTOS TINOCO
115	MV_1735	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 35 ESTE	ROSA MARIA TORRES GARCIA
146	MVCB_4859	VALIDADA	8-nov	13	8-sep	-61	21-nov	33			24-dic		CL 67D SUR 18U 74	EVELIA MUÑOZ
164	MVJ_0122	VALIDADA	8-nov	13	14-sep	-55	21-nov	33			24-dic		CL 82A SUR 46A 37	RICAURTE GRAJALES
182	MVJE_807	RENUNCIA	8-nov	13	19-sep	-50	21-nov	33			24-dic		KR 45A 75A 55 SUR	ARIEL QUITIAN MATEUS
