
ACTAS DE VECINDAD

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	163	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

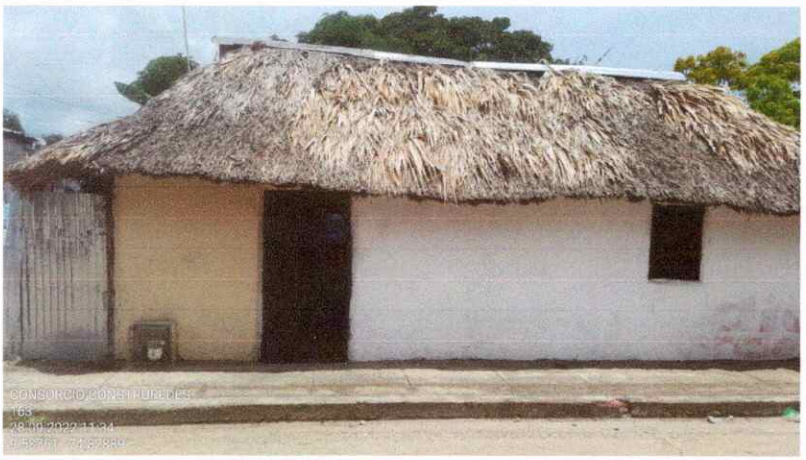

PROPIETARIO	ETILVIA BECERRA FONSECA		
DIRECCIÓN	CL 10		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,7	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	N	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque pañetado y acabado en pintura,puerta y ventana en madera,cubierta en madera y palma,anden en concreto.
Panoramica interna de la vivienda cuenta con muros en bahareque pañetado y con pintura, piso en cemento liso, unidad sanitaria con muros en mamposteria rebocados y acavados en ceramica.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Etilvia Becerra

Firma
Nombre: ETILVIA BECERRA FONSECA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.853.632

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

eterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	INC 011	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JAVIT GUISADO ORTEGA.		
DIRECCIÓN	CL 7 4A-41		
TELÉFONO	3204534157	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9.00	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada frontal actual de la vivienda, cuenta con muros en mamposteria revocados con acabado en pintura, ventanas en aluminio con protectores en hierro, cubierta en zin , anden en concreto. El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabado en pintura pisos en cemento liso, zona de cocina con muros a la vista piso en cemento y gravilla sin lavaplatos, cubierta en madera y zin, la zona de lavadero no cuenta con aparato fijo.

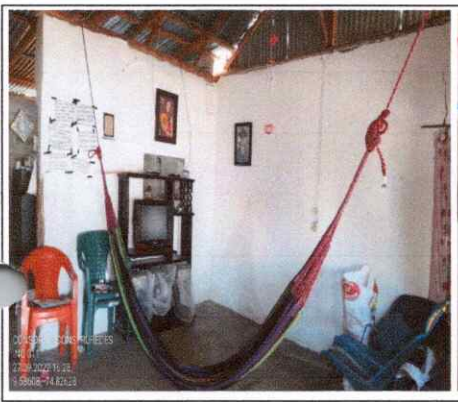

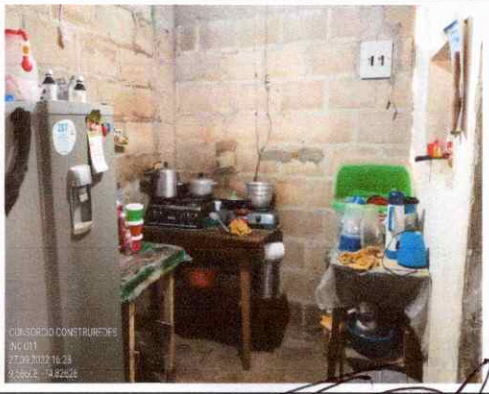



Firma		Firma	
Nombre:	JAVIT GUISADO ORTEGA PROPIETARIO DEL PREDIO	Nombre:	RONAL BLANCO ARROYO REPRESENTANTE CONTRATISTA
C.C. / NIT	73.316.157		

Firma	
Nombre:	RONALD JAVIER ARRIETA REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

eterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 017	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	DIGNA ORTEGA BOHORQUEZ.		
DIRECCIÓN	CL 9 4A-41		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8.00	ESTRATO	1

2. DATOS DEL PREDIO

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologias definidas en el acuerdo No 105 de 2003>

La fachada frontal actual de la vivienda cuenta con cubierta en madera y zin, muros en bahareque pañetado,puerta en madera, anden en concreto en mal estado.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque con pañete en mal estado y grietas, humedad a 40 cm de altura, pisos en arena , cubierta en madera y zin, espacio de unidad con muros revocados y pañetados con humedad y grietas.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: DIGNA ORTEGA BOHORQUEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.854.558

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES											
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A											
REGISTRO No.	INC 025	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MARGELIS JIMENEZ RAMIREZ		
DIRECCIÓN	CL 12 4A-64		
TELÉFONO	3216071002	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	16.80	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada frontal actual de la vivienda en laminas de zin anden en arena.
El interior de la vivienda cuenta con pisos en arena,cubierta en madera y palma, espacios internos de la vivienda se encuentran construidos artesanalmente en plastico y madera, zona de unidad sanitaria construida artesanalmente con plastico y madera , no cuenta con aparato sanitario fijo.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: MARGELIS JIMENEZ RAMIREZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.854.946

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576							Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO												
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES												
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A												
REGISTRO No.	INC 029	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

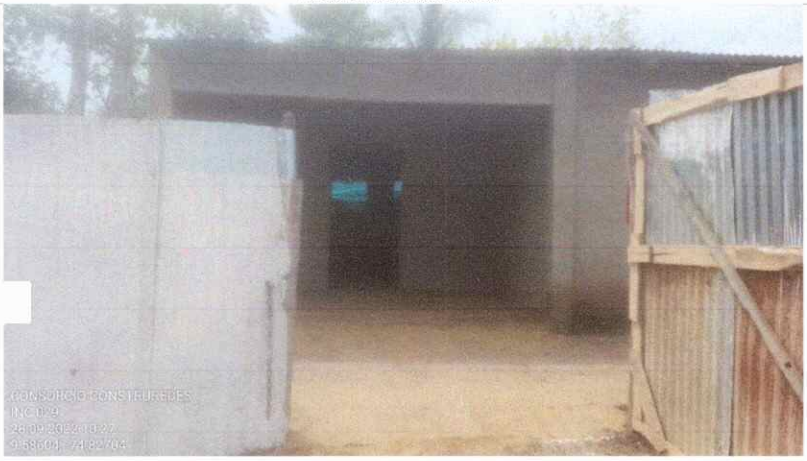

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JUAN CARLOS OCHOA FONSECA		
DIRECCIÓN	CL 7 KR 5		
TELÉFONO	3245172879	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12.00	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada frontal actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados sin pintar, terraza en arena , cubierta en madera y zin.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria rebocados sin pintar, pisos en arena, zona de cocina con mesón en concreto sin acavados, no cuenta con conexiones de agua intradomiciliarias.

4. ANEXO FOTOGRAFICO





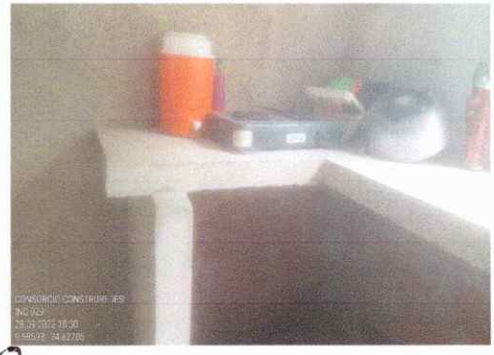

Firma: Juan Carlos Ochoa F
Nombre: JUAN CARLOS OCHOA FONSECA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.049.453.664

Firma:
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 030	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

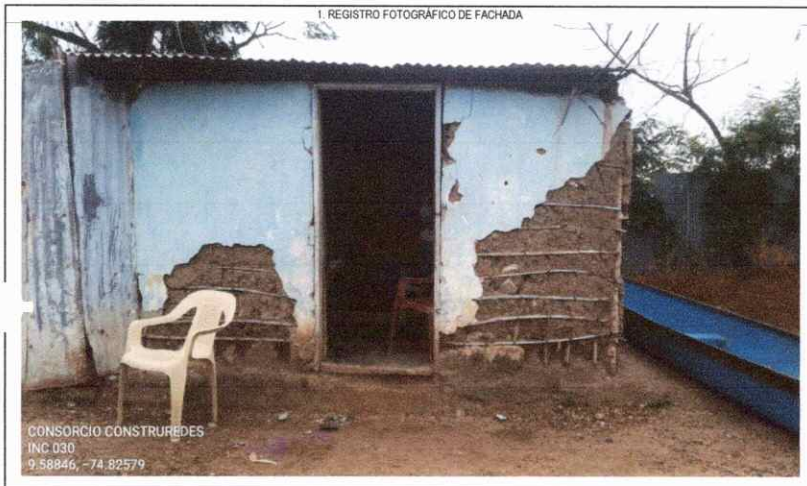

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	HUMBERTO RODRIGUEZ PIÑA		
DIRECCIÓN	CL 11		
TELÉFONO	3205971430	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	N	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachadafrontal actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque con pañete en mal estado, cubierta en madera zinc, anden en arena y puerta en madera.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bareheque con pañete en mal estado y grietas, piso en arena, zona de labores se evidencia sin aparato de lavaplatos fijo, la vivienda no cuenta con un espacio de unidad sanitaria adecuado, se evidencia sin muros y piso en concreto en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: HUMBERTO RODRIGUEZ PIÑA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.315.414

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 031	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	PATRICIA ANAYA LEGUIA		
DIRECCIÓN	CL 12 4A-64		
TELÉFONO	3126071002	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12.5	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura, ventanas en aluminio con protectores en hierro, cubierta en madera y zinc, teraza en cemento liso.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y cabado en pintura, pisos en cemento liso, cubierta en madera y zinc, zona de cocina se evidenci lavaplaos en mal funcionamiento, la unidad sanitaria se evidencia muros a la vista sin puerta de privacidad.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



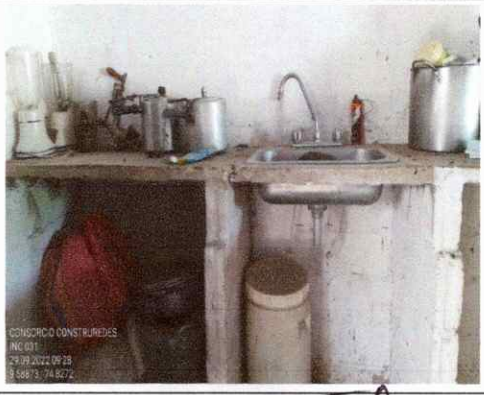



Firma
Nombre: PATRICIA ANAYA LEGUIA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.854.100

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 043	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

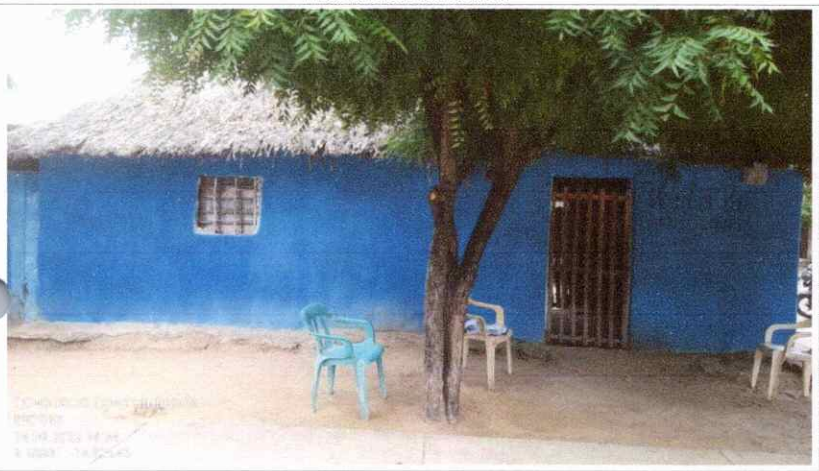

PROPIETARIO	JOSEFINA FERNANDEZ ANAYA		
DIRECCIÓN	CL 13 4A-26		
TELÉFONO	3243347067	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8.00	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada frontal actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque con pañete y pintura, cubierta en palma, puerta en madera y anden en arena.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque y pisos en arena, se evidencia que la vivienda recibe el agua de un vecino, no cuenta con aparato fijo de lavaplatos.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



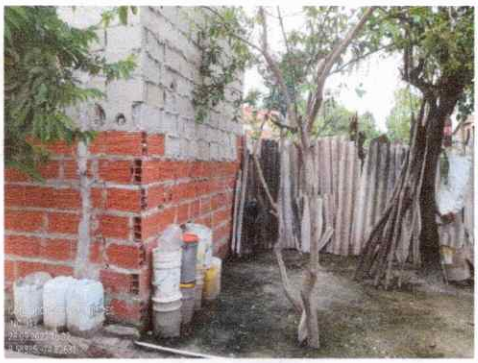



Firma: Josefina Fernandez A
Nombre: JOSEFINA FERNANDEZ ANAYA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.855.756

Firma:
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

eterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 044	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MARINA ROMERO VILLA		
DIRECCIÓN	CL 12 4A-52		
TELÉFONO	3005517600	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	13.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con muros en bahareque con pintura en mal estado, cubierta en madera y zinc, puerta en madera y anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque con pañete en mal estado, pisos en arena y cubierta en madera zinc, unidad sanitaria con muros externos en mal estado, muros internos con humedad a 40cm de altura y pisos en cemento y gravilla en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO





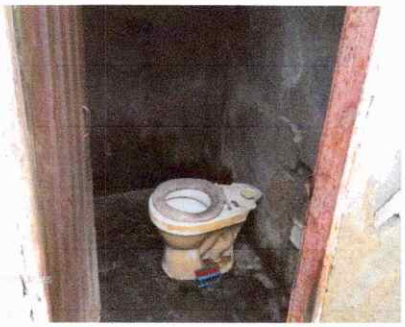

Firma marinaromero
Nombre: MARINA ROMERO VILLA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.854.569

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 063	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ADOLDO PINEDA CANTILLO		
DIRECCIÓN	CL 11 4A-50		
TELÉFONO	3216480546	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	13.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura, ventanas en aluminio con protectores en hierro, puerta en madera y terraza en concreto. El interor de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura, cubierta en madera y zinc, la unidad sanitaria cuenta con muros revocados en mal estado, piso en concreto agrietado, sin aparato sanitario de lavamanos , ducha en mal estado, taza campesina conectada a poso séptico.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ADOLFO PINEDA CANTILLO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.315.242

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de	1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO									
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES									
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A									
REGISTRO No.	INC 064	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO		REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	GERARDO RIVERA BALLESTA		
DIRECCIÓN	CR 7 CL 8-35		
TELÉFONO	3015471227	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12.40	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura, cubierta en madera y zinc,ventana en aluminio con protectores en hierro, puerta en aluminio con reja en hierro. El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura,pisos en cemento liso, se evidencia zona de cocina sin aparato de lavaplatos fijo, zona de labores se evidencia que no cuenta con aparato fijo de lavadero.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



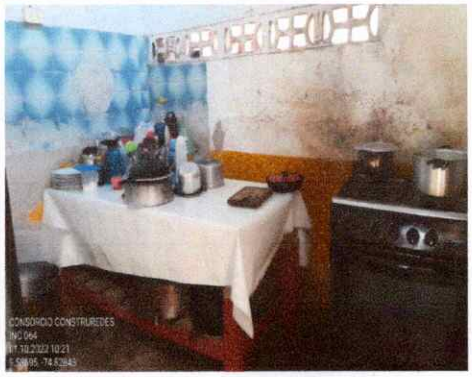



Firma
Nombre: GERARDO RIVERA BALLESTA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.333

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	INC 070	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	TOMAS VALLE ORTEGA		
DIRECCIÓN	CL 8 5A - 16		
TELÉFONO	3015441383	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	14.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada frontal actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados sin acabado, ventanas en aluminio con protectores en hierro, cubierta en madera y zinc,terraza en concreto. El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados sin acabados, pisos en cemento liso , zona de cocina se evidencia que no cuenta con aparato fijo de lavaplatos, se evidencia ducha de unidad sanitaria en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO





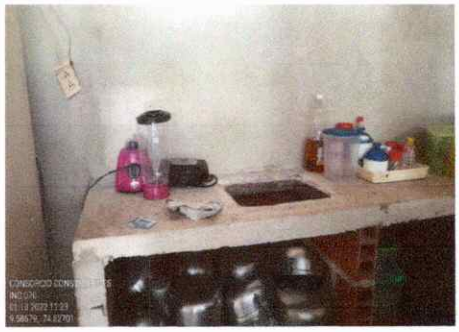

Firma
Nombre: TOMAS VALLE ORTEGA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.106

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copies: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576								Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO													
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES													
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A													
REGISTRO No.	INC 071	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO			REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	EDINSON CRUZATE MEDINA		
DIRECCIÓN	CL 8 KR 4A-54		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION :<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada frontal actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura, ventana en aluminio con protector en hierro, teraza en ceramica con rejas en hierro. El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura, pisos en ceramica, se evidencia unidad sanitaria con ducha en mal estado, zona de cocina con mezon y lavaplatos en buen estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: EDINSON CRUZATE MEDINA
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 73.210.898

Firma

Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

eterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	INC 072	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	EDINSON CRUZATE MEDINA		
DIRECCIÓN	KR 5 CL 8-34		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura, ventanas en aluminio con protectores en hierro, cubierta en madera y zinc, terraza en concreto con acabados en ceramica. El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura, pisos en cemento liso, zona de cocina cuenta con lavaplatos en buen estado, unidad sanitaria en buen estado y buen funcionamientos de aparatos sanitarios.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: EDINSON CRUZATE MEDINA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.210.898

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original. ENTerritorio
Copias. Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	INC 091	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	SINDY RAMIREZ GALINDO		
DIRECCIÓN	KR 7A CL 11-37		
TELÉFONO	3205056612	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada frontal actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura, ventanas en aluminio con protectores en hierro, cubierta en madera y zinc y anden en concreto en mal estado. El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura, pisos en ceramica, zona de cocina se evidencia lavaplatos en mal estado, zona de labores no cuenta con aparato de lavadero fijo.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: SINDY RAMIREZ GALINDO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.049.453.496

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 093	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

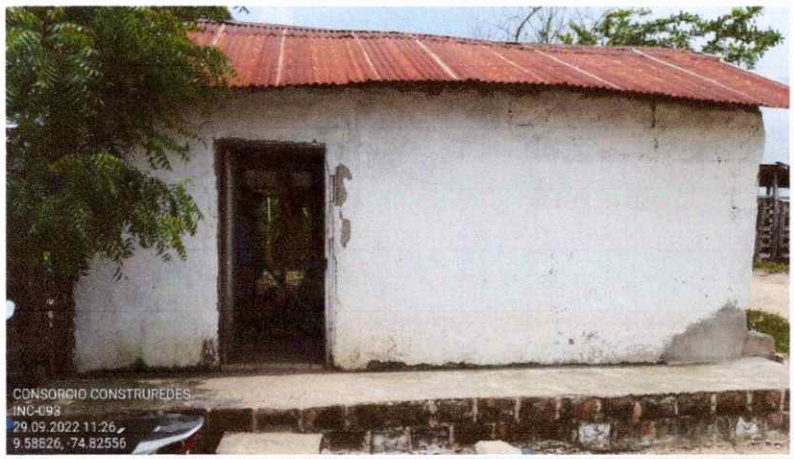

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	SANDRO GONZALEZ LAMBRAÑO		
DIRECCIÓN	CL 12 KR 4-2		
TELÉFONO	3117657035	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	13.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	N	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada frontal actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque pañetados con pintura en mal estado, cubierta en madera y zinc, puerta en madera y anden en concreto en mal estado. El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque en mal estado, pisos en arena , unidad sanitaria con aparatos con mal funcionamiento, muros internos con humedad a 50 cm de altura, piso en concreto en mal estado, muros externos de unidad sanitaria en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: SANDRO GONZALEZ LAMBRAÑO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.316.149

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 118	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	SANTIAGO ORTEGA OCHOA		
DIRECCIÓN	CL 7 CR 4A -29		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	14.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada frontal actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque con pañete y pintura en mal estado, cubierta en madera zinc, anden en concreto en mal estado y puerta en madera. El interior de la vivienda cuenta con muros en bareheque con pañete en mal estado y grietas, piso en cemento liso, zona de labores se evidencia sin aparato de lavaplatos fijo, la vivienda no cuenta con un espacio de unidad sanitaria adecuado, se evidencia muros a la vista en mal estado y piso en concreto en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: SANTIAGO ORTEGA OCHOA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.315.558

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 145	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

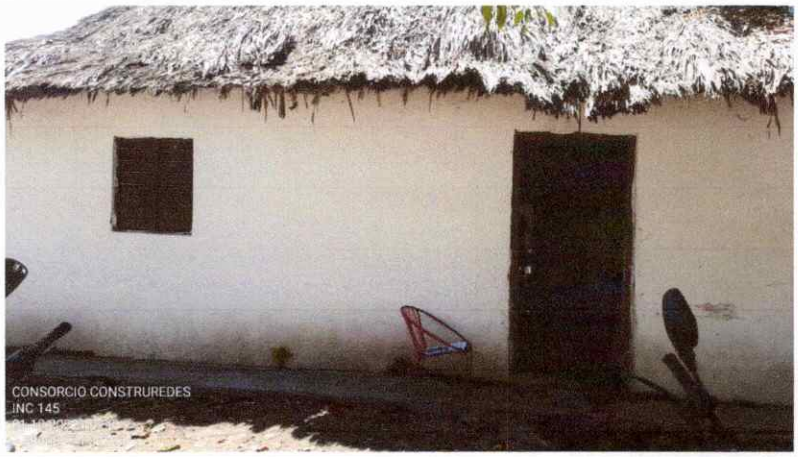

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ANTONIO CANTILLO PAYARES		
DIRECCIÓN	CL 7		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION :<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque, cubierta en palma, ventana en madera con protector en hierro, puerta en madera y anden en concreto en mal estado. El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque pañetado y pintura, pisos en cemento liso, se evidencia unidad sanitaria en un mal estado sin aparatos sanitarios, muros en mal estado piso en concreto en mal estado, no adecuado para uso.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ANTONIO CANTILLO PAYARES
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.484

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 173	FECHA	2022	10	1	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

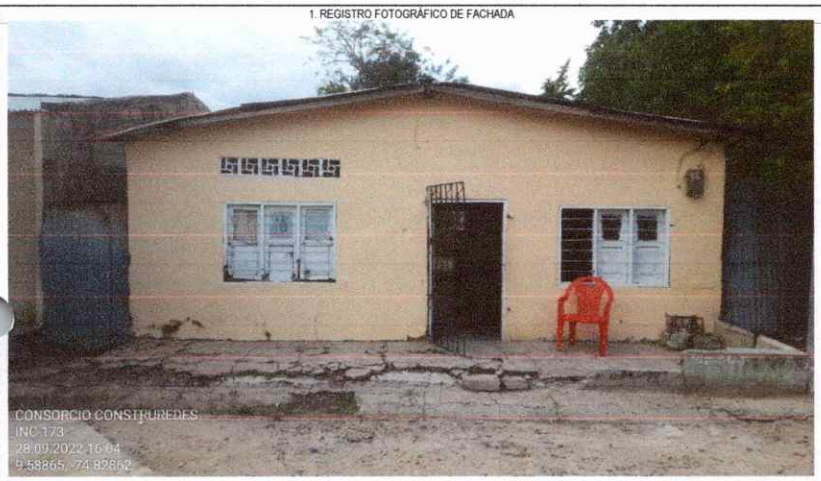

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	YEISON ALVAREZ HENAO		
DIRECCIÓN	CL 12 7-40		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revovados y acabados en pintura con humedad 30cm de altura, ventanas en madera con hierro, puerta en madera con reja en hierro, cubierta en madera y zinc , terraza en concreto en mal estado.

El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura en mal estado, piso en ceramica, zona de cocina se evidencia meson en mal esta sin aparato fijo de lavaplatos, unidad sanitaria con muros en mal estado humedad a 40cm de altura y piso en concreto en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma: Yeison Alvarez
Nombre: YEISON ALVAREZ HENAO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.049.452.007

Firma:
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 028	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	SOFIA FONSECA GONZALEZ		
DIRECCIÓN	CL 7 KR 5A-81		
TELÉFONO	3017900098	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,70	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada frontal actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,ventanas en aluminio con protectores en hierro, cubierta en madera zinc, ventana en aluminio con protectores en hierro, puerta y reja en metal. terraza en ceramica

El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura, piso con acabado en ceramica, zona de labores se evidencia sin aparato de lavaplatos fijo, área de cocina con muros en mal estado, meson en mal estado con aparato fijo en buen estado.







Firma
Nombre: SOFIA FONSECA GONZALEZ.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.854.294

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	INC 059	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JULIO MEDINA ARIAS		
DIRECCIÓN	CR 8 CL 8-21		
TELÉFONO	3008767577	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,puerta en madera, ventana en madera con protectores en hierro ,cubierta en madera zinc,terraza en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura , piso en cemento liso, área de cocina se evidencia meson sin aparato fijo lavaplatos. Unidad sanitaria se evidencian muros en mamposteria revocados con humedad a 70cm de altura, aparato sanitario fijo inodoro en mal funcionamiento.

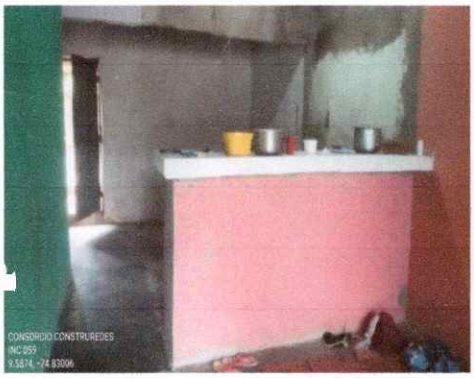





Firma
Nombre: JULIO MEDINA ARIAS
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73,316,758

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	INC 075	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	IRMA PINEDA CASERES		
DIRECCIÓN	CL 9		
TELÉFONO	3128607450	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9,0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura y ceramica,puerta y ventana en aluminio,terraza en ceramica.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura , piso con acabado en ceramica, área de cocina se evidencia meson con aparato fijo lavaplatos con tuberias en mal estado. Unidad sanitaria se evidencian muros y piso con acbados en ceramica,aparatos sanitarios en mal funcionamiento.







Firma Irma Pineda
Nombre: IRMA CASERES PINEDA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22,855,241

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra politica de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 077	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

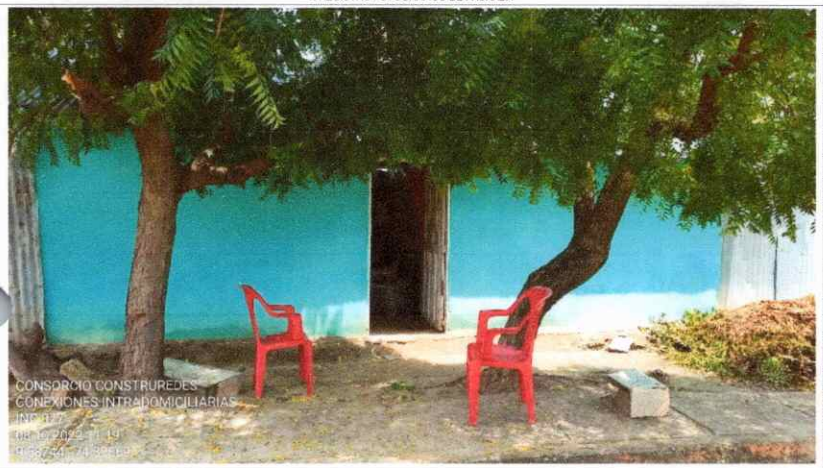

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	TOMAS FONSECA GONZALEZ		
DIRECCIÓN	CL 09		
TELÉFONO	3106108785	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÌA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura,puerta en madera ,cubierta en madera zinc, anden en arena.
El interior de la vivienda cuenta con muros a la vista, pisos en arena, unidad sanitaria cuenta con muros externos y internos con humedad a 70cm de altura, aparato fijo inodoro en mal estado.





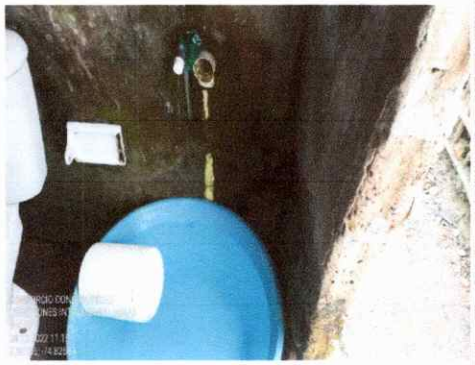

Firma
Nombre: TOMAS FONSECA GONZALEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
73,316,355

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 084	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MOISES VERGARA VEGA		
DIRECCIÓN	CL7 CR 7-75		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque revocados y acabados en pintura en mal estado,puerta en madera, ventana en madera ,cubierta en madera y palma, anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque revocado y acabados en pintura , piso en cemento liso, área de cocina se evidencia sin aparato fijo lavaplatos. Unidad sanitaria se evidencian muros a la vista con humedad, sin techo, aparato sanitario en mal estado.

ANEXO FOTOGRAFICO

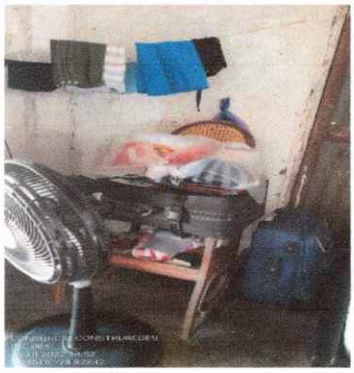



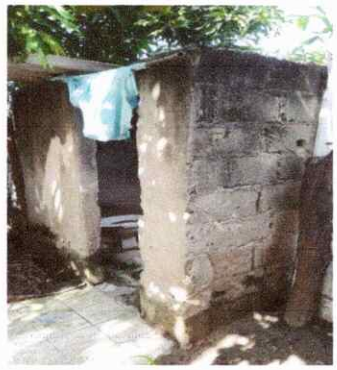

Firma Moisés Vergara V
Nombre: MOISES VERGARA VEGA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.916

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

eterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 086	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ADRIANA OCHOA MENDEZ		
DIRECCIÓN	CL 7 CR 7-30		
TELÉFONO	3028070651	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,30	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,puerta, ventanas y protectores en aluminio ,terraza en concreto con acabado en ceramica El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura , piso con acabado en ceramica, área de cocina se evidencia meson con aparato fijo lavaplatos. Unidad sanitaria se evidencian murosy piso con acbados en ceramica, aparatos sanitariosfijos inodoro y lavamanos en buen funcionamiento.







Firma
Nombre: ADRIANA OCHOA MENDEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 55,249,111

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 087	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	DAMARIS CONTRERAS DE AVILA		
DIRECCIÓN	CL 8 KR 7-41		
TELÉFONO	3022606160	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,puerta en madera, ventana en madera ,cubierta en madera zinc, anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura , piso con acabado en ceramica, área de cocina se evidencia meson sin aparato fijo lavaplatos.
Unidad sanitaria se evidencian muros con acbados en ceramica,pisos en ceramica aparatos sanitarios en buen funcionamiento.



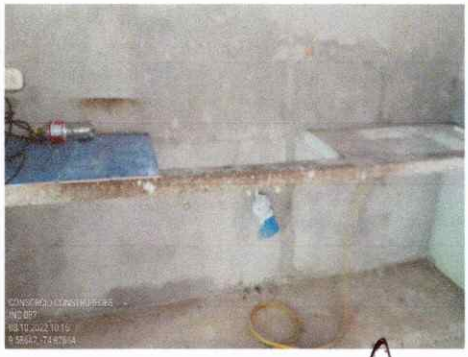



Firma
Nombre: DAMARIS CONTRERAS DE AVILA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 33.153.541

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	INC 094	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ROBERTO FONSECA RODRIGUEZ		
DIRECCIÓN	CL 8 4-40		
TELÉFONO	3002994268	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	21.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÌA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura en mal estado,puerta y ventanas en madera ,cubierta en madera zinc, anden en arena. El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura , piso en cemento, área de cocina se evidencia meson sin aparato fijo lavaplatos. Unidad sanitaria se evidencian muros revocados y acabados en pintura,piso en cemento liso con grietas, aparatos sanitarios en mal funcionamiento, se evidencia área de lavores sin aparato fijo de lavaplatos.

ANEXO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: ROBERTO FONSECA RODRIGUEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 73,316,888

Firma

Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 095	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

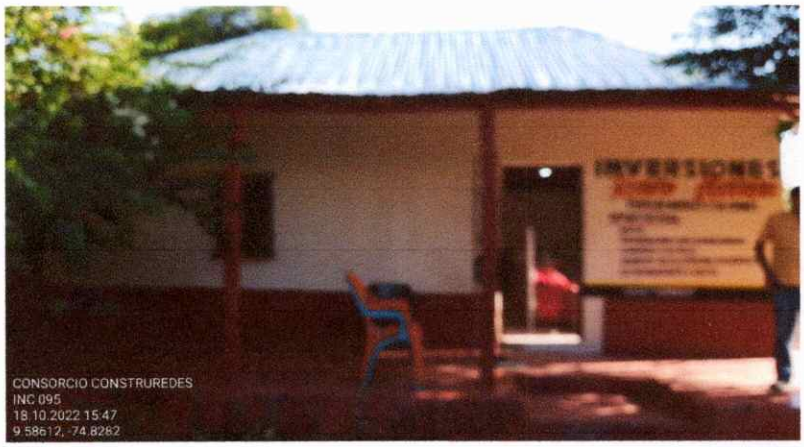

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	FRANCISCO ROMERO HERRERA		
DIRECCIÓN	CR 7 CL 7-71		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÌA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,puerta en madera, ventana en madera ,cubierta en madera zinc, terraza en ceramica.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura, se evidencia unidad sanitaria con muros y pisos con acabados en ceramica, aparatos sanitarios en mal funcionamiento.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



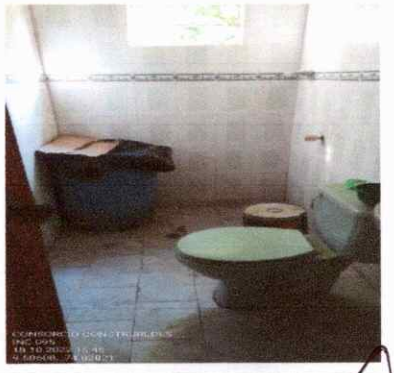



Firma
Nombre: FRANCISCO ROMERO HERRERA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 7,469,781

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	INC 099	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ESTER VERGARA RIVERA		
DIRECCIÓN	CL 6 6 -50		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,1	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,puerta en madera, ventana en madera con protector en hierro ,cubierta en madera zinc, anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura , piso en cemento liso, área de cocina se evidencia meson sin aparato fijo lavaplatos. Unidad sanitaria se evidencian muros revocados sin acavados ,piso en ceramica aparatos sanitarios en buen funcionamiento.





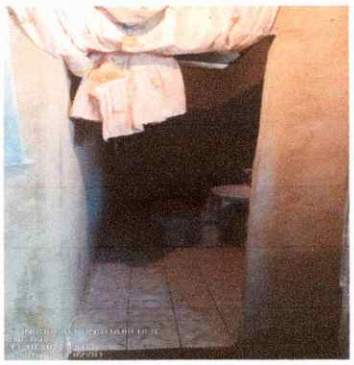

Firma
Nombre: ESTER VERGARA RIVERA
PROPIETARIO DEL PREDIO
22,853,845

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	INC 101	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	EDILBERTO FONSECA GONZALEZ		
DIRECCIÓN	CL 7 CR 5-49		
TELÉFONO	3127520103	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO			NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL			RURAL		
DOTACIONAL			RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS			OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,puerta y ventanas en aluminio con protectores en hierro, anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura , pisos con acabados en ceramica, área de cocina se evidencia meson en concreto con acabado en ceramica y aparato fijo lavaplatos, area de lavores se evidencia que no cuenta con aparato fijo de lavadero.







Firma
Nombre: EDILBERTO FONSECA GONZALEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
3,831,424

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 108	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ORMEDO MEDINA HENAO		
DIRECCIÓN	CL 6 KR 4 - 45		
TELÉFONO	3126569240	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL		X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO			NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL			RURAL		
DOTACIONAL			RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS			OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque revocados y acabados en pintura,puerta y ventana en madera ,cubierta en madera zinc, anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque revocados y acabados en pintura , pisos en cemento liso, área de cocina se evidencia que no cuenta con aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria con muros en mamposteria revocados en muy mal estado, presentan humedad a 90 cm de altura,piso en concreto presenta grietas, los aparatos sanitarios en muy mal estado y sin buen funcionamiento.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ORMEDO MEDINA HENAO
PROPIETARIO DEL PREDIO
73,316,685

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 109	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ELEIDA CASSERES ALVAREZ		
DIRECCIÓN	CR 5A 12-40		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10.90	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO			NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL			RURAL		
DOTACIONAL			RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS			OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,puerta y ventana en aluminio con protectores en hierro ,cubierta en madera zinc, terraza con acabado en ceramica

El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura , pisos en cemento liso, área de cocina se evidencia meson con aparato fijo lavaplatos con llave en mal funcionamiento, unidad sanitaria cuenta con muros revocados sin acabados,piso con acabado en ceramica se evidencian aparatos fijos en mal funcionamiento.

ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ELEIDA CASSERES ALVAREZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
22,854,229

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576							Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO									
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES									
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A									
REGISTRO No.	INC 123	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO		REVISÓ		RONAL JAVIER ARRIETA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	DEMETRIO PALOMINO ESCOBAR		
DIRECCIÓN	CL 6 CR 5-1		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,puerta en madera y ventanas en madera con protectores en hierro ,cubierta en madera zinc, terraza en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura , pisos en cemento liso, área de cocina se evidencia que no cuenta con aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria cuenta con muros revocados sin acabados con humeda a 50cm de altura,piso en concreto en mal estado,se evidencian aparatos fijos en mal funcionamiento.



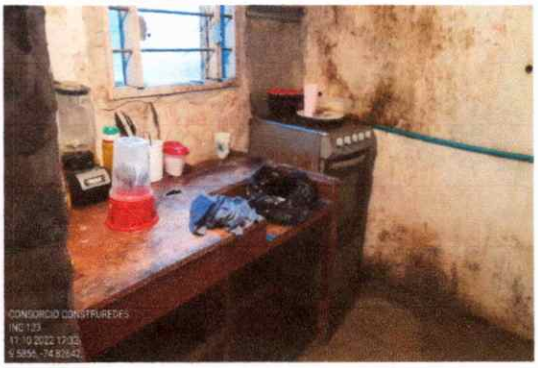

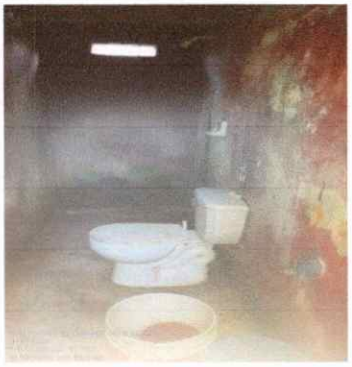

Firma
Nombre: DEMETRIO PALOMINO ESCOBAR
PROPIETARIO DEL PREDIO
9,127,197

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2220576								Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES											
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A											
REGISTRO No.	INC 124	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

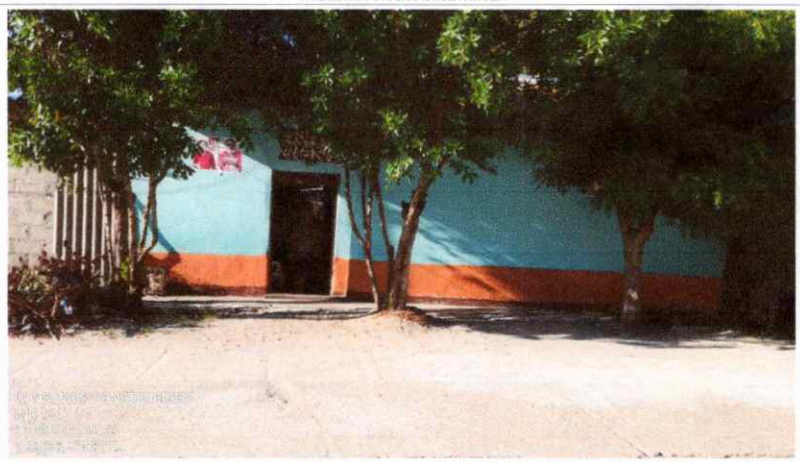

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	BENJAMIN ALVAREZ MARTINEZ		
DIRECCIÓN	CL 6 CR 5-160		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9,0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,puerta en madera ,cubierta en madera zinc, anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura , pisos en cemento liso, área de cocina se evidencia que no cuenta con aparato fijo lavaplatos.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

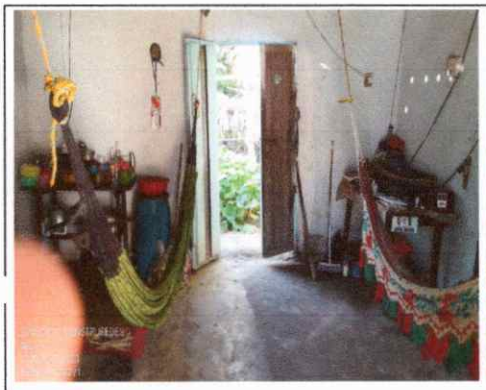





Firma
Nombre: BENJAMIN ALVAREZ MARTINEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
5,070,299

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES											
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A											
REGISTRO No.	INC 125	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	CARLOS ARTURO CAMPO PEÑA		
DIRECCIÓN	CL 10 CR 8-26		
TELÉFONO	3015037220	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,5	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	N	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura,puerta en zinc, ventana en madera con protector en hierro,cubierta en madera zinc, anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura en mal estado, piso en cemento liso,cubierta en madera y zinc, área de cocina se evidencia meson en mal estado sin aparato fijo lavaplatos. Unidad sanitaria se evidencian muros con grietas y ducha sin funcionamiento adecuado.

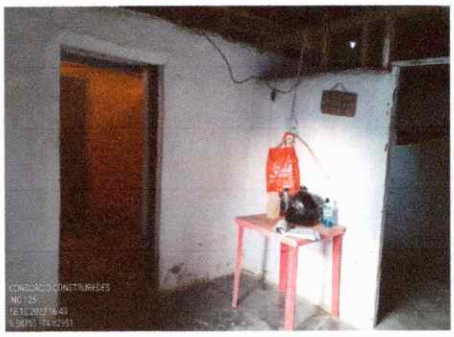





Firma
Nombre: CARLOS CAMPO PEÑA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 12,597,025

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 127	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



PROPIETARIO	CLOTILDE FONSECA ROMERO		
DIRECCIÓN	CL 6 KR 5-55		
TELÉFONO	3113716190	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	14.50	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque revocados, puerta y ventana en madera,cuubierta en madera i zinc,anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque,piso en cemento liso, unidad sanitaria se evidencian muros en mamposteria revocados, piso con acabado en ceramica, aparatos sanitarios fijos en mal funcionamiento, área de cocina se evidencia que no cuenta con aparato fijo lavaplatos.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

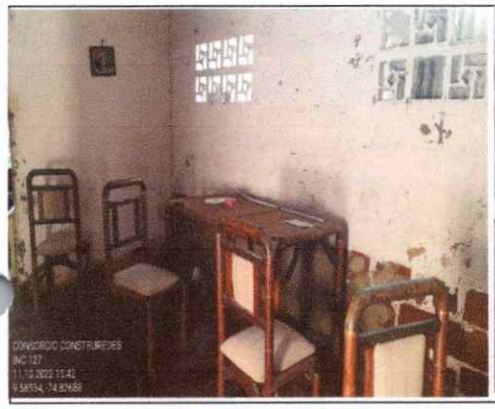



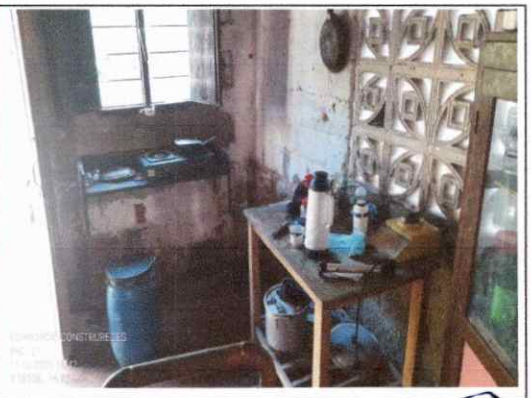

Firma
Nombre: CLOTILDE FONSECA ROMERO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.854.028

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 129	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	PEDRO CORREA HENAO		
DIRECCIÓN	CR 4 CL 6-20		
TELÉFONO	3116704262	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION :<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados en mal estado,puerta en madera ,cubierta en madera zinc, anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque , pisos en cemento liso, área de cocina se evidencia que no cuenta con aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria cuenta con muros externos con grietas.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: PEDRO CORREA HENAO
PROPIETARIO DEL PREDIO
3,831,962

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES											
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A											
REGISTRO No.	INC 131	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

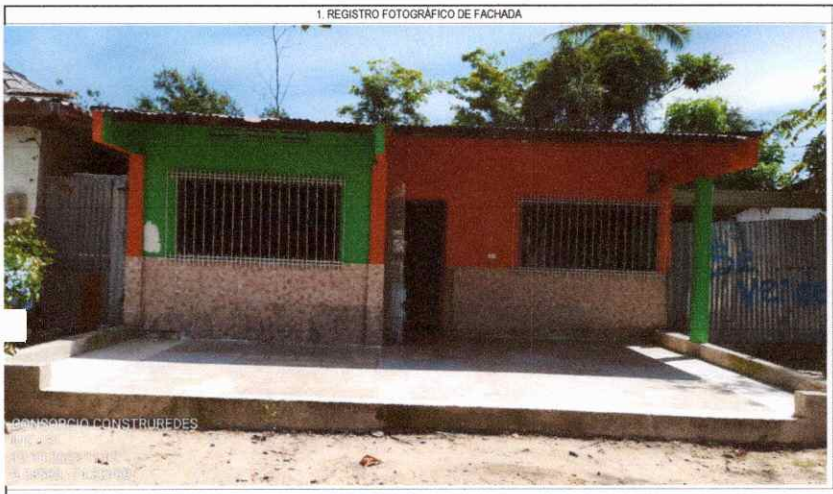

PROPIETARIO	YARIMA VERGARA ACUÑA		
DIRECCIÓN	CL 6 KR 5-61		
TELÉFONO	3022168275	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9,8	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria con acabados en pintura y ceramica,puerta y ventanas en aluminio con protectores en hierro,terraza en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria con acavados en pintura y ceramica, piso en ceramica, área de cocina se evidencia meson en concreto con acabado en ceramica y aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria cuenta con muros y pisos en ceramica y aparato fijo inodoro.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: YARIMA VERGARA ACUÑA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C / NIT 22.788.807

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 133	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	EDITH VERGARA CARDENAS		
DIRECCIÓN	KR 2 CL 5-49		
TELÉFONO	3103554522	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	16,0	ESTRATO	1


SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura y granito, cubierta en madera y zinc, puerta en madera con protector en hierro, ventana en aluminio con protector en hierro, anden en concreto con acabado en ceramica.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria con acabados en pintura, piso en ceramica, área de cocina se evidencia aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria se evidencian muros y pisos en ceramica con aparato fijo lavamanos en mal funcionamiento.

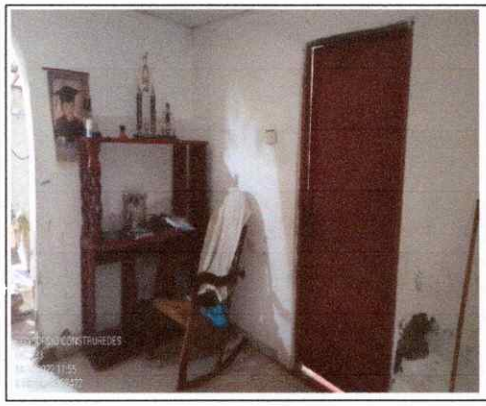





Firma Edith Lapeira Vergara
Nombre: EDITH VERGARA CARDENAS
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.853.774

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 138	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	HUMBERTO SIERRA TAPIA		
DIRECCIÓN	KR 4 CL 8-32		
TELÉFONO	3017408040	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	16.50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura,puerta y ventana en madera con protectores en hierro ,cubierta en madera zinc, terraza con acabado en ceramica y rejas en metal.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura, pisos en cemento liso, área de cocina se evidencia con aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria cuenta con muros y piso en ceramica, aparato fijo inodoro en buen estado.







Firma
Nombre: HUMBERTO SIERRA TAPIA
PROPIETARIO DEL PREDIO
3,831,592

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 141	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ILSE MARTINEZ DE AVILA		
DIRECCIÓN	CL 6 KR 8-29		
TELÉFONO	3122565025	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	14.70	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura,puerta y ventana en madera ,cubierta en madera zinc,anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados con acabados en pintura, pisos en cemento liso, área de cocina se evidencia que no cuenta con aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria se evidencian muros con humedad, aparato sanitario fijo inodoro en mal estado.

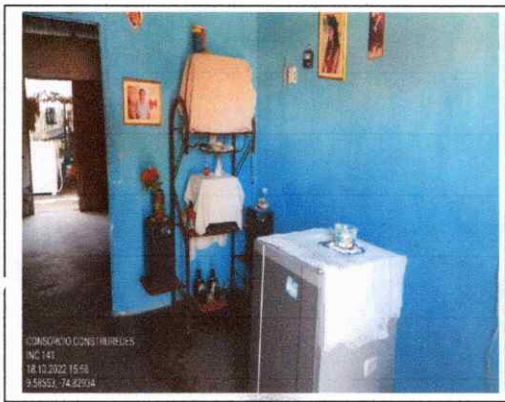





Firma	Firma	Firma
Nombre: ILSE MARTINEZ DE AVILA	Nombre: RONAL BLANCO ARROYO	Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
22,854,922		

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 148	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

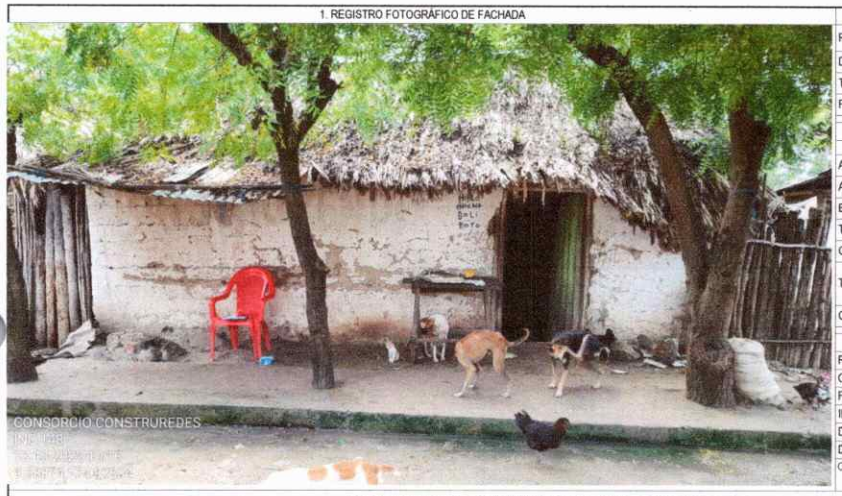

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	DENIS GONZALEZ MARTINEZ		
DIRECCIÓN	CL 12		
TELÉFONO	3122585025	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11,0	ESTRATO	1


SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque, puerta en madera y zinc, cubierta en madera y palma, anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque en mal estado, piso en arena, área de cocina se evidencia que no cuenta con aparato fijo de lavaplatos.

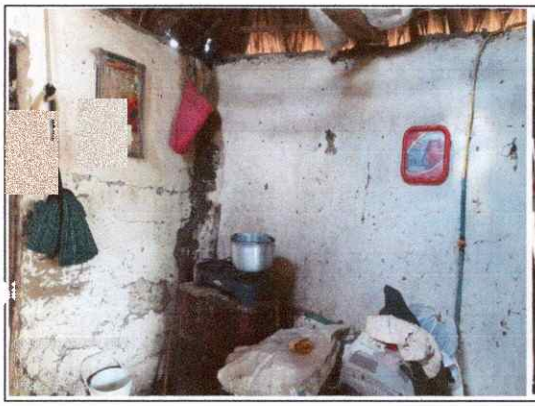





Firma
Nombre: DENIS GONZALEZ MARTINEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 39.097.406

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 151	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

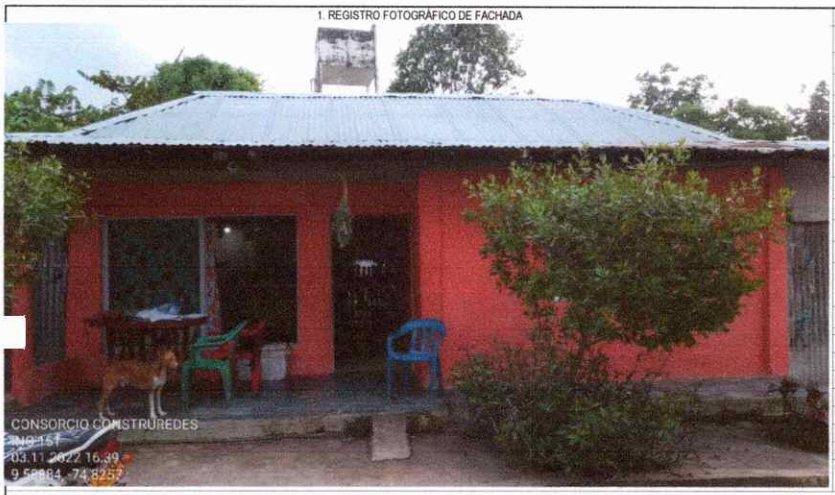

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ERIS ALVAREZ PEREZ		
DIRECCIÓN	CL 12		
TELÉFONO	3145085140	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	15,5	ESTRATO	1


SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria con acabados en pintura, cubierta en madera y zinc, puerta en madera, ventanas en aluminio, terraza en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados, piso en cemento liso, área de cocina se evidencia que no cuenta conn aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria cuenta con muros en mal estado , piso en concreto en mal estado, aparato sanitario fijo inodoro en mal funcionamiento.

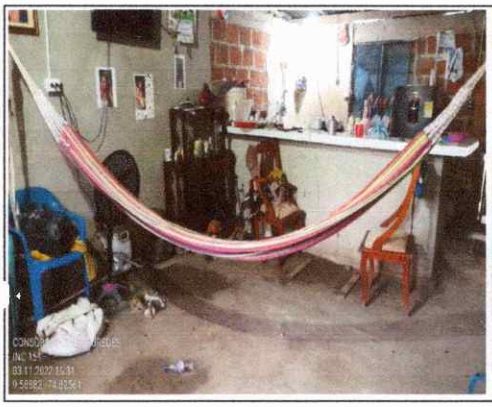





Firma
Nombre: ERIS ALVAREZ PEREZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.317.679

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 152	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

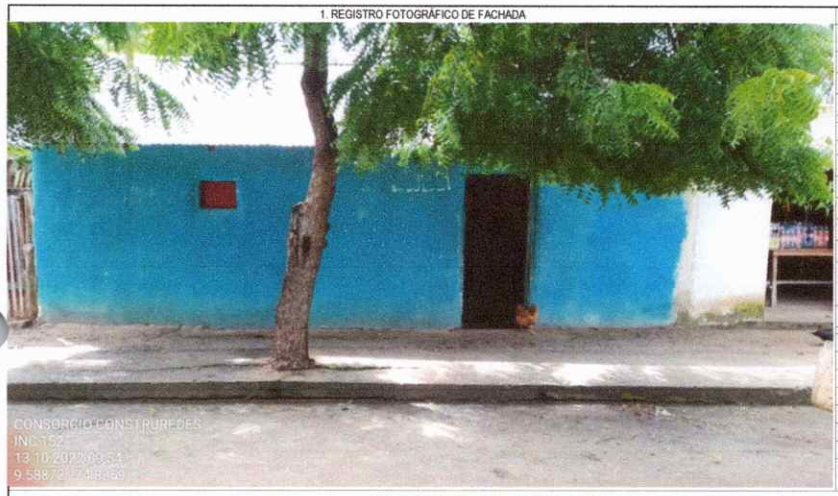

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	LUCILA GONZALEZ MARTINEZ		
DIRECCIÓN	CL 12		
TELÉFONO	3206995454	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11,0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque revocado, cubierta en madera y zinc, anden en concteto, puerta y ventana en madera.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque en mal estado, piso en arena, área de cocina no cuenta con aparato fijo lavaplatos. unidad sanitaria cuenta con muros en y pisos en ceramica.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



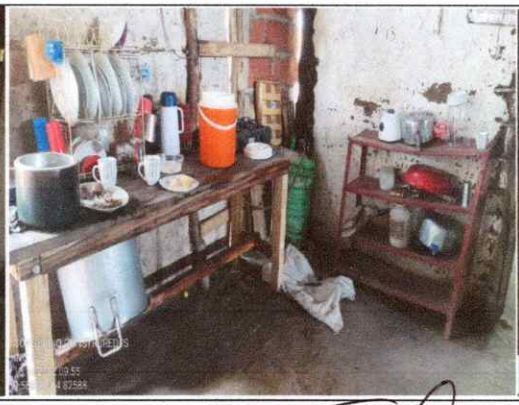



Firma Lucila Gonzalez
Nombre: LUCILA GONZALEZ MARTINEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 36.635.148

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 153	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

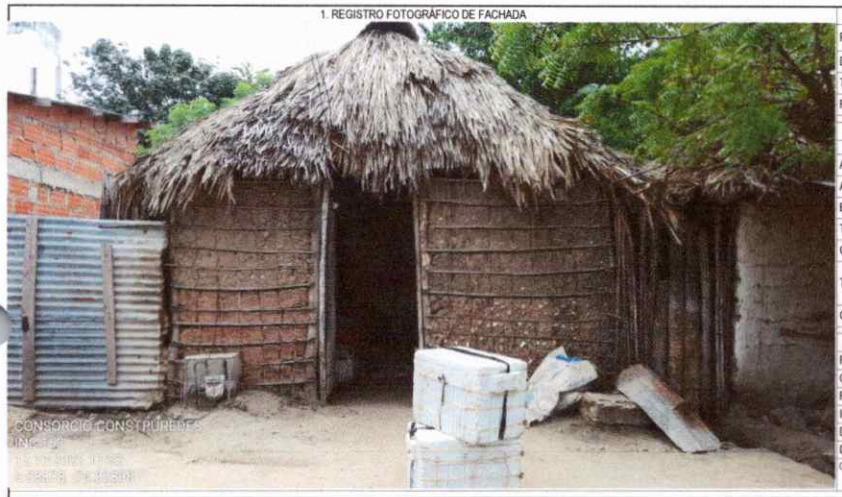

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MONICA CACERES MESA		
DIRECCIÓN	CL 12		
TELÉFONO	3023615874	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,7	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en bahareque en mal estado, cubierta en palma,anden en arena.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bahareque en mal estado, piso en arena, área de cicina se evidencia que no cuenta con aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria cuenta con muros a la vista en mal esta, sin techo.

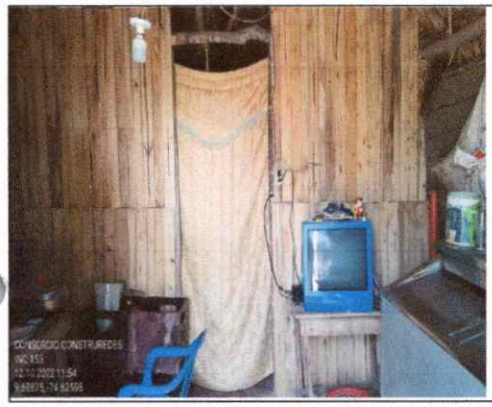





Firma monicacaceres
Nombre: MONICA CACERES MESA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 63.529.685

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copies: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 164	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	GERMAN FLOREZ VERGARA		
DIRECCIÓN	KR 9 CL 12A-28		
TELÉFONO	3127160717	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8.00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	N	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en bareque, con acabados en pintura,puerta en madera ,cubierta en madera zinc.
El interior de la vivienda cuenta con muros en bareque ,acabados en pinturas y pisos en arena.

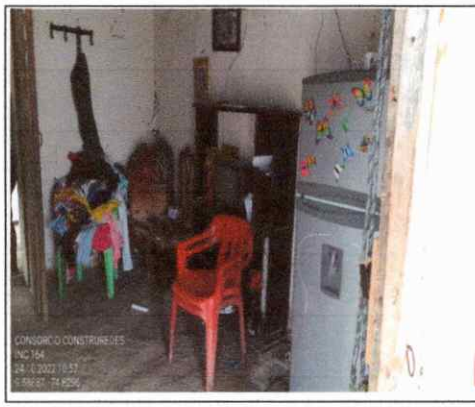





Firma
Nombre: GERMAN FLOREZ VERGARA
PROPIETARIO DEL PREDIO
3.831.908

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copies: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO:	**F-GG-04**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 182	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

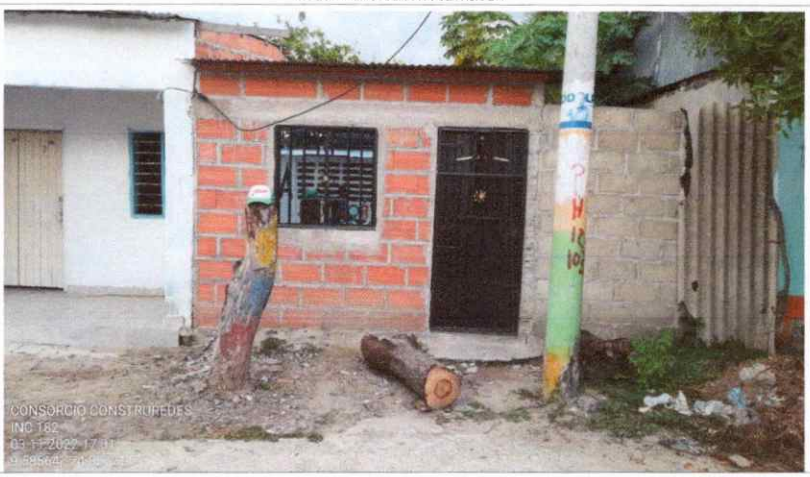

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	EMETERIO BECERRA PUERTA		
DIRECCIÓN	CL 6 CR 5-66		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3,5	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	N	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros a la vista, ventana y puerta en metal con protectores en hierro, cubierta en zinc en madera.
El interior de la vivienda cuenta con muros a la vista, piso en cemento liso, unidad sanitaria cuenta con muros a la vista, piso en cemento liso, aparato sanitario inodoro sin tanque en mal funcionamiento.



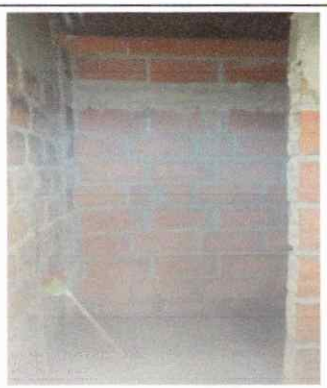



Firma EMETERIO BECERRA
Nombre: EMETERIO BECERRA PUERTA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73,315,737

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES											
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A											
REGISTRO No.	INC 197	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

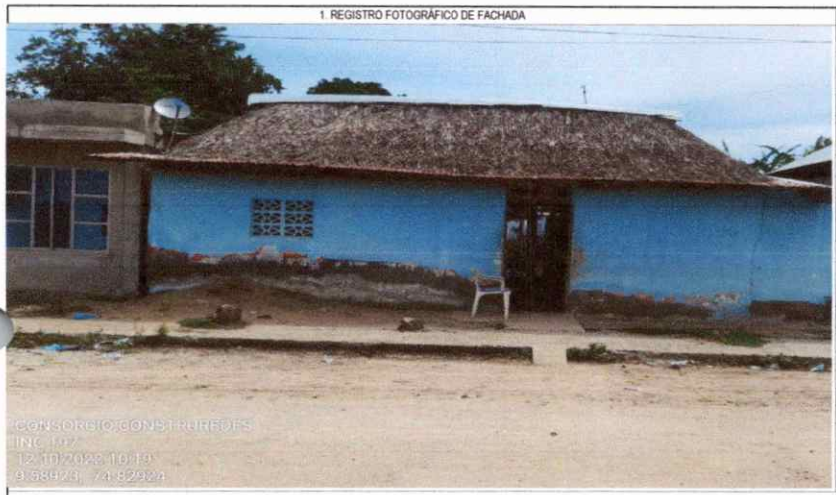

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MARIA GUISADO DE ROMERO		
DIRECCIÓN	CL 13		
TELÉFONO	3004012283	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	21,0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabado en pintura con humedad a 90cm de altura, cubierta en madera zinc y palma, anden en concreto.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados, piso en cemento liso,área de cocina con meson en concreto y aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria cuenta con muros y pisos en ceramica, aparatos sanitarios fijos inodoro y lavamanos en buen estado.

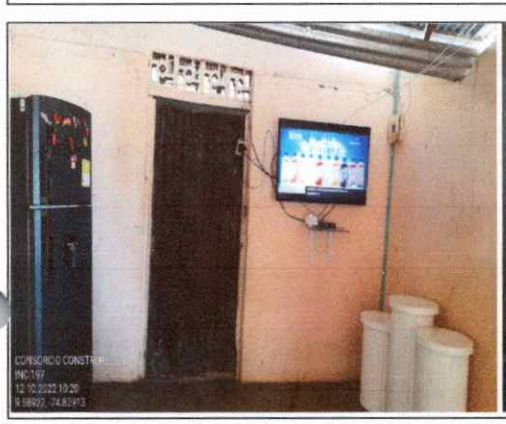

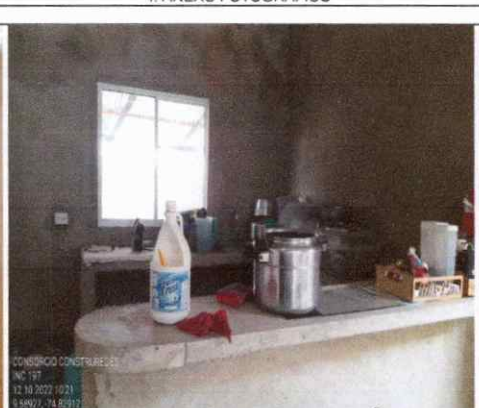



Firma
Nombre: MARIA GUISADO DE ROMERO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.853.823

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 213	FECHA	2022	10	13	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

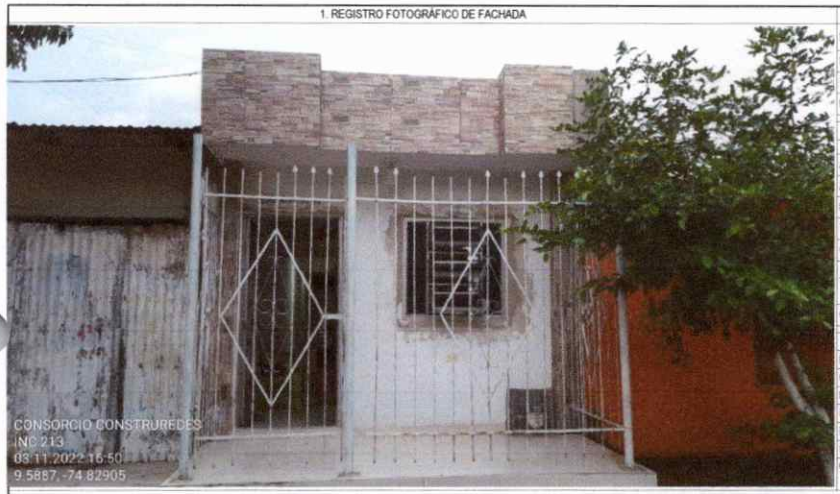

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ZAIDA MEDINA FONSECA		
DIRECCIÓN	CL 12 KR 7A-34		
TELÉFONO	3017137638	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	3,5	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	SISTEMA DEFICIENTE
ALCANTARILLADO	S	CONECTADO A RED PRINCIPAL
ENERGÍA	S	CONEXIÓN PARCIAL
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	CABLE
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada actual de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura, puerta y ventana en aluminio,terraza en ceramica con rejas en hierro.
El interior de la vivienda cuenta con muros en mamposteria revocados y acabados en pintura, área de cocina cuenta con aparato fijo lavaplatos, unidad sanitaria con muros y piso en ceramica, aparatos fijos sanitarios fijos en buen estado.



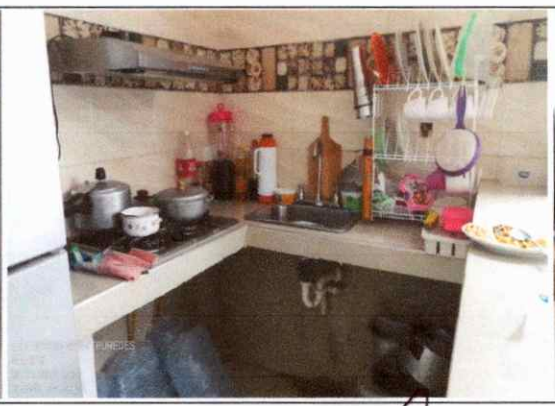



Firma
Nombre: ZAIDA MEDINA FONSECA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.049.348.409

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES


La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web **www.fonade.gov.co**.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROYECTO

SEMANA 24 DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2022



INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.777.324.138,72	66,97%	$ 1.442.732.132,23	54,36%	-$ 334.592.006,49	-12,61%
Durante el Periodo	$ 5.616.192,73	0,21%	$ 93.248.518,24	3,51%	$ 87.632.325,51	3,30%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.782.940.331,45**	**67,18%**	**$ 1.535.980.650,46**	**57,87%**	**-$ 246.959.680,99**	**-9,31%**

Desviación en días: 14 Días

SEMANA 25 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022



INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.782.940.331,45	67,18%	$ 1.535.980.650,46	57,87%	-$ 246.959.680,99	-9,31%
Durante el Periodo	$ 5.616.192,73	0,21%	$ 91.148.899,50	3,43%	$ 85.532.706,77	3,22%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.788.556.524,18**	**67,39%**	**$ 1.627.129.549,96**	**61,31%**	**-$ 161.426.974,22**	**-6,08%**

Desviación en días: 9 Días

SEMANA 26 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2022



INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.788.556.524,18	67,39%	$ 1.627.187.399,32	61,31%	-$ 161.369.124,86	-6,08%
Durante el Periodo	$ 50.648.545,01	1,91%	$ 38.973.704,87	1,47%	-$ 11.674.840,15	-0,44%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.839.205.069,19**	**69,30%**	**$ 1.666.161.104,18**	**62,78%**	**-$ 173.043.965,01**	**-6,52%**

Desviación en días: 10 Días

SEMANA 27 DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022



INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.839.205.069,19	69,30%	$ 1.666.161.104,18	62,78%	-$ 173.043.965,01	-6,52%
Durante el Periodo	$ 39.942.527,00	1,50%	$ 49.926.406,34	1,88%	$ 9.983.879,34	0,38%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.879.147.596,19**	**70,80%**	**$ 1.716.087.510,52**	**64,66%**	**-$ 163.060.085,67**	**-6,14%**

Desviación en días: 9 Días

MEMORIAS DE CÁLCULO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

$ 39.313.349,11	$ 33.036.427,82	$ 152.241,603				
Administracion	**Imprevistos**	**Utilidad**	**Iva**	**Salario Minimo**	**No. Inmuebles para Intervención**	**Costo Validación**
25,44%	1,0%	5,0%	19%	$ 1.000.000,00	217	$ 5.140.026,35

BASE PLANA

Ítem	Capítulo	Descripción	Und	Valor unitario	ACUMULADO	PROMEDIO
2.1	REDES HIDROSANITARIAS	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" R DE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes.	ML	$10.170,51	5860,00	33,11
2.2	REDES HIDROSANITARIAS	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML	$43.860,81	2909,10	16,82
2.3	REDES HIDROSANITARIAS	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML	$21.402,93	1349,20	7,67
2.4	PUNTOS HIDROSANITARIOS	Punto HIDROSANITARIO (INODORO), incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	$94.202,36	141,00	1,00
2.5	PUNTOS HIDROSANITARIOS	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA, incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	$112.904,76	156,00	1,00
2.6	PUNTOS HIDROSANITARIOS	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado	Und	$85.214,13	141,00	1,00
2.7	PUNTOS HIDROSANITARIOS	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	$89.406,34	127,00	1,00
2.8	PUNTOS HIDROSANITARIOS	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	$142.030,87	124,00	1,00
2.9	APARATOS	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	$147.311,27	146,00	1,00
2.10	APARATOS	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	$114.887,70	147,00	1,00
2.11	APARATOS	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	$185.296,96	127,00	1,00
2.12	APARATOS	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	$177.856,36	114,00	1,00
2.13	CAJAS DE INSPECCIÓN	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M	$175.509,36	231,10	1,31
3.1	UNIDADES SANITARIAS	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Santario, Ducha, Lavamanos)	Und	$2.596.959,72		
3.2	UNIDADES SANITARIAS	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Santario, Ducha, Lavamanos)	Und	$2.305.691,80	8,00	1,00
3.3	UNIDADES SANITARIAS	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Santario, Ducha, Lavamanos)	Und	$2.927.724,89	69,00	1,00
3.4	UNIDADES SANITARIAS	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento). Incluye Manija de agarre.(No incluye: Santario, Ducha, Lavamanos))	Und	$3.012.931,39	2,88	0,96
3.5	CIMENTACIÓN	Relleno compactado con material de sitio	M3	$12.187,55		
3.6	CIMENTACIÓN	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	$36.557,30		
3.7	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	$547.962,74	81,64	0,79
3.8	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	Acero de refuerzo 60000 PSI (incluye alambre de amarre)	KG	$4.953,42	10807,00	103,91
3.9	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2	$52.948,33	357,63	2,37
3.10	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, incluye acero de refuerzo 1/4"	M2	$53.858,79		
3.11	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	$180.903,59	60,80	0,80
3.12	MAMPOSTERIA	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2	$26.760,01	462,95	3,03
3.13	MAMPOSTERIA	Suministro e instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	$5.988,18	26,00	2,17
3.14	MORTEROS	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	$12.398,76	792,88	8,09
3.15	MORTEROS	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2	$12.851,95	773,78	6,00
3.16	MORTEROS	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso para ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	$15.479,97	163,27	3,47
3.17	ELEMENTOS	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	Und	$293.930,52	47,00	1,00
3.18	ELEMENTOS	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	$45.618,89	76,00	1,00
3.19	ELEMENTOS	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	$188.625,09	104,00	1,00
3.20	ELEMENTOS	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	$18.970,82	177,00	1,00
3.21	ELEMENTOS	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2	$49.939,55	20,24	5,06
3.22	ELEMENTOS	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26, con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	ML	$18.894,82		
3.23	ELEMENTOS	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	$30.580,27	148,00	1,00
3.24	ACABADOS	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2	$31.418,61	16,64	3,33
3.25	ACABADOS	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2	$19.876,75	99,59	3,69
3.26	ACABADOS	Recuperación de piso esmaltado	M2	$15.405,26	21,90	3,65
3.27	ACABADOS	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	$30.290,43	259,33	5,08
3.28	ACABADOS	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	$36.709,45	175,08	3,50
3.29	ACABADOS	C a rburo bla nco pa ra m uro e x te rior (3 m a nos)	M2	$4.777,63	2149,05	13,35
4.1	CONEXIONES	Suministro e instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	$121.071,76	5,00	1,00
4.2	CONEXIONES	Suministro e instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	$132.377,90		
4.3	CONEXIONES	Suministro e instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	$28.070,96	5,00	1,00
4.4	CONEXIONES	Suministro e instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	$27.279,28	2,00	1,00
4.5	CONEXIONES	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6". incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	ML	$78.181,52	193,20	7,43
4.6	CONEXIONES	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	ML	$12.950,73	168,50	2,91
4.7	CONEXIONES	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP). Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	$69.790,32	176,00	1,00
4.8	INTERVENCIONES VARIAS	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2	$162.285,76	38,74	2,77
4.9	CAJAS DE INSPECCIÓN	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	M	$238.957,93	23,40	0,81

IDENTIFICACION INMUEBLE

	CODIGO INMUEBLE	BARRIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	DIRECCION	DIAGNOSTICO (Sin IVA)	DIAGNOSTICO (Incluido IVA)	Validación (Sin IVA)	Validación (Con IVA)	DIAGNÓSTICO + VALIDACIÓN (Sin IVA)	DIAGNÓSTICO + VALIDACIÓN (Incluido IVA)	INTRADOMICILIARIA (sin AIU)	DOMICILIARIA (sin AIU)
1	B-C-SM-MZ32-VE-002	SAN MARTIN	DEIVIS DEL CARMEN HERNANDEZ ESCOBAR	73.317.194	CL 10 4A-33	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.268.622,67	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ32-VE-003	SAN MARTIN	EDUARDO LUIS VILLAMIZAR HERNANDEZ	1.049.453.110	CL 9 4A-5	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.072.190,36	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ18-VE-004	SAN MARTIN	AGUEDA MARIA ORTEGA MEDINA	22.856.925	CRA 3 CL 7-4	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.781.252,52	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ22-VE-005	SAN MARTIN	MERYS MARINA MEDINA MORANTE	22.854.333	CRA 4 CL 7-26	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.452.998,84	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ34-VE-006	SAN MARTIN	ROBINSON RAFAEL BENITEZ PRIETO	12.561.694	CRA 9 11-34	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.841.735,38	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ22-VE-007	SAN MARTIN	ARMANDO DE JESUS ROSALES MERCADO	7.452.211	CRA 4 CL 7-44 APTO 1	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.457.220,75	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ22-VE-009	SAN MARTIN	SEBASTIAN GONZALEZ ACOSTA	3.831.796	CRA 4 CL 7-70	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.123.536,06	$ 95.691,78
1	B-C-SM-MZ21-VE-010	SAN MARTIN	ANICIA ISABEL BARRIOS ROMERO	22.854.288	CL 8 3-10	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.274.155,67	$ 851.117,54
1	B-C-SM-MZ22-VE-011	SAN MARTIN	JOSE DE JESUS ANAYA HENAO	1.049.453.412	CL 8	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.972.584,97	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ34-VE-012	SAN MARTIN	MARCO RAFAEL HENAO MERCADO	3.831.384	CRA 4 CL 8-139	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.908.227,53	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ21-VE-013	SAN MARTIN	INGRIS JOHANA VILLAMIZAR HERNANDEZ	1.049.452.023	CRA 4 CL 8-42	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.128.729,09	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ21-VE-014	SAN MARTIN	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ ESCOBAR	22.854.599	CRA 4 CL 8-34	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.786.084,86	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ21-VE-015	SAN MARTIN	LILIANA DIAZ MARTINEZ	22.856.915	CL 8 CRA 6-21	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.234.232,87	$ 260.956,66
1	B-C-SM-MZ21-VE-016	SAN MARTIN	YEIRA LUCIA REGINO DIAZ	1.065.292.058	CL 9	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.575.939,63	$ 796.177,25
1	B-C-SM-MZ38-VE-017	SAN MARTIN	ALVARO DE JESUS PEREZ ESCOBAR	73.316.976	CL 9 4-30	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.693.240,00	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ24-VE-018	SAN MARTIN	JESUS ANTONIO CANTILLO SANCHEZ	73.317.648	CRA 4 CL 9-13	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.780.339,83	$ 260.956,66
1	B-C-SM-MZ24-VE-019	SAN MARTIN	DEIBIS DE JESUS PIÑA SIERRA	72.295.531	CRA 4 CL 9-23	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.514.417,88	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ24-VE-020	SAN MARTIN	FRANCISCO MIGUEL MEDINA RODRIGUEZ	73.315.248	CL 10 4-1	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.312.860,40	$ 1.355.497,94
1	B-C-SM-MZ85-VE-021	SAN MARTIN	SIXTA TULIA ACUÑA ARIZA	22.853.800	CL 10 4-2	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.634.193,52	$ 260.956,66
1	B-C-SM-MZ85-VE-022	SAN MARTIN	JOHN JAIRO RAMOS VASQUEZ	73.316.487	CL 10 4-26	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.146.591,88	$ 616.572,98
1	B-C-SM-MZ85-VE-023	SAN MARTIN	TERESA DE JESUS BARBOSA RODRIGUEZ	36.635.051	CL 10 4-30	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.877.612,04	$ 95.691,78
1	B-C-SM-MZ29-VE-024	SAN MARTIN	CARMEN EDITH ACOSTA LOPEZ	22.854.309	CL 10 4-57	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.082.778,30	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ31-VE-025	SAN MARTIN	MILTON VILLAMIL DAVILA	73.316.101	CL 10 4A-7	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.265.667,38	$ 299.808,85
1	B-C-SM-MZ31-VE-026	SAN MARTIN	PETRONA EMILIA GUERRERO OSPINO	22.855.165	CL 10 4A-17	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.926.281,66	$ 95.691,78
1	B-C-SM-MZ31-VE-027	SAN MARTIN	YOLANDA ESTHER MIRANDA FUNES	22.856.997	CL 10 CRA 4A-13	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.049.612,46	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ31-VE-028	SAN MARTIN	ISAAC DE LAS MERCEDES MIRANDA MARTINEZ	1.749.152	CL 10 4-25	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.382.081,36	$ 286.858,12
1	B-C-SM-MZ31-VE-029	SAN MARTIN	BLASINA ISABEL RODRIGUEZ PIÑA	40.975.295	CL 10 4A-133	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.563.277,58	$ 162.614,93
1	B-C-SM-MZ31-VE-030	SAN MARTIN	MANUEL DEL CRISTO PEREZ MEDINA	73.315.866	CL 10 4A-20	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.833.177,06	$ 95.691,78
1	B-C-SM-MZ31-VE-031	SAN MARTIN	ELISA REYES VERGARA	22.854.464	CL 10 # 4A-51	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.866.522,70	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ30-VE-032	SAN MARTIN	JOSEFINA DEL CARMEN BOHORQUEZ ALVAREZ	22.854.721	CL 10 CRA 4A-8	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.473.013,88	$ 913.662,76
3	B-C-SM-MZ45-VE-033	SAN MARTIN	SILVIA ROSA ANAYA LEGUIA	22.853.870	CL 10 # 5A-25	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.638.043,97	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ44-VE-034	SAN MARTIN	MANUEL DAVID CANTILLO MEZA	73.202.033	CL 10 5A-2	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.093.251,16	$ 730.045,78
3	B-C-SM-MZ44-VE-035	SAN MARTIN	HELEN DEL SOCORRO PINEDA CASSERES	22.854.598	CL 10 5A-24	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.794.669,90	$ 1.051.472,69
3	B-C-SM-MZ55-VE-036	SAN MARTIN	DEIBER DE JESUS MARTINEZ PUERTA	73.316.659	CL 10 # 6-12	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.040.186,99	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ45-VE-037	SAN MARTIN	TERESA RIVERA CRUZATE	22.853.565	CRA 6 # 9-2	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.699.094,95	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ56-VE-038	SAN MARTIN	ERASMO DE JESUS TORRES CASERES	73.315.850	CRA 6 9-30	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.595.649,98	$ 808.227,30
1	B-C-SM-MZ56-VE-039	SAN MARTIN	YURANIS PAOLA GUERRA VILLAMIZAR	22.856.914	CRA 6 CL 9-50	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 1.940.153,05	$ -
1	B-C-SM-MZ46-VE-040	SAN MARTIN	JOSE DE JESUS MEJIA SANCHEZ	73.315.749	CL 9 5A-49	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.816.122,70	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ45-VE-041	SAN MARTIN	DORIS ISABEL JIMENEZ RAMIREZ	22.856.787	CL 10 5A-51	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.490.111,50	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ21-VE-042	SAN MARTIN	OLIVIA ESTER BOLAÑO PRIETO	22.853.965	CRA 4 CL 8-2	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.088.814,89	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ31-VE-043	SAN MARTIN	HECTOR MANUEL HENAO DIAZ	3.831.445	CL 9 4A-59	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.092.651,29	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ145-VE-044	SAN MARTIN	LUIS ROBERTO MERCADO TORRES	73.315.487	CL 11 # 7A - 3	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.595.311,44	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ55-VE-046	SAN MARTIN	ARACELIS MARIA CANTILLO OVIEDO	39.091.669	CL 10A CRA 6-7	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.957.780,71	$ 456.171,89
1	B-C-SM-MZ55-VE-047	SAN MARTIN	JORGE ELIECER BENITEZ PRIETO	73.315.349	CL 10 CRA 6-50	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.145.633,13	$ 108.642,51
2	B-C-SM-MZ55-VE-048	SAN MARTIN	CRISTIAN DAVID BENITEZ VERGARA	1.049.453.937	CL 11 # 6 - 37	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.789.308,02	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ145-VE-053	SAN MARTIN	JAIME LUIS MOSILLO OCHOA	73.315.632	CL 11 CRA 7A-7	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 6.006.106,73	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ91-VE-054	SAN MARTIN	EMPERATRIZ ISABEL OCHOA HERRERA	22.853.603	CL 11 # 7A - 24	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.736.405,67	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ56-VE-055	SAN MARTIN	EDWIN SALVADOR ROSALES SIERRA	73.316.784	CL 10 6-30	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 2.147.948,04	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ55-VE-056	SAN MARTIN	ALVARO MARIEL BECERRA PUERTA	73.315.017	CL 10 4 - 51	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.803.234,02	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ-VE-058	SAN MARTIN	ELIANA ESTHER VERGARA RODRIGUEZ	22.855.356	CL 10 # 6-35	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.200.303,34	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ-VE-059	SAN MARTIN	ELIZABETH SERRANO OLANO	1.049.453.389	CL 10 CRA 6-53	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 2.254.504,38	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ55-VE-060	SAN MARTIN	ROSARIO ISABEL CASERES ALVAREZ	22.853.794	CL 10 # 6-52	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.693.226,93	$ 929.787,04
1	B-C-SM-M55-VE-061	SAN MARTIN	ALMA LUZ PALOMINO MARRUGO	22.854.681	CL 10 KR 6 - 76	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.815.036,77	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ56-VE-062	SAN MARTIN	GILMA ORTEGA BOHORQUEZ	22.853.758	CL 10 6-61	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.505.066,87	$ 108.642,51
3	B-C-SM-MZ66-VE-065	SAN MARTIN	RANGEL ANTONIO MONTES OCHOA	73315021	CL 10 # 7 - 1	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.652.200,82	$ 886.408,82
3	B-C-SM-MZ66-VE-066	SAN MARTIN	PEDRO ADAN VERGARA VEGA	3.831.416	CL 10 7 - 31	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 2.842.017,56	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ66-VE-067	SAN MARTIN	HERIBERTO MANUEL DE LA ROSA RIVERA	3.831.744	CL 10 7-43	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.865.010,17	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ66-VE-068	SAN MARTIN	RAFAEL ENRIQUE MEDINA CAUSADO	4.031.810	CL 10 7-53	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.371.015,84	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ66-VE-069	SAN MARTIN	EMMA LUCIA MORENO REINA	39.616.741	CL 10 CRA 7-77	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.497.293,98	$ 108.642,51
3	B-C-SM-MZ75-VE-070	SAN MARTIN	SILVIA MARIA ANAYA HENAO	32,753,489	CR 8 # 16 - 15 P	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 2.789.012,98	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ75-VE-071	SAN MARTIN	DONIDALDO DAVID FONSECA GONZALEZ	73.317.213	CRA 8 CL 8-43	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.310.935,79	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ75-VE-072	SAN MARTIN	JUAN FEDERICO CAPELA AVILA	3.831.372	CL 10 CRA 8-1	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.317.505,03	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ75-VE-073	SAN MARTIN	JAVITH ENRRIQUE CAPELA HERNANDEZ	73.317.734	CRA 8 8-15	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.509.761,90	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ75-VE-074	SAN MARTIN	OSWALDO DEL CRISTO PIÑEREZ MENCO	73.239.408	CRA 8 CL 8-10	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.230.297,42	$ 108.642,51
3	B-C-SM-MZ76-VE-075	SAN MARTIN	JULIO CESAR MEDINA ARIAS	73,316,758	CR 8 # 8 - 21	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.632.552,29	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ-VE-076	SAN MARTIN	NILSON RAFAEL DE LA ROSA VASQUEZ	73.190.803	CRA 8 CL 7-59	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.608.533,35	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ68-VE-077	SAN MARTIN	IRLENA SOFIA GONZALEZ TERAN	57,445,250	KR 8 # 7 - 20	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.517.649,62	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ89-VE-080	SAN MARTIN	AUDITH JUDITH SANCHEZ PIÑA	22,855,984	CL 11 # 6 - 36	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.447.628,46	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ-VE-082	SAN MARTIN	ONASIS DE LA CRUZ PEREZ MARTINEZ	73.316.850	CRA 6 CL 11-27	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.337.228,10	$ 1.085.195,80
3	B-C-SM-MZ89-VE-083	SAN MARTIN	LUZ MARY PEREZ MARTINEZ	22,855,082	CRA 6 # 11	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.396.812,55	$ 134.543,97
1	B-C-SM-MZ89-VE-084	SAN MARTIN	BERANIA ISABEL MARTINEZ CANTILLO	22.854.413	CRA 6 11-43	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.561.430,22	$ 108.642,51
2	B-C-SM-MZ69-VE-085	SAN MARTIN	ERMIDA ESTHER HENAO ESCOVAR	22.853.647	CL 6 CR 7 - 22	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.213.522,18	$ 281.517,19
2	B-C-SM-MZ69-VE-086	SAN MARTIN	LUIS ALFONSO HENAO ESCOBAR	3.831.589	CL 6 CR 7 - 22	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.279.929,54	$ 730.045,78
1	B-C-SM-MZ69-VE-087	SAN MARTIN	JOSE RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ	73.315.449	CL 6 CR 7 - 30	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.158.295,54	$ 108.642,51
2	B-C-SM-MZ69-VE-088	SAN MARTIN	ARTURO EDUARDO ALVAREZ MEZA	6.813.964	CL 5 CR 6-5	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.311.689,57	$ 95.691,78
3	B-C-SM-MZ69-VE-089	SAN MARTIN	LILIA GUISADO DE GALVAN	22.853.469	CL 7 CRA 8-29	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.237.420,72	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ-VE-091	SAN MARTIN	SEGUNDO RAFAEL CARDENAS DIAZ	73.315.437	CL 6 CRA 8-16	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.819.279,35	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ-VE-092	SAN MARTIN	JORGE ISAAC GONZALEZ CRUZATE	73.316.344	CL 2 CRA 4-299	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.690.694,10	$ 69.790,32
1	B-C-SM-MZ77-VE-094	SAN MARTIN	SARA ESTHER FONSECA ROMERO	36.525.923	CR 8 CL 6 - 37	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 2.588.747,41	$ 95.691,78
2	B-C-SM-MZ-VE-096	SAN MARTIN	ARELVIS ESTHER TORRES CANTILLO	39.090.314	CL 6 CRA 8-44	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.164.851,74	$ 260.956,66
2	B-C-SM-MZ68-VE-097	SAN MARTIN	MOISES JOSE VERGARA VEGA	3.831.916	CR 7 # 7 - 75	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.136.465,56	$ 651.864,26
1	B-C-SM-MZ59-VE-099	SAN MARTIN	URIEL JOSE BENITEZ VALETH	73.315.659	CL 5 CR2 - 93	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.324.380,16	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ58-VE-100	SAN MARTIN	PEDRO RAFAEL PORTO FONSECA	12.548.951	CL 7 CR 6 - 36	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.427.480,87	$ 82.741,05
1	B-C-SM-MZ58-VE-101	SAN MARTIN	TERESA ISABEL PORTO FONSECA	22.853.999	CL 7 KR 6 - 18	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 2.461.493,58	$ 108.642,51
2	B-C-SM-MZ59-VE-102	SAN MARTIN	JOAQUIN JENITH ANAYA CABALLERO	73.315.081	CL 7 CR 6 - 35	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.712.481,35	$ 437.243,46
2	B-C-SM-MZ47-VE-103	SAN MARTIN	PETRONA ISABEL MEDINA DE CRUZATE	22.854.084	CL 8 CR 5A - 1	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.741.010,14	$ 390.334,55
2	B-C-SM-MZ47-VE-104	SAN MARTIN	TEOTISTA HORTENSIA ESCOBAR MARTINEZ	22.853.685	CL 8 CR 5A - 23	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.685.055,34	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ47-VE-105	SAN MARTIN	YADIRA ZUÑIGA DE MORANTE	22.853.989	CL 8 # 5A - 35	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 2.544.861,69	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ58-VE-107	SAN MARTIN	FELIX MANUEL RIVERA BALLESTA	3.831.482	CL 8 # 6 - 27	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.026.470,78	$ 573.682,74
3	B-C-SM-MZ68-VE-108	SAN MARTIN	IVAN DARIO BAÑOS CARDONA	73,206,883	CL 7 # 7 - 32	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 2.332.033,44	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ47-VE-110	SAN MARTIN	ALFREDO JOSE ESCOBAR HERNANDEZ	73.315.246	CL 7 CR 5A - 74	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.839.772,05	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ47-VE-111	SAN MARTIN	MARGARITA LUCIA NARVAEZ SEVILLA	22.856.586	CL 7 CR 5A - 50	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.842.361,38	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ47-VE-112	SAN MARTIN	YARINA ISABEL DE ANGEL PADILLA	22.855.582	CL 7 5 - 50	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.622.740,76	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ47-VE-113	SAN MARTIN	JESIE DEL SOCORRO ESTRADA PALENCIA	22.856.754	CL 7 # 5A-22	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.406.016,61	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ47-VE-114	SAN MARTIN	MARTINA MARIA ESTRADA PALENCIA	22.854.513	CL 7 CR 5 - 20	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.473.352,06	$ 95.691,78
2	B-C-SM-MZ47-VE-115	SAN MARTIN	ELSA REGINA ORTEGA DE GUISADO	22.854.219	CL 7 # 5A-10	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.854.530,86	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ34-VE-116	SAN MARTIN	EMMA LUCIA MORENO REINA	39,616,741	KR 4 # 6 - 1	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.781.839,56	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ23-VE-117	SAN MARTIN	ARTURO ENRIQUE VILLAFAÑE HERRERA	5.124.620	CL 7 3 - 51	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.204.566,53	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ21-VE-118	SAN MARTIN	JAIDER ANTONIO SENCIO BARRIOS	73.317.318	CL 8 # 3 - 4	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.672.180,58	$ 135.921,79
3	B-C-SM-MZ34-VE-119	SAN MARTIN	DIONISIA MARIA BOHORQUEZ DURAN	22.853.588	CL 8 # 4 - 49	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.911.754,24	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ30-VE-120	SAN MARTIN	DORGY MARGOTH VILLAMIZAR PADILLA	22.854.629	CR 5A CL 10 - 32	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.307.416,22	$ 851.117,54
2	B-C-SM-MZ30-VE-121	SAN MARTIN	AMALFI ESTHER NIETO REALES	22.855.136	CL 11 4A - 69	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.434.158,24	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ30-VE-122	SAN MARTIN	RODRIGO RAFAEL TORRES CASERES	73.316.822	CL 11 4A - 59	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.688.946,39	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ30-VE-123	SAN MARTIN	MARIA BERNARDA MARTINEZ CASTILLO	22.854.421	CL 11 # 4A - 45	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.701.677,46	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ87-VE-124	SAN MARTIN	FRANCISCO MIGUEL CABARCAS DE LA HOZ	85.485.870	CL 11 4A - 70	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.603.760,35	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ3O-VE-125	SAN MARTIN	JOSE FRANCISCO VERGARA TORRES	73.317.470	CL 11 KR 4A - 19	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.703.113,85	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ30-VE-126	SAN MARTIN	MELISSA PAOLA DURANGO HERNANDEZ	1,049,454,476	CL 11 4A - 29	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.666.406,59	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ87-VE-127	SAN MARTIN	FELIPE MANUEL VERGARA VILLA	3.831.622	CL 11 4A-32	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.624.362,63	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ87-VE-128	SAN MARTIN	JOSE GREGORIO MARTINEZ MEZA	73.352.002	CR 4A 11 - 15	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.215.008,88	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ87-VE-129	SAN MARTIN	SANDRA PAOLA GUISADO FERNABDEZ	22.855.631	CL 12 4A - 27	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.709.056,61	$ 82.741,05
2	B-C-SM-MZ66-VE-131	SAN MARTIN	ANDY XIOMARA ESCUDERO PEREZ	1.003.190.169	CRA 8 CL 9-3	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.738.861,62	$ 95.691,78
2	B-C-SM-MZ67-VE-133	SAN MARTIN	MANUEL DEL CRISTO BOHORQUEZ ALVAREZ	3.831.621	CL 9 # 7 - 53	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.431.259,19	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ66-VE-134	SAN MARTIN	MYRIAM MARLENE TEHERAN DE CAUSADO	22.853.475	CL 9 # 7 - 46	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.864.932,20	$ 149.664,20
2	B-C-SM-MZ56-VE-135	SAN MARTIN	ERASMO MANUEL PEREZ DIAZ	73.315.730	CL 9 # 6 - 88	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.144.840,83	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ56-VE-136	SAN MARTIN	ALEJANDRO PEREZ PADILLA	15.245.173	CL 9 6-75	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.541.253,50	$ 95.691,78
2	B-C-SM-MZ-VE-137	SAN MARTIN	ISIDRO MANUEL HENAO ESCOBAR	73.316.151	CL 9 # 6-66	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.854.098,52	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ56-VE-138	SAN MARTIN	TOMAS FONSECA GONZALEZ	5.120.199	CL 9 6-58	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.522.950,11	$ 95.691,78
2	B-C-SM-MZ56-VE-139	SAN MARTIN	OSCAR DAVID BECERRA RIVERA	72.297.061	CL 9 CRA 6-38	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.229.232,43	$ 82.741,05
2	B-C-SM-MZ56-VE-140	SAN MARTIN	INES BENEDICTA PADILLA PALENCIA	22.853.700	CL 9 6-46	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.701.183,84	$ 95.691,78
3	B-C-SM-MZ31-VE-141	SAN MARTIN	ANA JULIA VASQUEZ GUERRERO	22.854.689	CL 9 # 4A - 69	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.275.647,87	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ31-VE-142	SAN MARTIN	APOLER ROMAN CALVO HOYOS	3.831.874	CL 9 4A-39	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.175.833,43	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ32-VE-143	SAN MARTIN	EDWIN GABRIEL PUELLO CHAMORRO	73.316.258	CR 4A CL 8 - 45	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.811.563,78	$ 495.501,22
3	B-C-SM-MZ32-VE-144	SAN MARTIN	JUAN ALVIS VERGARA	3.831.520	CR 4A CL 8 - 39	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.250.219,03	$ 95.691,78
2	B-C-SM-MZ87-VE-145	SAN MARTIN	MANUELA SEGUNDA VILLA AYOLA	22.858.537	CL 12 # 4A - 3	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.884.130,53	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ87-VE-146	SAN MARTIN	FIDEL ENRIQUE HENAO ESCOBAR	12.586.040	CL 12 # 4A - 39	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 6.014.393,81	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ87-VE-147	SAN MARTIN	ANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ	26.842.705	CL 12 4A - 49	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.807.497,63	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ87-VE-148	SAN MARTIN	JORGE LUIS RODRIGUEZ MIRANDA	12.698.121	CR 5A 11- 48	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.751.453,25	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ89-VE-149	SAN MARTIN	ROBERT JAVITH VERGARA JEREZ	73.317.298	CL 12 5A-39	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.793.062,94	$ 95.691,78
2	B-C-SM-MZ89-VE-150	SAN MARTIN	PABLO EMILIO CAUSADO SANCHEZ	3.831.454	CRA 6A 11-30	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.926.966,64	$ 82.741,05
2	B-C-SM-MZ89-VE-151	SAN MARTIN	ELVIDA NAVARRO NAVARRO	33.204.357	CR 6A # 11 - 20	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.395.112,59	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ56-VE-152	SAN MARTIN	ELVER DAVID OCHOA MEDINA	72.099.587	CL 9 CRA 6-22 APTO 101	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.150.305,37	$ 95.691,78
2	B-C-SM-MZ76-VE-153	SAN MARTIN	OSCAR ALFREDO TORRES CANTILLO	73.315.785	CL 7 8 - 30	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.653.562,24	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ075-VE-154	SAN MARTIN	RONALD ALBERTO MANJARRES PORTO	1.049.452.013	CL 9 # 8-50	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.187.787,84	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ75-VE-155	SAN MARTIN	ONEIDA MARIA DIPPE DE FRANCO	29.207.395	CR 9 CL 8 - 70	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.597.947,40	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ75-VE-156	SAN MARTIN	ESPERANZA ESTHER QUIROZ VERA	22.856.301	CL 10 CRA 8-25	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.646.783,04	$ 108.642,51
2	B-C-SM-MZ145-VE-157	SAN MARTIN	MAIRA SOL ROSALES QUIROZ	22.855.489	CL 10 # 7	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.745.840,55	$ 1.199.134,90
2	B-C-SM-MZ75-VE-158	SAN MARTIN	MARIEL JOSE ROSALES QUIROZ	73.316.691	CRA 9 CL 8-72	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.787.189,68	$ 95.691,78
2	B-C-SM-MZ-VE145-160	SAN MARTIN	ANA AYDEE MEDINA DE URIBE	22.853.289	CL 10 # 7 - 2	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.713.708,08	$ 925.499,58
2	B-C-SM-MZ-VE145-162	SAN MARTIN	IDALUZ GUERRA VEGA	22.854.666	CL 10 7 - 44	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.753.820,82	$ 1.167.862,30
3	B-C-SM-MZ-VE-164	SAN MARTIN	FRANCISCO JOSE MEDINA CAUSADO	909.454	CL 8 CR 7 - 65	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.526.638,57	$ 69.790,32
2	B-C-SM-MZ84-VE-165	SAN MARTIN	SIXTA ISABEL VILLAMIZAR PADILLA	22.854.587	CRA 8 CL 10-29	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.786.377,22	$ 108.642,51
1	B-C-SM-MZ84-VE-166	SAN MARTIN	MARLENE ESTHER RIVERA BALLESTAS	22.854.152	CRA 8 CL 10-39	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.656.564,79	$ 149.664,20
2	B-C-SM-MZ91-VE-167	SAN MARTIN	SERGIO ALFONSO CRUZATE ROMERO	3.831.686	CL 11 7A - 34	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.100.751,08	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ92-VE-168	SAN MARTIN	JULIA MARIA PRIETO MANJARREZ	22.853.329	CL 11 CRA 8-4	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.372.909,39	$ 95.691,78
3	B-C-SM-MZ92-VE-169	SAN MARTIN	WISMAN JOSE SANCHEZ GARCIA	12.596.289	CR 8 # 11 - 29	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.677.065,06	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ92-VE-170	SAN MARTIN	ELINA ISABEL RAMIREZ DE GAMARRA	22.853.998	CR 8 # 11 - 67	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.473.702,90	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ91-VE-171	SAN MARTIN	ARGEMIRO ENRIQUE ORELLANO CARDENAS	3.831.867	CL 12 # 7A - 41	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.802.635,39	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ75-VE-172	SAN MARTIN	RAFAEL ROBLE OSPINO	3.961.248	CL 12 CR 8 - 19	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.703.583,63	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ-VE-173	SAN MARTIN	ALFONSO MANUEL ROMERO HENAO	73.315.070	CRA 9 11 - 32 P	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.913.327,72	$ 95.691,78
1	B-C-SM-MZ84-VE-175	SAN MARTIN	ELISA ESTHER OCHOA RIVERA	22.853.843	CL 10 # 8 - 36	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.602.565,72	$ 1.511.860,98
2	B-C-SM-MZ77-VE-179	SAN MARTIN	MARIS LUZ JULIO VERGARA	45.523.464	CR 8 CL 6 - 23	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.305.722,03	$ 1.042.771,86
2	B-C-SM-MZ-VE87-180	SAN MARTIN	IGNACIA MARIA CRUZ ROMERO	22.853.408	CR 8 CL 8 - 40	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.697.015,89	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ145-VE-184	SAN MARTIN	OSCAR ALFONSO CAMPO ACUÑA	1.081.908.062	CR 8 # 7 - 66 P	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.142.381,68	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ59-VE-187	SAN MARTIN	PEDRO MANUEL VERGARA RIVERA	3.831.929	CL 6 # 6-180	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.795.659,61	$ 89.216,42
3	B-C-SM-MZ87-VE-189	SAN MARTIN	RAUL ALBERTO OCHOA CRUZATE	3.831.774	CR 5A 11 - 20	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.187.339,74	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ56-VE-190	SAN MARTIN	YEISON RAFAEL PALOMINO MARRUGO	73.316.825	CR 7 CL 9 - 28	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.293.820,40	$ 730.045,78
3	B-C-SM-MZ56-VE-191	SAN MARTIN	JORGE RAFAEL PALOMINO MARRUGO	1.193.567.190	KR 7 # 9	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.775.724,82	$ 730.045,78
3	B-C-SM-MZ56-VE-192	SAN MARTIN	YON JAIRO VALETH SOTO	73.317.273	CL 10 6 - 1 P APTO 1	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 1.986.444,60	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ33-VE-193	SAN MARTIN	LUCILA ROSA PALENCIA MEDINA	22.853.719	CL 7 # 5 - 58	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.699.324,79	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ33-VE-194	SAN MARTIN	JHON JAIRO SANES VALETH	73.316.748	CL 9 # 4- 49	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.955.196,22	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ33-VE-195	SAN MARTIN	SANTANDER PIÑA ORTEGA	73.317.097	CL 9 # 4- 3	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.728.128,70	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ33-VE-196	SAN MARTIN	MANUEL SEGUNDO ROMERO GUERRA	3.831.054	CR 4 CL 8 - 25	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.879.612,72	$ 108.642,51
3	B-C-SM-MZ41-VE-197	SAN MARTIN	JAIME MERCADO CANTILLO	3.831.131	CL 9 # 5A - 2	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.679.609,16	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ-VE-198	SAN MARTIN	KENI ROBERT MEDINA FRANCO	1.002.301.923	CL 10 7-13	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.648.358,84	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ31-VE-199	SAN MARTIN	JUAN CARLOS VILLAMIL GOMEZ	1,049,452,165	CL 9 # 4A - 44	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.151.206,79	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ30-VE-200	SAN MARTIN	NELFIS DEL CARMEN TORRES PEREZ	22.856.790	CL 11 5A-3	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.733.276,25	$ 353.781,27
3	B-C-SM-MZ31-VE-201	SAN MARTIN	YULISSA PAOLA PEREZ ROMERO	1.049.454.950	CL 11 # 4A -4	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.836.293,92	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ18-VE-202	SAN MARTIN	ANTONIO MARIA HENAO ESCOBAR	73,315,178	KR 3 # 7 - 6	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.859.029,27	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ92-VE-203	SAN MARTIN	EMERSON JOSE SANCHEZ HENAO	73.316.943	CL 12 CR 8 - 33	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.838.153,82	$ 95.691,78
3	B-C-SM-MZ91-VE-205	SAN MARTIN	JOSE ESQUEA POLO	77.019.127	CL 11 # 7A - 4	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.570.401,35	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ91-VE-206	SAN MARTIN	SANDRA BENAVIDES ORTEGA	1.049.452.097	KR 7A # 11 - 27	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.161.294,50	$ 175.565,66
3	B-C-SM-MZ145-VE-208	SAN MARTIN	DAIBER ENRIQUE BANDA RIVERA	73.316.074	CR 8 CLL 6-68	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.279.757,08	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ34-VE-209	SAN MARTIN	FIDELIA JOSEFA RAMOS RODRIGUEZ	22.855.911	CR 4A CL 7 -2	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 4.027.668,97	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ34-VE-210	SAN MARTIN	ROSA IDALIA DURAN PASO	22.855.736	CR 4A CL 7 - 26	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.762.080,34	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ46-VE-211	SAN MARTIN	NICOLASA MARCELA MEDINA ARRIRTA	22.855.812	CR 5A # 8 - 31	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.377.875,74	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ56-VE-212	SAN MARTIN	ANDRES ROSALES MERCADO	7.417.790	CR 5 # 8-41	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 3.963.293,33	$ 69.790,32
3	B-C-SM-MZ-VE-216	SAN MARTIN	ELISA REYES VERGARA	22.854.464	CRA 8 CL 7-70 P	$ 152.241,60	$ 181.167,51	$ 19.904,84	$ 23.686,76	$ 172.146,44	$ 204.854,27	$ 5.855.582,18	$ 95.691,78
A		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	$ 26.946.763,71	$ 32.066.648,81	$ 3.523.156,35	$ 4.192.556,06	$ 30.469.920,06	$ 36.259.205,33	$ 882.381.679,54	$ 35.961.851,71
P		PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO								

VM: Valor Maximo Ayuda.

VM INTRADOMICILIARIA	VM INTRADOMICILIARIA + DOMICILIARIA + DIAGNOSTICO
8,23 SMLMV	10,03 SMLMV
$ 8.230.000,00	$ 10.030.000

CASO 1 - INTRA | CASO 2 - INTRA

Ítem	Grupo	Descripción	Und	Valor
2.1	REDES HIDROSANITARIAS	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" R DE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes.	ML	$10.170,51
2.2	REDES HIDROSANITARIAS	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML	$43.860,81
2.3	REDES HIDROSANITARIAS	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML	$21.402,93
2.4	PUNTOS HIDROSANITARIOS	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	$94.202,36
2.5	PUNTOS HIDROSANITARIOS	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	$112.904,76
2.6	PUNTOS HIDROSANITARIOS	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado	Und	$85.214,13
2.7	PUNTOS HIDROSANITARIOS	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	$89.406,34
2.8	PUNTOS HIDROSANITARIOS	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	$142.030,87
2.9	APARATOS	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	$147.311,27
2.10	APARATOS	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und	$114.887,70
2.11	APARATOS	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und	$185.296,96
2.12	APARATOS	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und	$177.856,36
2.13	CAJAS DE INSPECCIÓN	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0,40 m x 0,40 m x 1,00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M	$175.509,36
3.1	UNIDADES SANITARIAS	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	$2.596.959,72
3.2	UNIDADES SANITARIAS	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	$2.305.691,80
3.3	UNIDADES SANITARIAS	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	$2.927.724,89
3.4	UNIDADES SANITARIAS	Unidad sanitaria tipo 4. Caseta unidad sanitaria especial (incluye cubierta con teja en fibrocemento) Incluye Manija de agarre (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und	$3.012.931,39
3.5	CIMENTACIÓN	Relleno compactado con material de sitio	M3	$12.187,55
3.6	CIMENTACIÓN	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	$36.557,30
3.7	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	$547.962,74
3.8	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG	$4.953,42
3.9	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2	$52.948,33
3.10	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, incluye acero de refuerzo 1/4"	M2	$53.858,79
3.11	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	$180.903,59
3.12	MAMPOSTERIA	Mampostería en bloque de arcilla No 4 o similar, incluye mortero de pega	M2	$26.760,01
3.13	MAMPOSTERIA	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und	$5.988,18
3.14	MORTEROS	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	$12.398,76
3.15	MORTEROS	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	$12.851,95
3.16	MORTEROS	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	$15.479,97
3.17	ELEMENTOS	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	Und	$293.930,52
3.18	ELEMENTOS	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	$45.618,89
3.19	ELEMENTOS	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	$188.625,09
3.20	ELEMENTOS	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	$18.970,82
3.21	ELEMENTOS	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2	$49.939,55
3.22	ELEMENTOS	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	ML	$18.894,82
3.23	ELEMENTOS	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	$30.580,27
3.24	ACABADOS	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2	$31.418,61
3.25	ACABADOS	Recuperación de piso en concreto e=0,05m	M2	$19.876,75
3.26	ACABADOS	Recuperación de piso esmaltado	M2	$15.405,26
3.27	ACABADOS	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	$30.290,43
3.28	ACABADOS	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	$36.709,45
3.29	ACABADOS	C a rburo bla nco pa ra m uro e x te rior (3 m a nos)	M2	$4.777,63
4.1	CONEXIONES	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und	$121.071,76
4.2	CONEXIONES	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und	$132.377,90
4.3	CONEXIONES	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	$28.070,96
4.4	CONEXIONES	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und	$27.279,28
4.5	CONEXIONES	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	ML	$78.181,52
4.6	CONEXIONES	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	ML	$12.950,73
4.7	CONEXIONES	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP). Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und	$69.790,32
4.8	INTERVENCIONES VARIAS	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2	$162.285,76
4.9	CAJAS DE INSPECCIÓN	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0,60 m x 0,60 m x 1,00 m Aplica para DOMICILIARIA (incluye acero de refuerzo)	M	$238.957,93

Sumatoria	INTRADOMICILIARIA (Incluye AIU)	DOMICILIARIA (Incluye AIU)	INTRA+DOMC+DIAGNOS	CHEQUEO INTRADOMICILIARIAS + DIAGNOSTICO	CHEQUEO INTRADOMICILIARIAS	CHEQUEO NORM INTRA + DOMICILIARIA + DIAGNOSTICO	DESCUENTO POR INTRA	CONSOLIDADO EJECUTADO - DESCUENTOS	2.1	2.2	2.3
$ 5.338.412,99	$ 6.975.129,56	$ 92.395,40	$ 7.272.379,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.379,23	9,61	-7,82	-2,67
$ 5.141.980,68	$ 6.715.072,81	$ 92.395,40	$ 7.012.322,49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.012.322,49	-3,11	-0,32	-0,37
$ 5.851.042,84	$ 7.653.800,21	$ 92.395,40	$ 7.951.049,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.951.049,88	2,99	16,53	-4,67
$ 3.522.789,16	$ 4.571.425,17	$ 92.395,40	$ 4.868.674,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.868.674,84	0,29	6,43	-5,67
$ 5.911.525,70	$ 7.733.873,47	$ 92.395,40	$ 8.031.123,14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.031.123,14	11,69	8,08	7,83
$ 4.527.011,07	$ 5.900.914,55	$ 92.395,40	$ 6.198.164,22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.198.164,22	2,99	16,78	-2,47
$ 5.219.227,84	$ 6.783.049,40	$ 126.686,35	$ 7.114.590,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.114.590,01	-0,11	-2,82	3,33
$ 6.125.273,22	$ 6.982.454,70	$ 1.126.794,52	$ 8.314.103,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.314.103,48	7,89	2,48	-0,47
$ 6.042.375,29	$ 7.907.105,24	$ 92.395,40	$ 8.204.354,91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.204.354,91	-8,41	5,18	7,63
$ 6.016.870,04	$ 7.821.902,43	$ 143.831,82	$ 8.170.588,51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.170.588,51	-12,61	-2,32	2,33
$ 4.198.519,41	$ 5.466.024,44	$ 92.395,40	$ 5.763.274,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.763.274,11	1,89	-1,82	4,33
$ 5.855.875,18	$ 7.660.197,74	$ 92.395,40	$ 7.957.447,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.957.447,41	-8,61	1,28	2,53
$ 5.495.189,54	$ 6.929.600,90	$ 345.480,53	$ 7.479.935,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.479.935,70	0,89	0,18	-5,67
$ 6.372.116,89	$ 7.381.986,48	$ 1.054.059,07	$ 8.640.899,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.640.899,81	-2,11	13,68	-4,57
$ 5.801.882,51	$ 7.537.280,43	$ 143.831,82	$ 7.885.966,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.885.966,52	4,89	2,18	-1,67
$ 6.041.296,49	$ 7.652.591,90	$ 345.480,53	$ 8.202.926,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.202.926,69	-10,31	-6,82	-1,67
$ 5.584.208,20	$ 7.300.537,83	$ 92.395,40	$ 7.597.787,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.597.787,50	-3,11	-4,32	1,33
$ 6.668.358,34	$ 7.033.695,88	$ 1.794.543,73	$ 9.033.093,87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.033.093,87	-11,81	9,98	-4,67
$ 5.895.150,19	$ 7.459.108,81	$ 345.480,53	$ 8.009.443,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.009.443,60	9,39	10,78	-1,37
$ 5.763.164,86	$ 6.813.572,99	$ 816.280,97	$ 7.834.708,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.834.708,23	-1,61	3,58	-4,17
$ 5.973.303,82	$ 7.781.370,58	$ 126.686,35	$ 8.112.911,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.112.911,20	-5,61	9,18	18,73
$ 5.152.568,62	$ 6.729.090,19	$ 92.395,40	$ 7.026.339,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.026.339,86	-5,81	-7,82	6,63
$ 5.565.476,24	$ 6.971.217,05	$ 396.916,94	$ 7.572.988,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.572.988,25	-4,61	-0,82	-2,67
$ 4.021.973,44	$ 5.198.004,29	$ 126.686,35	$ 5.529.544,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.529.544,90	-1,11	-6,12	4,33
$ 3.158.254,97	$ 4.037.381,94	$ 143.831,82	$ 4.386.068,03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.386.068,03	-3,11	-1,82	-4,17
$ 5.668.939,48	$ 7.125.337,51	$ 379.771,47	$ 7.709.963,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.709.963,25	14,89	4,68	-2,17
$ 5.725.892,51	$ 7.365.223,19	$ 215.285,91	$ 7.785.363,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.785.363,36	6,89	5,98	-2,67
$ 3.928.868,84	$ 5.074.743,11	$ 126.686,35	$ 5.406.283,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.406.283,72	4,89	0,68	3,73
$ 5.936.313,02	$ 7.766.689,40	$ 92.395,40	$ 8.063.939,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.063.939,07	-6,11	-5,82	-0,67
$ 5.386.676,64	$ 5.921.823,07	$ 1.209.598,13	$ 7.336.275,47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.336.275,47	0,89	14,68	-4,67
$ 5.707.834,29	$ 7.464.206,41	$ 92.395,40	$ 7.761.456,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.761.456,08			
$ 3.823.296,94	$ 4.095.155,21	$ 966.507,61	$ 5.266.517,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.266.517,09	-14,11	3,18	-2,17
$ 5.846.142,59	$ 6.347.663,48	$ 1.392.044,69	$ 7.944.562,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.944.562,44			
$ 3.109.977,31	$ 4.024.903,56	$ 92.395,40	$ 4.322.153,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.322.153,23			
$ 3.768.885,27	$ 4.897.231,80	$ 92.395,40	$ 5.194.481,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.194.481,48			
$ 6.403.877,28	$ 7.408.081,01	$ 1.070.012,13	$ 8.682.947,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.682.947,40	1,89	2,38	-0,67
$ 1.940.153,05	$ 2.568.568,62	$ -	$ 2.773.422,89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.773.422,89	-27,11	-15,02	-6,17
$ 4.885.913,02	$ 6.376.064,85	$ 92.395,40	$ 6.673.314,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.673.314,52	-8,11	1,18	-3,67
$ 3.559.901,82	$ 4.620.558,61	$ 92.395,40	$ 4.917.808,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.917.808,28	0,89	1,18	-1,67
$ 3.158.605,21	$ 4.089.282,03	$ 92.395,40	$ 4.386.531,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.386.531,70	-7,11	0,68	-5,67
$ 5.201.293,80	$ 6.742.161,04	$ 143.831,82	$ 7.090.847,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.090.847,12	-15,61	-12,22	7,33
$ 5.665.101,76	$ 7.407.632,82	$ 92.395,40	$ 7.704.882,49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.704.882,49	-3,11	0,68	0,63
$ 5.413.952,60	$ 6.563.605,88	$ 603.925,97	$ 7.372.386,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.372.386,12	-12,51	-11,32	1,33
$ 5.254.275,64	$ 6.812.303,71	$ 143.831,82	$ 7.160.989,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.160.989,79	0,89	-11,82	0,93
$ 4.859.098,34	$ 6.340.564,89	$ 92.395,40	$ 6.637.814,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.637.814,56	-8,11	-11,82	2,33
$ 6.114.749,24	$ 7.951.484,71	$ 143.831,82	$ 8.300.170,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.300.170,79	-0,61	-3,32	-1,67
$ 5.806.195,99	$ 7.594.427,46	$ 92.395,40	$ 7.891.677,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.891.677,13	7,89	-10,12	0,33
$ 2.256.590,55	$ 2.843.668,40	$ 143.831,82	$ 3.192.354,49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.192.354,49	-8,11	6,18	-4,67
$ 5.873.024,34	$ 7.682.901,52	$ 92.395,40	$ 7.980.151,19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.980.151,19	10,89	11,48	2,83
$ 5.270.093,66	$ 6.884.681,59	$ 92.395,40	$ 7.181.931,26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.181.931,26			
$ 2.324.294,70	$ 2.984.738,35	$ 92.395,40	$ 3.281.988,03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.281.988,03			
$ 6.623.013,97	$ 7.537.263,13	$ 1.230.945,06	$ 8.973.062,46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.973.062,46	0,89	-12,82	-4,67
$ 4.884.827,09	$ 6.374.627,18	$ 92.395,40	$ 6.671.876,85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.671.876,85	-3,61	1,68	0,33
$ 5.613.709,38	$ 7.288.158,02	$ 143.831,82	$ 7.636.844,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.636.844,11	4,89	-1,82	-4,67
$ 5.538.609,64	$ 6.159.048,66	$ 1.173.516,64	$ 7.537.419,57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.537.419,57			
$ 2.911.807,88	$ 3.762.547,05	$ 92.395,40	$ 4.059.796,73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.059.796,73			
$ 4.973.652,68	$ 6.440.786,97	$ 143.831,82	$ 6.789.473,06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.789.473,06	-22,11	-9,32	-3,97
$ 5.479.658,35	$ 7.110.687,86	$ 143.831,82	$ 7.459.373,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.459.373,95	-2,11	-6,32	1,83
$ 4.605.936,49	$ 5.953.967,50	$ 143.831,82	$ 6.302.653,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.302.653,58	-1,11	-4,82	-3,67
$ 2.858.803,30	$ 3.692.374,29	$ 92.395,40	$ 3.989.623,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.989.623,96			
$ 5.419.578,30	$ 7.031.147,89	$ 143.831,82	$ 7.379.833,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.379.833,98	8,69	7,68	6,83
$ 5.426.147,54	$ 7.039.844,91	$ 143.831,82	$ 7.388.531,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.388.531,00	-1,11	-5,82	-2,17
$ 5.618.404,41	$ 7.294.373,78	$ 143.831,82	$ 7.643.059,87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.643.059,87	0,89	-7,32	6,33
$ 5.338.939,93	$ 6.924.390,76	$ 143.831,82	$ 7.273.076,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.273.076,84	-17,11	-14,82	3,33
$ 5.702.342,61	$ 7.456.935,98	$ 92.395,40	$ 7.754.185,65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.754.185,65			
$ 5.678.323,67	$ 7.425.137,30	$ 92.395,40	$ 7.722.386,97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.722.386,97			
$ 5.587.439,94	$ 7.304.816,33	$ 92.395,40	$ 7.602.066,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.602.066,00	-3,11	-1,32	3,83
$ 5.517.418,78	$ 7.212.115,32	$ 92.395,40	$ 7.509.364,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.509.364,99	2,89	-2,82	-4,67
$ 6.422.423,90	$ 7.065.956,28	$ 1.436.690,72	$ 8.707.501,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.707.501,27	-3,11	-9,82	-2,67
$ 5.531.356,52	$ 7.144.840,13	$ 178.122,76	$ 7.527.817,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.527.817,16			
$ 5.670.072,73	$ 7.362.777,46	$ 143.831,82	$ 7.711.463,55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.711.463,55	-10,11	-7,82	1,13
$ 4.495.039,37	$ 5.578.282,02	$ 372.700,61	$ 6.155.836,89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.155.836,89	5,39	-13,32	0,33
$ 6.009.975,32	$ 6.990.098,72	$ 966.507,61	$ 8.161.460,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.161.460,60	-5,11	-4,32	-3,67
$ 5.266.938,05	$ 6.829.067,46	$ 143.831,82	$ 7.177.753,55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.177.753,55	-3,11	0,68	4,73
$ 5.407.381,35	$ 7.032.145,83	$ 126.686,35	$ 7.363.686,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.363.686,44	22,69	7,28	4,13
$ 5.307.211,04	$ 6.933.821,29	$ 92.395,40	$ 7.231.070,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.231.070,96			
$ 5.889.069,67	$ 7.704.143,93	$ 92.395,40	$ 8.001.393,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.001.393,60	-2,61	5,48	-1,17
$ 5.760.484,42	$ 7.533.909,92	$ 92.395,40	$ 7.831.159,59	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.831.159,59	12,89	-8,82	2,33
$ 2.684.439,19	$ 3.427.242,70	$ 126.686,35	$ 3.758.783,31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.758.783,31	-10,11	-1,82	0,33
$ 5.425.808,40	$ 6.837.747,22	$ 345.480,53	$ 7.388.082,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.388.082,01	5,89	-12,82	7,33
$ 5.788.329,83	$ 6.800.166,76	$ 863.003,10	$ 7.868.024,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.868.024,12	-8,81	-4,82	-2,67
$ 4.394.170,48	$ 5.725.046,89	$ 92.395,40	$ 6.022.296,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.022.296,56	2,39	-0,32	-4,67
$ 5.510.221,92	$ 7.185.441,93	$ 109.540,88	$ 7.499.837,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.499.837,07	-20,61	-7,82	-0,67
$ 2.570.136,09	$ 3.258.771,35	$ 143.831,82	$ 3.607.457,43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.607.457,43	-2,11	8,68	-5,17
$ 6.149.724,82	$ 7.562.754,06	$ 578.866,62	$ 8.346.474,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.346.474,95	-5,11	2,78	-4,07
$ 6.131.344,69	$ 7.600.523,32	$ 516.763,91	$ 8.322.141,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.322.141,50	-3,11	8,88	-4,17
$ 5.754.845,66	$ 7.526.444,77	$ 92.395,40	$ 7.823.694,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.823.694,44	-0,81	9,48	-1,17
$ 2.614.652,01	$ 3.369.142,40	$ 92.395,40	$ 3.666.392,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.666.392,07			
$ 5.600.153,53	$ 6.654.544,67	$ 759.498,58	$ 7.618.897,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.618.897,52	0,89	-5,42	2,83
$ 2.401.823,76	$ 3.087.379,08	$ 92.395,40	$ 3.384.628,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.384.628,75			
$ 4.909.562,37	$ 6.407.374,22	$ 92.395,40	$ 6.704.623,89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.704.623,89	-1,11	8,68	2,63
$ 5.912.151,70	$ 7.734.702,23	$ 92.395,40	$ 8.031.951,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.031.951,90	-3,81	5,98	1,83
$ 4.692.531,08	$ 6.120.046,49	$ 92.395,40	$ 6.417.296,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.417.296,17	-4,11	-4,12	2,83
$ 3.475.806,93	$ 4.509.225,39	$ 92.395,40	$ 4.806.475,06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.806.475,06	6,89	3,18	-0,17
$ 5.569.043,84	$ 7.246.170,79	$ 126.686,35	$ 7.577.711,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.577.711,41	-11,61	-0,32	-1,17
$ 5.924.321,18	$ 7.750.813,40	$ 92.395,40	$ 8.048.063,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.048.063,07	-17,11	-1,32	0,83
$ 5.851.629,88	$ 7.654.577,40	$ 92.395,40	$ 7.951.827,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.951.827,07			
$ 3.274.356,85	$ 4.242.525,63	$ 92.395,40	$ 4.539.775,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.539.775,30			
$ 5.808.102,37	$ 7.509.399,87	$ 179.946,86	$ 7.894.200,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.894.200,99	-5,11	-5,82	-0,17
$ 4.981.544,56	$ 6.502.671,43	$ 92.395,40	$ 6.799.921,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.799.921,11			
$ 6.158.533,76	$ 7.026.488,33	$ 1.126.794,52	$ 8.358.137,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.358.137,11	-7,91	-4,02	-1,67
$ 5.503.948,56	$ 7.194.282,09	$ 92.395,40	$ 7.491.531,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.491.531,76	-6,11	-0,82	0,33
$ 5.758.736,71	$ 7.531.596,12	$ 92.395,40	$ 7.828.845,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.828.845,79	-6,61	3,68	-1,67
$ 5.771.467,78	$ 7.548.450,79	$ 92.395,40	$ 7.845.700,47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.845.700,47			
$ 5.673.550,67	$ 7.418.818,33	$ 92.395,40	$ 7.716.068,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.716.068,00	-18,81	-3,52	-1,57
$ 5.772.904,17	$ 7.550.352,43	$ 92.395,40	$ 7.847.602,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.847.602,10	-8,11	-6,82	-0,17
$ 5.736.196,91	$ 7.501.755,68	$ 92.395,40	$ 7.799.005,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.799.005,35	-9,11	-7,22	4,33
$ 5.694.152,95	$ 7.446.093,68	$ 92.395,40	$ 7.743.343,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.743.343,35	-7,11	-7,52	2,03
$ 5.284.799,20	$ 6.904.150,26	$ 92.395,40	$ 7.201.399,93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.201.399,93	9,89	0,88	3,33
$ 5.791.797,66	$ 7.558.220,04	$ 109.540,88	$ 7.872.615,19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.872.615,19	-12,11	-4,82	2,83
$ 5.834.553,40	$ 7.597.678,90	$ 126.686,35	$ 7.929.219,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.929.219,52	-9,11	3,68	-3,07
$ 4.501.049,51	$ 5.866.544,05	$ 92.395,40	$ 6.163.793,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.163.793,72	-3,61	4,58	-1,77
$ 6.014.596,40	$ 7.764.583,74	$ 198.140,43	$ 8.167.578,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.167.578,45	4,89	-3,12	12,83
$ 5.214.631,15	$ 6.811.254,78	$ 92.395,40	$ 7.108.504,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.108.504,45	4,89	-1,52	2,83
$ 5.636.945,28	$ 7.336.065,51	$ 126.686,35	$ 7.667.606,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.667.606,13	5,39	7,08	1,33
$ 5.923.888,84	$ 7.750.241,03	$ 92.395,40	$ 8.047.490,71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.047.490,71	-3,11	-4,82	5,33
$ 5.618.641,89	$ 7.311.833,65	$ 126.686,35	$ 7.643.374,26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.643.374,26	8,89	3,18	2,83
$ 5.311.973,48	$ 6.922.980,82	$ 109.540,88	$ 7.237.375,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.237.375,96	-17,11	-13,32	0,33
$ 5.796.875,62	$ 7.547.797,29	$ 126.686,35	$ 7.879.337,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.879.337,90	-7,11	6,18	-3,67
$ 4.345.438,19	$ 5.660.530,21	$ 92.395,40	$ 5.957.779,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.957.779,88			
$ 5.245.623,75	$ 6.852.285,88	$ 92.395,40	$ 7.149.535,55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.149.535,55	9,49	7,28	-0,17
$ 6.307.065,00	$ 7.693.929,28	$ 655.994,07	$ 8.554.777,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.554.777,62	-0,31	4,98	-0,17
$ 5.345.910,81	$ 6.950.764,97	$ 126.686,35	$ 7.282.305,59	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.282.305,59			
$ 5.953.920,85	$ 7.790.000,41	$ 92.395,40	$ 8.087.250,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.087.250,08	-7,11	-3,12	0,23
$ 6.084.184,13	$ 7.962.455,97	$ 92.395,40	$ 8.259.705,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.259.705,64	4,89	8,98	-3,17
$ 5.877.287,95	$ 7.688.546,11	$ 92.395,40	$ 7.985.795,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.985.795,79	9,89	-0,82	0,33
$ 5.821.243,57	$ 7.614.348,95	$ 92.395,40	$ 7.911.598,63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.911.598,63	-13,11	-6,12	3,03
$ 5.888.754,72	$ 7.669.436,02	$ 126.686,35	$ 8.000.976,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.000.976,64	-1,11	-6,82	0,83
$ 6.009.707,69	$ 7.846.711,13	$ 109.540,88	$ 8.161.106,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.161.106,28	-0,61	-4,82	-2,17
$ 5.464.902,91	$ 7.142.589,55	$ 92.395,40	$ 7.439.839,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.439.839,23	10,89	26,18	-0,67
$ 5.245.997,15	$ 6.818.489,28	$ 126.686,35	$ 7.150.029,89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.150.029,89	2,89	1,68	-3,67
$ 4.723.352,56	$ 6.160.851,05	$ 92.395,40	$ 6.458.100,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.458.100,72	1,69	1,18	-2,17
$ 5.257.578,16	$ 6.868.112,32	$ 92.395,40	$ 7.165.362,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.165.362,00	1,89	3,18	-1,67
$ 5.667.737,72	$ 7.411.122,57	$ 92.395,40	$ 7.708.372,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.708.372,24	28,89	13,68	5,33
$ 5.755.425,55	$ 7.475.776,07	$ 143.831,82	$ 7.824.462,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.824.462,16	9,89	-5,52	2,53
$ 6.944.975,46	$ 7.606.918,31	$ 1.587.534,70	$ 9.399.307,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.399.307,27	19,89	9,18	0,13
$ 4.882.881,46	$ 6.337.760,42	$ 126.686,35	$ 6.669.301,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.669.301,04	5,69	1,18	0,33
$ 6.639.207,66	$ 7.564.378,13	$ 1.225.268,90	$ 8.994.501,29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.994.501,29	14,89	3,68	-0,17
$ 4.921.683,12	$ 4.969.683,39	$ 1.546.132,89	$ 6.720.670,55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.720.670,55	8,89	6,68	-2,17
$ 5.596.428,89	$ 7.316.716,80	$ 92.395,40	$ 7.613.966,47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.613.966,47			
$ 5.895.019,73	$ 7.660.584,79	$ 143.831,82	$ 8.009.270,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.009.270,88	8,89	6,18	-0,97
$ 4.806.228,99	$ 6.164.826,13	$ 198.140,43	$ 6.567.820,83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.567.820,83	16,89	6,18	-1,67
$ 5.170.541,40	$ 6.752.884,36	$ 92.395,40	$ 7.050.134,03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.050.134,03	-3,11	-2,32	3,13
$ 4.468.601,17	$ 5.789.294,75	$ 126.686,35	$ 6.120.835,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.120.835,36			
$ 4.746.855,38	$ 6.191.966,43	$ 92.395,40	$ 6.489.216,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.489.216,10			
$ 4.543.493,22	$ 5.922.735,27	$ 92.395,40	$ 6.219.984,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.219.984,95			
$ 4.872.425,71	$ 6.358.209,00	$ 92.395,40	$ 6.655.458,67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.655.458,67			
$ 5.773.373,95	$ 7.550.974,37	$ 92.395,40	$ 7.848.224,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.848.224,04			
$ 5.009.019,50	$ 6.504.754,57	$ 126.686,35	$ 6.836.295,19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.836.295,19			
$ 5.114.426,70	$ 4.769.436,76	$ 2.001.552,76	$ 6.975.843,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.975.843,78	-2,11	1,18	-4,67
$ 6.348.493,90	$ 7.024.245,40	$ 1.380.525,67	$ 8.609.625,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.609.625,34	-6,11	-4,72	-1,17
$ 5.766.806,21	$ 7.542.279,34	$ 92.395,40	$ 7.839.529,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.839.529,01	-6,11	4,48	-3,17
$ 5.212.172,00	$ 6.807.999,11	$ 92.395,40	$ 7.105.248,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.105.248,78			
$ 5.884.876,03	$ 7.672.873,76	$ 118.113,61	$ 7.995.841,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.995.841,64			
$ 4.257.130,06	$ 5.543.619,08	$ 92.395,40	$ 5.840.868,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.840.868,75			
$ 5.023.866,19	$ 5.684.588,83	$ 966.507,61	$ 6.855.950,71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.855.950,71			
$ 6.505.770,61	$ 7.646.482,09	$ 966.507,61	$ 8.817.843,97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.817.843,97			
$ 2.056.234,92	$ 2.629.854,01	$ 92.395,40	$ 2.927.103,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.927.103,68			
$ 5.769.115,11	$ 7.545.336,08	$ 92.395,40	$ 7.842.585,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.842.585,76			
$ 5.024.986,54	$ 6.560.184,28	$ 92.395,40	$ 6.857.433,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.857.433,95			
$ 3.797.919,02	$ 4.935.669,59	$ 92.395,40	$ 5.232.919,26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.232.919,26			
$ 5.988.255,23	$ 7.784.019,28	$ 143.831,82	$ 8.132.705,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.132.705,36			
$ 5.749.399,48	$ 7.519.234,57	$ 92.395,40	$ 7.816.484,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.816.484,24			
$ 3.718.149,16	$ 4.830.062,26	$ 92.395,40	$ 5.127.311,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.127.311,94			
$ 3.220.997,11	$ 4.171.882,67	$ 92.395,40	$ 4.469.132,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.469.132,34			
$ 6.087.057,53	$ 7.590.284,43	$ 468.371,03	$ 8.263.509,73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.263.509,73			
$ 4.906.084,24	$ 6.402.769,52	$ 92.395,40	$ 6.700.019,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.700.019,20			
$ 5.928.819,59	$ 7.756.768,86	$ 92.395,40	$ 8.054.018,53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.054.018,53			
$ 5.933.845,60	$ 7.729.131,84	$ 126.686,35	$ 8.060.672,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.060.672,45			
$ 4.640.191,67	$ 6.050.754,34	$ 92.395,40	$ 6.348.004,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.348.004,01			
$ 4.336.860,16	$ 5.509.137,78	$ 232.431,38	$ 5.946.423,43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.946.423,43			
$ 4.349.547,40	$ 5.665.970,40	$ 92.395,40	$ 5.963.220,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.963.220,07			
$ 4.097.459,29	$ 5.332.230,94	$ 92.395,40	$ 5.629.480,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.629.480,62			
$ 5.831.870,66	$ 7.628.418,16	$ 92.395,40	$ 7.925.667,83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.925.667,83			
$ 5.447.666,06	$ 7.119.769,69	$ 92.395,40	$ 7.417.019,37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.417.019,37			
$ 4.033.083,65	$ 5.247.004,04	$ 92.395,40	$ 5.544.253,71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.544.253,71			
$ 5.951.273,96	$ 7.752.205,25	$ 126.686,35	$ 8.083.745,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.083.745,86			
$ 918.343.531,25	################	**$ 47.609.895,48**	################	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.252.054.206,35	2892,28	1341,53	
	################	1693748431									

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRATO: OBRA — CONTRATO No. 2220576

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUREDES (N.I.T 901568676 - 5)

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS. (N.I.T 800.173.768 -1)

PERÍODO A PAGAR: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022

En Bogotá DC, a los Veinte (20) días del mes de octubre del año 2022 se reunieron el Ing. Duarte Jose Pineda de Obra del Contratista y la Ing. Marcy Correa castaño Directora de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS													
1,1	ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.	GL	1,00	$ 4.319.349,87	$ 4.319.349,87	1,00	0,00	1,00	4.319.349,9	$ -	$ 4.319.349,87	0,00	$ -
	SUBTOTAL (ACTIVIDAD 1)				$ 4.319.349,87				4.319.349,87	$ -	$ 4.319.349,87		$ -
	IVA 19%				$ 820.676,48				820.676,48	$ -	$ 820.676,48		$ -
	TOTAL (ACTIVIDAD 1)				$ 5.140.026,35				$ 5.140.026,35	$ -	$ 5.140.026,35		$ -
ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.													
1,2	ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	217,00	$ 152.241,60	$ 33.036.427,82	124,00	53,00	177,00	18.877.958,4	$ 8.068.804,80	$ 26.946.763,20	40,00	$ 6.089.664,62
1,2	ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. ADICIÓN	UN	108,00	$ 152.241,60	$ 16.442.093,11								
	SUBTOTAL (ACTIVIDAD 2)				$ 49.478.520,93				$ 18.877.958,40	$ 8.068.804,80	$ 26.946.763,20		22.531.757,73
	IVA 19%				$ 9.400.918,98				$ 3.586.812,10	$ 1.533.072,91	$ 5.119.885,01		$ 4.281.033,97
	TOTAL (ACTIVIDAD 2)				$ 58.879.439,91				$ 22.464.770,50	$ 9.601.877,71	$ 32.066.648,21		$ 26.812.791,70
ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO													
	2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS												
	REDES HIDROSANITARIAS												
2,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes			$ 10.170,51	$ -	3.936,30	1923,70	5.860,00	40.034.178,51	$ 19.565.010,09	$ 59.599.188,60		$ -
2,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes			$ 43.860,81	$ -	2.078,60	830,50	2.909,10	91.169.079,67	$ 36.426.402,71	$ 127.595.482,38		$ -
2,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes			$ 21.402,93	$ -	957,10	392,10	1.349,20	20.484.744,30	$ 8.392.088,85	$ 28.876.833,15		$ -
	PUNTOS HIDROSANITARIOS - No incluye aparatos												
2,4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata			$ 94.202,36	$ -	106,00	35,00	141,00	9.985.450,16	$ 3.297.082,60	$ 13.282.532,76		$ -
2,5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería			$ 112.904,76	$ -	111,00	45,00	156,00	12.532.428,36	$ 5.080.714,20	$ 17.613.142,56		$ -
2,6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 85.214,13	$ -	106,00	35,00	141,00	9.032.697,78	$ 2.982.494,55	$ 12.015.192,33		$ -
2,7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 89.406,34	$ -	83,00	44,00	127,00	7.420.726,22	$ 3.933.878,96	$ 11.354.605,18		$ -
2,8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 142.030,87	$ -	83,00	41,00	124,00	11.788.562,21	$ 5.823.265,67	$ 17.611.827,88		$ -
	APARATOS												
2,9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento			$ 147.311,27	$ -	103,00	43,00	146,00	15.173.060,81	$ 6.334.384,61	$ 21.507.445,42		$ -
2,101	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería			$ 114.887,70	$ -	104,00	43,00	147,00	11.948.320,80	$ 4.940.171,10	$ 16.888.491,90		$ -
2,11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero			$ 185.296,96	$ -	83,00	44,00	127,00	15.379.647,68	$ 8.153.066,24	$ 23.532.713,92		$ -
2,12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)			$ 177.856,36	$ -	78,00	36,00	114,00	13.872.796,08	$ 6.402.828,96	$ 20.275.625,04		$ -
	CAJAS DE INSPECCIÓN												

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL												CÓDIGO:		F-GG-32
													VERSIÓN:		01
	GERENCIA DE PROYECTOS												VIGENCIA:		2020-10-20
2,13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)			$ 175.509,36	$ -	158,90	72,20	231,10	27.888.437,30	$ 12.671.775,79	$ 40.560.213,09		$ -
	3. ADECUACIONES														
	UNIDADES SANITARIAS														
3,1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 2.596.959,72	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 2.305.691,80	$ -	8,00	0,00	8,00	18.445.534,40	$ -	$ 18.445.534,40		$ -
3,3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 2.927.724,89	$ -	58,00	11,00	69,00	169.808.043,62	$ 32.204.973,79	$ 202.013.017,41		$ -
3,4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 3.012.931,39	$ -	1,88	1,00	2,88	5.678.188,58	$ 3.012.931,39	$ 8.691.119,97		$ -
	CIMENTACIÓN														
3,5	Relleno compactado con material de sitio			$ 12.187,55	$ -	48,05	-48,05	-	585.563,03	-$ 585.611,78	-$ 48,75		$ -
3,6	Relleno con material seleccionado (recebo)			$ 36.557,30	$ -	2,98	-2,98	-	108.940,75	-$ 108.940,75	$ 0,00		$ -
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS														
3,7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales			$ 547.962,74	$ -	49,26	32,38	81,64	26.992.644,57	$ 17.743.033,52	$ 44.735.678,09		$ -
3,8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)			$ 4.953,42	$ -	6.647,00	4160,00	10.807,00	32.925.382,74	$ 20.606.227,20	$ 53.531.609,94		$ -
3,9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)			$ 52.948,33	$ -	233,55	124,08	357,63	12.366.124,83	$ 6.569.828,79	$ 18.935.953,62		$ -
3,10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"			$ 53.858,79	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,11	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)			$ 180.903,59	$ -	52,00	8,80	60,80	9.406.986,68	$ 1.591.951,59	$ 10.998.938,27		$ -
	MAMPOSTERÍA														
3,12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega			$ 26.760,01	$ -	311,62	151,33	462,95	8.338.954,32	$ 4.049.592,31	$ 12.388.546,63		$ -
3,13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arciilla, incluye mortero de pega			$ 5.988,18	$ -	16,00	10,00	26,00	95.810,88	$ 59.881,80	$ 155.692,68		$ -
	MORTEROS														
3,14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor			$ 12.398,76	$ -	490,29	302,59	792,88	6.078.988,04	$ 3.751.740,79	$ 9.830.728,83		$ -
3,15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.			$ 12.851,95	$ -	436,21	337,57	773,78	5.606.149,11	$ 4.338.432,76	$ 9.944.581,87		$ -
3,16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor			$ 15.479,97	$ -	100,69	62,59	163,27	1.558.613,16	$ 968.891,32	$ 2.527.504,48		$ -
	ELEMENTOS														
3,17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético			$ 293.930,52	$ -	29,00	18,00	47,00	8.523.985,08	$ 5.290.749,36	$ 13.814.734,44		$ -
3,18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			$ 45.618,89	$ -	112,00	-36,00	76,00	5.109.315,68	-$ 1.642.280,04	$ 3.467.035,64		$ -

3,19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 188.625,09	$ -	63,00	41,00	104,00	11.883.380,67	$ 7.733.628,69	$ 19.617.009,36		$ -
3,201	Suministro e instalación de registro de cierre metalico			$ 18.970,82	$ -	124,00	53,00	177,00	2.352.381,68	$ 1.005.453,46	$ 3.357.835,14		$ -
3,21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm			$ 49.939,55	$ -	11,08	9,16	20,24	553.330,21	$ 457.446,28	$ 1.010.776,49		$ -
3,22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta			$ 18.894,82	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.			$ 30.580,27	$ -	100,00	48,00	148,00	3.058.027,00	$ 1.467.852,96	$ 4.525.879,96		$ -
	ACABADOS												
3,24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)			$ 31.418,61	$ -	13,64	3,00	16,64	428.549,84	$ 94.255,83	$ 522.805,67		$ -
3,25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m			$ 19.876,75	$ -	87,89	11,70	99,59	1.746.967,56	$ 232.557,98	$ 1.979.525,54		$ -
3,26	Recuperación de piso esmaltado			$ 15.405,26	$ -	21,90	0,00	21,90	337.375,19	$ -	$ 337.375,19		$ -
3,27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros			$ 30.290,43	$ -	168,99	90,34	259,33	5.118.840,35	$ 2.736.437,45	$ 7.855.277,80		$ -
3,28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros			$ 36.709,45	$ -	115,82	59,26	175,08	4.251.688,50	$ 2.175.402,01	$ 6.427.090,51		$ -
3,29	Estuco blanco en polvo para muros			$ 4.777,63	$ -	1.423,59	725,46	2.149,05	6.801.386,29	$ 3.465.979,46	$ 10.267.365,75		$ -
	4. ACOMETIDAS												
	CONEXIONES												
4,1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio			$ 121.071,76	$ -	5,00	0,00	5,00	605.358,80	$ -	$ 605.358,80		$ -
4,2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.			$ 132.377,90	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
4,3	Suminitro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto			$ 28.070,96	$ -	3,00	2,00	5,00	84.212,88	$ 56.141,92	$ 140.354,80		$ -
4,4	Suminitro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto			$ 27.279,28	$ -	2,00	0,00	2,00	54.558,56	$ -	$ 54.558,56		$ -
4,5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio			$ 78.181,52	$ -	163,70	29,50	193,20	12.798.314,82	$ 2.306.354,84	$ 15.104.669,66		$ -
4,6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio			$ 12.950,73	$ -	138,00	30,50	168,50	1.787.200,74	$ 394.997,27	$ 2.182.198,01		$ -
4,7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.			$ 69.790,32	$ -	123,00	53,00	176,00	8.584.209,36	$ 3.698.886,96	$ 12.283.096,32		$ -
	INTERVENCIONES VARIAS												
4,8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)			$ 162.285,76	$ -	31,39	7,35	38,74	5.094.150,01	$ 1.192.800,34	$ 6.286.950,35		$ -
	CAJAS DE INSPECCIÓN												
4,9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)			$ 238.957,93	$ -	19,20	4,20	23,40	4.587.992,26	$ 1.003.623,31	$ 5.591.615,57		$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					1.304.671.478,60				668.467.280,07	$ 249.876.385,14	$ 918.343.665,21		$ 386.327.813,39
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (ACTIVIDAD 3) ADICIÓN					651.679.570,36								
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (ACTIVIDAD 3) INICIAL + ADICIÓN					1.956.351.048,96								
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					633.662.104,77				216.516.552,02	$ 80.934.961,15	$ 297.451.513,16		$ 125.131.578,76
	ADMINISTRACIÓN	25,44%			497.695.706,86				170.058.076,05	$ 63.568.552,38	$ 233.626.628,43		$ 98.281.795,73
	IMPREVISTOS	1,00%			19.563.510,49				6.684.672,80	$ 2.498.763,85	$ 9.183.436,65		$ 3.863.278,13
	UTILIDAD	5,00%			97.817.552,45				33.423.364,00	$ 12.493.819,26	$ 45.917.183,26		$ 19.316.390,67
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19,00%			18.585.334,97				6.350.439,16	$ 2.373.825,66	$ 8.724.264,82		$ 3.670.114,23
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					2.590.013.153,73				884.983.832,09	$ 330.811.346,29	$ 1.215.795.178,37		$ 1.374.217.975,36
VALOR TOTAL (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)					2.654.032.619,99				912.588.628,94	$ 340.413.224,00	$ 1.253.001.852,93		$ 1.401.030.767,06

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1.771.707.945,99	V/R ANTICIPO (ACTIVIDAD 3):	$ 345.450.914,11	% EJECUTADO PRESENTE ACTA:	19,21%
V/R ADICIONES:	$ 882.324.674,00	% ANTICIPO (ACTIVIDAD 3) :	20%	% FACTURADO PRESENTE ACTA:	90% DEL ACTA 17,29%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 2.654.032.619,99	% RETEGARANTIA:			

FORMA DE PAGO: ENTerritorio realizará pagos mensuales, hasta el noventa por ciento (90%) del valor de cada acta de recibo parcial, de conformidad con las actas parciales mensuales de obra e informe mensual del CONTRATISTA debidamente aprobados por la interventoría, acompañados de la respectiva factura o cuenta de cobro.
El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de las 3 Actividades, se pagará una vez se haya liquidado el contrato, previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción y la entrega de los documentos señalados en la actividad de entrega de obras señalado en este estudio y de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio vigente durante la ejecución del contrato, dicha entrega será realizada a la interventoría y a ENTerritorio, así como de la aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el anexo "ESQUEMA DE GARANTÍAS Y SEGUROS" del presente

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3) (90%)	% PAGADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	RETENCIÓN GARANTÍA (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (ACTIVIDAD 3)	SALDO POR AMORTIZAR (ACTIVIDAD 3)	VALOR NETO A PAGAR (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	SALDO POR PAGAR (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	% PAGADO ACUMULADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)
1	COBRO ACTA PARCIAL No. 1 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)		$ 379.145.500,44	21,40%		$ 81.050.167,27	$ 264.400.746,84	$ 298.095.333,170	$ 2.355.937.286,82	21,40%
2	COBRO ACTA PARCIAL No. 2 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)		$ 442.194.944,42	24,96%		$ 95.946.599,15	$ 168.454.147,69	$ 346.248.345,270	$ 2.009.688.941,55	46,36%
3	COBRO ACTA PARCIAL No. 3 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)		$ 306.371.901,60	17,29%		$ 66.162.269,26	$ 102.291.878,43	$ 240.209.632,340	$ 1.769.479.309,21	63,65%
	TOTAL		$ 1.127.712.346,46	17,29%	$ -	$ 243.159.035,68	$ 102.291.878,43	$ 884.553.310,78	$ 1.769.479.309,21	63,65%

OK

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/08/2022

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CONSTRUREDES
NIT: 901568676 - 5

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ING. MARCY CORREA CASTAÑO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
NIT: 800.173.768 -1

Avaló


DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:


Nombre: ARQ. ERIKA GUTIERREZ GAITAN
SUPERVISOR - ENTerritorio

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
Nota 2: Instrucciones para la firma
Nota 3: En la presente acta se realizan los descuentos en los ítems: 3.5 y 3.6 de llenos cobrados en el actas anteriores y que corresponden a cantidades incluidas en los APUS contractuales, razón por la cual no deben pagarse por aparte. De igual forma se hace el descuento de 36 unidades en el ítem 3.18 suministro de juego de incrustaciones que estan incluidas en la Unidad sanitaria tipo 3, cantidades que se cobraron en las actas 1 y 2.
Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor la encontrará apta, apta con reparos suficiente y adecuada la ejecución de los acuerdos en la obra, caso en el cual la misma se entregará.
Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).


RELACIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO

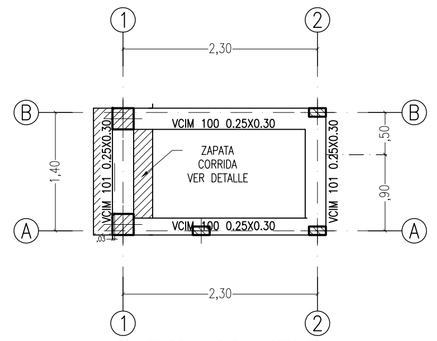


PLANTA DE CIMIENTO CASETA T3
ESC 1:25

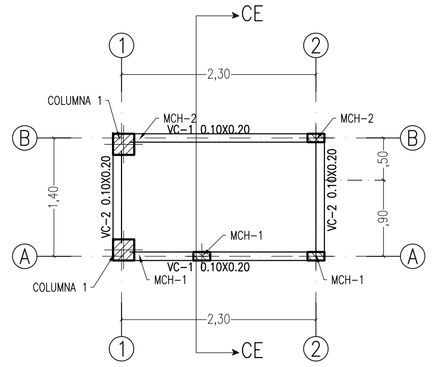


PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA CASETA T3
ESC 1:25




PLANTA ESTRUCTURAL DE Llosa DE TANQUE ELEVADO CASETA T3
ESC 1:25

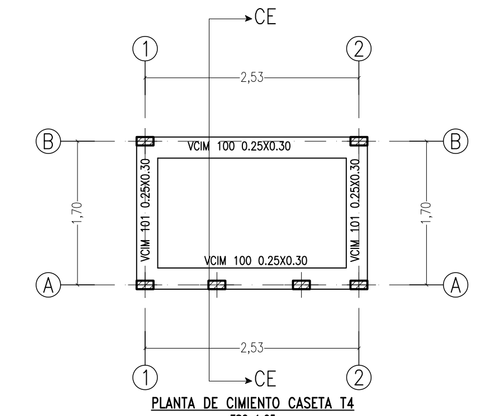


PLANTA DE CIMIENTO CASETA T4
ESC 1:25

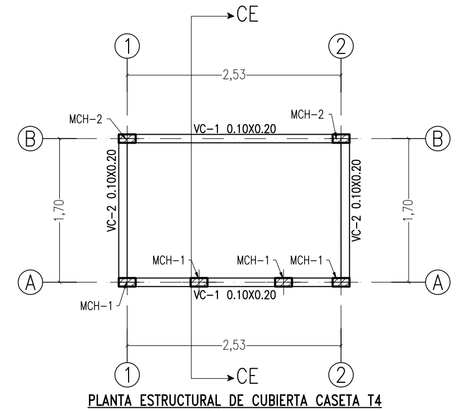



PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA CASETA T4
ESC 1:25






DETALLES DE VIGAS CIMIENTO CASETA T3
ESC 1:50







DETALLES DE VIGAS CORONAS CASETA T3
ESC 1:50

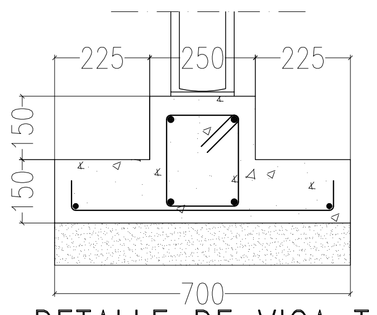


DETALLE DE VIGA T
ESC 1:10





DETALLE DE VIGAS DE TANQUE CASETA T3
ESC 1:50






DETALLES DE VIGAS CIMIENTO CASETA T4
ESC 1:50







DETALLES DE VIGAS CORONAS CASETA T4
ESC 1:50

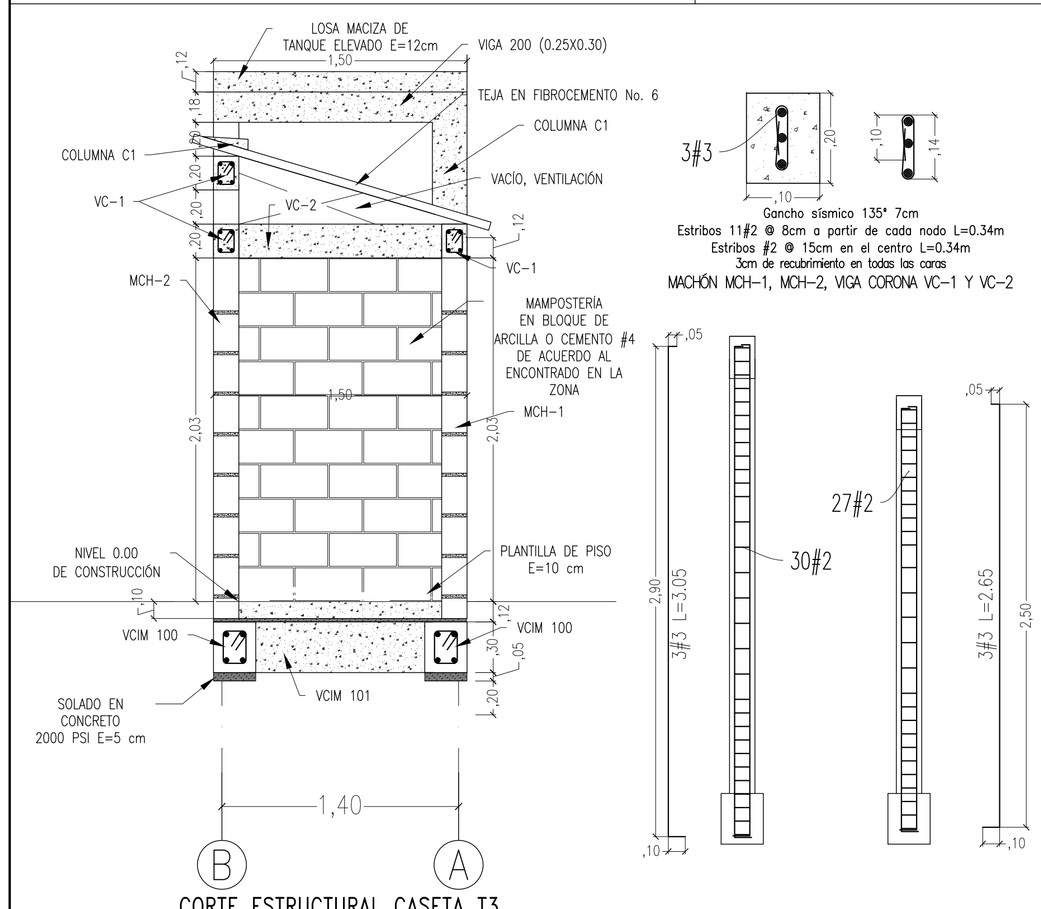


CORTE ESTRUCTURAL CASETA T3
ESC 1:25

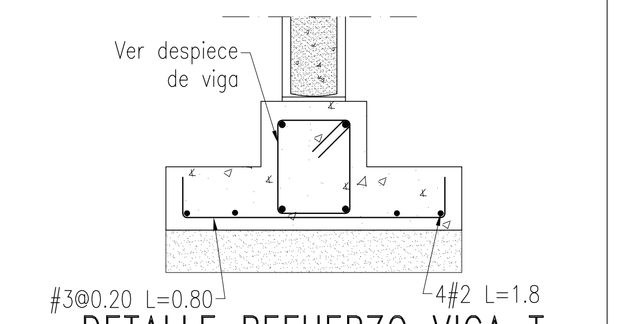


DETALLE REFUERZO VIGA T
ESC 1:10

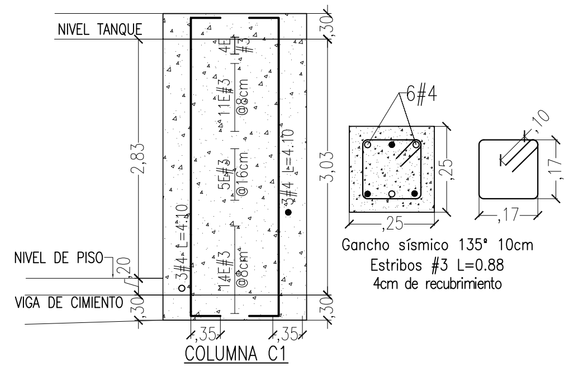


DESPIECE COLUMNAS CASETA T3
ESC VERTICAL: 1:50

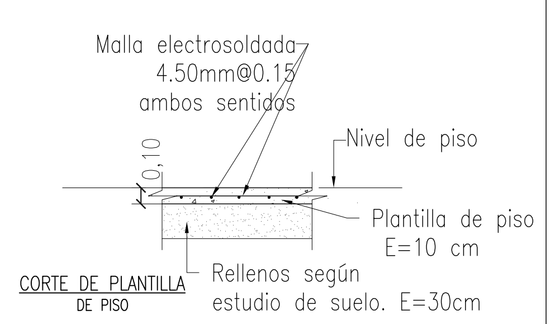




CORTE TRANSVERSAL DE LOSA MACIZA DE TANQUE ELEVADO CASETA T3 E=12cm

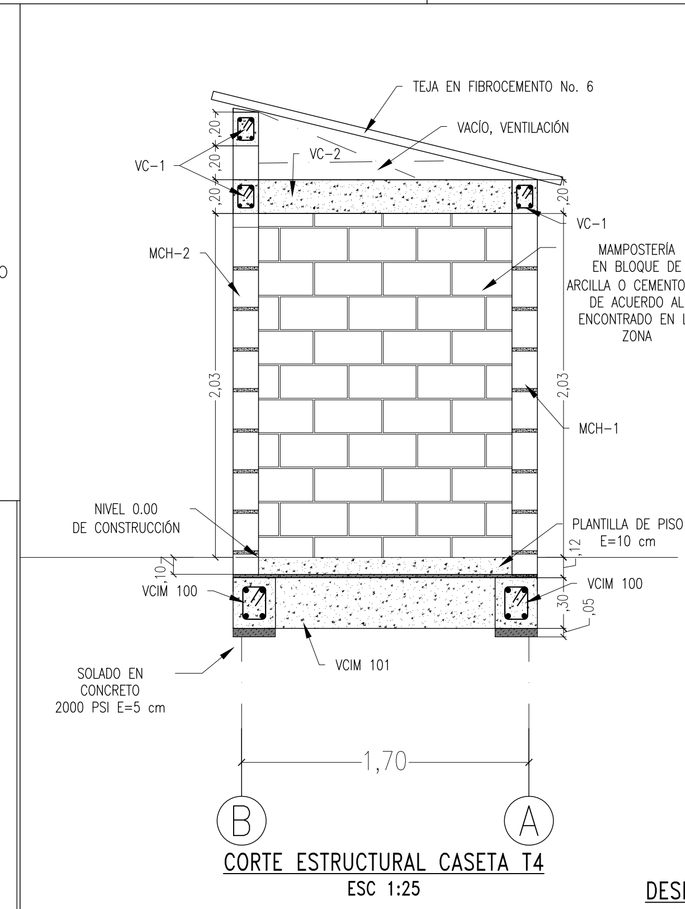


CORTE ESTRUCTURAL CASETA T4
ESC 1:25

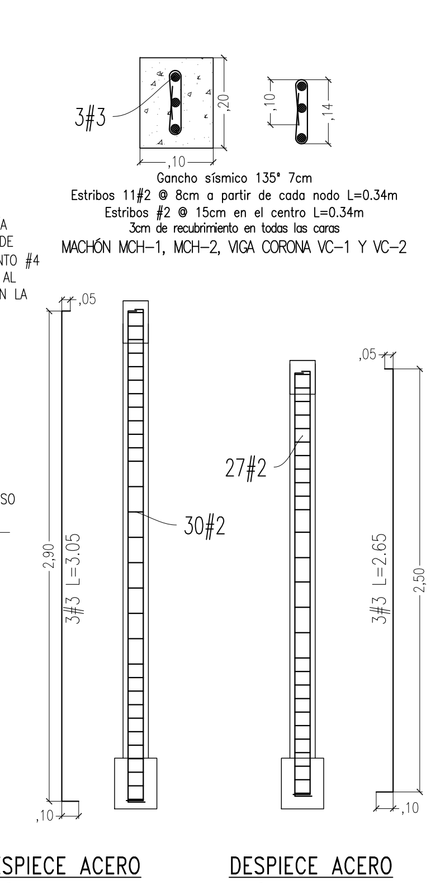

DESPIECE ACERO MACHÓN 2 CASETA T4
ESC 1:25

DESPIECE ACERO MACHÓN 1 CASETA T4
ESC 1:25

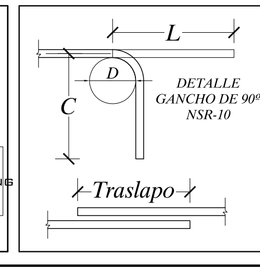

DETALLE GANCHO DE 90° NSR-10

DIMENSIONES DE LOS GANCHOS ESTANDAR Y LONGITUDES DE TRASLAPOS PARA CADA BARRA					
Barra #	Ø Pulg	L(cm)	D(cm)	C(cm)	Traslapo(m)
3	3/8	-	-	-	0,40
4	1/2	25	3,8	20	0,60
5	5/8	30	4,8	25	0,70
6	3/4	35	5,7	30	0,85
7	7/8	40	6,7	35	1,25
8	1	45	8,0	40	1,40

ESPECIFICACIONES GENERALES
-Zona de amenaza sísmica: Intermedia (Aa=0.10; Av=0.15)
-Capacidad de disipación de energía: D.M.O., -Grupo de uso: I,
-Tipo de suelo:D, -Carga de acabados: 1.4KN/m².
-Mortero de pega: Tipo S. 1:3,
-Mortero de relleno: Tipo grueso 1:3
-fy :420MPa Ø > #2 y cumplir con NTC 2289 (ASTM A706)
-Concreto f'c= 21.0 MPa. y cumplir NSR-10.
-Carga viva de diseño: 1.8 KN/m².,
-Mamposteria fcu=5Mpa.
- No se puede embeber ductos, tuberías o camisas de cualquier material en las vigas y/o columnas.

NOTA: El primer estribo de cada viga debe ser colocado a una distancia no mayor a 5cm medidos desde la cara de la columna.
El tamaño máximo de los agregados debe definirse según el diseño de mezcla

Cantidad ┐ ┌ Diametro en octavos
1#4 L=3.0
└ Longitud en metros

RECUBRIMIENTO		REFUERZO	AGREGADO MAXIMO	
Cimentación:	7.5 cm	#2 fy = 240MPa	Zapatas:	3/4"
Columnas:	4.0 cm	#3 a #9 fy = 420MPa	Columnas:	1/2"
Vigas:	4.0 cm		Losas y escalera:	1/2"
Losa:	3.0 cm			

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS MUNICIPIO DE CÓRDOBA-BOLÍVAR

CONTIENE:
PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1, T2, T3, T4 Y TANQUE

ESCALA: INDICADAS
PLANO Nº: 2/2

DISEÑO ESTRUCTURAL:
LOGO DE ESTRUCTURAL.PNG
LOGO JOSE ALEXANDER.PNG

DIRECCION:
BARRIO SAN MARTÍN MUNICIPIO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

FECHA:
JUNIO DE 2022

PETICIONARIO:
CONSORCIO CONSTRUREDES

EQUIPO DE TRABAJO:

ARCHIVO MAGNÉTICO:
EST. CASETAS CORDOBA.dwg

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA – BOLIVAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CORDOBA BOLIVAR, BARRIO SAN MARTÍN
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
CONTRATO DE OBRA No.:	2220576
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220587
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

FOTOGRAFÍA (1)



Descripción.
Se evidencia la construcción de apoyos en bloque para lavadero estándar. Se encuentra con instalación de lavadero estándar, aplicación de pintura, instalación de tubería sanitaria e hidráulica. Se lleva a cabo la verificación de los acabados y junta entre elementos.

FOTOGRAFÍA (2)



Descripción.
Se realiza el proceso constructivo en una vivienda con intervención de Adecuación, con instalación de cerámica en pared y piso como se evidencia. Se hace verificación de remates de enchape pared contra piso y desnivel de ducha para evitar estancamiento. La unidad sanitaria se encuentra con pañete, placa de piso, aplicación de pintura e instalación de ducha y puntos hidrosanitarios.

FOTOGRAFÍA (3)



Descripción.
Se evidencia instalación de sanitario, lavamanos con pedestal, ducha, cerámica de pared y piso e incrustaciones de pared. La caseta tipo 3 se encuentra en un porcentaje de avance alto, cuenta con pañete, aplicación de pintura en muros internos e instalación de tanque y cubierta. Faltantes, puerta y aplicación de pintura en muro exterior.

FOTOGRAFÍA (4)



Descripción.
Se observa la construcción en una vivienda con intervención en Caseta Tipo 3, se encuentra con aplicación de pintura, instalación de puerta, cubierta, instalación de tanque, con construcción de columnas, columnetas, viga dintel, vigas de amarre.

FOTOGRAFÍA (5)



Descripción.
Se evidencia proceso constructivo en Caseta tipo 3, cuenta con fundición de viga cimentación, sobrecimiento, armado de configuración de acero de refuerzo para columnas y columnetas, de acuerdo a especificaciones técnicas. Además, se encuentra en etapa de levantamiento de muro, a nivel de viga dintel.

FOTOGRAFÍA (6)



Descripción.
Se evidencia instalación de sanitario, lavamanos con pedestal e incrustaciones de pared en vivienda con intervención de Adecuación.

FOTOGRAFÍA (7)




Descripción.
Se evidencia construcción de apoyos en muro para lavaplatos, instalación de tubería hidrosanitaria e instalación de accesorios, aplicación de 3 manos de pintura dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y de calidad.

FOTOGRAFÍA (8)



Descripción.
Se evidencia armado de formaleta y fundición de losa de tanque elevado, construcción de lavadero estándar; el cual ya tiene pañete en mortero 1:4. Se instalan las tuberías de red hidráulica y sanitaria. Las labores están ejecutándose en vivienda con intervención de Adecuación.

FOTOGRAFÍA (9)

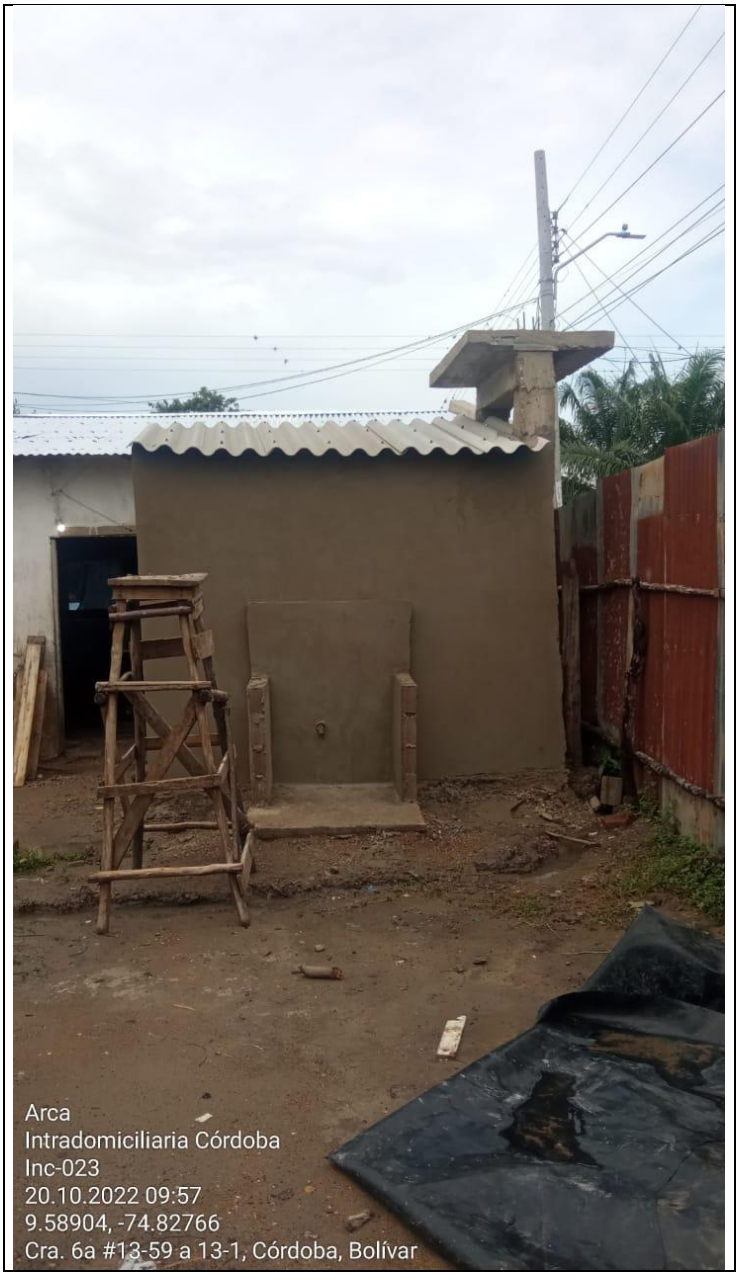

Descripción.
La caseta Tipo 3 y el muro de apoyo para lavadero estándar, se evidencia terminación de pañete en mortero 1:4 en muros exteriores e interiores, con detalles en filos, igualmente, cuentan con instalación de puntos hidráulicos y sanitarios, instalación de cubierta, plantilla de piso.

FOTOGRAFÍA (10)



Descripción.
Se realiza desmonte de cubierta existente en palma amarga en vivienda con intervención de Adecuación, para posterior instalación de correa en perfil metálico y cubierta en teja. La unidad sanitaria cuenta con enchape de pared y piso, instalación de sanitario, instalación de ducha.

FOTOGRAFÍA (11)



Descripción.
Se evidencia Caseta Tipo 3 con aplicación de pintura, instalación de tanque elevado, cubierta, instalación de puerta, instalación de cerámica en pared y piso, faltante instalación de sanitario, lavamanos con pedestal e incrustaciones.

FOTOGRAFÍA (12)



Descripción.
Instalación de tanque elevado con estructura de soporte columna y losa en viga T; en cumplimiento de los parámetros establecido por NSR-10, construida en viviendas con intervención de adecuación.

VIDEO DEL AVANCE DEL PROYECTO

SE ADJUNTA EN CARPETA DIGITAL

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE MATERIALES Y DEMÁS PRUEBAS

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Página /Pages 1 de 3

Número de páginas incluyendo anexos 3
Number of pages and documents attached

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)
Object

Fabricante: Alfa
Manufacturer

Modelo: B-001/LCD/2-X
Model

Número de identificación: 170225/33
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1000,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b -17 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: miércoles, 06 de abril de 2022
Date of issue

Número: **F 1305**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M.
Verificado por:
reviewed by

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method

Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente — Inicial/*Initial* 20,2 °C; Final/*End* 21,0 °C

Resultados

Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,10
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,05

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
10	100,20	100,30	100,20			100,23	100,0	0,10		0,10	-0,23		2,0,E-01	2,00
20	201,00	202,00	200,20			201,07	200,0	0,05		0,90	-0,53		3,7,E-01	1,96
30	309,00	308,00	307,00			308,00	300,0	0,03		0,65	-2,60		3,7,E-01	1,96
40	410,00	411,00	409,00			410,00	400,0	0,03		0,49	-2,44		3,7,E-01	1,96
50	512,00	511,00	513,00			512,00	500,0	0,02		0,39	-2,34		3,7,E-01	1,96
60	612,00	613,00	612,00			612,33	600,0	0,02		0,16	-2,01		3,7,E-01	1,96
70	714,00	713,00	711,00			712,67	700,0	0,01		0,42	-1,78		3,7,E-01	1,96
80	816,00	813,00	815,00			814,67	800,0	0,01		0,37	-1,80		3,7,E-01	1,96
90	916,00	918,00	917,00			917,00	900,0	0,01		0,22	-1,85		3,7,E-01	1,96
100	1020,00	1019,00	1021,00			1020,00	1000,0	0,01		0,20	-1,96		3,7,E-01	1,96

0,040	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	**Reversibilidad (v)**	**Repetibilidad (b)**	**Exactitud (q)**	**Accesorios**
Máximos errores encontrados (%)	0,040	No se determino	0,9	-2,60	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305** *Number*

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

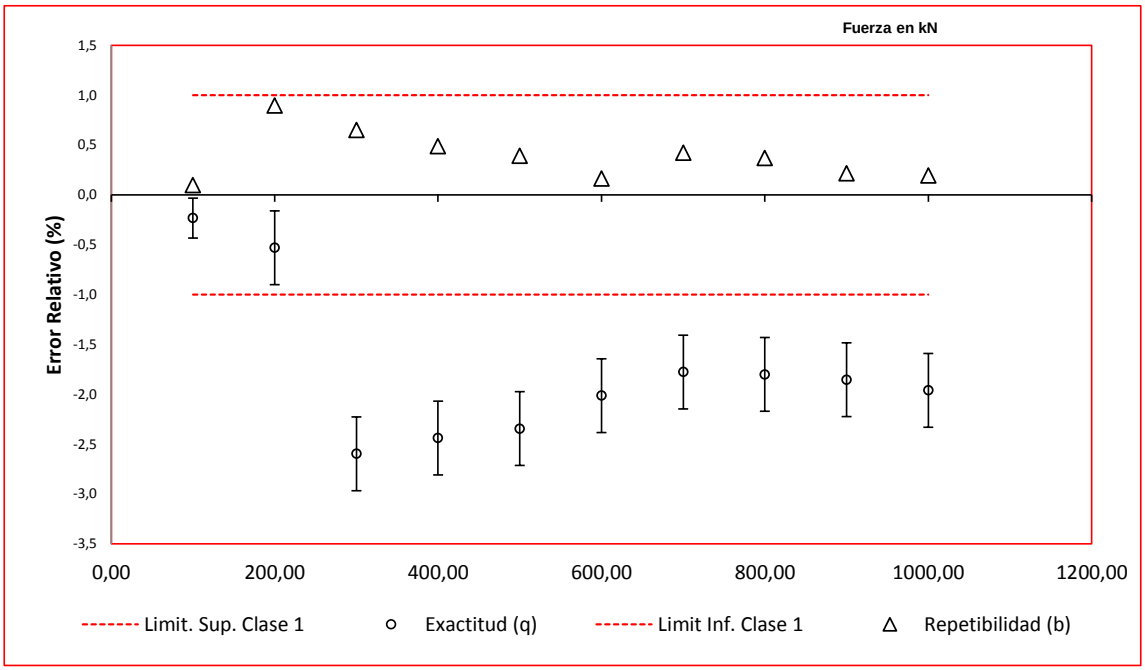

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com

Teléfono: 311 4143542

«CIUDAD_PROPONENTE»

El consorcio Construredes Se hace responsables de todos los ensayos emitidos por la empresa **Hernán Ramos Villamil S.A.S Nit 901.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia y los cuales poseen la calibración de los equipos, cuyo proveedor si está acreditado para realizar las calibraciones correspondientes y es un respaldo a nuestro trabajo. Estarán encargados de realizar los ensayos pertinentes que garanticen el control y aseguramiento de la calidad de la obra “ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba, departamento de bolívar”

REPRESENTANTE LEGAL

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 26/10/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	28/09/2022	26/10/2022	28	3.000		180,3	5	3228	107,6%
	VIGA	28/09/2022	26/10/2022	28	3.000		170,3	5	3140	104,6%
	PLACA	28/09/2022	26/10/2022	28	3.000		183,3	5	3248	108,2%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

OFICINA Y LABORATORIO
Calle 12 No. 24B – 17 Barrio La Palma
Telef. y Fax 095-282 58 08 - SINCELEJO

Sincelejo, 1 de julio de 2022
Señores
ENTerritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Ref. Certificación para realización de ensayos de geotecnia

Cordial saludo,

Yo, **HERNAN RAMOS VILLAMIL**, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.053.862 de Cartagena y la Matricula profesional 494 de S.I.A.B. que me acredita como ingeniero civil, en calidad de representante legal de la empresa **HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. Nit. 900.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia, certifico que seremos los encargados de realizar todos los ensayos pertinentes que garanticen el control y el aseguramiento de la calidad de la obra *"ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar"* la cual está a cargo de la firma **Consorcio Construredes Nit 901.568.676-5**.

Firma Electrónica
ID Firma: 67c37f62-3496-469f-b5c0-733a2abbe22b

HERNAN RAMOS VILLAMIL
C.C. 9.053.862 de Cartagena.
T.P. 494 S.I.A.B.
Representante Legal

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 13/10/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	06/10/2022	13/10/2022	7	3.000		132,1	5	2186	72,8%
	VIGA	06/10/2022	13/10/2022	7	3.000		133,5	5	2215	73,8%
	PLACA	06/10/2022	13/10/2022	7	3.000		128,5	5	2232	74,4%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached 3

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Cilindros)
Object

Fabricante: N/P
Manufacturer

Modelo: N/P
Model

Número de identificación: N/P
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1200,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b - 170 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: viernes, 20 de agosto de 2021
Date of issue

Número: **F 1304**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M
Verificado por:
reviewed by

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method
Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	32,0	°C
	Final/*End*	33,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,08
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,04

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
8	100,00	100,40	100,30			100,23	100,0	0,10		0,40	-0,23		5,7,E-01	2,00
17	200,00	200,00	200,20			200,07	200,0	0,05		0,10	-0,03		3,7,E-01	1,96
25	300,00	300,00	301,00			300,33	300,0	0,03		0,33	-0,11		3,7,E-01	1,96
33	401,00	401,00	400,00			400,67	400,0	0,03		0,25	-0,17		3,7,E-01	1,96
42	501,00	501,00	500,00			500,67	500,0	0,02		0,20	-0,13		3,7,E-01	1,96
50	600,00	601,00	601,00			600,67	600,0	0,02		0,17	-0,11		3,7,E-01	1,96
58	700,00	702,00	702,00			701,33	700,0	0,01		0,29	-0,19		3,7,E-01	1,96
67	800,00	801,00	801,00			800,67	800,0	0,01		0,12	-0,08		3,7,E-01	1,96
83	1001,00	1002,00	1004,00			1002,33	1000,0	0,01		0,30	-0,23		3,7,E-01	1,96
100	1201,00	1205,30	1203,00			1203,10	1200,0	0,01		0,36	-0,26		3,7,E-01	1,96

0,033	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	Reversibilidad (v)	Repetibilidad (b)	Exactitud (q)	Accesorios
Máximos errores encontrados (%)	0,033	No se determino	0,4	-0,23	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

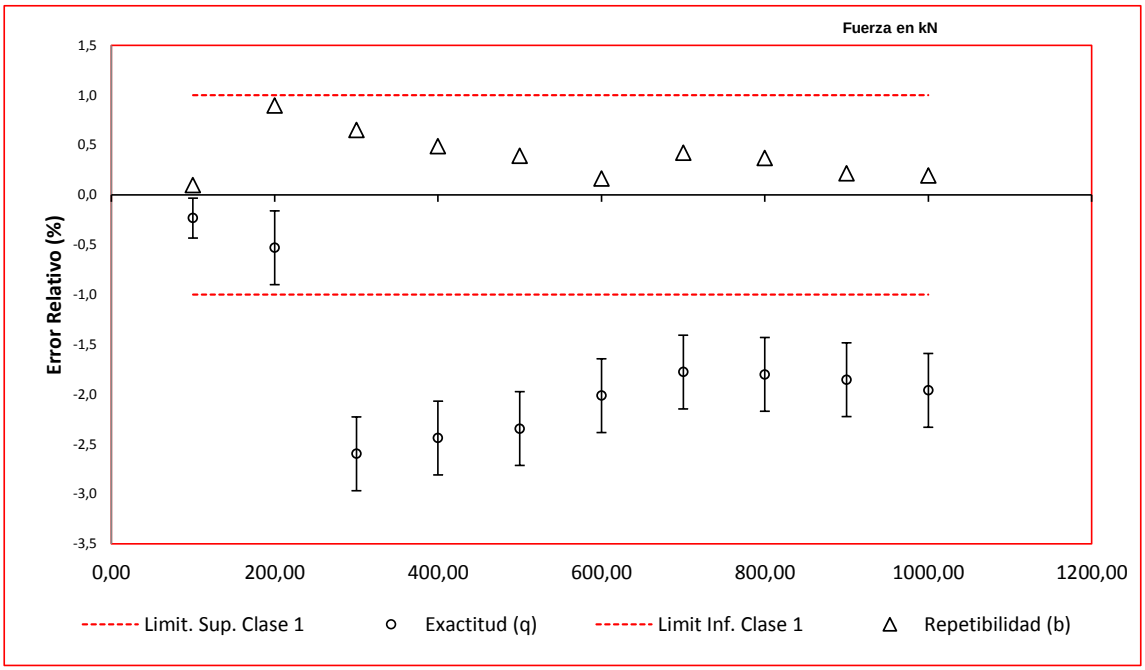

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

enterritorio	**CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS**	CÓDIGO:	**F-GG-23**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-19**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	(31/10/2022)	**INFORME MENSUAL DEL**	**(01/10/2022)**	**AL**	**(31/10/2022)**	
CONTRATO No. :	2220587					
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES					
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A					
SUPERVISOR:	ENTERRITORIO					

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	**Nombre**		**Desde**	**Hasta**	
N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME	N/A	N/A	N/A	N/A
	Adicione las filas necesarias				

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	**Hasta**
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	2124	CAZUELA CASAGRANDE	NA-24532-001 R0	3/12/2021	
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	N/A	MANOMETRO HUMEDÓMETRO	NA-23741-001 R0	16/07/2021	
Hernán Ramos Villamil S.A.S	B-001/LCD/2-X	MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION (MARCO CILINDROS)	F1305	30/03/2022	
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	N/A	MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION (CILINDROS)	F1304	30/03/2022	

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este periodo o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
XX	**YY**	**Fecha ensayo o aplicac. protocolo**	**Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)**	**Nombre de la norma, protocolo o requisito**	**Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo**	**Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)**
06	01	13/10/2022	I.N.V.E 410 NTC-673-1513	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	FC-19 VERSIÓN 2	LOS ELEMENTOS SOMETIDOS AL ENSAYO A COMPRESIÓN, COMO LO FUERON LA COLUMNA, LOSA DE TANQUE Y VIGA PRESENTAN UN 70% DE RESISTENCIA A LOS 7 DIAS DE TOMADA LA MUESTRA
06	02	26/10/2022	I.N.V.E 410 NTC-673-1513	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	FC-19 VERSIÓN 2	LOS ELEMENTOS SOMETIDOS AL ENSAYO A COMPRESIÓN, COMO LO FUERON LA COLUMNA, LOSA DE TANQUE Y VIGA PRESENTAN MAS DEL 100% DE RESISTENCIA A LOS 28 DIAS DE TOMADA LA MUESTRA

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
XX	**YY**		**Desde**	**Hasta**		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	Número de orden del documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente
# del ítem según contrato	**Descripción del ítem**	**Numero de norma (4)**	**Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible**		
N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME	N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME		N/A

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.
(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Periodo XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

	
Firma	**Firma**
NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")	DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

NA-24532-001 R0

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	CAZUELA CASAGRANDE
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR
Modelo *Model*	PS-11
Número de Serie *Serial Number*	2124
Identificación Interna *Internal Identification*	No presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Ver tabla de resultados
Solicitante *Customer*	HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
Dirección *Address*	Calle 12 No24 B - 17
Ciudad *City*	Sincelejo - Sucre
Fecha de Calibración *Date of Calibration*	2021 – 12 – 03
Fecha de Emisión *Date of Issue*	2021 – 12 – 13
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	02

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo coresponden al item que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los intrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar. no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatureS

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología


DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Instrumentos de Referencia	Pie de Rey
Certificado No.	L-21980-001 de Pinzuar
Documento de Referencia	INVIAS E – 125/13 Numeral 5

TABLA DE RESULTADOS

Cazuela

Letra*	Especificación	Valor Medido
	mm	mm
A	54 ± 0.5	54,03
B	2 ± 0.1	2,08
C	27 ± 0.5	27,36
K	50 ±2	51,33
L	150 ± 2	151,24
M	125 ± 2	126,05
U	47 ± 1	46,95
P	28	27,33
R	24	23,95
T	45	45,04

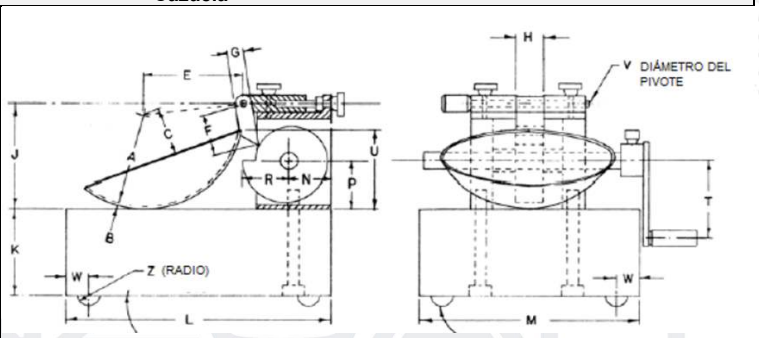

CONDICIONES AMBIENTALES

La verificación se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar., las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	19,8 °C	**Humedad Máxima:**	56 %
Temperatura Mínima:	19,5 °C	**Humedad Mínima:**	53 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada (Tablas de resultados), se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k y la probabilidad de cobertura aproximadamente al 95 %. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.
* La incertidumbre máxima encontrada en la medición de dimensiones es 12 µm para un factor de cobertura k=2.

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Se adjunta la estampilla de calibracón.

NA-24532-001

Fin de Certificado

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN – LABORATORIO PRESIÓN

NA-23741-001 R0

CALIBRATION CERTIFICATE – LABORATORY OF PRESSURE

INSTRUMENTO *Instrument*	*MANÓMETRO HUMEDÓMETRO*
INTERVALO DE MEDIDA *Measurement range*	*0 %HR - 20 %HR*
FABRICANTE *Manufaturer*	*RYR*
MODELO *Model*	*DI*
SERIE *Identification number*	*No Presenta*
CODIGO INTERNO *Internal Code*	*23741-001*
SOLICITANTE *Customer*	*HERNAN RAMOS VILLAMIL SAS*
DIRECCIÓN *Address*	*Calle 12 No. 24 B - 17*
CIUDAD *City*	*Sincelejo - Sucre*
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of calibration*	2021 - 07 - 14
FECHA DE EXPEDICIÓN *Date of Issue*	2021 - 07 - 16

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS ***3***
Number of pages of this certificate and documents attached

Firmas que autorizan el certificado
Signatures authorizing the certificate

Ing. Sergio Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Durán Romero
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DETALLES DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE CALIBRACIÓN Comparación directa. **Documento de Referencia** DKD R 6 - 1 del 2014

FACTOR DE CONVERSIÓN 1 psi = 6,89476 kPa Nota: Factor de conversión tomado del NIST Special Publication 811 2008 Edition

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

INTERVALO A CALIBRAR 0 %HR - 20 %HR **DIVISIÓN DE ESCALA** 0,2 %HR **RESOLUCIÓN** 0,1 %HR

	Indicación del IBC	indicaciones del instrumento patrón	
		M1 - asc	M2 - desc
%	% HR	psi	psi
0	0,00	0,000	0,000
20	4,00	6,166	5,972
40	8,00	12,136	11,988
60	12,00	17,966	17,689
80	16,00	23,934	23,899
100	20,00	29,988	29,988

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Indicación del IBC		Promedio Patrón	Desviación	Histeresis	Incertidumbre Expandida
%	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4,00	6,00	6,07	-0,07	0,19	0,25
8,00	12,00	12,06	-0,06	0,15	0,21
12,00	18,00	17,83	0,17	0,28	0,34
16,00	24,00	23,92	0,08	0,04	0,13
20,00	30,00	29,99	0,01	0,00	0,12

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

La desviación máxima encontrada durante la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es:

0,172 psi

La desviación máxima encontrada, respecto al valor máximo de la escala en porcentaje es:

% Desviación = 0,6

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla de resultados de la página No. 2, para cada punto de calibración. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CONDICIONES AMBIENTALES

Max. Temp.	*20,3 °C*	***Min. Temp.***	*19,6 °C*
Max. Hum. (%)	*55 HR*	***Min. Hum. (%)***	*53 HR*

TRAZABILIDAD

El Laboratorio de Metrología de Pinzuar Ltda. asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo utilizados en las mediciones.

PATRÓN UTILIZADO	Manómetro Digital		
CERT.DE CALIBRACIÓN	7337 de Flexilatina S.A.S.	**CLASE DE EXACTITUD**	0,050%
INTERVALO DE MEDIDA	30 psi	**SERIE**	3227038

OBSERVACIONES .

1. Se realizó una inspección general del instrumento encontrándose en buen estado de funcionamiento
2. Los Certificados de calibración sin las firmas no tienen validez .
3. El usuario es responsable de la recalibración de los instrumentos de medición.
4. Los resultados contenidos parcialmente en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
5. Se adjunta estampilla de calibración adherida al instrumento No. **NA-23741-001**

Fin de Certificado

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com

Teléfono: 311 4143542

«CIUDAD_PROPONENTE»

El consorcio Construredes Se hace responsables de todos los ensayos emitidos por la empresa **Hernán Ramos Villamil S.A.S Nit 901.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia y los cuales poseen la calibración de los equipos, cuyo proveedor si está acreditado para realizar las calibraciones correspondientes y es un respaldo a nuestro trabajo. Estarán encargados de realizar los ensayos pertinentes que garanticen el control y aseguramiento de la calidad de la obra “ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba, departamento de bolívar”

REPRESENTANTE LEGAL

CALIBRACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DEL PROYECTO

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Página /Pages 1 de 3

Número de páginas incluyendo anexos 3
Number of pages and documents attached

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)
Object

Fabricante: Alfa
Manufacturer

Modelo: B-001/LCD/2-X
Model

Número de identificación: 170225/33
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1000,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b -17 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: miércoles, 06 de abril de 2022
Date of issue

Número: **F 1305**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M.
Verificado por:
reviewed by

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method

Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente — Inicial/*Initial* 20,2 °C; Final/*End* 21,0 °C

Resultados

Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,10
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,05

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
10	100,20	100,30	100,20			100,23	100,0	0,10		0,10	-0,23		2,0,E-01	2,00
20	201,00	202,00	200,20			201,07	200,0	0,05		0,90	-0,53		3,7,E-01	1,96
30	309,00	308,00	307,00			308,00	300,0	0,03		0,65	-2,60		3,7,E-01	1,96
40	410,00	411,00	409,00			410,00	400,0	0,03		0,49	-2,44		3,7,E-01	1,96
50	512,00	511,00	513,00			512,00	500,0	0,02		0,39	-2,34		3,7,E-01	1,96
60	612,00	613,00	612,00			612,33	600,0	0,02		0,16	-2,01		3,7,E-01	1,96
70	714,00	713,00	711,00			712,67	700,0	0,01		0,42	-1,78		3,7,E-01	1,96
80	816,00	813,00	815,00			814,67	800,0	0,01		0,37	-1,80		3,7,E-01	1,96
90	916,00	918,00	917,00			917,00	900,0	0,01		0,22	-1,85		3,7,E-01	1,96
100	1020,00	1019,00	1021,00			1020,00	1000,0	0,01		0,20	-1,96		3,7,E-01	1,96

0,040	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	**Reversibilidad (v)**	**Repetibilidad (b)**	**Exactitud (q)**	**Accesorios**
Máximos errores encontrados (%)	0,040	No se determino	0,9	-2,60	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305** *Number*

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

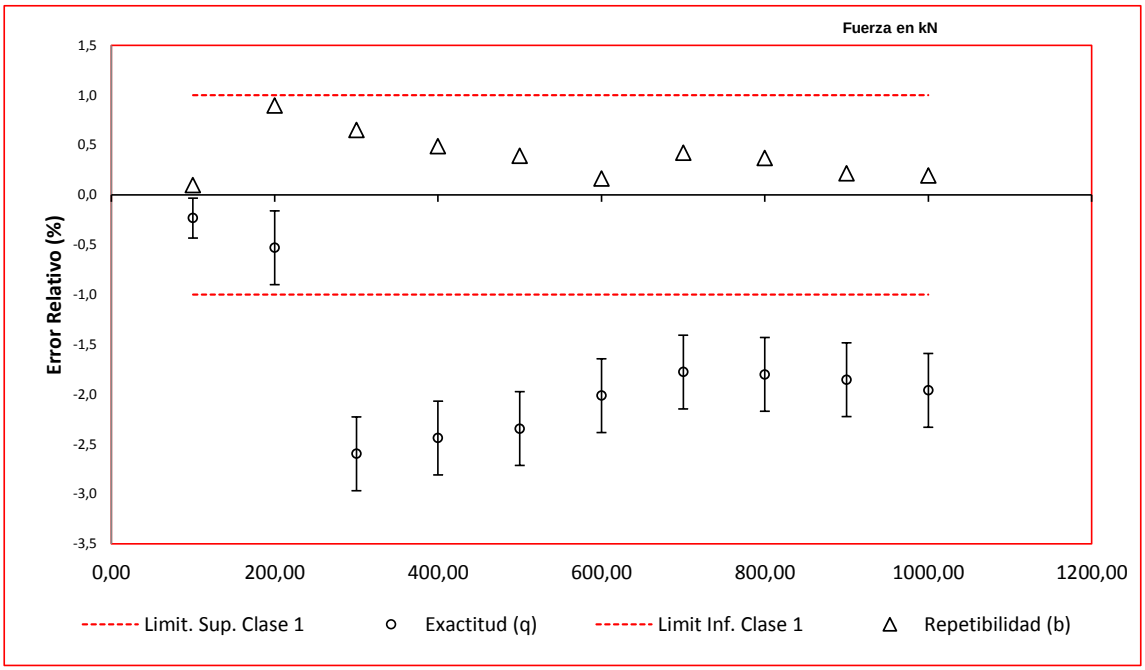

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN – LABORATORIO PRESIÓN

NA-23741-001 R0

CALIBRATION CERTIFICATE – LABORATORY OF PRESSURE

INSTRUMENTO *Instrument*	*MANÓMETRO HUMEDÓMETRO*
INTERVALO DE MEDIDA *Measurement range*	*0 %HR - 20 %HR*
FABRICANTE *Manufaturer*	*RYR*
MODELO *Model*	*DI*
SERIE *Identification number*	*No Presenta*
CODIGO INTERNO *Internal Code*	*23741-001*
SOLICITANTE *Customer*	*HERNAN RAMOS VILLAMIL SAS*
DIRECCIÓN *Address*	*Calle 12 No. 24 B - 17*
CIUDAD *City*	*Sincelejo - Sucre*
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of calibration*	2021 - 07 - 14
FECHA DE EXPEDICIÓN *Date of Issue*	2021 - 07 - 16

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS ***3***
Number of pages of this certificate and documents attached

Firmas que autorizan el certificado
Signatures authorizing the certificate

Ing. Sergio Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Durán Romero
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DETALLES DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE CALIBRACIÓN Comparación directa. **Documento de Referencia** DKD R 6 - 1 del 2014

FACTOR DE CONVERSIÓN 1 psi = 6,89476 kPa Nota: Factor de conversión tomado del NIST Special Publication 811 2008 Edition

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

INTERVALO A CALIBRAR 0 %HR - 20 %HR **DIVISIÓN DE ESCALA** 0,2 %HR **RESOLUCIÓN** 0,1 %HR

	Indicación del IBC	indicaciones del instrumento patrón	
		M1 - asc	M2 - desc
%	% HR	psi	psi
0	0,00	0,000	0,000
20	4,00	6,166	5,972
40	8,00	12,136	11,988
60	12,00	17,966	17,689
80	16,00	23,934	23,899
100	20,00	29,988	29,988

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Indicación del IBC		Promedio Patrón	Desviación	Histeresis	Incertidumbre Expandida
%	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4,00	6,00	6,07	-0,07	0,19	0,25
8,00	12,00	12,06	-0,06	0,15	0,21
12,00	18,00	17,83	0,17	0,28	0,34
16,00	24,00	23,92	0,08	0,04	0,13
20,00	30,00	29,99	0,01	0,00	0,12

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

La desviación máxima encontrada durante la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es:

0,172 psi

La desviación máxima encontrada, respecto al valor máximo de la escala en porcentaje es:

% Desviación = 0,6

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla de resultados de la página No. 2, para cada punto de calibración. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CONDICIONES AMBIENTALES

Max. Temp.	*20,3 °C*	***Min. Temp.***	*19,6 °C*
Max. Hum. (%)	*55 HR*	***Min. Hum. (%)***	*53 HR*

TRAZABILIDAD

El Laboratorio de Metrología de Pinzuar Ltda. asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo utilizados en las mediciones.

PATRÓN UTILIZADO	Manómetro Digital		
CERT.DE CALIBRACIÓN	7337 de Flexilatina S.A.S.	**CLASE DE EXACTITUD**	0,050%
INTERVALO DE MEDIDA	30 psi	**SERIE**	3227038

OBSERVACIONES .

1. Se realizó una inspección general del instrumento encontrándose en buen estado de funcionamiento
2. Los Certificados de calibración sin las firmas no tienen validez .
3. El usuario es responsable de la recalibración de los instrumentos de medición.
4. Los resultados contenidos parcialmente en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
5. Se adjunta estampilla de calibración adherida al instrumento No. **NA-23741-001**

Fin de Certificado

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached 3

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Cilindros)
Object

Fabricante: N/P
Manufacturer

Modelo: N/P
Model

Número de identificación: N/P
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1200,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b - 170 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: viernes, 20 de agosto de 2021
Date of issue

Número: **F 1304**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M
Verificado por:
reviewed by

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method
Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	32,0	°C
	Final/*End*	33,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,08
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,04

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
8	100,00	100,40	100,30			100,23	100,0	0,10		0,40	-0,23		5,7,E-01	2,00
17	200,00	200,00	200,20			200,07	200,0	0,05		0,10	-0,03		3,7,E-01	1,96
25	300,00	300,00	301,00			300,33	300,0	0,03		0,33	-0,11		3,7,E-01	1,96
33	401,00	401,00	400,00			400,67	400,0	0,03		0,25	-0,17		3,7,E-01	1,96
42	501,00	501,00	500,00			500,67	500,0	0,02		0,20	-0,13		3,7,E-01	1,96
50	600,00	601,00	601,00			600,67	600,0	0,02		0,17	-0,11		3,7,E-01	1,96
58	700,00	702,00	702,00			701,33	700,0	0,01		0,29	-0,19		3,7,E-01	1,96
67	800,00	801,00	801,00			800,67	800,0	0,01		0,12	-0,08		3,7,E-01	1,96
83	1001,00	1002,00	1004,00			1002,33	1000,0	0,01		0,30	-0,23		3,7,E-01	1,96
100	1201,00	1205,30	1203,00			1203,10	1200,0	0,01		0,36	-0,26		3,7,E-01	1,96

0,033	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	Reversibilidad (v)	Repetibilidad (b)	Exactitud (q)	Accesorios
Máximos errores encontrados (%)	0,033	No se determino	0,4	-0,23	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

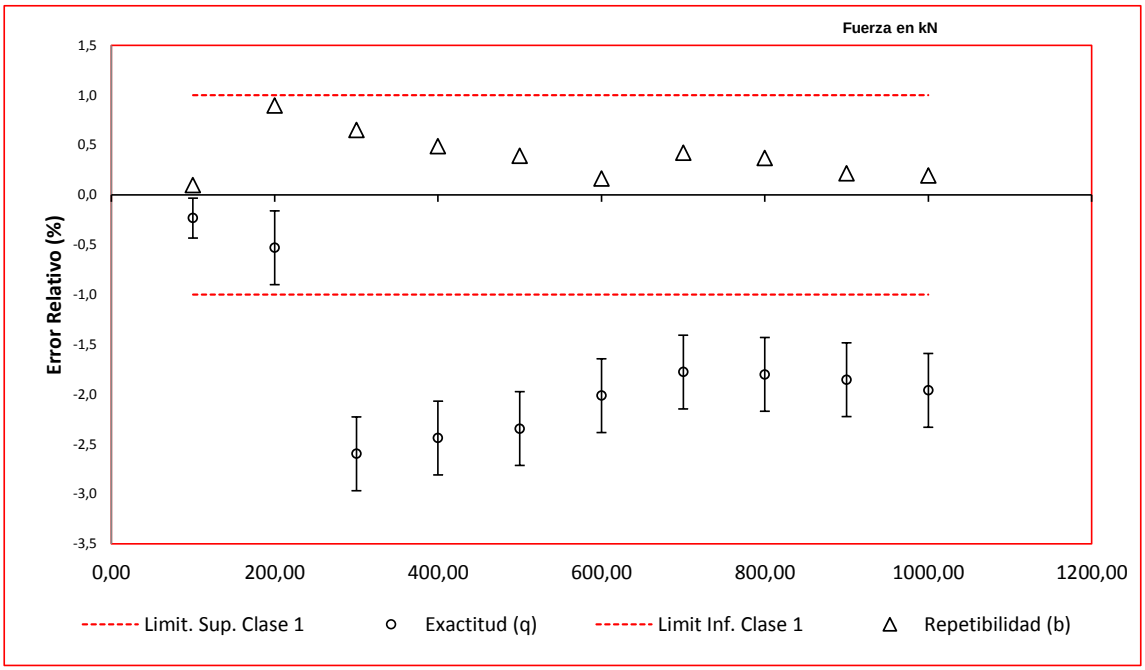

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

OFICINA Y LABORATORIO
Calle 12 No. 24B – 17 Barrio La Palma
Telef. y Fax 095-282 58 08 - SINCELEJO

Sincelejo, 1 de julio de 2022
Señores
ENTerritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Ref. Certificación para realización de ensayos de geotecnia

Cordial saludo,

Yo, **HERNAN RAMOS VILLAMIL**, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.053.862 de Cartagena y la Matricula profesional 494 de S.I.A.B. que me acredita como ingeniero civil, en calidad de representante legal de la empresa **HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. Nit. 900.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia, certifico que seremos los encargados de realizar todos los ensayos pertinentes que garanticen el control y el aseguramiento de la calidad de la obra *"ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar"* la cual está a cargo de la firma **Consorcio Construredes Nit 901.568.676-5**.

Firma Electrónica
ID Firma: 67c37f62-3496-469f-b5c0-733a2abbe22b

HERNAN RAMOS VILLAMIL
C.C. 9.053.862 de Cartagena.
T.P. 494 S.I.A.B.
Representante Legal

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

NA-24532-001 R0

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	CAZUELA CASAGRANDE
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR
Modelo *Model*	PS-11
Número de Serie *Serial Number*	2124
Identificación Interna *Internal Identification*	No presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Ver tabla de resultados
Solicitante *Customer*	HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
Dirección *Address*	Calle 12 No24 B - 17
Ciudad *City*	Sincelejo - Sucre
Fecha de Calibración *Date of Calibration*	2021 – 12 – 03
Fecha de Emisión *Date of Issue*	2021 – 12 – 13
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	02

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo coresponden al item que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los intrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar. no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatureS

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología


DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Instrumentos de Referencia	Pie de Rey
Certificado No.	L-21980-001 de Pinzuar
Documento de Referencia	INVIAS E – 125/13 Numeral 5

TABLA DE RESULTADOS

Cazuela

Letra*	Especificación	Valor Medido
	mm	mm
A	54 ± 0.5	54,03
B	2 ± 0.1	2,08
C	27 ± 0.5	27,36
K	50 ±2	51,33
L	150 ± 2	151,24
M	125 ± 2	126,05
U	47 ± 1	46,95
P	28	27,33
R	24	23,95
T	45	45,04

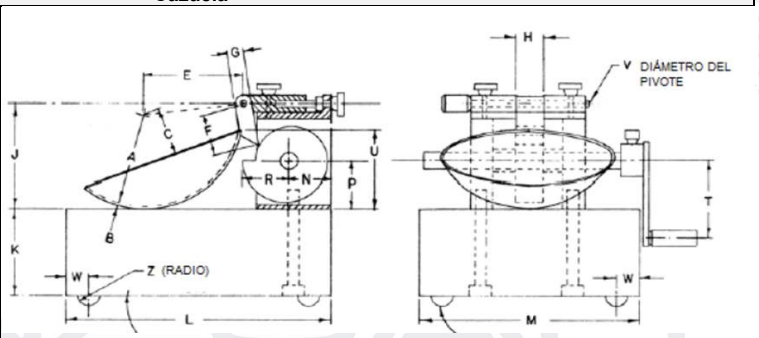

CONDICIONES AMBIENTALES

La verificación se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar., las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	19,8 °C	**Humedad Máxima:**	56 %
Temperatura Mínima:	19,5 °C	**Humedad Mínima:**	53 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada (Tablas de resultados), se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k y la probabilidad de cobertura aproximadamente al 95 %. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.
* La incertidumbre máxima encontrada en la medición de dimensiones es 12 µm para un factor de cobertura k=2.

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Se adjunta la estampilla de calibracón.

NA-24532-001

Fin de Certificado

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 13/10/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	06/10/2022	13/10/2022	7	3.000		132,1	5	2186	72,8%
	VIGA	06/10/2022	13/10/2022	7	3.000		133,5	5	2215	73,8%
	PLACA	06/10/2022	13/10/2022	7	3.000		128,5	5	2232	74,4%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 26/10/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	28/09/2022	26/10/2022	28	3.000		180,3	5	3228	107,6%
	VIGA	28/09/2022	26/10/2022	28	3.000		170,3	5	3140	104,6%
	PLACA	28/09/2022	26/10/2022	28	3.000		183,3	5	3248	108,2%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

enterritorio	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1-oct-22** **Y EL** **31-oct-22** **FECHA INICIO** **1-jun**

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES **CONTRATO No.** 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A **CONTRATO No.** 2220587

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
MEZCLADORA			X		CORDOBA - BOLIVAR	MEZCLA DE CONCRETO	En buen estado
RANA			X		CORDOBA - BOLIVAR	COMPACTACIÓN DEL TERRENO	En buen estado
MOTO CARRO			X		CORDOBA - BOLIVAR	TRANSPORTE DE MATERIALES	En buen estado
MOTO CARRO				X	CORDOBA - BOLIVAR	TRANSPORTE DE MATERIALES	En buen estado

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA O LIBRO DE OBRA DE TODA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Sábado, 01 Octubre /2022

=PERSONAL DE OBRA.

- Ing. Residente
- Ing. Diagnósticos
- SISO
- Profesional social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con la ejecución de la ACTIVIDAD 3. con las intervenciones en las viviendas, con la construcción de caseta tipo 2, tipo 3 y tipo 4, además de las intervenciones de adecuación. Se realizaron las labores de fundición de elementos estructurales tales como viga dintel, columnetas y columnas., aplicación de pintura sobre muros, instalación de lavadero estándar, instalación lavaplatos, armado de acero de refuerzo para losa tanque, instalación de aparatos sanitarios, construcción de soporte para lavadero estándar.

↳ Se continua con el desarrollo de la ACTIVIDAD 2 con el diligenciamiento de los diagnósticos, recepción de documentos, levantamiento arquitectonicos para proyección trazado hidrosanitario.

Estado del clima:

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Lunes, 03 Octubre / 2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Ing. Inspector
- Arq. Residente
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con la ACTIVIDAD 2. con el diligenciamiento de formularios de diagnósticos, levantamiento arquitectonico y trazado para las redes intradomiciliarias.

Se desarrolla las labores de la ACTIVIDAD 3.: con la ejecución de levantamiento de muros en bloque, aplicación de pañete en muros interior y exterior. excavación de zanjas para la tubería hidrosanitaria, instalación de tanque elevado, excavación de cajas de inspección y fundición de las mismas.

- Se envía mediante correo electronico por parte de Arq. Residente Interventoría a Supervisora Interventoria; oficio TEC-071-22 RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME DE MINVIVIENDA. (Recorrido de obra 14 Julio)
- Se envía a Interventoria Acta parcial de obra N°2 Cordoba-Bol. Para Revisión y VBo. Se destaca que la Interventoría ya realizó revisión y ajuste de cantidades.
- Se envía oficio TEC-072-22 Solicitud reprogramación de obra;

Estado del clima: Mayormente soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Martes, 04 Octubre 2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Ing. Inspector
- Arq. Residente
- Profesional social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

En la actividad 2, se continua con el levantamiento arquitectonico y trazado de las redes hidrosanitarias con la proyección de las intervenciones en las viviendas diagnósticadas. Por su parte, se continúa con la ejecución de la ACTIVIDAD 3; con excavación de cimentación para caseta tipo 3, corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales, replanteo, instalación de tubería sanitaria e hidráulica, pañete en muro, e instalación de aparatos sanitarios.

- Se envía de Interventoría para Enterritorio, F-GG-09-V1 Acta de seguimiento de contrato N°20 (realizada el 28 sept - 2022)
- Se recepciona por correo electrónico INFORME SEMANAL 21 firmado por Enterritorio, con una observación.
- Se recibe por Secretaría de planeación del Municipio de Córdoba Oficio OFI-SP-051-22 RESPUESTA A REVISION DE RESPUESTA DE SOLICITUD INCLUSION (PQR N°222) - CCR_CORDOBA-2220576-2022-096, con Concepto Favorable.
- Se recibe de contratista REPROGRAMACION 2 CONTRATO 2220576 DE 2022
- Se remite a Enterritorio con oficio GER 107-E REMISION INFORME SEMANAL 21.

Estado del clima: Mayormente soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Miercoles, 05 Octubre /2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Apoyo social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

En la actividad 3 se continua con la ejecución de las intervenciones de matiz inicial e inclusión, se desarrollaron las siguientes labores: pañete en muros externos, aplicación de pintura, levantamiento de muro para soporte de lavadero estándar y lavadero, armado de formaleta para columnas, columnetas y viga dintel, excavación de zanjas para tuberías. Por su parte, la ACTIVIDAD 2 se desarrolla con levantamiento arquitectonicos, diligenciamiento de formatos.

- Se realiza comité de obra N°21 estuvieron presentes Contratista, Interventoría, Entenitorio se socializaron avances, porcentajes de ejecución, suministros y se establecieron compromisos técnicos y sociales.
- Se envía INFORME SEMANAL N°23 Y ANEXOS de Interventoría a Entenitorio.
- Se recibe de parte de Entenitorio observaciones a INFORME SEMANAL N°22; las cuales son subsanadas y nuevamente enviadas por Interventoría.
- Se envía de Directora Interventoría a Contratista Acta Parcial de obra N°2; con solicitud antes de enviarla a Entenitorio

Estado del clima: Lluvias torrenciales

Ronald Ametal
R. Interventoría

Ronal Blanco
R. Obra

Jueves, 06 Octubre /2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Apoyo social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con el desarrollo de la ACTIVIDAD 2; con el diseño arquitectonico y el trazado de las redes hidrosanitarias para los diagnósticos realizados. Se continua con las labores tendientes a fin de realizar nuevas actas de entrega y recibo a satisfacción. Además, de forma paralela se desarrolla la ejecución de la ACTIVIDAD 3; se realizaron levantamiento de muro, instalación de tanque elevado, armado de formaletas para columnas, fundición de elementos estructurales.

- Se envía de Interventoría oficios TEC-073-22, TEC-074-22, TEC-075-22
- Se recepciona por parte de especialista HSE Informe N°7 y se emite a Contratista mediante oficio para seguimiento por parte del personal Interventoría.
- Se envía Directora Interventora Reprogramación 2 para revisión del profesional.
- Se radica con rad 20224300376892, en Interventoría, Informe semanal N°22
- Se recibe radicación Acta parcial Número 2 por parte de Consorcio Construdes,
- Se envía Interventoría respuesta a comunicado CCR-CORDOBA-2220576-2022_095

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Viernes, 07 Octubre /2022

=PERSONAL DE OBRA
- Ing Residente
- Ing Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA.
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora Social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con la ejecución de la ACTIVIDAD 3, con la excavación para cimentación de tanque elevado, aplicación de pañete, fundición de elementos estructurales, levante de muros, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tuberías hidrosanitarios. Se continua además, realizando los diagnosticos correspondientes, con el diseño arquitectónicos y trazado de redes hidrosanitarias, recepción de documentos y diligenciamiento de formularios.

- Residente interventoría envía: actas de seguimiento Nº 19 y Nº 20 para firmas.
- Se envía oficio TEC-076-22 y TEC-077-22 de Interventoría para Consorcio Constructores.
- Se recepciona correo CCB_CORDOBA-220576-2022-096 enviado por Contratista a Secretaria de Planeación Municipal.
- Se envía Informe Semanal Nº 23 con curva S ajustada a Interventoría se recepciona firmada.
- Se recepciona Informe presupuesto y Programación #16 respecto al cronograma producto de adición y prorroga, el mismo es enviado a Interventoría.
- Se radica en Interventoría Informe Semanal 23 y mensual Nº5, con oficio INT/276-GER-11-22 y INT/276-GER-112-22, respectivamente de Interventoria.

→ Estado del clima: lluvias torrenciales

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R Obra

Sábado, 08 Octubre/2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con el desarrollo de la ACTIVIDAD 3 con la ejecución de las intervenciones en las viviendas donde se realizan construcción de Cuarto Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 y Adecuación de acuerdo a las necesidades de la vivienda, por tanto, se realizaron las labores de fundición de caja de inspección, levantamiento de muro para soporte de lavadero estándar y lavaplatos, instalación de tanque elevado, excavación zanjas para tubería sanitaria, instalación aparatos sanitarios e incrustaciones de pared, instalación de lavaplatos y lavadero estándar.

Por su parte, se continua con el desarrollo de la ACTIVIDAD 2 con el diligenciamiento de los formularios, levantamiento arquitectónico, registro fotográfico de las condiciones iniciales y trazado de redes hidrosanitarios y aparatos proyectados, esta actividad es llevada a cabo por profesional de Diagnóstico y su equipo de apoyo.

Estado del clima: Soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Lunes, 10 Octubre / 2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Director de obra
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con la ejecución de la ACTIVIDAD 3 con el desarrollo de las labors de intervención en las viviendas. Se realizaron: levante de muro, armado de acero de refuerzo, armado de formaleta para columna de tanque, fundición de viga dintel, columnas y columnetas, instalación de tanque elevado,

- Se recepciona mediante correo electrónico Informe mensual Nº5-SEP-22. por parte del Consorcio constructes. oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022-100
- Se recepciona de parte de Contratista oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022-099
- Se recepciona mediante medio físico y digital oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022-103
- Se recibe mediante correo electrónico NUEVAS OBSERVACIONES AL ACTA Nº2 emitidas por Interventoria, se remite
- Se envio oficio TEC-078-22 RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL ACTA PARCIAL Nº2

Estado del clima: soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Martes, 11 Octubre /2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Trabajadora social.
- Ing Diagnóstico
- SISO

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Trabajadora social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua desarrollando las labores correspondientes a la ACTIVIDAD 2, con el proceso de diligenciamiento de formularios, levantamiento topográfico, recepción de documentación y soportes, así como trazado hidrosanitario y proyección de intervenciones. De igual forma, se continua desarrollando la ejecución de la ACTIVIDAD 3 con las labores de intervención en las viviendas. Se realizan: excavación de cimentación, encofrado de elementos estructurales, armado de acero, levante de muro, puesta de tubería hidrosanitaria.

- Se envía oficio TEC-079-22 respuesta a oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022-103.
- Se envía Acta de aprobación Nº19 con ofic F-66-09-V1.
- Se envía Informe semanal Nº24 a Directora Interventoría.

Estado del clima. Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría.

Ronald Blanco
R. Obra.

Miercoles, 12 Octubre /2022

- PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- Trabajadora social
- SISO

- PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

Se continua con el desarrollo de la ACTIVIDAD 3 con las intervenciones, donde se realiza: instalación de lavaplatos, levante de muro para soporte lavadero estándar, aplicación de pintura sobre muros, instalación de cubierta, instalación de tanque elevado, fundición de viga dintel. Por otra parte, el equipo de diagnóstico continua con el diligenciamiento de formulario, recepción de documentos, levantamiento arquitectónico y trazado de redes hidrosanitarias intradomiciliarias.

- Se envía Interventoría a ENTemitorio ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°21
- Se recepciona por parte del Contratista oficio CCR_CORDOBA-2220576_2022_104
- Se realiza comite de obra N° 22, en presencia de Interventoría, Contratista y entidad supervisora ENTemitorio.
- Se recepciona por parte del Contratista oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022_101 RESPUESTA A OFICIO CON REFERENCIA NRO-INT/ENT/276-TEC-069-22.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Jueves, 13 Octubre/2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing Diagnóstico
- Trabajadora social
- SISO

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con el desarrollo de la ACTIVIDAD 2, con el diligenciamiento de los formularios, levantamiento arquitectónico, recepción de doumentos, levantamiento arquitectonico y trazado de redes hidrosanitarias intradomiciliarias. La ACTIVIDAD 3 se continua ejecutando las intervenciones en las viviendas, realizando: levante de muro, fundición de elementos estructurales, armado de formaletas, instalación de aparatos sanitarios, instalación tanque elevado.

- Se recepciona contratista oficio CCR_CORDOBA_2220576-2022-105.
- Se recepaona observacion HSE, que son enviados a Profesional PGIO dichas observaciones fueron dadas por Profesional Int. al INFORME N°5. SEP.
- Se recibe observaciones por parte ENTerritorio, correspondiente oficio TEC-078-22.
- Se recepaona de Contratista oficio CCR-CORDOBA_2220576-2022-106
- Se envia INFORME SEMANAL N°24 y sus anexos, semana 33 para VoBo de parte de ENTerritorio.
- Se envia de Interventoría oficio 6ER-113-22 REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO EN LA VINCULACION DE PERSONAL NO CALIFICADO-OFICIO ARCA-INT/ENT 276-6ER-102-22. RESPUESTA A CCR-CORDOBA_2220576-2022-099.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra.

Viernes, 14 Octubre / 2022

=PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- Trabajadora social
- SISO

=PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 3 continua con la intervención en las viviendas beneficiadas, en las labores se ejecuta: instalación de cubierta, aplicación de pintura, instalación de aparatos sanitarios, excavación de zanjas para tubería hidrosanitaria.
La ACTIVIDAD 2 continua con el diligenciamiento de los formularios, levantamiento arquitectónico y trazado redes.

- Se recepciona de Directora Interventoría ACTA COMITE DE SEGUIMIENTO NO 21, para ser enviado a ENTerritorio.
- Se recepciona de parte Contratista, consorcio Construredes oficio CCR_CORDOBA_2220576-2022_106
- Se radica en ENTERRITORIO mediante oficio TEC-081-22 REMISIÓN INF. ESPECIALISTA PRO Y PRE Nº 17 Y ANEXOS.
- Se envia oficio TEC-083-22 SOLICITUD CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION.
- Se envia oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-084-22 Respuesta a oficio con observaciones por parte de la Personería Municipal Córdoba, Bol.
- Se envia oficio TEC-080-22 Solicitud planilla Afiliación Seguridad Social Personal mano de obra.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Sábado, 15 Octubre / 2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- Trabajadora social
- SISO

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 2 se continua con la recepción de documentación, diligenciamiento de los formularios de diagnóstico, levantamiento arquitectónico, trazado de redes hidrosanitarias intradomiciliarias, por el grupo de apoyo y profesional de diagnóstico.
Por su parte, se continua ejecutando la ACTIVIDAD 3, donde se realizaron las siguientes labores; excavación de vigas de cimentación, corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales, levantamiento de muro, instalación de tanque elevado, levantamiento muro soporte para lavadero estandar, aplicación de pañete, instalación de puerta, instalación de lavaplatos, fundida de losa tanque elevado, encofrado de viga dintel.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco.
R - Obra.

Martes, 18 Octubre/2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social.

=PERSONAL INTERVENTORIA.

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 3 se continua ejecutando con las intervención en las viviendas donde se desarrollan labores constructivos en Casita tipo 2, tipo 3 y tipo 4 y Adecuación. Se realizaron: Instalación de tanque elevado, fundición de columna tanque, armado de formaleta para viga dintel, levantamiento de muro para soporte lavaplatos y lavadero, excavación de caja de inspección. Por su parte, se continua con levantamiento y trazado arquitectonico, digitación y armado de carpetas de diagnósticos para cada beneficiario.

- Se radica en ENTerritorio GER-114-ALCANCE COMUNICADO AVAL ACTA PARCIAL N°2
- Se recibe Informe semanal N°24 firmado para la radicación, mediante GER-115-22.
- Radicación mediante oficio GER-116-22 INFORME MENSUAL N°3-CONTRATISTA.
- Se envía INFORME SEMANAL N°25 AJUSTADO a Directora Interventoría.
- Se envía oficio TEC-085-22 REITERACIÓN Solicitud Respuesta a Observaciones recorrido de Campo visita Ministerio de Vivienda.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Miercoles 19 Octubre/2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajador social

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

Se continua ejecutando la ACTIVIDAD 2, con la organización de la información suministrada por los beneficiarios, Se realiza Levantamiento Arquitectonico, trazado hidrosanitario. La ACTIVIDAD 3, se continua ejecutando las intervenciones en Casita tipo 2, tipo 3 y Tipo 4. y adecuaciones. El personal de mano de obra realizaron instalación de sanitario, lavamanos con pedestal, incrustaciones de pared, fundición de losa tanque, armado de acero columna.

- Se reciben observaciones a INFORME MENSUAL N°3 INT, de parte supervisora, las cuales son subsanadas en las horas de la tarde.
- Se recepciona oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022-106 respuesta a Obs. del Acta Parcial #2, por parte de Contratista.
- Se radica Informe mensual N°3 Contratista a ENTerritorio mediante oficio GER-116-E en formato. ZIP
- Se envia a ENTerritorio Acta de comité seguimiento N°22 (12-OCT)
- Se envia a Supervisora ENTerritorio, Informe Semanal N°25 y anexos.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra.

Jueves, 20 Octubre / 2022

= PERSONAL DE OBRA

- Ing Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

= PERSONAL INTERVENTORIA.

- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Trabajadora social

= ACTIVIDADES REALIZADAS =

La ACTIVIDAD 3 se desarrolla con la excavación de cajas de inspección, instalación de cerámica de piso y pared, instalación de aparatos sanitarios, levante de muro para Caseta tipo 3, aplicación de pañete en muros internos y externos, armado de encofrado de elementos estructurales, instalación de micromedidores, instalación de cubierta, aplicación de pintura, construcción de muros para soporte de lavaplatos y lavadero estándar, fundición de columnas y columnetas,

Por su parte, la ACTIVIDAD 2 se continua con el diligenciamiento de los formularios, levantamiento arquitectónico, trazado de redes hidrosanitarias, recepción de documentación de los beneficiarios.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Viernes, 21 Octubre /2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 2, Se continua con el diligenciamiento de los formularios de diagnóstico, recepción de documentación, trazado de redes hidrosanitarias, Levantamiento arquitectonico por equipo profesional de diagnóstico.

La ejecución de la ACTIVIDAD 3 se continua desarrollando con el desarrollo de las excavaciones para cajas de inspección, Instalacion de equipos sanitarios, lavamanos con pedestal, ducha, fundición de columnas y columnetas, levante de muro, instalación de tubería sanitaria e hidráulica, aplicación de pintura en muros internos y externos, retiro de equipo sanitario para cambio, instalación de tanque elevado.

- Se remite a Enteritorio oficio GER-117-22: Remisión Acta de Recibo Parcial N°5 de Interventoría.
- Se recibe 30 Diagnóstico para revisión y aprobación de Interventoría, mediante oficio CCR-CORDOBA-2220576-2022-109.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Sábado, 22 Octubre / 2022

=PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social

=PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Trabajadora Social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 3, se continua desarrollando las intervenciones en la construcción de casita Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 y Adecuación, donde se realizan labores de levante de muro para soporte de lavadero estandar y lavaplatos, encofrado de columna de tanque, corte, figurado y armado de acero de refuerzo para elementos estructurales, instalación de cubierta, aplicación de pañete en muros internos y externos de Casita tipo 3 y muros soporte para lavadero y lavaplatos. Se continuan realizando las visitas por el equipo de prof. de diagnostico con el propósito de seguir la ejecución de la ACTIVIDAD 2, se diligenciaron los formularios, se realizó levantamiento arquitectónico, trazado hidrosanitario, y recepción de documentación.

- Se recibe de Supervisora ACTA DE SEGUIMIENTO DE OBRA N° 21, para recolección de firmas y remisión nuevamente a Supervisora.
- Se envia a contratista; con copia a Interventoría. oficio TEC-087-22 RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576-2022-109.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Lunes, 24 Octubre/2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Profesional Social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional Social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 2, se continua desarrollando con el diligenciamiento de los formularios, levantamiento arquitectonico, trazado hidrosanitario.

Se continua con la ejecución de la ACTIVIDAD 3, con las intervenciones en las viviendas beneficiadas, se realizan levantamiento de muro, armado en formaleta metalica para columna tanque elevado, se funde viga dintel en concreto tipo 3, se realiza instalación de lavaplatos y lavadero, se aplica pintura sobre muros., instalación de cubierta, instalación de sanitario, ducha, instalación de lavamanos con pedestal e incrustacion de pared.

- Se recepcion Informe social Mensual Nº 4 de contratista.
- Se recepciona llamado de atención por inconsistencia en la revisión de las actas parciales cto obra 2220576 para emitir respuesta.
- Se radica con oficio GIR-118-22- AVAL CORTE DE OBRA Nº3 CON SOPORTES
- Se recepciona por parte contratista respuesta a oficio NRO. INT/ENT/276-TEC-085-22. Observaciones de Minivivienda.
- Se envia oficio TEC-086-22 Solicitud cumplir fechas de entrega a la Interventoría de las actas parciales de obra, para firma pertinente.

-Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Martes, 25 Octubre /2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing Diagnóstico
- SISO
- Profesional social

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 3 se encuentra ejecutandose, dando cumplimiento a las intervenciones de Casita tipo 2, tipo 3, tipo 4 y Adecuación. Se realizaron las siguientes labores: aplicación de pañete en muros internos y externos, fundición de columna, instalación de sanitario, armado de acero de refuerzo para elementos estructurales, levantamiento de muros, fundición de losa de tanque, instalación de lavaplatos.

La ACTIVIDAD 2 se continua ejecutandose con el diligenciamiento de formularios, levantamiento arquitectonico, trazado de redes hidrosanitarias y recepción de soportes.

- Se recuben observaciones del ACTA N°3 por parte de Supervisora y son respondidas por Interventoría y Contratista.
- Se recibe aprobación de Directora de Interventoría, para INFORME SEMANAL N°26.
- Se envia a Directora de Interventoría, INFORME SEMANAL N°26.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Miercoles, 26 Octubre/2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- Siso
- Profesional social

= PERSONAL INTERVENTORIA.
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Profesional social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua con la ejecución de Diagnosticos correspondientes a la ACTIVIDAD 2, donde se realiza la recapción de los documentos, levantamiento arquitectonico y trazado de redes hidrosanitarias.

La ACTIVIDAD 3 se desarolla por las wadrillas de mano de obra, se realizan excavación de zanjas para tuberia sanitarias, excavación de caja de inspección y fundición de las mismas, instalación de cubierta, tanque elevado, colocación de enchape en pared y piso.

- Se envió ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°23 realizada el dia miércoles 19 de octubre de 2022.
- Se envió a Supervisora ENtemtono INFORME SEMANAL N°26 Y ANEXOS correspondiente al periodo del 17 al 23 octubre 2022 realizado y aprobado por Interventoria.
- Se recibe respuesta a oficio GER-113-22 REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO EN LA VINCULACIÓN DE PERSONAL NO CALIFICADO por parte de Contratista mediante oficio CCR_CORDOBA_ 2220576-2022-099.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Jueves, 27 Octubre/2022

=PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social.

=PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua el desarrollando la ACTIVIDAD 3 con la ejecución de las intervenciones en las viviendas según la necesidad, siendo Carta tipo 2, tipo 3, tipo 4 y Adecuación. Se realizaron las siguientes labores: instalación combo sanitario, aplicación de pañete en muro externo e interior, levantamiento de muro, instalación de ducha e inmobiliarias.
Se continua con la ACTIVIDAD 2 con el diligenciamiento de los formularios de diagnósticos, recapción de documentación y levantamiento arquitectonico con trazado de redes hidrosanitarias.

- Se envia oficio TEC-OBB-22 con el asunto TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA.
- Se envia COMUNICADO RESPUESTA A OBSERVACIONES AL ACTA PARCIAL N°3 dirigido a ENTerritorio.
- Se envia INFORME N°4 DEL CONTRATISTA correspondiente al mes de AGOSTO, con observaciones técnicas, dirigido a Directora Interventoría.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Viernes 28 Octubre /2022

= PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora Social

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua el desarrollo de la ACTIVIDAD 2, con el diligenciamiento de los formularios, levantamiento arquitectonico, trazado de redes hidraulicas y sanitarias.

Por su parte, en la ACTIVIDAD 3, se realizan labores de armado de formaleta para columna tanque, excavación de caja de inspección y fundición de viga dintel, armado de acero de refuerzo para elementos estructurales, construcción de soporte lamplatos.

- Se realiza COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA N°24 con Supervisora, Contratista e Interventoría, se hizo revisión de avances y cumplimiento compromisos. Además, se estableieron compromisos para la siguiente semana.
- Se realizó recorrido de obra con personal Contratista e Interventoría.
- Se envía observaciones al INFORME N°4 MES AGOSTO CONTRATISTA. Con oficio GER-119-22.
- Se envia oficio TEC-089-22 REITERACION SOLICITUD CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION para fines pertinentes.

Estado del clima: Soleado

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA.

Sábado, 29 Octubre /2022

=PERSONAL DE OBRA
- Ing Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social

=PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing Inspector
- Trabajadora social.

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

Se continua desarrollando la ACTIVIDAD 2 con el diligenciamiento de los formularios, recepción de documentos, además se realizo levantamiento arquitectonico y trazado de redes hidrosanitarias.
La ACTIVIDAD 3 se continua ejecutando de acuerdo a lo establecido en la programación de obra. se realizan labores de excavación de tubería sanitaria, excavación de cimentación caseta tipo 3, armado de acero de refuerzo para columnas, columnetas, viga dintel, instalación tanque 500 Lts, instalación de incrustaciones de pared, levantamiento de muros, aplicación de pintura, instalación cubierta, fundición de losa tanque.

Estado del clima: Soleado

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

Ronald Blanco
R. Obra

Lunes, 31 Octubre / 2022

-PERSONAL DE OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnóstico
- SISO
- Trabajadora social.

=PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

La ACTIVIDAD 3 se continua ejecutando de acuerdo a lo programado, con las intervenciones en las viviendas según sea: Caseta tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Se realizaron trabajos de instalación de tanque elevado, armado de formaleta para viga dintel, aplicación de pañete en mortero 1:4 sobre muros internos, construcción de soporte lavadero estándar, excavación de zanja para tubería sanitaria, fundición de columnas, columnetas.

Se continua la ACTIVIDAD 2 con el diligenciamiento de los formularios, recepción de documentos, levantamiento arquitectonico y trazado de redes hidrosanitarias.

- Se envia INFORME SEMANAL N°27 a Directora Interventoría para revisión y aprobación.
- Se realiza Informe especialista HSE N° 08 de proyecto.
- Se recepciona INFORME SEMANAL 25 y 26 aprobados por Supervisora con firmas.

Estado del clima: Soleado

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

Ronald Blanco P.
R. Obra

RELACIÓN DELPERSONAL EMPLEADO

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/10/2020 Y EL 31/10/2022 PLAZO: 7.5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO																																
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	Resaltados en rojo lo dias Domingo
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
OSWALDO GARZON - PROFESIONAL DIAGNOSTICO Y COSTOS Y PRESUPUESTO	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
GUSTAVO CAMARGO - ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
PEDRO MANJARRES - ESPECIALISTA HSEQ	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
RAMIRO ANDRADE - ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
PERSONAL CONTRATISTA	9	0	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	9	0	9		**TOTAL PERIODO** 234
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***																															**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región																																0	0,00%	
RODOLFO JOSE TORRES ANAYA	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
YOVANNI CHAMORRO FLOREZ	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
JESUS MANUEL VALETH ANDRADE	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
																																0	0,00%	
De fuera de la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
ROBERTO ENRIQUE BRITO APIAYU	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
HERIBERTO VALENCIA PEREZ	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
																																0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región																																0	0,00%	
DONAIRO ALFONSO ESCOBAR ROMERO	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
YULDOR VERGARA TOREES	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
YEISON ESCOBAR VERGARA	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
JESUS ESCOBAR VERGARA	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
JOSE LUIS AHUMADA MARTINEZ	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
																																0	0,00%	
De fuera de la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
GENKY ALVAREZ PADILLA	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
ALEXI CORDOBA CUESTA	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
MAICOL RIOS ARANGO	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
CRISTIAN PACHECO HORTA	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
PEDRO PABLO GOMEZ DOMINGUEZ	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
TOMAS DE AVILA ROJANO	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	11,11%	
																																0	0,00%	
PROFESIONALES - TECNICOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**0**	**0,00%**	
De la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
De fuera de la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
En condición de desplazamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
MUJERES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
PROVEEDORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Local																																		
Nacional																																		
Internacional																																		

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: En el presente periodo no se nescito personal de mano de obra teniendo en cuenta que aun no icinia la actividad 3 correspondiente a la ejecución de obra.

Firma: Marcy A. Correa C.

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INFORMES SEMANALES PRESENTADOS Y APROBADOS DEL PROYECTO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 4/11/2022
HORA: 5:03:59 p. m.
20224300423562

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 04 de noviembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-123-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No 27

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 27 cuyo periodo es del 24 de octubre del 2022 hasta 31 de octubre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 23 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

INFORME SEMANAL 27

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 27	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 27

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 24/10/2022 al 30/10/2022 | Fecha 30/10/2022

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO: BOLIVAR — MUNICIPIO: CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCION ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220576
Contratista		CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	2.654.032.619,99
Variación del valor	$	882.324.674,00
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial (Días)		150 Días
Plazo actual (Días)	226 Días	7,5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo		76 Días
Fecha Contractual de terminación		11/12/2022
Tiempo Transcurrido (días)	187	82,74%
Días remanentes del Contrato	42,00	18,58%
Acumulado a última acta pagada	$	821.329.766,06
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	1.466.420.769,84

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2220587
Interventor		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	303.315.624,00
Variación del valor	$	100.836.311,00
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial		150 Días
Plazo actual	226 Días	7,5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo		76 Días
Fecha Contractual de terminación		11/12/2022
Ejecución del Contrato	187	82,74%
Días remanentes del Contrato	42,00	18,58%
Acumulado a última acta pagada	$	132.623.950,03
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	44.316.958,56

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC): $ 2.654.032.619,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.839.205.069,19	69,30%	$ 1.666.161.104,18	62,78%	-$ 173.043.965,01	-6,52%
Durante el Periodo	$ 39.942.527,00	1,50%	$ 49.926.406,34	1,88%	$ 9.983.879,34	0,38%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.879.147.596,19**	**70,80%**	**$ 1.716.087.510,52**	**64,66%**	**-$ 163.060.085,67**	**-6,14%**


Desviación en días: 9 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha de corte del presente informe tenemos el siguiente reporte:
En cuanto a la actividad 2 a corte del 23 de octubre se tenían aprobados 286 diagnósticos, durante la semana del presente informe no se aprobaron diagnósticos, sin embargo, conforme a la reprogramación de obra ya deberían tener 345 diagnósticos aprobados, es decir, se presenta un atraso de 59 diagnósticos. El atraso para esta actividad sigue correspondiendo al 12%.
El avance de la actividad 3 nos indica las siguientes cifras: un programado del 70,08% frente a un ejecutado del 64,06% lo cual representa un atraso de 6,02%. Este atraso corresponde a 15 viviendas, ya que conforme a lo programado se deberían tener terminadas 214 viviendas y con corte al 30 de octubre se contaban con 199 viviendas terminadas.
El atraso general del proyecto equivale al 6,14%, lo que representa una leve disminución con relación a la semana anterior, aunque de igual manera preocupa a la Interventoría que no se estén tomando los controles respectivos para nivelar la programación de obra. Mas aún si se considera que estamos a 42 días de terminar el plazo contractual, plazo en el cual se deben terminar las 146 viviendas restantes del objeto contractual.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

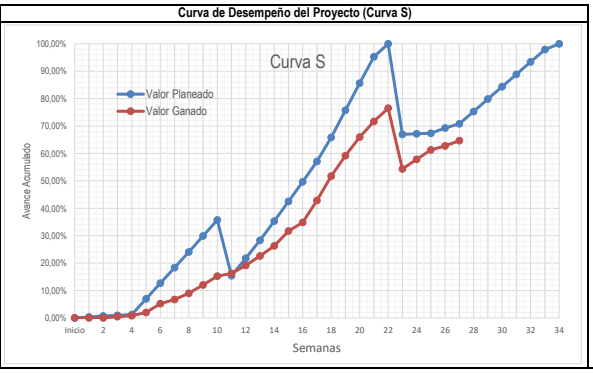

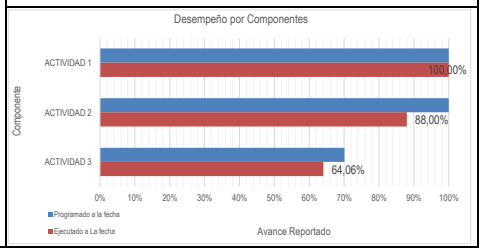


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	69,30%	62,78%	-6,52%	
Durante el Periodo	1,50%	1,88%	0,38%	
Acumulado a la Fecha	**70,80%**	**64,66%**	**-6,14%**	

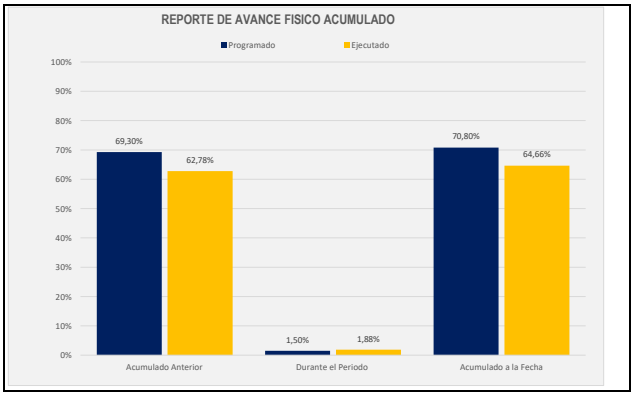


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
2	$ 821.329.766,06	46,36%	1	$ 379.134.821,64	21,40%	12/09/2022	$ 379.134.821,64









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
5	$ 132.623.950,03	65,50%	4	$ 88.078.501,16	43,50%		$ 39.483.466,03







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 27

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 24/10/2022 al 30/10/2022 | Fecha 30/10/2022

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 88,00%
Lo cual nos indica un atraso del 12%
Comentario: A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene 286 diagnósticos aprobados en actas, sin embargo, la cantidad programada es del 345 indicándonos un atraso de 59 diagnósticos por aprobar, la interventoría solicitó al Contratista en el comité de obra la entrega de los diagnósticos pendientes en el mes de octubre, sin embargo no se cumplió esta solicitud.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 70,08% vs 64,06% EJECUTADO
Lo cual nos indica un atraso del 6,14%
En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato la meta es de 345 viviendas, a la fecha se deben tener terminada 214 intervenciones según la reprogramación de obra, sin embargo, se han intervenido 240 viviendas, de las cuales se han terminado 199 y se adelantan labores constructivas en 41 más, el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo vinculados directamente por el Contratista y otros frentes que están contratados como independientes. En la última semana el atraso disminuyó levemente con base en el reporte anterior, pero no como se espera ya que el plazo contractual restante es de 42 días. Se esperará el avance de la primera semana de noviembre con el fin de evidenciar si se siguen disminuyendo los atrasos en las actividades 2 y 3, en caso contrario se reportará a la Entidad los atrasos para que se indiquen las acciones a tomar.
Es necesario que el contratista acelere la actividad 2 de diagnóstico con el fin de tener identificadas dichas viviendas de tal forma que no se constituya en un motivo de atraso para la actividad 3. Además de atender las solicitudes que ha venido haciendo la interventoría de incrementar los rendimientos en la ejecución de las obras, con el fin de aumentar el número de viviendas terminadas. La Interventoría requiere evidenciar acciones de parte del contratista para controlar los atrasos del proyecto.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. En la presente semana se aprobaron 30 diagnósticos correspondientes a los 108 de la adición, con lo cual completan 286 diagnósticos aprobados.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
Con corte al 30 de octubre se han intervenido 240 viviendas de las cuales solo 199 están terminadas, El contratista tiene en ejecución 41 intervenciones y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras y poder finalizar este primer grupo de viviendas para concentrar los esfuerzos en las 108 viviendas que hacen parte de la adición. El contratista debe emprender acciones que impacten efectivamente los rendimientos para disminuir sustancialmente los atrasos, más aún considerando el plazo restantes.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2022 el contratista debe tener terminadas 237 intervenciones de acuerdo a la reprogramación de obra, por lo cual deberá incrementar sus esfuerzos en las actividades 2 y 3, esto teniendo en cuenta las nuevas metas establecidas en el contrato de obra conforme a las adiciones realizadas. Se deberá continuar con la etapa de diagnóstico para la identificación y aprobación de las nuevas viviendas y con la terminación de las viviendas que se encuentran en ejecución y que hacen parte de la meta inicial del contrato, esto con el fin de poder continuar con la ejecución de las 108 nuevas viviendas dentro del plazo contractual.
Como a la fecha se presenta un atraso en la actividad 2 y 3 se deberá vincular más personal de obra para atender las necesidades del proyecto, ya que no hay lugar a más prórrogas, es decir, en las próximas semanas hasta la fecha del 11 de diciembre 2022 se deberá dar cumplimiento al objeto contractual


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	59	0	59	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cual?	0	0	0	0,0%
	Total	**59**	**0**	**59**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo No presentaron lluvias.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A			N/A		

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A			N/A	

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 27

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **24/10/2022** al **30/10/2022** Fecha **30/10/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.






ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS






CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 27

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **24/10/2022** al **30/10/2022** Fecha **30/10/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-084-22 con el asunto: RESPUESTA A OFICIO CON OBSERVACONES POR PARTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CORDOBA, BOLIVAR. Por medio del cual emitimos respuesta al comunicado recibido el día 27 de septiembre de 2022 por la PERSONERIA MUNICIPAL DE CORDOBA, BOLIVAR.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-085-22 con el asunto: REITERACIÓN Solicitud respuesta Observaciones recorrido de campo Visita Ministerio de Vivienda por medio del cual reiteramos solicitud de dar respuesta a la mayor brevedad a las observaciones del informe de visita de supervisión del Ministerio de Vivienda del 14 de julio 2022 en el barrio San Martin de Córdoba Bolívar.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-086-22 con el asunto: SOLICITUD CUMPLIR FECHAS DE ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA mediante el cual solicitamos al contratista la entrega oportuna de las actas parciales de cobro, fecha esta que no puede superar los diez días de cada mes tomando en cuenta que la interventoría debe realizar la respectiva revisión y emitir aprobada a la entidad ENTerritorio la también hace su revisión y posterior trámite para pago siempre y cuando no haya observaciones que subsanar.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-087-22 con el asunto: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_109 mediante el cual realizamos entrega de aval para 30 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 20.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-088-22 con el asunto: SOLICITUD TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA por medio del cual solicitamos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra
A la fecha del ultimo corte 23 de octubre nos refleja un PROGRAMADO del 69,30% vs un ejecutado del 62,38% indicándonos un atraso del 6,52%
A la fecha se han terminado 191 intervenciones de las 345 por ejecutar a corte del 11 de diciembre 2022.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-089-22 con el asunto: REITERACIÓN SOLICITUD CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION por medio del cual solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en varios comités de obra se han comprometido a la entrega semanal de por lo menos 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción, este requerimiento también se ha solicitado mediante los oficios ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22, ARCA-INT/ENT/276-TEC-069-22, ARCA-INT/ENT/276-TEC-073-22 y ARCA-INT/ENT/276-TEC-083-22

Marcy A. Correa C		Erika M Gutierrez G	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-043	26-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-049	8-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	11	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-053	18-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	20	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE	18-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-057	26-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	76	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-062	8-sep-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	9	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-sep-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-063	8-sep-22	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES	9	**Coopsercor**			8-sep-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-068	20-sep-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	20-sep-22

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-070	27-sep-22	REITERACIÓN SOLICITUD ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO (INCLUYE MICROMEDIDOR) Y ALCANTARILLADO.	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	27-sep-22

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-048	5-ago-22	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIOS TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 DE DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	5-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-056	26-ago-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	76	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	26-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-065	13-sep-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	33	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-sep-22

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	31/10/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	188	28	188	1	223	223	223	0	0	188	35	107	0	97	0	256	295	29	285	1	240	199	0	41	345
	TOTAL	**217**	**0**	**188**	**28**	**188**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**107**	**0**	**97**	**0**	**256**	**295**	**29**	**285**	**1**	**240**	**199**	**0**	**41**	**345**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/10/2022 Y EL 30/10/2022 PLAZO: 7.5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 31/10/2022																	
BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x

SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ92-VE-168	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ92-VE-169	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$2.230.924,70	$2.230.924,70	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$8.930.810,61	$8.930.810,61	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.116.195,29	$8.116.195,29	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	133	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	134	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	136	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	137	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	138	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	139	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	141	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	142	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	143	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	144	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	145	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	146	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	147	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	148	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	149	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	150	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$8.311.308,81	$8.311.308,81	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	152	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	8/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	153	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	9/09/2022	TERMINADA	17/09/2022	23/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	154	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Caseta t2	$4.292.672,67	$4.292.672,67	10/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	155	B-C-SM-MZ23-VE-117	100%	Adecuacion	$4.772.651,25	$4.772.651,25	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	156	B-C-SM-MZ59-VE-187	100%	Adecuacion	$8.212.157,27	$8.212.157,27	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	157	B-C-SM-MZ34-VE-116	100%	Caseta t3	$7.989.636,90	$7.989.636,90	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	159	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	160	B-C-SM-MZ87-VE-189	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	161	B-C-SM-MZ18-VE-202	100%	Adecuacion	$8.298.564,37	$8.298.564,37	14/09/2022	TERMINADA	19/09/2022	25/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	162	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	14/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	163	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Adecuacion	$4.292.672,67	$4.292.672,67	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	164	B-C-SM-MZ75-VE-070	100%	Adecuacion	$4.222.499,91	$4.222.499,91	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	18	165	B-C-SM-MZ67-VE-078	100%	Adecuacion	$5.110.794,97	$5.110.794,97	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	166	B-C-SM-MZ34-VE-119	100%	Adecuacion	$7.021.881,94	$7.021.881,94	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	167	B-C-SM-MZ56-VE-190	100%	Adecuacion	$7.154.236,55	$7.154.236,55	17/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	168	B-C-SM-MZ56-VE-191	100%	Caseta t3	$8.896.139,02	$8.896.139,02	17/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	169	B-C-SM-MZ31-VE-199	100%	Adecuacion	$4.691.093,17	$4.691.093,17	18/09/2022	TERMINADA	24/09/2022	30/09/2022	6	12	-6		x
SM	18	170	B-C-SM-MZ67-VE-183	100%	Caseta t3	$6.957.541,97	$6.957.541,97	18/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	171	B-C-SM-MZ30-VE-200	100%	Caseta t3	$8.312.234,66	$8.312.234,66	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	172	B-C-SM-MZ31-VE-201	100%	Caseta t3	$6.950.167,16	$6.950.167,16	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	173	B-C-SM-MZ47-VE-105	100%	Adecuacion	$3.899.268,01	$3.899.268,01	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	14	174	B-C-SM-MZ68-VE-108	100%	Adecuacion	$3.617.504,69	$3.617.504,69	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	175	B-C-SM-MZ145-VE-208	100%	Adecuacion	$6.196.096,01	$6.196.096,01	21/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	5	11	-6		x
SM	12	176	B-C-SM-MZ66-VE-198	100%	Adecuacion	$5.360.187,87	$5.360.187,87	21/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	177	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	100%	Caseta t3	$9.273.205,89	$9.273.205,89	22/09/2022	TERMINADA	30/09/2022	6/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	178	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	100%	Adecuacion	$7.909.051,57	$7.909.051,57	22/09/2022	TERMINADA	28/09/2022	4/10/2022	6	12	-6		x
SM	17	179	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	100%	Adecuacion	$7.056.470,53	$7.056.470,53	23/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	6	12	-6		x
SM	15	180	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	100%	Caseta t3	$7.321.539,69	$7.321.539,69	23/09/2022	TERMINADA	1/10/2022	7/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	181	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	100%	Adecuacion	$5.983.563,40	$5.983.563,40	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	182	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	100%	Adecuacion	$7.900.843,94	$7.900.843,94	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	183	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	100%	Caseta t3	$7.343.027,38	$7.343.027,38	25/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	184	B-C-SM-MZ98-VE-INC-008	100%	Caseta t3	$7.345.145,38	$7.345.145,38	26/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	185	B-C-SM-MZ87-VE-INC-009	100%	Adecuacion	$6.166.474,80	$6.166.474,80	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	186	B-C-SM-MZ48-VE-INC-010	100%	Adecuacion	$7.156.353,68	$7.156.353,68	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	187	B-C-SM-MZ38-VE-INC-013	100%	Caseta t3	$8.739.765,67	$8.739.765,67	28/09/2022	TERMINADA	6/10/2022	12/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	188	B-C-SM-MZ33-VE-INC-014	100%	Adecuacion	$7.094.395,09	$7.094.395,09	28/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	189	B-C-SM-MZ55-VE-064	100%	Adecuacion	$7.807.428,21	$7.807.428,21	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	190	B-C-SM-MZ145-VE-161	100%	Adecuacion	$8.918.748,97	$8.918.748,97	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	191	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	100%	Adecuacion	$7.948.410,17	$7.948.410,17	30/09/2022	TERMINADA	5/10/2022	11/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	192	B-C-SM-MZ33-VE-INC-016	100%	Caseta t3	$7.602.156,55	$7.602.156,55	30/09/2022	TERMINADA	8/10/2022	14/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	193	B-C-SM-MZ85-VE-INC-019	100%	Caseta t3	$7.773.487,18	$7.773.487,18	1/10/2022	TERMINADA	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	194	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	100%	Caseta t3	$8.333.260,29	$8.333.260,29	1/10/2022	TERMINADA	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	195	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	100%	Caseta t3	$8.094.089,35	$8.094.089,35	2/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	196	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	100%	Caseta t3	$7.629.024,81	$7.629.024,81	2/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	197	B-C-SM-MZ33-VE-INC-032	100%	Caseta t3	$8.036.839,77	$8.036.839,77	3/10/2022	TERMINADA	11/10/2022	17/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	198	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	100%	Caseta t3	$7.811.643,60	$7.811.643,60	4/10/2022	TERMINADA	12/10/2022	18/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	199	B-C-SM-MZ33-VE-INC-027	100%	Caseta T2	$8.012.216,20	$8.012.216,20	5/10/2022	TERMINADA	13/10/2022	19/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	200	B-C-SM-MZ66-VE-INC-033	100%	Adecuacion	$6.628.918,24	$6.628.918,24	5/10/2022	TERMINADA	10/10/2022	16/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	201	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	85%	Caseta t3	$7.997.347,42	$6.797.745,31	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	202	B-C-SM-MZ98-VE-INC-036	85%	Caseta t3	$7.885.031,34	$6.702.276,64	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	203	B-C-SM-MZ85-VE-INC-038	85%	Caseta t3	$8.272.191,01	$7.031.362,36	7/10/2022	EN EJECUCION	15/10/2022	21/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	204	B-C-SM-MZ93-VE-INC-039	85%	Adecuacion	$7.727.983,14	$6.568.785,67	7/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	205	B-C-SM-MZ93-VE-INC-040	85%	Adecuacion	$7.621.248,46	$6.478.061,19	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	206	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	85%	Adecuacion	$7.737.812,12	$6.577.140,30	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	207	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	85%	Caseta t3	$8.221.884,89	$6.988.602,16	8/10/2022	EN EJECUCION	16/10/2022	22/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	208	B-C-SM-MZ96-VE-INC-046	75%	Caseta t3	$9.156.805,39	$6.867.604,04	9/10/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	209	B-C-SM-MZ95-VE-INC-049	75%	Caseta t3	$8.256.966,48	$6.192.724,86	10/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	210	B-C-SM-MZ32-VE-INC-050	75%	Caseta t3	$7.745.465,56	$5.809.099,17	11/10/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	8	14	-6		x

SM	17	211	B-C-SM-MZ36-VE-INC-051	75%	Adecuacion	$7.443.842,89	$5.582.882,17	12/10/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	212	B-C-SM-MZ30-VE-INC-052	75%	Caseta t3	$8.090.760,97	$6.068.070,73	13/10/2022	EN EJECUCION	21/10/2022	27/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	213	B-C-SM-MZ94-VE-INC-053	75%	Adecuacion	$5.710.686,86	$4.283.015,15	13/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	214	B-C-SM-MZ-VE-INC-055	75%	Adecuacion	$7.242.404,18	$5.431.803,14	13/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	215	B-C-SM-MZ-VE-INC-056	75%	Adecuacion	$7.673.332,15	$5.754.999,11	14/10/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	216	B-C-SM-MZ86-VE-INC-057	75%	Caseta t3	$7.705.011,19	$5.778.758,39	15/10/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	29/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	217	B-C-SM-MZ86-VE-INC-058	75%	Caseta t2	$8.107.440,98	$6.080.580,74	16/10/2022	EN EJECUCION	24/10/2022	30/10/2022	8	14	-6		x
SM	19	218	B-C-SM-MZ48-VE-INC-011	55%	Adecuacion	$6.827.750,12	$3.755.262,57	17/10/2022	EN EJECUCION	22/10/2022	31/10/2022	5	14	-6		x
SM	17	219	B-C-SM-MZ91-VE-INC-062	55%	Adecuacion	$4.551.930,25	$2.503.561,64	17/10/2022	EN EJECUCION	22/10/2022	1/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	220	B-C-SM-MZ87-VE-INC-063	55%	Adecuacion	$7.258.523,54	$3.992.187,95	18/10/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	2/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	221	B-C-SM-MZ67-VE-INC-064	55%	Adecuacion	$5.250.910,34	$2.888.000,69	18/10/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	3/11/2022	5	14	-6		x
SM	17	222	B-C-SM-MZ91-VE-INC-065	55%	Caseta T3	$8.132.709,35	$4.472.990,14	19/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	4/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	223	B-C-SM-MZ21-VE-INC-066	55%	Caseta T3	$8.884.140,18	$4.886.277,10	19/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	5/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	224	B-C-SM-MZ47-VE-INC-068	55%	Adecuacion	$5.141.678,32	$2.827.923,08	20/10/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	6/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	225	B-C-SM-MZ47-VE-INC-069	55%	Adecuacion	$5.804.814,20	$3.192.647,81	20/10/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	7/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	226	B-C-SM-MZ46-VE-INC-070	55%	Adecuacion	$7.533.082,62	$4.143.195,44	20/10/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	8/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	227	B-C-SM-MZ32-VE-INC-071	55%	Adecuacion	$4.494.495,27	$2.471.972,40	21/10/2022	EN EJECUCION	26/10/2022	9/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	228	B-C-SM-MZ32-VE-INC-072	55%	Adecuacion	$2.547.155,48	$1.400.935,51	21/10/2022	EN EJECUCION	26/10/2022	10/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	229	B-C-SM-MZ32-VE-INC-073	55%	Adecuacion	$5.899.252,59	$3.244.588,92	22/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	11/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	230	B-C-SM-MZ95-VE-INC-025	55%	Caseta T3	$7.925.272,79	$4.358.900,03	22/10/2022	EN EJECUCION	30/10/2022	12/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	231	B-C-SM-MZ48-VE-INC-029	55%	Adecuacion	$8.123.075,86	$4.467.691,72	22/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	13/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	232	B-C-SM-MZ86-VE-INC-030	55%	Caseta T3	$8.938.581,32	$4.916.219,73	23/10/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	14/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	233	B-C-SM-MZ98-VE-INC-031	55%	Caseta T3	$7.166.340,15	$3.941.487,08	23/10/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	15/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	234	B-C-SM-MZ32-VE-INC-017	55%	Caseta T3	$7.936.218,15	$4.364.919,98	23/10/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	235	B-C-SM-MZ145-VE-163	45%	Adecuacion	$7.980.298,74	$3.591.134,43	24/10/2022	EN EJECUCION	29/10/2022	16/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	236	B-C-SM-MZ86-VE-INC-043	45%	Caseta T3	$7.671.439,94	$3.452.147,97	25/10/2022	EN EJECUCION	2/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	237	B-C-SM-MZ98-VE-INC-044	45%	Caseta T3	$7.978.159,51	$3.590.171,78	26/10/2022	EN EJECUCION	3/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	238	B-C-SM-MZ91-VE-INC-091	45%	Adecuacion	$7.816.920,63	$3.517.614,28	27/10/2022	EN EJECUCION	1/11/2022	16/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	239	B-C-SM-MZ86-VE-INC-093	45%	Caseta T3	$9.612.473,24	$4.325.612,96	28/10/2022	EN EJECUCION	5/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	240	B-C-SM-MZ36-VE-INC-118	45%	Caseta T3	$8.070.784,75	$3.631.853,14	29/10/2022	EN EJECUCION	6/11/2022	16/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	241	B-C-SM-MZ48-VE-INC-145	45%	Caseta T3	$8.404.448,59	$3.782.001,87	230/10/2022	EN EJECUCION	#¡VALOR!	16/11/2022	8	14	-6		x
SM																

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total		Terminaciones Esperadas Período	Terminaciones Acumuladas Esperadas	Terminaciones Esperadas Período	Terminaciones Esperadas Período	Terminaciones Esperadas Período	adel ajro
		$ 5.140.026,35			$ 58.879.439,91			$ 2.590.013.153,73		$ -		$ 2.654.032.619,99							
		-			-			-		$ -		$ -							
		$ 5.140.026,35			$ 58.879.439,91			$ 2.590.013.153,73		$ -		$ 2.654.032.619,99							
1/05/2022	Semana 1	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -	$ -		0,00%	$ -		0	0			
8/05/2022	Semana 2	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -	$ -		0,10%	$ 2.570.013,18		0	0			
15/05/2022	Semana 3	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -	$ -		0,19%	$ 5.140.026,35		0	0			
22/05/2022	Semana 4	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -	$ -		0,19%	$ 5.140.026,35		0	0			
29/05/2022	Semana 5	100,00%	$ 5.140.026,35	7,38%	24	$ 4.348.020,18	0,00%	3	$ 22.883.102,57	$ -		1,22%	$ 32.371.149,10	10		0	0			
5/06/2022	Semana 6	100,00%	$ 5.140.026,35	9,23%	30	$ 5.435.025,22	0,87%	6	$ 45.766.205,14	$ -		2,12%	$ 56.341.256,71	20	5	3	0			
12/06/2022	Semana 7	100,00%	$ 5.140.026,35	12,92%	42	$ 7.609.035,31	1,74%	10	$ 76.277.008,56	$ -		3,35%	$ 89.026.070,22	40	12	6	0			
19/06/2022	Semana 8	100,00%	$ 5.140.026,35	15,69%	51	$ 9.239.542,88	2,90%	14	$ 106.787.811,98	$ -		4,57%	$ 121.167.381,21	90	23	10	0			
26/06/2022	Semana 9	100,00%	$ 5.140.026,35	21,85%	71	$ 12.862.893,03	4,06%	18	$ 137.298.615,41	$ -		5,85%	$ 155.301.534,78	150	25	14	0			
3/07/2022	Semana 10	100,00%	$ 5.140.026,35	28,92%	94	$ 17.029.745,70	5,22%	22	$ 167.809.418,83	$ -		7,16%	$ 189.979.190,88	230	18	18	0			
10/07/2022	Semana 11	100,00%	$ 5.140.026,35	35,38%	115	$ 20.834.263,35	6,38%	26	$ 198.320.222,25	$ -		8,45%	$ 224.294.511,96	280	20	22	0			
17/07/2022	Semana 12	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	7,54%	30	$ 228.831.025,68	$ -		9,78%	$ 259.515.670,57	330	20	26	0			
24/07/2022	Semana 13	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	8,70%	45	$ 343.246.538,51	$ -		14,09%	$ 373.931.183,41	420	10	30	0			
31/07/2022	Semana 14	100,00%	$ 5.140.026,35	49,23%	160	$ 28.986.801,19	13,04%	48	$ 366.129.641,08	$ -		15,08%	$ 400.256.468,62	500	12	45	0			
7/08/2022	Semana 15	100,00%	$ 5.140.026,35	52,31%	170	$ 30.798.476,26	13,91%	60	$ 457.662.051,35	$ -		18,60%	$ 493.600.553,96	680	30	48	0			
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	55,08%	179	$ 32.428.983,83	17,39%	66	$ 503.428.256,49	$ -		20,38%	$ 540.997.266,67	708	35	60	0			
21/08/2022	Semana 17	100,00%	$ 5.140.026,35	62,46%	203	$ 36.777.004,01	19,13%	80	$ 610.216.068,47	$ -		24,57%	$ 652.133.098,83	740	30	66	0			
28/08/2022	Semana 18	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	23,19%	91	$ 694.120.777,88	$ -		27,83%	$ 738.574.153,34	784	30	80	0			
4/09/2022	Semana 19	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	26,38%	101	$ 770.397.786,44	$ -		30,70%	$ 814.851.161,90	784	32	91	0			
11/09/2022	Semana 20	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	29,28%	116	$ 884.813.299,28	$ -		35,01%	$ 929.266.674,74	784	41	101	0			
18/09/2022	Semana 21	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	33,62%	137	$ 1.044.995.017,25	$ -		41,05%	$ 1.089.448.392,71	784	41	116	0			
25/09/2022	Semana 22	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	39,71%	149	$ 1.136.527.427,52	$ -		44,50%	$ 1.180.980.802,98	784	33	137	0			
2/10/2022	Semana 23	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	43,19%	160	$ 1.220.432.136,94	$ -		47,66%	$ 1.264.885.512,40	784	42	149	0			
9/10/2022	Semana 24	100,00%	$ 5.140.026,35	72,92%	237	$ 42.936.699,26	46,38%	174	$ 1.306.267.503,62	$ -		51,03%	$ 1.354.344.229,23	784	42	160	0			
16/10/2022	Semana 25	100,00%	$ 5.140.026,35	78,77%	256	$ 46.378.880,00	50,43%	185	$ 1.349.246.419,91	$ -		52,78%	$ 1.400.765.326,26	708	35	174	0			
23/10/2022	Semana 26	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.905,00	63,19%	191	$ 1.404.101.290,40	$ -		55,05%	$ 1.461.055.221,75	740	30	218	0			
30/10/2022	Semana 27	100,00%	$ 5.140.026,35	88,00%	286	$ 51.813.906,00	66,67%	199	$ 1.466.420.769,84	$ -		57,40%	$ 1.523.374.702,19	784	30	230	0			
6/11/2022	Semana 28	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			73,33%			$ -		0,19%	$ 5.140.026,35	784	32	253	0			
13/11/2022	Semana 29	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			80,00%			$ -		0,19%	$ 5.140.026,35	784	41	276	0			
20/11/2022	Semana 30	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			87,25%			$ -		0,19%	$ 5.140.026,35	784	41	301	0			
27/11/2022	Semana 31	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			94,49%			$ -		0,19%	$ 5.140.026,35	784	33	326	0			
4/12/2022	Semana 32	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			100,00%			$ -		0,19%	$ 5.140.026,35	784	42	345	0			
11/12/2022	Semana 33	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			100,00%			$ -		0,19%	$ 5.140.026,35	784	44	345	0			

TOTAL DIAGNOSTICOS APROBADOS **286**

TOTAL INTERVENCIONES TERMINADAS **199**

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 30-10-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**41**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 18 de octubre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-115-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 24

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 24 cuyo periodo es del 03 de octubre del 2022 hasta 09 de octubre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 21 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 18/10/2022
HORA: 11:41:39 a. m.
20224300392672

INFORME SEMANAL 24

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **3/10/2022** al **9/10/2022** Fecha **9/10/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO				
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	BOLÍVAR	**MUNICIPIO**	CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO			
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN			
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2220576	
Contratista			CONSORCIO CONSTRUREDES	
Valor inicial	$		1.771.707.945,99	
Valor actual	$		2.654.032.619,99	
Variación del valor	$		882.324.674,00	
Fecha de Inicio			26/04/2022	
Plazo inicial (Días)			150 Días	
Plazo actual (Días)	226 Días		7,5 MESES - 226 DIAS	
Variación en plazo			76 Días	
Fecha Contractual de terminación			11/12/2022	
Tiempo Transcurrido (días)	166		73,45%	
Días remanentes del Contrato	63,00		27,88%	
Acumulado a última acta pagada	$		379.134.821,64	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		1.280.190.068,86	

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.			2220587	
Interventor			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.	
Valor inicial	$		202.479.313,00	
Valor actual	$		303.315.624,00	
Variación del valor	$		100.836.311,00	
Fecha de Inicio			26/04/2022	
Plazo inicial			150 Días	
Plazo actual	226 Días		7,5 MESES - 226 DIAS	
Variación en plazo			76 Días	
Fecha Contractual de terminación			11/12/2022	
Ejecución del Contrato	166		73,45%	
Días remanentes del Contrato	63,00		27,88%	
Acumulado a última acta pagada	$		48.595.035,13	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		39.483.466,03	

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.777.324.138,72	66,97%	$ 1.442.732.132,23	54,36%	-$ 334.592.006,49	-12,61%
Durante el Periodo	$ 5.616.192,73	0,21%	$ 93.248.518,24	3,51%	$ 87.632.325,51	3,30%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.782.940.331,45**	**67,18%**	**$ 1.535.980.650,46**	**57,87%**	**-$ 246.959.680,99**	**-9,31%**

Desviación en días: 14 Días




Observaciones al desempeño del proyecto


A la fecha de corte del presente informe se indican las siguientes cifras: un avance programado del 67,18% frente a un ejecutado del 57,87% lo cual representa un atraso de 9,31%. Este atraso se debe a que dentro del plazo inicialmente pactado no se terminaron las 217 viviendas de la meta inicial y el Contratista no habia entregado la reprogramación ajustada a la fecha de corte de este informe.

En cuanto a la actividad 2 a corte del 2 de octubre se tenian aprobados 237 diagnósticos, con la adición el contratista debe continuar con esta actividad para identificar las 108 viviendas nuevas a intervenir. Se espera la reprogramación de obra con el fin de hacer seguimiento a las entregas establecidas para cada semana.

En cuanto a la actividad 3 el contratista deberá aprovechar las dos primeras semanas del nuevo plazo para ponerse al día con las viviendas pendientes de la primera etapa del contrato, que de acuerdo a los compromisos debería tener 237 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 216 viviendas, de las cuales se han terminado 174 y se adelantan labores constructivas en 42 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. En el transcurso de la siguiente semana se dará inicio a la ejecución 11 viviendas las cuales ya tienen parte del material y se deberá mejorar los rendimientos para lograr tener más viviendas terminadas. Se solicitó al contratista entregar cronograma con las fechas de terminación de las viviendas del primer grupo

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

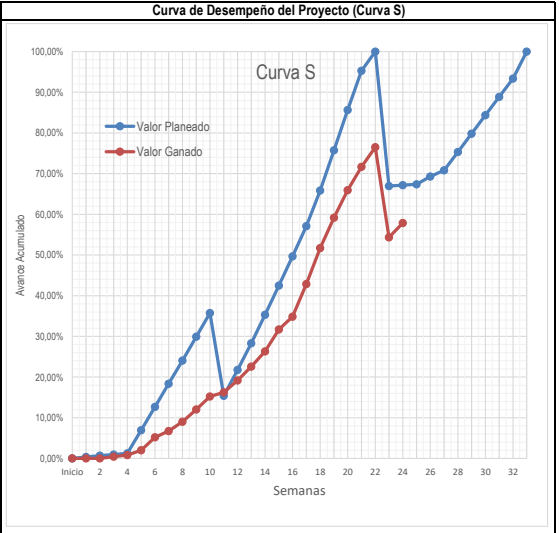

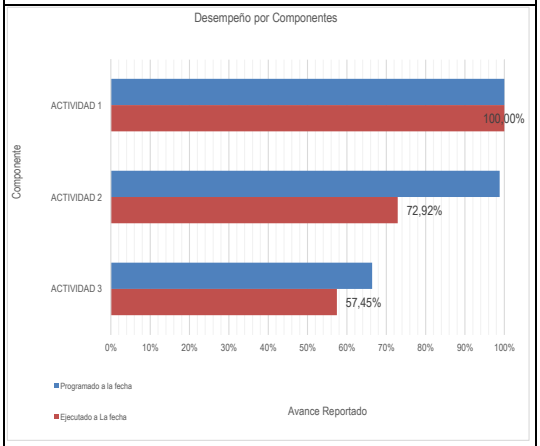

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **3/10/2022** al **9/10/2022** Fecha **9/10/2022**

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	66,97%	54,36%	-12,61%	
Durante el Periodo	0,21%	3,51%	3,30%	
Acumulado a la Fecha	**67,18%**	**57,87%**	**-9,31%**	

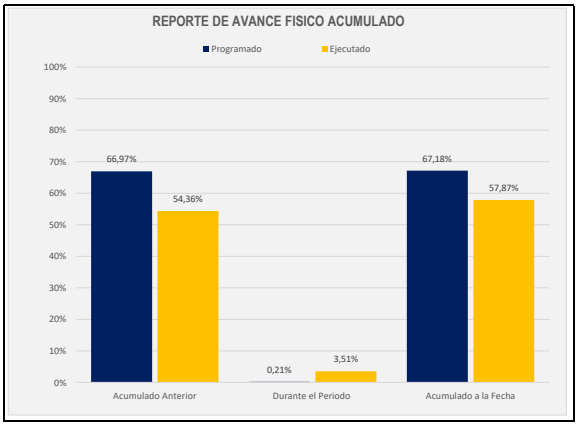


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1	$ 379.134.821,64	21,40%	12/09/2022	$ 379.134.821,64








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
3	$ 64.793.381,17	32,00%	3	$ 48.595.035,13	24,00%	9/09/2022	$ 16.198.346,04







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 98,83% vs EJECUTADO 72,92%
Comentario: A la fecha de corte del presente informe el contratista tenía 237 diagnósticos aprobados en actas, con la adición y la prórroga que se hizo al contrato de obra se deberá continuar con esta actividad para identificar las 108 nuevas viviendas objeto de la adición del contrato. Las cuales se deberán realizar en las siguientes semanas. Una vez el contratista entregue la reprogramación con las nuevas condiciones contractuales se hará el seguimiento al avance de esta actividad.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 66,39% vs 57,45% EJECUTADO
En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato, se debería tener 237 viviendas terminadas al 100% que corresponden a la meta inicial, sin embargo, a la fecha se han intervenido 216 viviendas, de las cuales se han terminado 174 y se adelantan labores constructivas en 42 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. Durante las últimas semanas se han registrado lluvias que han bajado los rendimientos de obra, además de las demoras en la entrega de materiales indispensables para la ejecución de las actividades.
A la meta de las 217 viviendas del objeto inicial, se suman las viviendas que se deben ejecutar para agotar el valor antes de la adición, es decir, otras 20 viviendas. La adición que se hizo al contrato de obra es para aproximadamente 108 viviendas. Es decir, en los próximos 2 meses y medio el contratista deberá ejecutar al 100% las 345 viviendas, Una vez se apruebe la reprogramación de la obra se hará el seguimiento con las metas propuestas por el contratista, para lo cual deberá disponer de todos los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para cumplir con el objeto del contrato. Se espera que el contratista termine lo más pronto posible las viviendas que corresponden a la meta inicial.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. En la presente semana no se aprobaron diagnósticos adicionales, la cifra sigue siendo los mismos 237.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
Con corte al 9 de octubre se han intervenido 216 viviendas, a la fecha deberían estar al 100% las 237 del alcance inicial, de las cuales solo 174 están terminadas indicándonos un atraso de 63 viviendas. El contratista tiene en ejecución 42 intervenciones y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras y poder finalizar este primer grupo de viviendas para concentrar los esfuerzos en las 108 viviendas que hacen parte de la adición.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo
A pesar de que se ha vinculado mayor personal de obra no se ha logrado mejorar los rendimientos en la ejecución de las viviendas debido a factores externos al Contratista, tales como: incremento de las lluvias en el Municipio, demoras en la entrega por parte del proveedor de la cerámica de piso y paredes y demoras en la entrega del material granular por parte del proveedor. Se solicitó al Contratista la entrega de los soportes que evidencien dichas demoras en estos insumos que afectan la normal ejecución de las obras. A esto se suma que el fuerte invierno ha afectado las vías de ingreso al Municipio por las cuales se reciben los materiales del proyecto.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 10 al 16 de octubre de 2022 el contratista deberá incrementar sus esfuerzos en las actividades 2 y 3, esto teniendo en cuenta las nuevas metas establecidas en el contrato de obra conforme a las adiciones realizadas. Se deberá continuar con la etapa de diagnóstico para la identificación y aprobación de las nuevas viviendas y con la terminación de las viviendas que se encuentran en ejecución y que hacen parte de la meta inicial del contrato, esto con el fin de poder continuar con la ejecución de las 108 nuevas viviendas dentro del plazo contractual.
Como a la fecha se presenta un atraso en la actividad 3 se deberá vincular más personal de obra para atender las necesidades del proyecto, ya que no hay lugar a más prórrogas, es decir, en los próximos 2 meses y medio se deberá dar cumplimiento al objeto contractual.


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **3/10/2022** al **9/10/2022** Fecha **9/10/2022**


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	51	8	59	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**51**	**8**	**59**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias torrenciales los dia 05 y 07 de octubre (se anexa reporte climatico)

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A			N/A		

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A			N/A	

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICION DE VIGAS Y COLUMNAS.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **3/10/2022** al **9/10/2022** Fecha **9/10/2022**






ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS






CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-071-22 con el asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES RECORRIDO DE CAMPO CÓRDOBA mediante el cual damos respuesta a las observaciones del informe de visita del 14 de julio 2022 en el barrio San Martin de Córdoba Bolívar

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-072-22 con el asunto: SOLICITUD REPROGRAMACIÓN DE OBRA mediante el cual solicitamos de manera urgente la reprogramación de obra contemplando la adición y prórroga del contrato en los términos establecidos, la cual es fundamental para el control y seguimiento de los avances en obra.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-073-22 con el asunto: REITERACIÓN SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION mediante el cual solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en varios comités de obra se han comprometido a la entrega semanal de por lo menos de 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-074-22 con el asunto: REMISIÓN DE INFORME TECNICO ESPECIALISTA HSE No. 7 mediante el cual se adjuntó informe HSE con observaciones para fines pertinentes.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-075-22 con el asunto: RESPUESTA A OBSERVACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ACTA PARCIAL No. 2 por medio del cual se da respuesta a observaciones producto de la revisión del acta parcial No.2

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-076-22 con el asunto: SOLICITUD RESPUESTA OBSERVACIONES RECORRIDO DE CAMPO VISITA MINISTERIO DE VIVIENDA con el cual se pide al contratista dar respuesta al informe con observaciones a la visita de supervisión del ministerio de vivienda.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-077-22 con el asunto: INFORME ESPECIALISTA DE PRESPUESTO Y PROGRAMACION No. 16 mediante el cual se realizan observaciones a la reprogramación de obra presentada por el contratista.

Marcy A. Correa C		Erika M. Gutierrez G	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría		Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	9/10/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																												
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES										
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3		
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	188	28	188	1	223	223	223	0	0	188	35	74	0	67	0	237	262	29	255	1	216	174	0	42	345		
	TOTAL	**217**	**0**	**188**	**28**	**188**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**74**	**0**	**67**	**0**	**237**	**262**	**29**	**255**	**1**	**216**	**174**	**0**	**42**	**345**		

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3/10/2022 Y EL 9/10/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 09/10/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x

SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ84-VE-176	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ84-VE-177	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.210.038,73	$8.210.038,73	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	133	B-C-SM-MZ84-VE-181	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	134	B-C-SM-MZ84-VE-182	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	153	B-C-SM-MZ46-VE-213	100%	Caseta t3	$8.311.308,81	$8.311.308,81	5/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	154	B-C-SM-MZ46-VE-214	100%	Adecuacion	$8.337.864,77	$8.337.864,77	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	155	B-C-SM-MZ46-VE-215	100%	Caseta t3	$8.081.818,61	$8.081.818,61	6/09/2022	TERMINADA	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	156	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$5.575.323,64	$5.575.323,64	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	157	B-C-SM-MZ46-VE-217	100%	Caseta t4	$8.310.190,06	$8.310.190,06	6/09/2022	TERMINADA	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ46-VE-218	100%	Adecuacion	$7.966.932,81	$7.966.932,81	7/09/2022	TERMINADA	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	159	B-C-SM-MZ46-VE-219	100%	Adecuacion	$4.519.608,59	$4.519.608,59	7/09/2022	TERMINADA	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	160	B-C-SM-MZ46-VE-220	100%	Adecuacion	$5.427.357,42	$5.427.357,42	8/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	161	B-C-SM-MZ46-VE-221	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	8/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	8/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	163	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	9/09/2022	TERMINADA	17/09/2022	23/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	164	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Caseta t2	$4.292.672,67	$4.292.672,67	10/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	165	B-C-SM-MZ23-VE-117	100%	Adecuacion	$4.772.651,25	$4.772.651,25	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	166	B-C-SM-MZ59-VE-187	100%	Adecuacion	$8.212.157,27	$8.212.157,27	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	167	B-C-SM-MZ34-VE-116	100%	Caseta t3	$7.989.636,90	$7.989.636,90	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	168	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	169	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	170	B-C-SM-MZ87-VE-189	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	171	B-C-SM-MZ18-VE-202	100%	Adecuacion	$8.298.564,37	$8.298.564,37	14/09/2022	TERMINADA	19/09/2022	25/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	172	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	14/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	173	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Adecuacion	$4.292.672,67	$4.292.672,67	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	174	B-C-SM-MZ75-VE-070	100%	Adecuacion	$4.222.499,91	$4.222.499,91	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	18	175	B-C-SM-MZ67-VE-078	100%	Adecuacion	$5.110.794,97	$5.110.794,97	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	176	B-C-SM-MZ34-VE-119	90%	Adecuacion	$7.021.881,94	$6.319.693,75	16/09/2022	EN EJECUCION	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	177	B-C-SM-MZ56-VE-190	90%	Adecuacion	$7.154.236,55	$6.438.812,90	17/09/2022	EN EJECUCION	22/09/2022	28/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	178	B-C-SM-MZ56-VE-191	90%	Caseta t3	$8.896.139,02	$8.006.525,12	17/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	179	B-C-SM-MZ31-VE-199	90%	Adecuacion	$4.691.093,17	$4.221.983,85	18/09/2022	EN EJECUCION	24/09/2022	30/09/2022	6	12	-6		x
SM	18	180	B-C-SM-MZ67-VE-183	90%	Caseta t3	$6.957.541,97	$6.261.787,77	18/09/2022	EN EJECUCION	26/09/2022	2/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	181	B-C-SM-MZ30-VE-200	90%	Caseta t3	$8.312.234,66	$7.481.011,19	19/09/2022	EN EJECUCION	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	182	B-C-SM-MZ31-VE-201	90%	Caseta t3	$6.950.167,16	$6.255.150,44	19/09/2022	EN EJECUCION	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	183	B-C-SM-MZ47-VE-105	90%	Adecuacion	$3.899.268,01	$3.509.341,21	20/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	14	184	B-C-SM-MZ68-VE-108	90%	Adecuacion	$3.617.504,69	$3.255.754,22	20/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	185	B-C-SM-MZ145-VE-208	90%	Adecuacion	$6.196.096,01	$5.576.486,41	21/09/2022	EN EJECUCION	26/09/2022	2/10/2022	5	11	-6		x

SM	12	186	B-C-SM-MZ66-VE-198	90%	Adecuacion	$5.360.187,87	$4.824.169,08	21/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	187	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	80%	Caseta t3	$9.273.205,89	$7.418.564,71	22/09/2022	EN EJECUCION	30/09/2022	6/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	188	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	80%	Adecuacion	$7.909.051,57	$6.327.241,26	22/09/2022	EN EJECUCION	28/09/2022	4/10/2022	6	12	-6		x
SM	17	189	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	80%	Adecuacion	$7.056.470,53	$5.645.176,42	23/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	6	12	-6		x
SM	15	190	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	80%	Caseta t3	$7.321.539,69	$5.857.231,75	23/09/2022	EN EJECUCION	1/10/2022	7/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	191	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	80%	Adecuacion	$5.983.563,40	$4.786.850,72	24/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	192	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	80%	Adecuacion	$7.900.843,94	$6.320.675,15	24/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	193	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	80%	Caseta t3	$7.343.027,38	$5.874.421,90	25/09/2022	EN EJECUCION	3/10/2022	9/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	194	B-C-SM-MZ98-VE-INC-008	70%	Caseta t3	$7.345.145,38	$5.141.601,77	26/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	195	B-C-SM-MZ87-VE-INC-009	70%	Adecuacion	$6.166.474,80	$4.316.532,36	27/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	196	B-C-SM-MZ48-VE-INC-010	70%	Adecuacion	$7.156.353,68	$5.009.447,58	27/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	197	B-C-SM-MZ38-VE-INC-013	70%	Caseta t3	$8.739.765,67	$6.117.835,97	28/09/2022	EN EJECUCION	6/10/2022	12/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	198	B-C-SM-MZ33-VE-INC-014	70%	Adecuacion	$7.094.395,09	$4.966.076,56	28/09/2022	EN EJECUCION	3/10/2022	9/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	199	B-C-SM-MZ55-VE-064	70%	Adecuacion	$7.807.428,21	$5.465.199,75	29/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	200	B-C-SM-MZ145-VE-161	70%	Adecuacion	$8.918.748,97	$6.243.124,28	29/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	201	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	70%	Adecuacion	$7.948.410,17	$5.563.887,12	30/09/2022	EN EJECUCION	5/10/2022	11/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	202	B-C-SM-MZ33-VE-INC-016	55%	Caseta t3	$7.602.156,55	$4.181.186,10	30/09/2022	EN EJECUCION	8/10/2022	14/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	203	B-C-SM-MZ85-VE-INC-019	55%	Caseta t3	$7.773.487,18	$4.275.417,95	1/10/2022	EN EJECUCION	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	204	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	55%	Caseta t3	$8.333.260,29	$4.583.293,16	1/10/2022	EN EJECUCION	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	205	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	55%	Caseta t3	$8.094.089,35	$4.451.749,14	2/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	206	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	55%	Caseta t3	$7.629.024,81	$4.195.963,65	2/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	207	B-C-SM-MZ33-VE-INC-032	55%	Caseta t3	$8.036.839,77	$4.420.261,87	3/10/2022	EN EJECUCION	11/10/2022	17/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	208	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	55%	Caseta t3	$7.811.643,60	$4.296.403,98	4/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	209	B-C-SM-MZ33-VE-INC-027	55%	Caseta T2	$8.012.216,20	$4.406.718,91	5/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	210	B-C-SM-MZ66-VE-INC-033	60%	Adecuacion	$6.628.918,24	$3.977.350,94	5/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	211	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	35%	Caseta t3	$7.997.347,42	$2.799.071,60	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	212	B-C-SM-MZ98-VE-INC-036	35%	Caseta t3	$7.885.031,34	$2.759.760,97	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	213	B-C-SM-MZ85-VE-INC-038	35%	Caseta t3	$8.272.191,01	$2.895.266,85	7/10/2022	EN EJECUCION	15/10/2022	21/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	214	B-C-SM-MZ93-VE-INC-039	45%	Adecuacion	$7.727.983,14	$3.477.592,41	7/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	215	B-C-SM-MZ93-VE-INC-040	45%	Adecuacion	$7.621.248,46	$3.429.561,81	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	216	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	45%	Adecuacion	$7.737.812,12	$3.482.015,45	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	217	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	35%	Caseta t3	$8.221.884,89	$2.877.659,71	8/10/2022	EN EJECUCION	16/10/2022	22/10/2022	8	14	-6		x
SM		218														
SM		219														

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		58.879.439,91	$		2.590.013.153,73	$	-	$	2.654.032.619,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		58.879.439,91	$		2.590.013.153,73	$	-	$	2.654.032.619,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	3,10%	11	$ 1.824.670,21	0,00%	0	$ -		$ -	**0,17%**	**$ 4.394.683,39**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	6,20%	22	$ 3.649.340,42	0,00%	0	$ -		$ -	**0,23%**	**$ 6.219.353,60**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	9,30%	33	$ 5.474.010,63	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 10.614.036,98**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	12,40%	44	$ 7.298.680,84	0,58%	2	$ 15.014.569,01		$ -	**1,03%**	**$ 27.453.276,20**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,49%	55	$ 9.123.351,05	1,16%	4	$ 30.029.138,01		$ -	**1,67%**	**$ 44.292.515,41**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	18,59%	66	$ 10.948.021,26	1,45%	5	$ 37.536.422,52		$ -	**2,02%**	**$ 53.624.470,13**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	21,69%	77	$ 12.772.691,47	1,74%	6	$ 45.043.707,02		$ -	**2,37%**	**$ 62.956.424,84**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,92%	92	$ 15.260.878,12	2,61%	9	$ 67.565.560,53		$ -	**3,31%**	**$ 87.966.465,00**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,14%	107	$ 17.749.064,77	3,19%	11	$ 82.580.129,54		$ -	**3,97%**	**$ 105.469.220,66**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	34,37%	122	$ 20.237.251,42	6,96%	24	$ 180.174.828,09		$ -	**7,74%**	**$ 205.552.105,86**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	38,60%	137	$ 22.725.438,07	10,72%	37	$ 277.769.526,63		$ -	**11,52%**	**$ 305.634.991,05**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	42,82%	152	$ 25.213.624,72	14,49%	50	$ 375.364.225,18		$ -	**15,29%**	**$ 405.717.876,25**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	47,05%	167	$ 27.701.811,37	17,39%	60	$ 450.437.070,21		$ -	**18,21%**	**$ 483.278.907,93**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	51,27%	182	$ 30.189.998,02	20,29%	70	$ 525.509.915,25		$ -	**21,13%**	**$ 560.839.939,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	55,50%	197	$ 32.678.184,67	23,48%	81	$ 608.090.044,79		$ -	**24,34%**	**$ 645.908.255,81**
14/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35	61,13%	217	$ 35.995.766,89	28,12%	97	$ 728.206.596,85		$ -	**28,99%**	**$ 769.342.390,09**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	237	$ 39.313.349,11	32,75%	113	$ 848.323.148,90		$ -	**33,64%**	**$ 892.776.524,36**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	70,22%	247	$ 41.343.096,19	37,68%	130	$ 975.946.985,46		$ -	**38,52%**	**$ 1.022.430.108,00**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,66%	257	$ 43.372.843,27	44,06%	152	$ 1.141.107.244,54		$ -	**44,82%**	**$ 1.189.620.114,16**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,49%	271	$ 46.214.489,17	50,43%	174	$ 1.306.267.503,62		$ -	**51,15%**	**$ 1.357.622.019,14**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	83,32%	285	$ 49.056.135,07	56,81%	196	$ 1.471.427.762,70		$ -	**57,48%**	**$ 1.525.623.924,12**
25/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	88,49%	300	$ 52.100.755,68	59,71%	**206**	$ 1.546.500.607,73		$ -	**60,43%**	**$ 1.603.741.389,76**
2/10/2022	**Semana 23**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,66%	315	$ 55.145.376,29	59,71%	206	$ 1.546.500.607,73		$ -	**60,54%**	**$ 1.606.786.010,37**
9/10/2022	**Semana 24**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**98,83%**	**330**	**$ 58.189.996,90**	63,19%	**218**	$ 1.636.588.021,78		**$ -**	**64,05%**	**$ 1.699.918.045,03**
16/10/2022	**Semana 25**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	66,67%	230	$ 1.726.675.435,82		$ -	**67,47%**	**$ 1.790.694.902,08**
23/10/2022	**Semana 26**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	73,33%	253	$ 1.899.342.979,40		$ -	**73,98%**	**$ 1.963.362.445,66**
30/10/2022	**Semana 27**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	80,00%	276	$ 2.072.010.522,98		$ -	**80,48%**	**$ 2.136.029.989,25**
6/11/2022	**Semana 28**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	87,25%	301	$ 2.259.692.635,57		$ -	**87,55%**	**$ 2.323.712.101,83**
13/11/2022	**Semana 29**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	94,49%	326	$ 2.447.374.748,16		$ -	**94,63%**	**$ 2.511.394.214,42**
20/11/2022	**Semana 30**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	100,00%	345	$ 2.590.013.153,73		$ -	**100,00%**	**$ 2.654.032.619,99**
27/11/2022	**Semana 31**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	100,00%	345	$ 2.590.013.153,73		$ -	**100,00%**	**$ 2.654.032.619,99**
						$ -							

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 09-10-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**42**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

miércoles 05 de octubre, 2022

	Hoy 04 OCT	Mañana 05 OCT	Jueves 06 OCT	Viernes 07 OCT	Sábado 08 OCT	Domingo 09 OCT	Lunes 10 OCT
Hora	↑ 30° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 23°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°
08:00	24°	25°	25°	25°	25°	25°	26°
14:00	29°	30°	29°	29°	29°	29°	30°
20:00	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Lluvia	23.8 mm	5.9 mm	16 mm	14.1 mm	8.4 mm	1.2 mm	2.2 mm
Viento	↑ 9 km/h	↑ 10 km/h	↑ 10 km/h	↘ 7 km/h	→ 10 km/h	↘ 7 km/h	↑ 10 km/h
	05:48	05:48	05:48	05:48	05:48	05:48	05:48
	17:48	17:47	17:47	17:46	17:45	17:45	17:44

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23°	24°	25°	26°	27°	29°	29°	29°	28°	28°	27°	26°	25°	25°	25°

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

Bogotá D.C, 02 de noviembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-121-22

ADMON

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 2/11/2022
HORA: 9:58:59 a. m.
20224300418222

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No 25

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 25 cuyo periodo es del 10 de octubre del 2022 hasta 16 de octubre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 22 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

INFORME SEMANAL 25

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 25	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 25

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **10/10/2022** al **16/10/2022** | Fecha **16/10/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCION ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99		
Valor actual	$ 2.654.032.619,99		
Variación del valor	$ 882.324.674,00		
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial (Días)	150 Días		
Plazo actual (Días)	226 Días		7,5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo	76 Días		
Fecha Contractual de terminación	11/12/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	173		76,55%
Días remanentes del Contrato	56,00		24,78%
Acumulado a última acta pagada	$ 821.329.766,06		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 1.349.246.419,91		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587		
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.		
Valor inicial	$ 202.479.313,00		
Valor actual	$ 303.315.624,00		
Variación del valor	$ 100.836.311,00		
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial	150 Días		
Plazo actual	226 Días		7,5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo	76 Días		
Fecha Contractual de terminación	11/12/2022		
Ejecución del Contrato	173		76,55%
Días remanentes del Contrato	56,00		24,78%
Acumulado a última acta pagada	$ 88.078.501,16		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 44.316.958,56		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.782.940.331,45	67,18%	$ 1.535.980.650,46	57,87%	-$ 246.959.680,99	-9,31%
Durante el Periodo	$ 5.616.192,73	0,21%	$ 91.148.899,50	3,43%	$ 85.532.706,77	3,22%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.788.556.524,18**	**67,39%**	**$ 1.627.129.549,96**	**61,31%**	**-$ 161.426.974,22**	**-6,08%**

Semáforo


Desviación en días: 9 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha de corte del presente informe tenemos el siguiente reporte:
En cuanto a la actividad 2 a corte del 2 de octubre se tenían aprobados 237 diagnósticos, durante la semana del presente informe se aprobaron otros 19 diagnósticos para un total de 256, sin embargo, conforme a la reprogramación de obra deberían tener 330 diagnósticos aprobados, es decir, se presenta un atraso de 74 diagnósticos. Este atraso para esta actividad corresponde al 20,06%.
El avance de la actividad 3 nos indica las siguientes cifras: un programado del 66,61% frente a un ejecutado del 60,83% lo cual representa un atraso de 5,78% Este atraso corresponde a 2 viviendas, ya que conforme a lo programado se deberían tener terminadas 187 viviendas y con corte al 16 de octubre se contaban con 185 viviendas terminadas..
El atraso general del proyecto equivale al 6,08%, aunque se disminuyó con relación a la semana anterior, el contratista debe seguir incrementando los esfuerzos hasta nivelar la programación de obra y cumplir con las viviendas programadas semanalmente. Para esto es importante tener identificadas las viviendas a intervenir y completar todos los diagnósticos

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

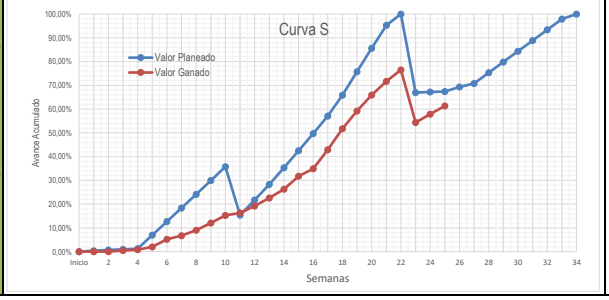




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	67,18%	57,87%	-9,31%	
Durante el Periodo	0,21%	3,43%	3,22%	
Acumulado a la Fecha	**67,39%**	**61,31%**	**-6,08%**	

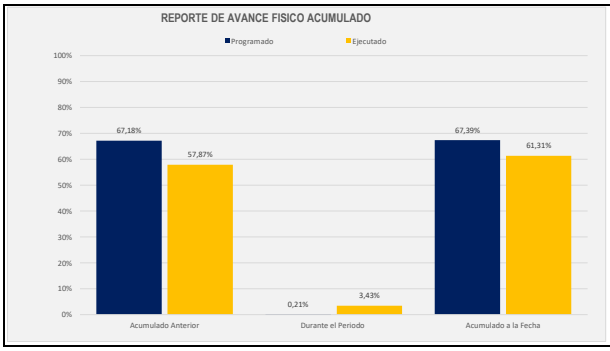


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
2	$ 821.329.766,06	46,36%	1	$ 379.134.821,64	21,40%	12/09/2022	$ 379.134.821,64









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
4	$ 88.078.501,16	43,50%	4	$ 88.078.501,16	43,50%		$ 39.483.466,03







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 25

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **10/10/2022** al **16/10/2022** Fecha **16/10/2022**

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 98,83% vs EJECUTADO 78,77%
Lo cual nos indica un atraso del 20,06%
Comentario: A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene 256 diagnósticos aprobados en actas, sin embargo, la cantidad programada es del 330 indicándonos un atraso de 74 diagnósticos por aprobar, con la adición y la prórroga que se hizo al contrato de obra se deberá continuar con esta actividad para identificar las 108 nuevas viviendas objeto de la adición del contrato. Las cuales según la programación deberían terminar la siguiente semana.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 66,61% vs 60,83% EJECUTADO
Lo cual nos indica un atraso del 5,78%
En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato la meta es de 345 viviendas, a la fecha se deben tener terminada 187 intervenciones según la reprogramación de obra, sin embargo, se han intervenido 227 viviendas, de las cuales se han terminado 185 y se adelantan labores constructivas en 42 más, el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo. Durante las últimas semanas se han registrado lluvias que han bajado los rendimientos de obra, además de las demoras en la entrega de materiales indispensables para la ejecución de las actividades.
Aunque el atraso en la ultima semana se redujo de manera considerable contra el reporte anterior, es necesario que el contratista acelere la actividad 2 de diagnóstico con el fin de tener identificadas dichas viviendas de tal forma que no se constituya en un motivo de atraso para la actividad 3. Además de cumplir con los compromisos establecidos semanalmente para la ejecución y entrega de viviendas terminadas

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. En la presente semana se aprobaron 19 diagnósticos correspondientes a los 108 de la adición, con lo cual completan 256 diagnósticos aprobados.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
Con corte al 16 de octubre se han intervenido 227 viviendas de las cuales solo 185 están terminadas, El contratista tiene en ejecución 42 intervenciones y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras y poder finalizar este primer grupo de viviendas para concentrar los esfuerzos en las 108 viviendas que hacen parte de la adición.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 17 al 23 de octubre de 2022 el contratista debe tener terminadas 199 intervenciones de acuerdo a la reprogramación de obra, por lo cual deberá incrementar sus esfuerzos en las actividades 2 y 3, esto teniendo en cuenta las nuevas metas establecidas en el contrato de obra conforme a las adiciones realizadas. Se deberá continuar con la etapa de diagnóstico para la identificación y aprobación de las nuevas viviendas y con la terminación de las viviendas que se encuentran en ejecución y que hacen parte de la meta inicial del contrato, esto con el fin de poder continuar con la ejecución de las 108 nuevas viviendas dentro del plazo contractual.
Como a la fecha se presenta un atraso en la actividad 2 y 3 se deberá vincular más personal de obra para atender las necesidades del proyecto, ya que no hay lugar a más prórrogas, es decir, en los próximos 2 meses se deberá dar cumplimiento al objeto contractual.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	59	0	59	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cual?	0	0	0	0,0%
	Total	**59**	**0**	**59**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo No presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR's

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A			N/A		

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A			N/A	

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 25

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **10/10/2022** al **16/10/2022** Fecha **16/10/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.






ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS






CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 25

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 10/10/2022 al 16/10/2022 Fecha 16/10/2022

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-077-22 con el asunto: INFORME ESPECIALISTA DE PRESPUESTO Y PROGRAMACION No. 16 mediante el cual se realizan observaciones a la reprogramación de obra presentada por el contratista.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-078-22 con el asunto: RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS AL ACTA PARCIAL No. 2 mediante el cual se da respuesta a observaciones realizadas por la entidad con respecto al acta parcial 2.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-079-22 con el asunto: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_103 mediante del cual realizamos entrega de aval para 19 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 019
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-080-22 con el asunto: SOLICITUD PLANILLA DE AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA mediante el cual solicitamos la planilla de afiliación a la seguridad social de los obreros (maestros, oficiales y ayudantes).
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-081-22 con el asunto: REMISIÓN DE INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO No. 17 APROBACIÓN REPROGRAMACIÓN DE OBRA por medio del cual remitimos INFORME TECTNICO ESPECIALISTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUETO No.17, el especialista de la Interventoría realizó la revisión de la información entregada por el contratista relacionada con los ajustes a la reprogramación de obra conforme a la adición y prórroga del contrato, en la cual se evidencia que se atendieron las observaciones realizadas por la Interventoría, en razón a lo anterior se aprueba la reprogramación presentada y a partir de la fecha se realizará el seguimiento con esta versión.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-082-22 con el asunto: INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO No. 17 al contratista mediante el cual se da aprobación a la programación de obra.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-083-22 con el asunto: SOLICITUD CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION. Mediante el cual solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en varios comités de obra se han comprometido a la entrega semanal de por lo menos 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-084-22 con el asunto: RESPUESTA A OFICIO CON OBSERVACONES POR PARTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CORDOBA, BOLIVAR. Por medio del cual emitimos respuesta al comunicado recibido el día 27 de septiembre de 2022 por la PERSONERIA MUNICIPAL DE CORDOBA, BOLIVAR.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-085-22 con el asunto: REITERACIÓN Solicitud respuesta Observaciones recorrido de campo Visita Ministerio de Vivienda por medio del cual reiteramos solicitud de dar respuesta a la mayor brevedad a las observaciones del informe de visita de supervisión del Ministerio de Vivienda del 14 de julio 2022 en el barrio San Martin de Córdoba Bolívar.

Marcy A. Correa C		Erika M Gutierrez G	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-048	5-ago-22	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIOS TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 DE DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	5-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-056	26-ago-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	76	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	26-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-065	13-sep-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	33	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-sep-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	9/10/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	188	28	188	1	223	223	223	0	0	188	35	94	0	67	0	256	282	29	255	1	227	185	0	42	345
	TOTAL	**217**	**0**	**188**	**28**	**188**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**94**	**0**	**67**	**0**	**256**	**282**	**29**	**255**	**1**	**227**	**185**	**0**	**42**	**345**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10/10/2022 Y EL 17/10/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 17/10/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ221-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x

SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ84-VE-176	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ84-VE-177	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.210.038,73	$8.210.038,73	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	133	B-C-SM-MZ84-VE-181	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	134	B-C-SM-MZ84-VE-182	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	153	B-C-SM-MZ46-VE-213	100%	Caseta t3	$8.311.308,81	$8.311.308,81	5/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	154	B-C-SM-MZ46-VE-214	100%	Adecuacion	$8.337.864,77	$8.337.864,77	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	155	B-C-SM-MZ46-VE-215	100%	Caseta t3	$8.081.818,61	$8.081.818,61	6/09/2022	TERMINADA	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	156	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$5.575.323,64	$5.575.323,64	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	157	B-C-SM-MZ46-VE-217	100%	Caseta t4	$8.310.190,06	$8.310.190,06	6/09/2022	TERMINADA	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ46-VE-218	100%	Adecuacion	$7.966.932,81	$7.966.932,81	7/09/2022	TERMINADA	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	159	B-C-SM-MZ46-VE-219	100%	Adecuacion	$4.519.608,59	$4.519.608,59	7/09/2022	TERMINADA	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	160	B-C-SM-MZ46-VE-220	100%	Adecuacion	$5.427.357,42	$5.427.357,42	8/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	161	B-C-SM-MZ46-VE-221	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	8/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	8/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	163	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	9/09/2022	TERMINADA	17/09/2022	23/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	164	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Caseta t2	$4.292.672,67	$4.292.672,67	10/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	165	B-C-SM-MZ23-VE-117	100%	Adecuacion	$4.772.651,25	$4.772.651,25	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	166	B-C-SM-MZ59-VE-187	100%	Adecuacion	$8.212.157,27	$8.212.157,27	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	167	B-C-SM-MZ34-VE-116	100%	Caseta t3	$7.989.636,90	$7.989.636,90	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	168	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	169	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	170	B-C-SM-MZ87-VE-189	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	171	B-C-SM-MZ18-VE-202	100%	Adecuacion	$8.298.564,37	$8.298.564,37	14/09/2022	TERMINADA	19/09/2022	25/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	172	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	14/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	173	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Adecuacion	$4.292.672,67	$4.292.672,67	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	174	B-C-SM-MZ75-VE-070	100%	Adecuacion	$4.222.499,91	$4.222.499,91	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	18	175	B-C-SM-MZ67-VE-078	100%	Adecuacion	$5.110.794,97	$5.110.794,97	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	176	B-C-SM-MZ34-VE-119	100%	Adecuacion	$7.021.881,94	$7.021.881,94	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	177	B-C-SM-MZ56-VE-190	100%	Adecuacion	$7.154.236,55	$7.154.236,55	17/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	178	B-C-SM-MZ56-VE-191	100%	Caseta t3	$8.896.139,02	$8.896.139,02	17/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	179	B-C-SM-MZ31-VE-199	100%	Adecuacion	$4.691.093,17	$4.691.093,17	18/09/2022	TERMINADA	24/09/2022	30/09/2022	6	12	-6		x
SM	18	180	B-C-SM-MZ67-VE-183	100%	Caseta t3	$6.957.541,97	$6.957.541,97	18/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	181	B-C-SM-MZ30-VE-200	100%	Caseta t3	$8.312.234,66	$8.312.234,66	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	182	B-C-SM-MZ31-VE-201	100%	Caseta t3	$6.950.167,16	$6.950.167,16	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	183	B-C-SM-MZ47-VE-105	100%	Adecuacion	$3.899.268,01	$3.899.268,01	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	14	184	B-C-SM-MZ68-VE-108	100%	Adecuacion	$3.617.504,69	$3.617.504,69	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	185	B-C-SM-MZ145-VE-208	100%	Adecuacion	$6.196.096,01	$6.196.096,01	21/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	5	11	-6		x
SM	12	186	B-C-SM-MZ66-VE-198	100%	Adecuacion	$5.360.187,87	$5.360.187,87	21/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	187	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	95%	Caseta t3	$9.273.205,89	$8.809.545,60	22/09/2022	EN EJECUCION	30/09/2022	6/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	188	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	95%	Adecuacion	$7.909.051,57	$7.513.598,99	22/09/2022	EN EJECUCION	28/09/2022	4/10/2022	6	12	-6		x
SM	17	189	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	95%	Adecuacion	$7.056.470,53	$6.703.647,00	23/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	6	12	-6		x
SM	15	190	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	95%	Caseta t3	$7.321.539,69	$6.955.462,71	23/09/2022	EN EJECUCION	1/10/2022	7/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	191	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	95%	Adecuacion	$5.983.563,40	$5.684.385,23	24/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	192	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	95%	Adecuacion	$7.900.843,94	$7.505.801,74	24/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	193	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	95%	Caseta t3	$7.343.027,38	$6.975.876,01	25/09/2022	EN EJECUCION	3/10/2022	9/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	194	B-C-SM-MZ98-VE-INC-008	85%	Caseta t3	$7.345.145,38	$6.243.373,57	26/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	195	B-C-SM-MZ87-VE-INC-009	85%	Adecuacion	$6.166.474,80	$5.241.503,58	27/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	196	B-C-SM-MZ48-VE-INC-010	85%	Adecuacion	$7.156.353,68	$6.082.900,63	27/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	197	B-C-SM-MZ38-VE-INC-013	85%	Caseta t3	$8.739.765,67	$7.428.800,82	28/09/2022	EN EJECUCION	6/10/2022	12/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	198	B-C-SM-MZ33-VE-INC-014	85%	Adecuacion	$7.094.395,09	$6.030.235,83	28/09/2022	EN EJECUCION	3/10/2022	9/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	199	B-C-SM-MZ55-VE-064	85%	Adecuacion	$7.807.428,21	$6.636.313,98	29/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	200	B-C-SM-MZ145-VE-161	85%	Adecuacion	$8.918.748,97	$7.580.936,62	29/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	201	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	85%	Adecuacion	$7.948.410,17	$6.756.148,64	30/09/2022	EN EJECUCION	5/10/2022	11/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	202	B-C-SM-MZ33-VE-INC-016	75%	Caseta t3	$7.602.156,55	$5.701.617,41	30/09/2022	EN EJECUCION	8/10/2022	14/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	203	B-C-SM-MZ85-VE-INC-019	75%	Caseta t3	$7.773.487,18	$5.830.115,39	1/10/2022	EN EJECUCION	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	204	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	75%	Caseta t3	$8.333.260,29	$6.249.945,22	1/10/2022	EN EJECUCION	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	205	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	75%	Caseta t3	$8.094.089,35	$6.070.567,01	2/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x

SM	18	206	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	75%	Caseta t3	$7.629.024,81	$5.721.768,61	2/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	207	B-C-SM-MZ33-VE-INC-032	75%	Caseta t3	$8.036.839,77	$6.027.629,83	3/10/2022	EN EJECUCION	11/10/2022	17/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	208	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	75%	Caseta t3	$7.811.643,60	$5.858.732,70	4/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	209	B-C-SM-MZ33-VE-INC-027	75%	Caseta T2	$8.012.216,20	$6.009.162,15	5/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	210	B-C-SM-MZ66-VE-INC-033	75%	Adecuacion	$6.628.918,24	$4.971.688,68	5/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	211	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	65%	Caseta t3	$7.997.347,42	$5.198.275,82	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	212	B-C-SM-MZ98-VE-INC-036	65%	Caseta t3	$7.885.031,34	$5.125.270,37	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	213	B-C-SM-MZ85-VE-INC-038	65%	Caseta t3	$8.272.191,01	$5.376.924,16	7/10/2022	EN EJECUCION	15/10/2022	21/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	214	B-C-SM-MZ93-VE-INC-039	65%	Adecuacion	$7.727.983,14	$5.023.189,04	7/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	215	B-C-SM-MZ93-VE-INC-040	65%	Adecuacion	$7.621.248,46	$4.953.811,50	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	216	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	65%	Adecuacion	$7.737.812,12	$5.029.577,88	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	217	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	65%	Caseta t3	$8.221.884,89	$5.344.225,18	8/10/2022	EN EJECUCION	16/10/2022	22/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	218	B-C-SM-MZ96-VE-INC-046	45%	Caseta t3	$9.156.805,39	$4.120.562,43	9/10/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	219	B-C-SM-MZ-VE-INC-047	45%	Adecuacion	$2.275.840,80	$1.024.128,36	10/10/2022	EN EJECUCION	15/10/2022	21/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	220	B-C-SM-MZ95-VE-INC-049	45%	Caseta t3	$8.256.966,48	$3.715.634,92	10/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	221	B-C-SM-MZ32-VE-INC-050	45%	Caseta t3	$7.745.465,56	$3.485.459,50	11/10/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	222	B-C-SM-MZ36-VE-INC-051	45%	Adecuacion	$7.443.842,89	$3.349.729,30	12/10/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	223	B-C-SM-MZ-VE-INC-052	45%	Caseta t3	$8.067.074,21	$3.630.183,39	12/10/2022	EN EJECUCION	20/10/2022	26/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	224	B-C-SM-MZ94-VE-INC-053	45%	Adecuacion	$5.710.686,86	$2.569.809,09	13/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	225	B-C-SM-MZ-VE-INC-055	45%	Adecuacion	$7.242.404,18	$3.259.081,88	13/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	226	B-C-SM-MZ-VE-INC-056	45%	Adecuacion	$7.673.332,15	$3.452.999,47	14/10/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	227	B-C-SM-MZ86-VE-INC-057	45%	Caseta t3	$7.705.011,19	$3.467.255,04	15/10/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	29/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	228	B-C-SM-MZ86-VE-INC-058	45%	Caseta t2	$8.107.440,98	$3.648.348,44	16/10/2022	EN EJECUCION	24/10/2022	30/10/2022	8	14	-6		x

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 58.879.439,91			$ 2.590.013.153,73		$ -		$ 2.654.032.619,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 58.879.439,91			$ 2.590.013.153,73		$ -		$ 2.654.032.619,99
1/05/2022	**Semana 1**	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	3,10%	11	$ 1.824.670,21	0,00%	0	$ -		$ -	**0,17%**	**$ 4.394.683,39**
15/05/2022	**Semana 3**	50,00%	$ 2.570.013,18	6,20%	22	$ 3.649.340,42	0,00%	0	$ -		$ -	**0,23%**	**$ 6.219.353,60**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	9,30%	33	$ 5.474.010,63	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 10.614.036,98**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	12,40%	44	$ 7.298.680,84	0,00%	0	$ -		$ -	**0,47%**	**$ 12.438.707,19**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,49%	55	$ 9.123.351,05	0,58%	2	$ 15.014.569,01		$ -	**1,10%**	**$ 29.277.946,41**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	18,59%	66	$ 10.948.021,26	1,16%	4	$ 30.029.138,01		$ -	**1,74%**	**$ 46.117.185,62**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	21,69%	77	$ 12.772.691,47	1,74%	6	$ 45.043.707,02		$ -	**2,37%**	**$ 62.956.424,84**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,92%	92	$ 15.260.878,12	2,61%	9	$ 67.565.560,53		$ -	**3,31%**	**$ 87.966.465,00**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,14%	107	$ 17.749.064,77	3,19%	11	$ 82.580.129,54		$ -	**3,97%**	**$ 105.469.220,66**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	34,37%	122	$ 20.237.251,42	6,38%	22	$ 165.160.259,08		$ -	**7,18%**	**$ 190.537.536,85**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	38,60%	137	$ 22.725.438,07	9,57%	33	$ 247.740.388,62		$ -	**10,38%**	**$ 275.605.853,04**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	42,82%	152	$ 25.213.624,72	13,04%	45	$ 337.827.802,66		$ -	**13,87%**	**$ 368.181.453,73**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	47,05%	167	$ 27.701.811,37	16,52%	57	$ 427.915.216,70		$ -	**17,36%**	**$ 460.757.054,42**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	51,27%	182	$ 30.189.998,02	19,71%	68	$ 510.495.346,24		$ -	**20,57%**	**$ 545.825.370,61**
14/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35	55,50%	197	$ 32.678.184,67	22,90%	79	$ 593.075.475,78		$ -	**23,77%**	**$ 630.893.686,80**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	61,13%	217	$ 35.995.766,89	26,38%	91	$ 683.162.889,82		$ -	**27,29%**	**$ 724.298.683,06**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	237	$ 39.313.349,11	29,86%	103	$ 773.250.303,87		$ -	**30,81%**	**$ 817.703.679,33**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	70,22%	247	$ 41.343.096,19	33,33%	115	$ 863.337.717,91		$ -	**34,28%**	**$ 909.820.840,45**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,66%	257	$ 43.372.843,27	36,81%	127	$ 953.425.131,95		$ -	**37,75%**	**$ 1.001.938.001,57**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,49%	271	$ 46.214.489,17	40,29%	139	$ 1.043.512.546,00		$ -	**41,25%**	**$ 1.094.867.061,52**
25/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	83,32%	285	$ 49.056.135,07	43,77%	151	$ 1.133.599.960,04		$ -	**44,75%**	**$ 1.187.796.121,46**
2/10/2022	**Semana 23**	100,00%	$ 5.140.026,35	88,49%	300	$ 52.100.755,68	47,25%	163	$ 1.223.687.374,08		$ -	**48,26%**	**$ 1.280.928.156,11**
9/10/2022	**Semana 24**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,66%	315	$ 55.145.376,29	48,99%	175	$ 1.268.731.081,10		$ -	**50,08%**	**$ 1.329.016.483,74**
16/10/2022	**Semana 25**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**98,83%**	**330**	**$ 58.189.996,90**	**50,43%**	**187**	**$ 1.306.267.503,62**		**$ -**	**51,60%**	**$ 1.369.597.526,87**
23/10/2022	**Semana 26**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	53,33%	199	$ 1.381.340.348,66		$ -	**54,46%**	**$ 1.445.359.814,92**
30/10/2022	**Semana 27**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	57,68%	214	$ 1.493.949.616,21		$ -	**58,70%**	**$ 1.557.969.082,47**
6/11/2022	**Semana 28**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	64,35%	237	$ 1.666.617.159,79		$ -	**65,21%**	**$ 1.730.636.626,05**
13/11/2022	**Semana 29**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	71,01%	260	$ 1.839.284.703,37		$ -	**71,71%**	**$ 1.903.304.169,63**
20/11/2022	**Semana 30**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	78,26%	285	$ 2.026.966.815,96		$ -	**78,79%**	**$ 2.090.986.282,22**
27/11/2022	**Semana 31**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	85,51%	310	$ 2.214.648.928,55		$ -	**85,86%**	**$ 2.278.668.394,81**
4/12/2022	**Semana 32**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	92,75%	335	$ 2.402.331.041,14		$ -	**92,93%**	**$ 2.466.350.507,40**
11/12/2022	**Semana 33**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	100,00%	345	$ 2.590.013.153,73			**100,00%**	**$ 2.654.032.619,99**

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 16-10-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**42**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 02 de noviembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-122-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No 26

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 26 cuyo periodo es del 17 de octubre del 2022 hasta 23 de octubre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 20 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 2/11/2022
HORA: 9:58:29 a. m.
20224300418212
