INFORME SEMANAL 26

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 26**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 26

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **17/10/2022** al **23/10/2022** | Fecha **23/10/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR — **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220576
Contratista		CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	2.654.032.619,99
Variación del valor	$	882.324.674,00
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial (Días)		150 Días
Plazo actual (Días)	226 Días	7,5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo		76 Días
Fecha Contractual de terminación		11/12/2022
Tiempo Transcurrido (días)	180	79,65%
Días remanentes del Contrato	49,00	21,68%
Acumulado a última acta pagada	$	821.329.766,06
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	1.404.101.290,40

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.		2220587
Interventor		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	303.315.624,00
Variación del valor	$	100.836.311,00
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial		150 Días
Plazo actual	226 Días	7,5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo		76 Días
Fecha Contractual de terminación		11/12/2022
Ejecución del Contrato	180	79,65%
Días remanentes del Contrato	49,00	21,68%
Acumulado a última acta pagada	$	88.078.501,16
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	44.316.958,56

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.788.556.524,18	67,39%	$ 1.627.187.399,32	61,31%	-$ 161.369.124,86	-6,08%
Durante el Periodo	$ 50.648.545,01	1,91%	$ 38.973.704,87	1,47%	-$ 11.674.840,15	-0,44%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.839.205.069,19**	**69,30%**	**$ 1.666.161.104,18**	**62,78%**	**-$ 173.043.965,01**	**-6,52%**

Semáforo


Desviación en días: 10 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha de corte del presente informe tenemos el siguiente reporte:
En cuanto a la actividad 2 a corte del 16 de octubre se tenían aprobados 256 diagnósticos, durante la semana del presente informe se aprobaron otros 30 diagnósticos para un total de 286, sin embargo, conforme a la reprogramación de obra deberían tener 345 diagnósticos aprobados, es decir, se presenta un atraso de 59 diagnósticos. El atraso para esta actividad corresponde al 12%.
El avance de la actividad 3 nos indica las siguientes cifras: un programado del 68,54% frente a un ejecutado del 62,13% lo cual representa un atraso de 6,41% Este atraso corresponde a 8 viviendas, ya que conforme a lo programado se deberían tener terminadas 199 viviendas y con corte al 23 de octubre se contaban con 191 viviendas terminadas.
El atraso general del proyecto equivale al 6,52%, lo que representa un leve incremento con relación a la semana anterior, aunque el incremento no es grande si preocupa a la Interventoría que no se estén tomando los controles respectivos para nivelar la programación de obra. Mas aún si se considera que estamos a 49 días de terminar el plazo contractual, plazo en el cual se deben terminar las 154 viviendas restantes objeto del contrato.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

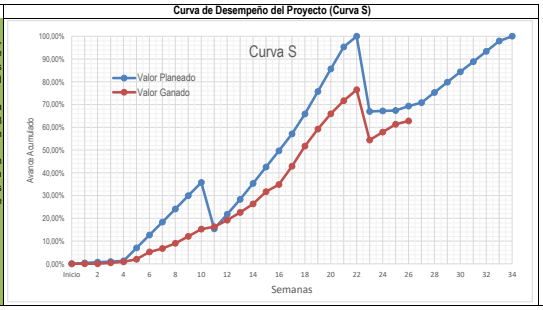




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	67,39%	61,31%	-6,08%	
Durante el Periodo	1,91%	1,47%	-0,44%	
Acumulado a la Fecha	**69,30%**	**62,78%**	**-6,52%**	

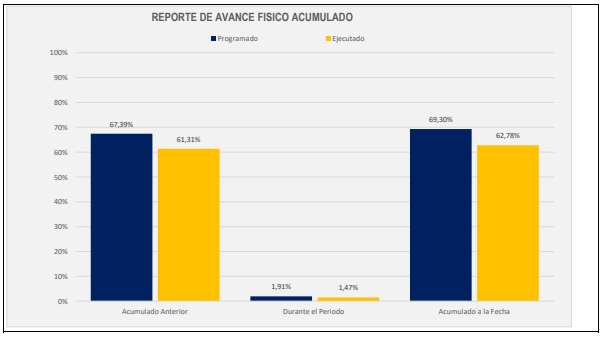


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
2	$ 821.329.766,06	46,36%	1	$ 379.134.821,64	21,40%	12/09/2022	$ 379.134.821,64








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
4	$ 88.078.501,16	43,50%	4	$ 88.078.501,16	43,50%		$ 39.483.466,03







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 88,00%
Lo cual nos indica un atraso del 12%
Comentario: A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene 286 diagnósticos aprobados en actas, sin embargo, la cantidad programada es del 345 indicándonos un atraso de 59 diagnósticos por aprobar, la interventoría requerirá al Contratista para la entrega de los diagnósticos pendientes en el mes de octubre.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 68,54% vs 62,13% EJECUTADO
Lo cual nos indica un atraso del 6,41%
En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato la meta es de 345 viviendas, a la fecha se deben tener terminada 199 intervenciones según la reprogramación de obra, sin embargo, se han intervenido 233 viviendas, de las cuales se han terminado 191 y se adelantan labores constructivas en 42 más, el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo. En la última semana el atraso incrementó con base en el reporte anterior, es necesario que el contratista acelere la actividad 2 de diagnóstico con el fin de tener identificadas dichas viviendas de tal forma que no se constituya en un motivo de atraso para la actividad 3. Además de atender las solicitudes que ha venido haciendo la interventoría de incrementar los rendimientos en la ejecución de las obras, con el fin de aumentar el número de viviendas terminadas. La Interventoría no evidencia acciones de parte del contratista para controlar los atrasos del proyecto

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 26

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/10/2022** al **23/10/2022** Fecha **23/10/2022**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. En la presente semana se aprobaron 30 diagnósticos correspondientes a los 108 de la adición, con lo cual completan 286 diagnósticos aprobados.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
Con corte al 23 de octubre se han intervenido 233 viviendas de las cuales solo 191 están terminadas, El contratista tiene en ejecución 42 intervenciones y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras y poder finalizar este primer grupo de viviendas para concentrar los esfuerzos en las 108 viviendas que hacen parte de la adición.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 24 al 30 de octubre de 2022 el contratista debe tener terminadas 214 intervenciones de acuerdo a la reprogramación de obra, por lo cual deberá incrementar sus esfuerzos en las actividades 2 y 3, esto teniendo en cuenta las nuevas metas establecidas en el contrato de obra conforme a las adiciones realizadas. Se deberá continuar con la etapa de diagnóstico para la identificación y aprobación de las nuevas viviendas y con la terminación de las viviendas que se encuentran en ejecución y que hacen parte de la meta inicial del contrato, esto con el fin de poder continuar con la ejecución de las 108 nuevas viviendas dentro del plazo contractual.
Como a la fecha se presenta un atraso en la actividad 2 y 3 se deberá vincular más personal de obra para atender las necesidades del proyecto, ya que no hay lugar a más prórrogas, es decir, en las próximas semanas hasta la fecha del 11 de diciembre 2022 se deberá dar cumplimiento al objeto contractual.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	59	0	59	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	59	0	59	100,00%



OBSERVACIONES

En el presente periodo No presentaron lluvias.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A			N/A		

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A			N/A	

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 26

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/10/2022** al **23/10/2022** Fecha **23/10/2022**






ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS






CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO, LEVAMTE DE MAMPOSTERIA Y PEÑETE INTERNO

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-079-22 con el asunto: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_103 mediante del cual realizamos entrega de aval para 19 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 019
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-080-22 con el asunto: SOLICITUD PLANILLA DE AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA mediante el cual solicitamos la planilla de afiliación a la seguridad social de los obreros (maestros, oficiales y ayudantes).
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-081-22 con el asunto: REMISIÓN DE INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO No. 17 APROBACIÓN REPROGRAMACIÓN DE OBRA por medio del cual remitimos INFORME TECTNICO ESPECIALISTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUETO No.17, el especialista de la Interventoría realizó la revisión de la información entregada por el contratista relacionada con los ajustes a la reprogramación de obra conforme a la adición y prórroga del contrato, en la cual se evidencia que se atendieron las observaciones realizadas por la Interventoría, en razón a lo anterior se aprueba la reprogramación presentada y a partir de la fecha se realizará el seguimiento con esta versión.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-082-22 con el asunto: INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO No. 17 al contratista mediante el cual se da aprobación a la programación de obra.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-083-22 con el asunto: SOLICITUD CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION. Mediante el cual solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en varios comités de obra se han comprometido a la entrega semanal de por lo menos 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-084-22 con el asunto: RESPUESTA A OFICIO CON OBSERVACONES POR PARTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CORDOBA, BOLIVAR. Por medio del cual emitimos respuesta al comunicado recibido el día 27 de septiembre de 2022 por la PERSONERIA MUNICIPAL DE CORDOBA, BOLIVAR.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-085-22 con el asunto: REITERACIÓN Solicitud respuesta Observaciones recorrido de campo Visita Ministerio de Vivienda por medio del cual reiteramos solicitud de dar respuesta a la mayor brevedad a las observaciones del informe de visita de supervisión del Ministerio de Vivienda del 14 de julio 2022 en el barrio San Martin de Córdoba Bolívar.

Marcy A. Correa C		[signature]	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	23/10/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	188	28	188	1	223	223	223	0	0	188	35	107	0	97	0	256	295	29	285	1	233	191	0	42	345
	TOTAL	**217**	**0**	**188**	**28**	**188**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**107**	**0**	**97**	**0**	**256**	**295**	**29**	**285**	**1**	**233**	**191**	**0**	**42**	**345**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/10/2022 Y EL 23/10/2022 PLAZO: 7.5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 23/10/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x

SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ92-VE-168	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ92-VE-169	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$2.230.924,70	$2.230.924,70	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$8.930.810,61	$8.930.810,61	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.116.195,29	$8.116.195,29	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	133	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	134	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	136	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	137	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	138	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	139	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	141	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	142	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	143	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	144	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	145	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	146	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	147	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	148	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	149	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	150	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$8.311.308,81	$8.311.308,81	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	152	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	8/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	153	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	9/09/2022	TERMINADA	17/09/2022	23/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	154	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Caseta t2	$4.292.672,67	$4.292.672,67	10/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	155	B-C-SM-MZ23-VE-117	100%	Adecuacion	$4.772.651,25	$4.772.651,25	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	156	B-C-SM-MZ59-VE-187	100%	Adecuacion	$8.212.157,27	$8.212.157,27	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	157	B-C-SM-MZ34-VE-116	100%	Caseta t3	$7.989.636,90	$7.989.636,90	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	159	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	160	B-C-SM-MZ87-VE-189	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	161	B-C-SM-MZ18-VE-202	100%	Adecuacion	$8.298.564,37	$8.298.564,37	14/09/2022	TERMINADA	19/09/2022	25/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	162	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	14/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	163	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Adecuacion	$4.292.672,67	$4.292.672,67	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	164	B-C-SM-MZ75-VE-070	100%	Adecuacion	$4.222.499,91	$4.222.499,91	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	18	165	B-C-SM-MZ67-VE-078	100%	Adecuacion	$5.110.794,97	$5.110.794,97	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	166	B-C-SM-MZ34-VE-119	100%	Adecuacion	$7.021.881,94	$7.021.881,94	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	167	B-C-SM-MZ56-VE-190	100%	Adecuacion	$7.154.236,55	$7.154.236,55	17/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	168	B-C-SM-MZ56-VE-191	100%	Caseta t3	$8.896.139,02	$8.896.139,02	17/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	169	B-C-SM-MZ31-VE-199	100%	Adecuacion	$4.691.093,17	$4.691.093,17	18/09/2022	TERMINADA	24/09/2022	30/09/2022	6	12	-6		x
SM	18	170	B-C-SM-MZ67-VE-183	100%	Caseta t3	$6.957.541,97	$6.957.541,97	18/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	171	B-C-SM-MZ30-VE-200	100%	Caseta t3	$8.312.234,66	$8.312.234,66	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	172	B-C-SM-MZ31-VE-201	100%	Caseta t3	$6.950.167,16	$6.950.167,16	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	173	B-C-SM-MZ47-VE-105	100%	Adecuacion	$3.899.268,01	$3.899.268,01	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	14	174	B-C-SM-MZ68-VE-108	100%	Adecuacion	$3.617.504,69	$3.617.504,69	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	175	B-C-SM-MZ145-VE-208	100%	Adecuacion	$6.196.096,01	$6.196.096,01	21/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	5	11	-6		x
SM	12	176	B-C-SM-MZ66-VE-198	100%	Adecuacion	$5.360.187,87	$5.360.187,87	21/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	177	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	100%	Caseta t3	$9.273.205,89	$9.273.205,89	22/09/2022	TERMINADA	30/09/2022	6/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	178	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	100%	Adecuacion	$7.909.051,57	$7.909.051,57	22/09/2022	TERMINADA	28/09/2022	4/10/2022	6	12	-6		x
SM	17	179	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	100%	Adecuacion	$7.056.470,53	$7.056.470,53	23/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	6	12	-6		x
SM	15	180	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	100%	Caseta t3	$7.321.539,69	$7.321.539,69	23/09/2022	TERMINADA	1/10/2022	7/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	181	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	100%	Adecuacion	$5.983.563,40	$5.983.563,40	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	182	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	100%	Adecuacion	$7.900.843,94	$7.900.843,94	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	183	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	100%	Caseta t3	$7.343.027,38	$7.343.027,38	25/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	184	B-C-SM-MZ98-VE-INC-008	100%	Caseta t3	$7.345.145,38	$7.345.145,38	26/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	185	B-C-SM-MZ87-VE-INC-009	100%	Adecuacion	$6.166.474,80	$6.166.474,80	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	186	B-C-SM-MZ48-VE-INC-010	100%	Adecuacion	$7.156.353,68	$7.156.353,68	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	187	B-C-SM-MZ38-VE-INC-013	100%	Caseta t3	$8.739.765,67	$8.739.765,67	28/09/2022	TERMINADA	6/10/2022	12/10/2022	8	14	-6		x

SM	15	188	B-C-SM-MZ33-VE-INC-014	100%	Adecuacion	$7.094.395,09	$7.094.395,09	28/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	189	B-C-SM-MZ55-VE-064	100%	Adecuacion	$7.807.428,21	$7.807.428,21	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	190	B-C-SM-MZ145-VE-161	100%	Adecuacion	$8.918.748,97	$8.918.748,97	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	191	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	100%	Adecuacion	$7.948.410,17	$7.948.410,17	30/09/2022	TERMINADA	5/10/2022	11/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	192	B-C-SM-MZ33-VE-INC-016	100%	Caseta t3	$7.602.156,55	$7.602.156,55	30/09/2022	TERMINADA	8/10/2022	14/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	193	B-C-SM-MZ85-VE-INC-019	85%	Caseta t3	$7.773.487,18	$6.607.464,10	1/10/2022	EN EJECUCION	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	194	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	85%	Caseta t3	$8.333.260,29	$7.083.271,25	1/10/2022	EN EJECUCION	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	195	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	85%	Caseta t3	$8.094.089,35	$6.879.975,95	2/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	196	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	85%	Caseta t3	$7.629.024,81	$6.484.671,09	2/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	197	B-C-SM-MZ33-VE-INC-032	85%	Caseta t3	$8.036.839,77	$6.831.313,80	3/10/2022	EN EJECUCION	11/10/2022	17/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	198	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	85%	Caseta t3	$7.811.643,60	$6.639.897,06	4/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	199	B-C-SM-MZ33-VE-INC-027	85%	Caseta T2	$8.012.216,20	$6.810.383,77	5/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	200	B-C-SM-MZ66-VE-INC-033	85%	Adecuacion	$6.628.918,24	$5.634.580,50	5/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	201	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	75%	Caseta t3	$7.997.347,42	$5.998.010,57	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	202	B-C-SM-MZ98-VE-INC-036	75%	Caseta t3	$7.885.031,34	$5.913.773,51	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	203	B-C-SM-MZ85-VE-INC-038	75%	Caseta t3	$8.272.191,01	$6.204.143,26	7/10/2022	EN EJECUCION	15/10/2022	21/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	204	B-C-SM-MZ93-VE-INC-039	75%	Adecuacion	$7.727.983,14	$5.795.987,36	7/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	205	B-C-SM-MZ93-VE-INC-040	75%	Adecuacion	$7.621.248,46	$5.715.936,35	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	206	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	75%	Adecuacion	$7.737.812,12	$5.803.359,09	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	207	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	75%	Caseta t3	$8.221.884,89	$6.166.413,67	8/10/2022	EN EJECUCION	16/10/2022	22/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	208	B-C-SM-MZ96-VE-INC-046	65%	Caseta t3	$9.156.805,39	$5.951.923,50	9/10/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	209	B-C-SM-MZ95-VE-INC-049	65%	Caseta t3	$8.256.966,48	$5.367.028,21	10/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	210	B-C-SM-MZ32-VE-INC-050	65%	Caseta t3	$7.745.465,56	$5.034.552,61	11/10/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	211	B-C-SM-MZ36-VE-INC-051	65%	Adecuacion	$7.443.842,89	$4.838.497,88	12/10/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	212	B-C-SM-MZ30-VE-INC-052	65%	Caseta t3	$8.090.760,97	$5.258.994,63	13/10/2022	EN EJECUCION	21/10/2022	27/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	213	B-C-SM-MZ94-VE-INC-053	65%	Adecuacion	$5.710.686,86	$3.711.946,46	13/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	214	B-C-SM-MZ-VE-INC-055	65%	Adecuacion	$7.242.404,18	$4.707.562,72	13/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	215	B-C-SM-MZ-VE-INC-056	65%	Adecuacion	$7.673.332,15	$4.987.665,90	14/10/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	216	B-C-SM-MZ86-VE-INC-057	65%	Caseta t3	$7.705.011,19	$5.008.257,27	15/10/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	29/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	217	B-C-SM-MZ86-VE-INC-058	65%	Caseta t2	$8.107.440,98	$3.648.348,44	16/10/2022	EN EJECUCION	24/10/2022	30/10/2022	8	14	-6		x
SM	19	218	B-C-SM-MZ48-VE-INC-011	45%	Adecuacion	$6.827.750,12	$3.648.348,44	17/10/2022	EN EJECUCION	22/10/2022	31/10/2022	5	14	-6		x
SM	17	219	B-C-SM-MZ91-VE-INC-062	45%	Adecuacion	$4.551.930,25	$3.648.348,44	17/10/2022	EN EJECUCION	22/10/2022	1/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	220	B-C-SM-MZ87-VE-INC-063	45%	Adecuacion	$7.258.523,54	$3.648.348,44	18/10/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	2/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	221	B-C-SM-MZ67-VE-INC-064	45%	Adecuacion	$5.250.910,34	$3.648.348,44	18/10/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	3/11/2022	5	14	-6		x
SM	17	222	B-C-SM-MZ91-VE-INC-065	45%	Caseta T3	$8.132.709,35	$3.648.348,44	19/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	4/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	223	B-C-SM-MZ21-VE-INC-066	45%	Caseta T3	$8.884.140,18	$3.648.348,44	19/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	5/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	224	B-C-SM-MZ47-VE-INC-068	45%	Adecuacion	$5.141.678,32	$3.648.348,44	20/10/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	6/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	225	B-C-SM-MZ47-VE-INC-069	45%	Adecuacion	$5.804.814,20	$3.648.348,44	20/10/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	7/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	226	B-C-SM-MZ46-VE-INC-070	45%	Adecuacion	$7.533.082,62	$3.648.348,44	20/10/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	8/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	227	B-C-SM-MZ32-VE-INC-071	45%	Adecuacion	$4.494.495,27	$3.648.348,44	21/10/2022	EN EJECUCION	26/10/2022	9/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	228	B-C-SM-MZ32-VE-INC-072	45%	Adecuacion	$2.547.155,48	$3.648.348,44	21/10/2022	EN EJECUCION	26/10/2022	10/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	229	B-C-SM-MZ32-VE-INC-073	45%	Adecuacion	$5.899.252,59	$3.648.348,44	22/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	11/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	230	B-C-SM-MZ95-VE-INC-025	45%	Caseta T3	$7.925.272,79	$3.648.348,44	22/10/2022	EN EJECUCION	30/10/2022	12/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	231	B-C-SM-MZ48-VE-INC-029	45%	Adecuacion	$8.123.075,86	$3.648.348,44	22/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	13/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	232	B-C-SM-MZ86-VE-INC-030	45%	Caseta T3	$8.938.581,32	$3.648.348,44	23/10/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	14/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	233	B-C-SM-MZ98-VE-INC-031	45%	Caseta T3	$7.166.340,15	$3.648.348,44	23/10/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	15/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	234	B-C-SM-MZ32-VE-INC-017	45%	Caseta T3	$7.936.218,15	$3.648.348,44	23/10/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	16/11/2022	8	14	-6		x

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		58.879.439,91	$		2.590.013.153,73	$	-	$	2.654.032.619,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		58.879.439,91	$		2.590.013.153,73	$	-	$	2.654.032.619,99
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,00%**	**$**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,10%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	7,38%	24	$ 4.348.020,18	0,00%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,22%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	9,23%	30	$ 5.435.025,22	0,87%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**2,12%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	12,92%	42	$ 7.609.035,31	1,74%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**3,35%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,69%	51	$ 9.239.542,88	2,90%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**4,57%**	**$ 121.187.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	21,85%	71	$ 12.862.893,03	4,06%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**5,85%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	28,92%	94	$ 17.029.745,70	5,22%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**7,16%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,38%	115	$ 20.834.263,35	6,38%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**8,45%**	**$ 224.284.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	7,54%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**9,78%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	8,70%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**14,09%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	49,23%	160	$ 28.986.801,19	13,04%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**15,08%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	52,31%	170	$ 30.798.476,26	13,91%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**18,60%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35	55,08%	179	$ 32.428.983,83	17,39%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**20,38%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	62,46%	203	$ 36.777.004,01	19,13%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**24,57%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	23,19%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**27,83%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	26,38%	101	$ 770.397.786,44		$ -	**30,70%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	29,28%	116	$ 884.813.299,28		$ -	**35,01%**	**$ 929.266.674,74**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	33,62%	137	$ 1.044.995.017,25		$ -	**41,05%**	**$ 1.089.448.392,71**
25/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	39,71%	149	$ 1.136.527.427,52		$ -	**44,50%**	**$ 1.180.980.802,98**
2/10/2022	**Semana 23**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	43,15%	160	$ 1.220.432.136,94		$ -	**47,66%**	**$ 1.264.885.512,40**
9/10/2022	**Semana 24**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,92%	237	$ 42.936.699,26	46,38%	174	$ 1.306.267.503,62		$ -	**51,03%**	**$ 1.354.344.229,23**
16/10/2022	Semana 25	100,00%	$ 5.140.026,35	78,77%	256	$ 46.378.880,00	50,43%	185	$ 1.349.246.419,91		$ -	**52,78%**	**$ 1.400.765.326,26**
23/10/2022	**Semana 26**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**88,00%**	**286**	**$ 51.811.905,00**	**63,19%**	**191**	**$ 1.404.101.290,40**		$ -	**55,05%**	**$ 1.461.055.221,75**
30/10/2022	**Semana 27**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			66,67%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
6/11/2022	**Semana 28**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			73,33%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
13/11/2022	**Semana 29**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			80,00%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
20/11/2022	**Semana 30**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			87,25%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
27/11/2022	**Semana 31**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			94,49%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
4/12/2022	**Semana 32**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			100,00%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
11/12/2022	**Semana 33**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			100,00%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**

TOTAL DIAGNOSTICOS APROBADOS **286**

TOTAL INTERVENCIONES TERMINADAS **191**

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 23-10-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**42**

COMPONENTE HSE DEL PROYECTO

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., CERTIFICA;

Que durante el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del 2022, **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A** con **NIT: 800173768-1**, evidencia que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES de acuerdo con las obligaciones del contrato 2220576 con objeto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.)., da el cumplimiento normatividad ambiental, se evidencia la implementación del Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto, evidenciando la implementación de los programas mediante las fichas de manejo ambiental.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., al primer día (1) del mes de noviembre de 2022.

Marcy A. Correa C

Marcy Alejandra Correa Castaño
Director de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.

Formato
Control De Licencias Ambientales
IN-FO-53 V:3

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PERMISO	LOCALIZACIÓN	MATERIAL	NO LICENCIA / PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	VIGENCIA / LICENCIA / PERMISO
Cantera Triturados y Agregados del Caribe S.A.S Licencia Ambiental	Bosconia Cesar	Por medio de la cual se otorga a A& G Constructores S.A.S. con identificación tributaria N° 900193651-7 Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimineto de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de conseción minera KHE -08121 del 24 de noviembre del 2009.	Resolución 743 del 2018	CORPOCESAR	30 años
Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A Licencia Ambiental	Bosconia Cesar	Aprobar la CESION DEL 100% de los derechos preferencias. beneficios y obligaciones emanados del Contrato de concesion 0363-20, de la Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A a favor de la Sociedad MARMOLES VENEZIANOS LTDA., segun Resolucion 00006 del 11/01/2012 y modificada con la Resolucion 000162 del 24/09/2012.	Resolución 1266 del 2008	CORPOCESAR	30 años

YIRA LEMUS GÓMEZ. ESP. AMBIENTAL
Diligencia

Formato
Informe HSE Interventoría No 08
IN-FO-11 V.1

ARCA

PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	PERIODO			1 al 31 de octubre de 2022		
		CUMPLIMIENTO					
ITEM	ASPECTOS PARA DESTACAR EN LA GESTIÓN MENSUAL (CONTRATISTA)	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	ASPECTOS A MEJORAR
IMPLEMENTACIÓN DEL SG SST	El contratista cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, el cual se ha venido implementado en el transcurso del periodo ejecutado, se evidencia la afiliaciones del personal tanto administrativo, como operativo. Se implementó el PAPSO, actualmente se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se continúa con la implementación de las medidas de bioseguridad: toma de temperatura, encuesta de auto condiciones, limpieza y desinfección de puestos de trabajo y oficinas con hipoclorito diluido y alcohol. El personal del contratista cuenta con los EPP requeridos y los utiliza de manera correcta. Se tienen publicadas las políticas y normas de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se cuenta con elementos para atención de emergencias y la brigada de emergencias. Plan de trabajo anual 90 %. Programa de capacitaciones ejecutado en un 100% Programa de inspecciones ejecutado en un 100%. Implementación del PAPSO en un 100%.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Continuar con la implementación de la interventoría
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado continua presentando los soporte de pago de seguridad social de 25 personas y/ o afiliaciones del personal administrativo y operativo que trabajo, estas son revisadas y avaladas por el profesional PGIO del contratista, así mismo son verificados por la interventoría donde se evidencia que se realizaron las afiliaciones correspondientes en caso de no presentarse la información pertinente se restringe el ingreso a obra del personal que no cuente con afiliaciones o pagos vigentes por parte de interventoría.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de la información completa para el ingreso del personal de acuerdo a los lineamientos establecidos por la interventoría.
DOTACIÓN Y ELEMÉNTOS DE PROTECCION PERSONAL	En recorridos diarios realizados por Interventoría, se evidencia la entrega y reposición de los EPP, uso de dotación, en el periodo se mantiene la entrega de tapabocas como medida preventiva para el peligro biológico presente por COVID -19 , se exige el uso adecuado, se reitera al contratista realizar inspección diaria, verificando las condiciones de la dotación y porte de la misma de acuerdo al manual de imagen de Enterritorrio.		X		50%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de Elementos de protección personal y la dotación al personal de obra y asegurar el uso por parte del contratista.
PLAN DE EMÉRGENCIAS, EQUIPOS DE ATENCION DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION	En el periodo se realiza ubicación de señalización preventiva, de obligatoriedad y de salvamento, se establecen salidas de emergencias, de acuerdo a la dinámica y avance de la obra ,así mismo se mantienen punto de encuentro, puntos con elementos de atención a emergencias con camilla, botiquín, extintor , ubicado en el campamento de obra, se tiene realizo la conformación de la brigada para atención de emergencias, en el periodo no se presentaron emergencias.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento que se encuentre el personal de obra se debe realizar la conformación de la brigada de emergencia.
PLAN DE TRABAJO ANUAL, CAPACITACIONES Y CHARLAS	El contratista inicia con la realización de charlas diarias por parte del profesional PGIO. Interventoría realiza la revisión y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido en el SG-SST, se evidencia el cumplimiento del 90 % , se recomienda al contratista realizar todas las actividades planeadas.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer entrega de los soportes del informe, y realizar todas actividades planificadas.
CONFORMACION Y REUNIONES DE COMITÉ COPASST Y CONVIVENCIA.	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, realizo reunión del Copasst el 19 de octubre del 2022, para el periodo no aplica realizar reunión de comité de convivencia laboral, así mismo se evidencia que para el periodo no se presenta posibles casos para ser evaluados por el COCOLA.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la reuniones mensuales y trimestrales de cada uno de los comités.
PAZ Y SALVOS TRABAJADORES	Se realiza la entrega por parte del contratista Consorcio Construredes de 9 paz y salvos de personal retirado del mes de septiembre, así mismo se evidencia el retiro de 2 personas , las cuales se presenta los paz y salvos, se evidencia la falta de la entrega del señor Oswaldo Garzón, este profesional fue retirado en el mes mayo del 2022.		X		50%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento de salida de personal realizar la entrega de paz y salvo
PERMISOS DE TRABAJO (ALTURA, CALIENTE, ESPACIO CONFINADO)	De acuerdo al avance de obra el contratista continua realizando tareas de alto riesgo en trabajo en alturas (TSA) , por lo cual implementa los formatos requeridos de acuerdo a los procedimientos establecidos para dichas actividades como (permisos, inspecciones preoperacionales y análisis de trabajo seguro (ATS) de la diferente maquinaria, equipos y herramientas electromecánicas) estos firmados y avalados por profesional de apoyo PGIO del contratista, interventoría sugiere realizar seguimiento a las medidas preventivas establecidas en los ATS realizados para las actividades.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar el diligenciamiento de los permisos de acuerdo a las actividades de alto de riesgo ejecutadas(Trabajo en Altura)
ASPECTOS AMBIENTALES (AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	• La Interventoría evidencia que el contratista ha implementado las medidas de manejo ambiental establecidas en el contrato se debe reforzar las mejoras en los acopios de material, en cuanto a señalización señalizados y demarcados, se solicita el constante orden y aseo en espacios exteriores, por lo que el contratista toma las medidas necesarias y realiza las respectivas jornadas. • Se cuenta con la documentación de los materiales como insumos, equipos, maquinaria, volquetas, entre otros. Se solicito al contratista hacer refuerzo en el acopio, en el manejo de suelo reforzar las hojas de seguridad y las etiquetas. • En este periodo ingresó material granular a obra. Los certificados y permisos ambientales de los proveedores de estos materiales fueron presentados Licencia Ambiental de la Resolución 1266 del 2008 se evidencia que Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A. está avalado para explotación y comercialización de material pétreo, se solicita al contratista realizar el requerimiento al proveedor la actualización del título minero HHNL-20ya que se tenía vigente hasta el 02 de agosto del 2037. • La obra cuenta con un punto ecológico el cual fue adecuado con la nueva normatividad en colores, dichos puntos están señalizados y demarcados, de tal manera que los trabajadores identifiquen donde deben realizar el depósito de los residuos. Solamente fue necesario realizar el retiro de residuos sólidos ordinarios de obra. • La Interventoría sugiere mantener y mejorar los puntos de acopio de los materiales granulares que se encuentran en obra, en cuanto señalización , demarcación y protección. • La Interventoría solicita de manera permanente el orden y aseo dentro del proyecto, se insistió en la generación de una brigada de orden y aseo para mantener los espacios organizados.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Darle cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto.
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION	• Para este periodo Para el periodo del mes de octubre de 2022, se realizaron actividades de excavaciones de las cimentaciones de las baterías sanitarias y la estructura de soporte del tanque elevado, los materiales obtenidos de las excavaciones realizadas, la cantidad reutilizada fue 45 m3 para compartir las zapatas de las estructuras del tanque elevado y para conformar el relleno de las plantillas cuando se requiere ganar altura para las pendientes de adecuación de las baterías sanitarias.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN OBRA	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, se evidencia un vehículo, el uso de herramientas menores (pulidoras) que se encuentran en obra cuentan con la documentación reglamentaria y aprobación de la interventoría. A la fecha de corte de este periodo informado se cuenta con la autorización de acceso para:-1 volquetas.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar todas las inspecciones realizadas en el proyecto
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DE LA OBRA	Actualmente el Contratista cuenta con un punto ecológico en obra y con un recipiente rojo adicional destinado solo a la disposición de los residuos generados por la implementación del PAPSO en obra. Se entregaron los residuos ordinarios generados en obra al recolector autorizado del municipio.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
MANEJO DE CAMPAMENTO (SERVICIOS SANITARIOS)	El proyecto de obra cuenta con el respectivo campamento, el mismo se encuentra señalizado, se tiene 1 unidad sanitaria para el servicio del personal femenino y masculino, se cuenta con área de almacén y punto de atención al ciudadano.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Verificar el uso de baño de los trabajadores en los frentes de trabajo.
OTROS CUALES	En recorridos diarios realizados por interventoría se evidencia la presencia de condiciones inseguras y la ocurrencia actos inseguros por parte de los trabajadores, los cuales son direccionados al profesional SST del contratista para que sean subsanados de manera inmediata, mejorando así las condiciones y controlando los peligros presente durante la ejecución de la actividades, a los cuales el contratista realiza la gestión necesaria para atender las solicitudes realizadas. En el periodo no se presentaron casos positivos para covid-19.						

	ASPECTOS PARA DESTACAR (INTERVENTORÍA)
SEGUIMIENTO A NIVEL CUMPLIMIENTO FRENTE A NORMATIVA EN SST (Evaluación Inicial, Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de peligros, Plan de formación anual, Plan de trabajo anual, Diagnostico de Condiciones, estadísticas de Incidentes, niveles de cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y Resolución 312 del 2019)	Interventoría cuenta con la documentación del SGSST para la implementación en obra , Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos . Actualmente se cuenta con 12 profesionales asesores de interventoría quienes apoyan el proceso desde sus áreas , todos cuentan con pagos de parafiscales con afiliaciones vigentes a la EPS, ARL , AFP y CCF ; a todos los profesionales se les han realizado los exámenes médicos de ingreso, conocen las políticas, procedimientos y protocolos establecidos en el SG-SST a si mismo el PAPSO establecido por la empresa y el aprobado para la obra ,se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos . Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales , para este periodo no se presentó ausentismo por enfermedad general, el personal se encuentra capacitado de acuerdo los peligros asociados y presentes durante la ejecución de sus actividades.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA (Señalización de obras, Manejo de aguas superficiales, Manejo y disposición de escombros, Transporte de materiales y escombros, Manejo de maquinaria y equipo, Almacenamiento y manejo de materiales de construcción, Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas de emisiones atmosféricas, Control de plagas. Licencias, permisos y tránsitos, Manejo de campamentos transitorios, Control de plagas)	Para este periodo la interventoría cuenta con un campamento, el mismo está debidamente señalizado, Se fomenta el orden y aseo y desinfección en cada puesto de trabajo de manera periódica. Se utiliza de manera responsable los recursos de energía, agua y papelería. Se cuenta con cartelera informativa. se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos.
	La Interventoría verifica y controla todos los aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los informes mensuales, RCD, maquinaria y equipos, documentación de licencias y certificados generados para el proyecto, las apreciaciones generadas se transmiten al contratista mediante informes técnicos, oficios, notas en bitácora y correos electrónicos.

INDICADORES RESULTADO SST

CONSTANTE K	100		

PERIODO	No TOTAL DE PERSONAS MENSUAL		No TOTAL DE HORAS MENSUALES				TOTAL HORAS TRABAJADAS		INCIDENTES LABORALES		No DIAS DE ENFERMEDADES COMUNES		No ACCIDENTES		No ACCIDENTES MORTALES		No. DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES LABORALES		DIAS CARGADOS POLIZA MUERTE		ENFERMEDAD LABORAL	
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTV HORA EXTRA	INTV HORA NOCTURNA	CONTRA HORA EXTRA	CONTRA HORA NOC	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
MAYO	0	0	0	870	0	5152	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNIO	0	29	0	5152	0	4458	5152	5152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JULIO	0	28	0	5152	0	4458	5152	5152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGOSTO	0	82	0	5152	0	5544	5152	5152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	59	0	5152	0	5280	5152	5152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCTUBRE	0	30	0	5152	0	4950	5152	5152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formato
Informe HSE Interventoría No 08
IN-F0-11 V.1

ARCA

PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	**PERIODO**	**1 al 31 de octubre de 2022**

PERIODO	SINIESTRALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS INCIDENTES LABORALES		MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		AUSENTISMO LABORAL		AUSENTISMO COMÚN		INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES		OBSERVACION INDICADORES INTERVENTORÍA	OBSERVACION INDICADORES CONTRATISTA
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA		
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,ni Incidentes laborales.	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,ni Incidentes laborales.
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

INDICADORES ESTRUCTURA Y PROCESO DE INTERVENTORÍA SST

PERIODO	POLITICA SG SST				FUNCIONAMIENTO COPASST				CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO ANUAL				INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES			
	N.° de trabajadores que conocen la Política	No. Total de Trabajadores	RESULTADO	ANALISIS	No de actas de reunión realizadas	No total de actas al mes	RESULTADO	ANALISIS	Actividades Ejecutadas X 100	No. Actividades Programadas	RESULTADO	ANALISIS	No de accidentes y/o Incidentes Investigados	No accidentes y/o Incidentes reportados	RESULTADO	ANALISIS
MAYO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
JUNIO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
JULIO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
AGOSTO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
SEPTIEMBRE	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
OCTUBRE	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo

REPORTE DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES DE TRABAJO

FECHA	INCIDENTE	ACCIDENTE	CEDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O ACCIDENTE	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	DÍAS DE INCAPACIDAD
N/A				N/A				N/A		

CAPACITACIONES Y CHARLAS

FECHA DE CAPACITACIÓN	TEMAS DE LA CAPACITACIÓN Y/O CHARLA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
octubre-22	Movimientos Repetitivos - Posturas Correctas		
octubre-22	Plan de Emergencia		

CONTROL AMBIENTAL

PERIODO	RELACION DE MATERIAL DE PETREO			DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS				RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN				ACCIDENTE E INCIDENTE AMBIENTAL				OBSERVACIONES DE AMBIENTALES
	Tipo de material	Cantidad	Cantera	RECICLABLES (papel, plástico, vidrio, chatarra)	ORDINARIO	PELIGROSOS	OTROS	DESCAPOTE	EXCAVACION	ESCOMBRO	ESCOMBRERA	FECHA	LUGAR	DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
MAYO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
JUNIO	ARENA DE RIO	35	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	32	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	35														
JULIO	ARENA DE RIO	35	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	65	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	30														
AGOSTO	ARENA DE RIO	119	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	27	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	Para el periodo no se presentaron accidentes de emergencia, , se ingreso material granular, y no se realizo retiro de material RCD, pero se realizo reutilización en el proyecto.
	GRAVA	70														
SEPTIEMBRE	ARENA DE RIO	98	Licencia Ambiental de la Resolución 1266 del 2008 se evidencia que Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A	0	0	0	0	0	0	42	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	50														
OCTUBRE	ARENA DE RIO	56	Licencia Ambiental de la Resolución 1266 del 2008 se evidencia que Sociedad MINERA DE LOS SANTOS S.A	0	0	0	0	0	0	45	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	50														

FOTOGRAFÍA






UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIOS VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

FOTOGRAFÍA





UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIOS VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

FOTOGRAFÍA




UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIO VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

OBSERVACIÓN Y/O CONCLUSIÓN: En este período se evidencio que dentro de los requerimientos hechos al contratista se ha cumplido en un 92,3 % con los aspectos de Seguridad industrial, Salud en el trabajo, Medio ambiente, se debe hacer la entrega de toda la documentación completa del personal que ingresa al proyecto, se evidencia la falta del buen uso de los elementos de protección personal y dotación establecida en el proyecto, falta de entrega de paz y salvos de personal retirado del proyecto, en los aspectos que hasta la fecha están pendiente se realizará un estricto control para que en este proyecto se minimicen los factores de riesgo de accidentes, se le solicita al contratista una gestión permanente. La interventoría verifica y controla todos estos aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los planes generados para el proyecto y la normatividad vigente en cuanto seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

7.	VERIFICACIÓN	APROBACIÓN
INSPECTOR Y/O RESIDENTE	COORDINADOR DE GESTIÓN HSEQ PROYECTO	DIRECTOR

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

“CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL 6.
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTORÍA

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

NOVIEMBRE 2 DE 2022

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL 6.

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Municipio	Córdoba	Contrato:		2220576 de 2022	
Contratista de obra	Consorcio Construredes	Contratista de interventoría		Arca Arquitectura e Ingeniería S.A.	
Fecha:	Noviembre 2 de 2022	Elaboró:	Norelis Anaya PérezProfesional Social – contratista	Revisó:	Fernanda Grijalba P. Social Interventorí a

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. ANTECEDENTES 6
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 7
4. LÍNEAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 8
4.1. Línea de Comunicación 8
4.1.1 Socializaciones: 8
4.1.2 Visitas Casa a Casa: 9
4.1.3. Levantamiento de diagnóstico. 12
4.1.4. Piezas de Divulgación: 12
4.2. Línea de Participación Comunitaria: 15
4.2.1. Conformación del Comité Veedor: 15
4.2.1.1 Reuniones Comité Veedor 15
4.2.2. Punto de Atención a la Comunidad: 16
4.2.3. Recepción y trámite de las PQRS: 17
4.2.4. Buzón de PQRS: 18
4.2.5. Recorridos de obra 19
4.2.6. Otras reuniones 21
4.3. Línea de Capacitación 21
4.3.1. Jornada de educación sanitaria 21
4.3.2. Visitas casa a casa e instalación de acrílicos 21
4.4. Reporte de Actividades Complementarias 22
4.4.1 Generación de Empleo 22
4.4.2 Memoria social del Programa 23
4.4.3 Capacitación al personal de obra no calificado 24
4.5 Reporte de Informes. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información del proyecto 6
Tabla 2 Material divulgativo 11
Tabla 3 Punto de atención a la Comunidad 12

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el presente informe, se dan a conocer las actividades desarrolladas en cada uno de las líneas de intervención del Plan de Gestión Social, que se ejecutaron en el marco del contrato de obra **N.º 2220576** cuyo objeto corresponde a "**CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)"** en el periodo comprendido entre 1 al 30 de septiembre del 2022, en el cumplimiento de los parámetros establecidos en el plan de Gestión Social del Programa de Conexiones Intradomiciliarias – PCI de agua potable y Saneamiento Básico, es importante mencionar que las actividades aquí plasmadas contaron con el acompañamiento de la Interventoría.

2. ANTECEDENTES

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, es un programa del Ministerio de Vivienda y ejecutado por ENTerritorio, con el cual se busca garantizar el acceso a los servicios mencionados a poblaciones vulnerables que no cuenten con estos servicios.

El municipio de Córdoba departamento de Bolívar, ha sido beneficiario en el marco de este programa, con la priorización de uno de sus barrios, cumpliendo con los criterios de focalización, el barrio San Martín, este se encuentra situado en el centro de la cabecera municipal, debido a su ubicación, este es un sector comercial, que es visitado diariamente por un gran número de personas en búsqueda de los productos y servicios que aquí se ofrecen, adicional, se cuenta con infraestructura vial en buen estado, que facilitan el tránsito vehicular y peatonal.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la información más relevante del proyecto.

Tabla 1 Información del proyecto

FECHA DE INICIO DE OBRAS:					
NOMBRE DEL MUNICIPIO	**NOMBRE BARRIOS A INTERVENIR**	**NOMBRE BARRIOS INTERVENIDOS**	**FECHA DE INFORME**	**N° DE VIVIENDAS A INTERVENIR POR BARRIO**	**N° DE VIVIENDAS INTERVENIDAS POR BARRIO**
CÓRDOBA BOLÍVAR	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN	Del 1 al 31 de octubre de 2022	286	240

4. LÍNEAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El componente de gestión social, se implementa desde el inicio del proyecto, bajo tres líneas estratégicas, este se encuentra enfocado en el trabajo directo con la comunidad, a través de actividades de socialización y participación, promoviendo la corresponsabilidad de las familias beneficiadas de los barrios focalizados.

4.1. Línea de Comunicación

Esta línea contempla una serie de actividades relacionadas con la transmisión y divulgación de la información del programa de Conexiones Intradomiciliarias a los potenciales beneficiarios del Barrio San Martín, en el marco de esta línea se pretende dar a conocer a través de estrategias comunicativas y metodologías participativas las particularidades del programa, en este sentido es vital que la comunidad conozca y se interese por solicitar información que promuevan el conocimiento y la apropiación de este programa.

Las actividades desarrolladas en el marco de esta línea de intervención, son vitales para la ejecución del programa, debido a que la comunidad contará con el conocimiento necesario, lo cual favorecerá el desarrollo de acciones de las demás líneas de acción. Por ello, es necesario la implementación de estrategias que contribuyan a la fácil comprensión de los objetivos del programa. Teniendo en cuenta la idea anterior, a continuación, se detallan las actividades realizadas bajo el enfoque de esta línea.

4.1.1 Socializaciones:

Durante este periodo no se desarrollan socializaciones, puesto que no fueron requeridas.

Tabla 2. Socializaciones.

Reuniones de Acercamiento y de socialización masiva	Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar de la actividad	Principales resultados	Ejecutó	Evidencias
N/A							

4.1.2 Socialización Casa a Casa:

Durante este periodo se realizaron visitas casa a casa:

-Se realizó visita a un beneficiario del PCI, el día 04 de octubre de 2022, con el fin dar respuesta al derecho de petición dirigido al contratista de obra el día 29 de septiembre, mediante el cual expuso que requería la visita del personal técnico para revisión de lo proyectado en el diagnóstico ya que está inconforme con la información suministrada por el profesional de diagnósticos. Debido a que determinó la instalación de lavaplatos y lavadero. De acuerdo con lo manifestado por el beneficiario, la vivienda se encuentra ubicada en un segundo piso y requiere la instalación de tanque elevado, por ello, el personal técnico del contratista de obra expresó que el proyecto no contempla la instalación de tanque en el segundo piso porque no está diseñado para ello. Al finalizar la visita el beneficiario se comprometió a facilitar los documentos de la vivienda (escritura pública) al profesional de diagnósticos, costos y presupuestos del contratista de obra, con el objetivo de revisar la documentación y entregar respuesta al beneficiario del PCI, de manera escrita. A la fecha de corte de este informe, no se ha entregado dicha respuesta al beneficiario ya que está en revisión por parte del supervisor del proyecto.
Ver evidencias.

-Se realizó visita a una beneficiaria del PCI, Rosario Cáceres, cuya vivienda se halla identificada con el código (B – C – SM - MNZ56 – VE – 060), el día 14 de octubre, la visita se realiza debido a que la beneficiaria se encuentra en condición de discapacidad motora, en

este caso, el personal técnico del contratista de obra no ha puesto en funcionamiento los aparatos hidrosanitarios debido a una situación que imposibilita la conexión del agua potable, debido a la necesidad de retirar un material (arena) que impide las actividades del personal de obra, lo cual fue aceptado por el beneficiario. Ya que la beneficiaria se encuentra en condición de adulto mayor, fue necesario conversar con un hijo que se encuentra a cargo de la misma, señalando por parte del personal técnico del contratista de obra que se realizará la conexión en el menor tiempo posible, ya que la beneficiaria requiere con urgencia la unidad sanitaria debido a su condición de salud, por ello el personal técnico y social de contratista de obra realizó la gestión correspondiente.
Ver evidencias.

- Se realizó recorrido en una de las viviendas intervenidas identificada con código (B – C – SM – MNZ – VE - 174), el día 18 de octubre de 2022, con la finalidad de conocer la satisfacción de la beneficiaria con respecto a la intervención, manifestó tener inquietudes frente al funcionamiento del tanque de agua, situación que fue resuelta por el personal técnico, quien acompañó la visita.
Ver evidencias.

- Se realizó una (1) visita casa a casa a un beneficiario del PCI, cuyo nombre es Tulio Virrareal, cuyo código de la vivienda corresponde a (B – SM – MNZ – VE - 064), el día 21 de octubre, en acompañamiento al personal técnico del contratista de obra, con el fin de identificar si presenta dudas e inquietudes referente a la intervención, en este caso, el personal técnico pregunta acerca de la percepción que se tiene con respecto a la intervención, el beneficiario manifiesta no tener inquietudes con respecto a la intervención, solamente manifiesta la posibilidad de que se le realice la conexión de la lavadora.
El profesional técnico expone que la intervención en la vivienda corresponde a la adecuación (instalación de sanitario, lavamanos, lavadero y ducha), debido a que en la visita de levantamiento de diagnóstico se verificó que la vivienda requiere de dichos aparatos

hidrosanitarios y el proyecto no contempla instalaciones o conexiones diferentes a los aparatos instalados.

Ver evidencias.

- Se realizó acompañamiento al personal técnico a una (1) visita, a la vivienda intervenida con código B – C –SM – MNZ87 – VE - 128, el día 25 de octubre de 2022, con el fin de realizar verificación del estado actual de la intervención.

Durante el desarrollo de esta actividad el beneficiario expresó inquietudes con respecto a la intervención, puesto que la vivienda no cuenta con acceso a agua potable y considera que en la intervención se debe hacer esta conexión. Ante esto el profesional de diagnósticos y el ingeniero residente de obra, comunicaron en el momento en el cual se inició la intervención, se explicó la necesidad de realizar por parte del beneficiario la conexión del agua potable a la red principal, ya que esta se suministraba a través de una vivienda cercana. Por ello, el beneficiario expresó que llevaría a cabo la gestión con el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado para la ruptura del pavimento y llevar a cabo la respectiva conexión. De esta manera, el beneficiario expresó realizar lo pertinente para que el contratista de obra realice la conexión intradomiciliaria.

Ver evidencias.

- Se realizó visita en compañía del personal técnico a beneficiaria del PCI, Arelis Villafañe Cantillo, cuya vivienda se encuentra identificada con el código (B – C – SM – MNZ – VE – INC - 073), el día 27 de octubre de 2022, esto con el fin de conocer si existen dudas e inquietudes frente a la intervención, adicional, retroalimentando a la beneficiaria sobre los aspectos relevantes del programa, manifestó que encuentra satisfecha con el avance de la intervención.

Ver evidencias.

4.1.3. Levantamiento de diagnóstico.

Se realizó el día 26 de octubre de 2022, acompañamiento al personal técnico encargado del levantamiento de diagnósticos, se llevaron a cabo visitas a cuatro (4) potenciales beneficiarios el PCI, a los cuales se les realizó previamente entrega de las piezas de divulgación del programa (volante 1, folleto 1), durante la visita el equipo social facilitó información relacionada con las generalidades técnicas y sociales del programa, se señaló que este proyecto busca mejorar las condiciones de las viviendas de los sectores vulnerables a través de la conexión intradomiciliaria y domiciliaria, según sea el caso. Además, se resaltó a los potenciales beneficiarios los documentos que debe facilitar si es propietario (certificado de libertad y tradición y escritura pública), para el caso de ser arrendatario, (contar con fotocopia del contrato de arrendamiento) y para poseedores (declaración extrajuicio de posesión, recibo de pago de servicios públicos que se encuentre a nombre del posible beneficiario y certificado de la Alcaldía sobre el pago del impuesto predial del inmueble a intervenir). Se resalta que las personas se mostraron interesadas y atentas a la información entregada.
Ver Evidencias.

4.1.4 Link del Programa

Durante este periodo no se actualizó información relacionada con este ítem.

4.1.4. Piezas de Divulgación:

4.1.4.1 Volantes y folletos

-Se realiza la divulgación del volante 1 y folleto 1. El volante n° 1, contiene información relacionada con la documentación que debe facilitar el propietario, el poseedor y el arrendatario al momento de la visita del personal de diagnósticos del contratista de obra, en caso de ser

propietario debe contar con certificado de libertad y tradición y escritura pública, y si es arrendatario, contar con fotocopia del contrato de arrendamiento y para poseedores declaración extrajuicio de posesión, recibo de pago de servicios públicos que se encuentre a nombre del posible beneficiario y certificado de la Alcaldía sobre el pago del impuesto predial del inmueble a intervenir. Además, se recalca la información contenida en el folleto n° 1, relacionada con los actores del programa, quienes ejecutarán las obras, actividades que se desarrollarán durante la ejecución del programa, información sobre la ubicación del Punto de Atención al Ciudadano, horario de atención y número de contacto.

Esta actividad de entrega de piezas informativas se llevó a cabo los días 6 y 7 de octubre a través de visita casa a casa a cada uno de los potenciales beneficiarios del PCI, los cuales atendieron la visita del equipo social y se mostraron atentos a la entrega de información mencionada anteriormente, además se mencionó que la intervención está sujeta al diagnóstico y al balance financiero del programa.

El día seis (6) de octubre se entregaron treinta (30) piezas de divulgación (volante 1, folleto 1) a cada potencial beneficiario del Programa de Conexiones Intradomiciliarias. Además, el siete (7) de octubre se entregaron treinta (30) piezas de divulgación (volante 1, folleto 1) a cada potencial beneficiario del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.

Ver evidencias.

-Se realiza la elaboración de la pieza de divulgación (oficio de invitación N°9). Invitación a reunión mensual a los miembros del Comité Veedor. Esta pieza fue divulgada el día 19 de octubre, se entregaron a cuatro de ellos, en cada una de sus residencias, ya que una miembro se encuentra fuera de la cabecera municipal.

Ver evidencias.

4.1.4.2 Valla Informativa

Durante este periodo continúa instalada la valla publicitaria en un lugar estratégico de la obra, específicamente en la Calle 10 - Carrera 9 barrio San Martín, actualmente se encuentra en condiciones óptimas, en la cual se puede evidenciar con facilidad la información del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar.

Ver evidencias.

4.1.4.3 Perifoneo

Durante este periodo no se reportan actividades en este ítem.

4.1.4.4 Carteleras Informativas

Durante este periodo, no se actualizó la información de las carteleras informativas, sin embargo continúan instaladas en la Alcaldía Municipal y establecimiento comercial ubicado en la calle 10 – carrera 6 Barrio San Martín.

Ver evidencias.

Tabla 3. Material divulgativo.

Núm de pieza	Material Utilizado	Descripción medio de divulgación	Fecha de Divulgación	Relación Evidencias
1	Instalación valla informativa	Valla Instalada	Desde mayo de 2022	- Registro fotográfico
2	Material Informativo y/o de convocatoria	Volante informativo	19-10-2022	- Registro fotográfico
3	Cartelera Informativa	Carteleras instaladas en la Alcaldía Municipal de Córdoba Bolívar y establecimiento comercial.	31-10-2022	- Registro fotográfico

4.2. Línea de Participación Comunitaria:

Esta línea tiene como objetivo incentivar la participación y responsabilidad ciudadana en la gestión del Control social sobre el Programa de Conexiones Intradomiciliarias, por ello se han apoyado las actividades realizadas por los demás entes comprometidos e inmiscuidos con el programa. A continuación, se describen las actividades realizadas bajo el marco de esta línea de intervención.

4.2.1. Conformación del Comité Veedor:

El comité de Veeduría Ciudadana del proyecto, se conformó el pasado 07 de abril de 2022. Fue reportado en el informe mensual 1.

4.2.1.1 Reuniones Comité Veedor

Para el día 21 de octubre de 2022, se programó el encuentro mensual con el Comité veedor, sin embargo, el espacio no se llevó a cabo debido a la inasistencia de sus miembros, cabe mencionar que, se realizaron llamadas telefónicas a cada uno de ellos, media hora antes de realizarse el encuentro, sin embargo no se obtuvo respuesta por parte de dos (2) de ellos y los otros tres (3) señalaron no encontrarse en la cabecera municipal.
Es de anotar que, la programación de la fecha y hora se acordó de manera mancomunada y adicional a esto, se reforzó la convocatoria con un oficio de invitación, entregado también con anterioridad (19 de octubre) a cuatro (4) de ellos en cada uno de sus domicilios.

Ver evidencias.

Tabla 4. Actividades con veedores.

Actividad	Barrio	Fecha	N° asistentes	Relación de Evidencias
Reunión dirigida a Comité Veedor	San Martín – Casa de la Cultura	21 de octubre de 2022	0	Evidencias fotográficas, acta de reunión

Ver evidencias.

4.2.2. Punto de Atención a la Comunidad:

El Punto de Atención a la comunidad, continúa ubicado en un lugar de fácil acceso para la ciudadanía, específicamente a la vía de acceso que conduce a la zona rural, ubicado en la Calle 3 Carrera 5 -1 Barrio Abajo, cuenta con la debida identificación (Pendón), con los datos requeridos y el horario de atención establecido es de ocho (8) horas semanales, los días martes y jueves de 8 a.m. a 12.m.

Este espacio se implementa con la finalidad de que las personas interesadas, se acerquen depositen sus dudas, quejas o soliciten información.

A continuación, se da a conocer la información del PAC.

Tabla 5 Punto de atención a la Comunidad

Dirección del Punto de Atención	**Barrio**	**Horarios de Atención**		**Línea Telefónica y correo**	**N° de Buzones Instalados**	**Relación de Evidencias**
		Día	Hora			
Calle. 3 Carrera 5. Córdoba —Bolívar	Barrio Abajo.	Martes Y Jueves	8:00 am a 12 m	320 5747617 ccontruredes@gmail.com	1	Registro Fotográfico

Ver evidencias.

4.2.3. Recepción y trámite de las PQRS:

Al corte del presente informe, no se reciben PQRS, sin embargo, se continúa con el trámite correspondiente para lograr el cierre de las peticiones, de la siguiente manera:

- El día 06 de octubre, se cierra una (1) solicitud de inclusión, para ello, fue necesario realizar visita casa a casa con el fin de brindarle la información del concepto emitido por el municipio a los residentes o peticionarios, en este caso, favorable, sin embargo, se comunicó que la intervención está sujeta al diagnóstico y al balance financiero del programa.
- El día 07 de octubre, se cierra cuatro (4) solicitudes de inclusión, al realizar visita a cada uno de los peticionarios, cuyo concepto emitido fue favorable.
- El día 14 de octubre, se realizó cierre de una (1) solicitud de inclusión, con concepto favorable, resaltando al peticionario que la intervención está sujeta al diagnóstico y al balance financiero del programa.
- El día 18 de octubre se realiza el cierre de la PQRS N° 227 por parte de un beneficiario del PCI, para ello, el contratista de obra realizó la proyección de respuesta, revisada y aprobada por el componente técnico de ENTerritorio, esta fue enviada a través de correo electrónico, además, se realizó entrega física al peticionario en su domicilio, el día 18 de octubre de 2022.

Cabe resaltar que durante las visitas no se presentaron inquietudes por parte de los potenciales beneficiarios, sin embargo, se recalca que la intervención se realiza de acuerdo al diagnóstico realizado por el profesional de diagnósticos, quien a través de visita realiza un diagnóstico, mediante el cual se tienen en cuenta las condiciones de la vivienda y los equipos sanitarios que requiere. Por otra parte, se menciona que le PCI busca contribuir al desarrollo de la población ya que algunas viviendas no cuentan con acceso a algunos aparatos sanitarios y a los servicios de agua potable y alcantarillado.

A la fecha del presente informe continúan abiertas dieciocho (18) solicitudes de inclusión, debido al rechazo de los peticionarios en firmar el cierre de las mismas, debido a la insatisfacción por el concepto no favorable emitido por el municipio, teniendo en cuenta que las viviendas no hacen parte del Barrio San Martín. Se ha realizado gestión para la ejecución de una reunión con el componente social del Municipio y Prestador, con la finalidad de dar a conocer esta situación y solicitar el apoyo del cierre de las PQRS pendientes.

A continuación, se relaciona el estado de las PQRS.

Tabla 6 PQRS recibidas

Barrios	Punto de información	PQRS recibidas	PQRS atendidas	PQRS pendientes o en trámite	Producto	Observaciones
San Martín	Municipio					
	Empresa de servicios					
	Contratista	227		18	Inclusiones	
	TOTAL	227		18		Pendiente por cierre 18

4.2.4. Buzón de PQRS:

Este buzón cumple una función importante porque a través de él todos los posibles beneficiarios del Programa de Conexión Intradomiciliarias, solicitan o exponen situaciones favorables o desfavorables, ante el Consorcio Construredes por razones de interés general o interés particular. A la fecha continua instalado el buzón, el cual funciona como un mecanismo que permite exponer solicitudes de información y/o consulta a las cuales se les realiza el seguimiento correspondiente, es importante mencionar que se ha notificado a los posibles beneficiarios, la función de este buzón de PQRS, que mediante el cual los usuarios, pueden

hacer relaciones, quejas, denuncias, etc., asimismo se abrió el espacio para indicarles cómo se debe hacer un procedimiento en el buzón PQRS.

A la fecha de este corte, se encuentra instalado el buzón de PQRS en el punto de atención y no se han recibido PQRS.

Ver Evidencias.

4.2.5. Recorridos de obra

Durante este periodo, se realiza un recorrido el día 28 de octubre de 2022, con la participación de contratista de obra, interventoría, y presidente del comité veedor, el recorrido se realizó a seis (6) intervenciones, las cuales se encuentran en un 80% de intervención, se recibieron algunas observaciones por parte de diferentes beneficiarios, frente a lo cual se realizó el acompañamiento técnico.

1. Durante la visita a la vivienda con código de identificación (B – C – SM – MNZ93 - VE – INC - 039), la beneficiaria Eliani Flórez Mendoza expuso una situación que se presenta en la intervención, relacionada con una falla en la descarga del sanitario, frente a lo que el contratista de obra, solicitó al personal encargado, atender y corregir esa falencia para el perfecto funcionamiento del aparato. Cabe resaltar que esta intervención consiste en la instalación de lavaplatos, lavadero y adecuación de unidad sanitaria.
2. En la intervención cuyo código es (B – C – SM – MNZ93 - VE – INC - 040), cuyo beneficiario es Bermuil del Socorro Vergara Causado, se presenta una falla en el funcionamiento del tanque elevado, lo cual se atribuye a una fuga de agua. Frente a lo que el contratista de obra recalcó la necesidad de corregir esta falencia para realizar la entrega de la intervención. Cabe resaltar que esta intervención consiste en la instalación de lavaplatos, lavadero y adecuación de unidad sanitaria.

3. La beneficiaria Ana Raquel Rodríguez, cuya vivienda se encuentra identificada con el código (B – C – SM – MNZ93 - VE – INC - 006), en esta no se recibieron dudas e inquietudes por parte de la beneficiaria, sin embargo se recalcó la calidad de la obra.
4. En la intervención, identificada con código (B – C – SM – MNZ93 - VE –172), cuyo beneficiario es Rafael Robles Ospino, no se recibieron inquietudes por parte del personal técnico. Cabe resaltar que esta consiste en adecuación de unidad sanitaria, instalación de lavadero y lavaplatos.
5. Emerson Sánchez Henao, beneficiario del PCI, con código de identificación en la vivienda (B – C – SM – MNZ92 - VE – 203), no se recibieron inquietudes u observaciones por parte del personal técnico.
6. Se visitó a la beneficiaria Elina Ramírez de Gamarra, con código de identificación de la vivienda (B – C – SM – MNZ93 - VE – 170), esta intervención consiste en la instalación de lavadero, lavaplatos y adecuación de unidad sanitaria.

Durante las visitas los beneficiarios se mostraron prestos a la visita por parte del personal de obra e interventoría, además, por parte del presidente del Comité veedor se recomendó al contratista de obra, estar atentos a las solicitudes e inquietudes de los beneficiarios con el fin de generar confianza en la población beneficiaria.

Tabla 7 Reuniones y recorridos

Actividad o Tipo de reunión	Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar de Actividad	Acciones realizadas y principales resultados	Ejecutó	Evidencias por reunión
Recorrido de obra	28-10-2022	San Martín	12	6 viviendas beneficiarias	Visitas de verificación de calidad de obras.	-contratista de obra e interventoría	Acta de reunión Registro fotográfico Listado de asistencia.

4.2.6. Otras reuniones

Durante este periodo no se realizaron actividades en este ítem.

4.3. Línea de Capacitación

4.3.1. Jornada de educación sanitaria

No se realizan jornadas de capacitación durante este periodo.

4.3.2. Visitas casa a casa e instalación de acrílicos

-Se realiza quince (15) visitas casa a casa, el día 11 de octubre, con el fin de realizar refuerzo en temas de educación sanitaria, e instalación de acrílico, el cual contiene las recomendaciones de uso y mantenimiento de los equipos sanitarios y el uso eficiente y ahorro del agua, esta actividad se llevó a cabo con el fin de resaltar la información brindada durante la jornada masiva de capacitación en educación sanitaria, la cual consistió en brindar información relacionada con el uso adecuado de cada uno de los aparatos hidrosanitarios que contribuya a la durabilidad de los mismos. Se recomendó no golpearlos, cuidar que los niños no arrojen juguetes pequeños al inodoro, no usar ácidos o detergentes agresivos para su limpieza y limpiar los aparatos hidrosanitarios regularmente, con el fin de promover su mantenimiento.

Ver evidencias.

-Se continúa con la actividad de visitas casa a casa de refuerzo e instalación de refuerzo, el día 13 de octubre, con el fin de brindar información relacionada con educación sanitaria a los beneficiarios de Programa de Conexiones Intradomiciliarias. En este caso, se visitó a

quince (15) beneficiarios recalcando la necesidad de cuidado de los equipos sanitarios, la importancia de su buen uso y mantenimiento, no arrojar elementos sólidos, ni papeles por el inodoro, así como toallas higiénicas pañales, condones, o cualquier otro elemento que pueda afectar el funcionamiento de los aparatos hidrosanitarios. También, se recalcó la importancia de verter agua caliente con detergente por el lavadero, lavaplatos y lavamanos, con el fin de disolver los depósitos de grasa evitando que se obstruyan las tuberías. A cada beneficiario se le otorgó información relacionada con la importancia de la higiene en la vivienda, el almacenamiento, manipulación y uso adecuado del agua potable, lavar los recipientes para almacenar y servir el agua potable, mantener tapados los recipientes para el agua potable, almacenar el recipiente del agua potable en un lugar limpio elevado, evitar tocar el agua con las manos al momento de servirla, lavarse las manos antes de depositar el agua tratada en el recipiente de almacenamiento y revisar el interior del tanque de almacenamiento frecuentemente.

Ver evidencias.

4.4. Reporte de Actividades Complementarias

4.4.1 Generación de Empleo

Durante este periodo se cuenta con la vinculación de diecinueve (19) personas, como personal de mano de obra no calificada, de las cuales doce (12) hacen parte del municipio, tal como lo certifica el presidente del Comité Veedor del proyecto.

Cabe resaltar que la información de la oferta laboral para el personal femenino no calificado y personal de obra no calificado por parte del contratista de obra se encuentra publicada en las carteleras informativas. Además, a la fecha de este informe el contratista de obra cuenta con

la vinculación laboral de una (1) persona, la cual hace parte de personal femenino no calificado.

Tabla 8 Generación de empleo

Barrios	No. total de beneficiarios	No. de empleos generados	Nº de vinculaciones de MONC
San Martín	286	20	20

Ver Evidencias.

4.4.2 Memoria social del Programa

Durante este periodo se realizó visita a una beneficiaria del programa, la cual fue escogida para la realización de la memoria social 3 del PCI, el día 11 de octubre, mediante la cual se recolectó información del después de la intervencion. La beneficiaria Doris Esther Torres Anaya, cuya vivienda se encuentra identificada con el codigo (216). Se le explicó que durante la toma de registro audiovisual es importante tener en cuenta los cambios presentados en la vivienda, en su familia, en sus hábitos, en este sentido el beneficiario expresó que las condiciones de la vivienda han mejorado ya que se sienten seguros al realizar actividades de higiene personal como bañarse, ya que antes lo hacían en un lugar cubierto con palos, plásticos y otros materiales que no garantizaban la intimidad o privacidad de cada uno de los miembros. Además, recalcó que se siente cómoda al realizar otras actividades relacionadas con la limpieza como el lavado de platos y lavado de ropa ya que cuenta con los aparatos instalados en la vivienda.

Ver Evidencias

4.4.3 Capacitación al personal de obra no calificado

-Se realiza entrega de información al personal de mano de obra no calificado del contratista de obra, por parte del equipo social de obra e interventoría, el día 5 de octubre de 2022, con el fin de reforzar la información suministrada sobre las generalidades del Programa de Conexiones Intradomiciliarias. Esta actividad se realiza con el fin de transmitir información acertada del proyecto y prevenir situaciones conflictivas con los beneficiarios o la comunidad en general. En este caso se recalcó la siguiente información:

- La importancia de la comunicación asertiva del personal de obra con los beneficiarios del PCI.
- La transmisión de información precisa y veraz del proyecto por parte de estos, referente a si el beneficiario requiere de informacion es necesario que se diriga al personal tecnico o social del contratista de obra.
- El compromiso con la calidad de las obras.

Cabe resaltar que durante el desarrollo de la actividad no se presentaron dudas e interrogantes por parte del personal, se mostraron prestos y atentos a la entrega de información.

-Se continúa con la realización de esta actividad el día 18 de octubre, este espacio fue dirigido por el personal técnico en acompañamiento del equipo social quienes resaltaron la información suministrada durante los encuentros cada mes, relacionada con:

1. En caso de presentarse dudas e inquietudes por parte del beneficiario del PCI, es necesario indicarle que debe acercarse al Punto de Atención al Ciudadano, en el cual será atendido por el personal técnico y social del contratista de obra e interventoría.
2. Se resaltó la importancia de ejecutar de manera eficiente las labores, debido a que esto se reflejará en la calidad de obras para la población. A partir de esto, se evidenciará satisfacción por parte de los usuarios.
3. Ademas, se resaltó la importancia de la comunicación asertiva con los beneficiarios

y dado el caso se requiera de colaboración del beneficiario frente a la ejecución de la obra, es necesario consultarle a éste la necesidad que se tenga.

Cabe resaltar que el pesonal se mostró atento al suministro de información y se recomendó que frente a cualquier situación que requiera del acompñamiento del componente social deben acercarse al Punto de Atencion al Ciudadano.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el componente social se continúa realizando acompañamiento social a la población beneficiaria a través de visitas casa a casa, con el fin de facilitar información acertada del PCI, además del acompañamiento brindado al personal de obra no calificado, otorgando información relacionada con algunas generalidades del programa, ya que frecuentemente los usuarios se acercan al Punto de Atención al Ciudadano con el fin de solicitar información del programa. Recalcando la disponibilidad del personal técnico y social del contratista de obra frente a cualquier duda o situación particular por parte del beneficiario, relacionada con la intervención en cada una de sus viviendas.

Por otra parte, se menciona que a la fecha de corte del presente informe continúan abiertas dieciocho (18) solicitudes de inclusión, por lo que se solicitará acompañamiento del equipo social del Municipio y el Prestador de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado, para realizar el trámite de cierre de cada una de ellas. Esto debido a que algunos peticionarios, a los cuales se les brindó la información del concepto emitido por el municipio que corresponde a no favorable, no han firmado el cierre de la solicitud debido a que se muestran inconformes con la respuesta y argumentan requerir el beneficio. Frente a esto, el componente social solicitará el acompañamiento de la delegada social del Municipio, lo cual se reportará posteriormente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL AVANCE O ATRASOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES

El presente informe contiene los avances realizados durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de octubre de 2022, a continuación se muestra por cada actividad del proyecto los avances más significativos:

Actividad 1:

Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la norma sismo resistente NSR-10.

El 29 de Junio de 2022 se envió a la Entidad el comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 con el informe de la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados. Durante el mes de Julio no se recibieron observaciones ni de parte del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, ni de la Entidad, por lo cual se asume que está actividad quedó finalizada al 100%.

Actividad 2:

Diagnóstico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención

En el seguimiento realizado por la Interventoría a la reprogramación se puede evidenciar que el contratista no ha cumplido con la meta de entregar todos los diagnósticos, razón por la cual se tiene un atraso del 12% en la actividad N° 2, ya que a la fecha se deberían tener todos los diagnósticos.

A la fecha del actual informe mensual el contratista avanzó con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 286 por la interventoría, los últimos 49 fueron avalados en comités de aprobación 19 y 20.

Durante el periodo el contratista presentó el siguiente oficio para aprobación de diagnósticos:

Mediante el siguiente comunicado No CCR_CORDOBA_2220576_2022_103, el contratista hizo entrega de 19 diagnósticos, y el oficio No CCR_CORDOBA_2220576_2022_109 mediante el cual remitió 30 diagnósticos completando a la fecha de corte del presente informe un acumulado de 286 diagnósticos aprobados.

Con corte al 31 de octubre de 2022 y de acuerdo a la reprogramación esta actividad nos refleja un atraso de 59 diagnósticos, por consiguiente, queda de la siguiente manera: 188 diagnósticos aprobados de la matriz inicial más 98 inclusiones aprobadas.

Actividad 3:

Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias. Acta de entrega y recibos de las obras.

A la fecha del actual informe y de acuerdo a la reprogramación de obra el contratista debería tener en proceso constructivo de 214 viviendas, sin embargo, de las 240 que se han intervenido solo 199 están en un 100%.

El programado general del contrato de obra presenta un atraso del 6,14% con corte al 30 de octubre de 2022, el atraso en las últimas 3 semanas se ha mantenido en un promedio del 7%, con leves disminuciones, pero no como se espera, ya que estamos a 42 días de finalizar el plazo contractual.

La Interventoría solicitó continuar con el reforzamiento del personal operativo con el fin de dar inicio a un mayor número de viviendas en ejecución de obras.

En el proceso constructivo de las diferentes intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta en fibrocemento, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones con la construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 cuadrillas de trabajo.

Actividad 4:


El detalle de los avances en esta actividad están en el numeral 2.3.1 Plan de Gestión Social.

INFORME DE DESEMPEÑO

Durante las semanas del mes de octubre se evidencia que el contratista mantuvo un promedio de atraso del 7%, aunque el atraso no se ha incrementado, las disminuciones no son significativas, por lo cual se ha solicitado al Contratista tomar medidas adicionales para lograr nivelar la entrega de viviendas terminadas por semana.

El atraso general del proyecto equivale al 6,14%, lo que representa una leve disminución con relación a la semana anterior, aunque de igual manera preocupa a la Interventoría que no se estén tomando los controles respectivos para nivelar la programación de obra. Mas aún si se considera que estamos a 42 días de terminar el plazo contractual, plazo en el cual se deben terminar las 146 viviendas restantes del objeto contractual.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

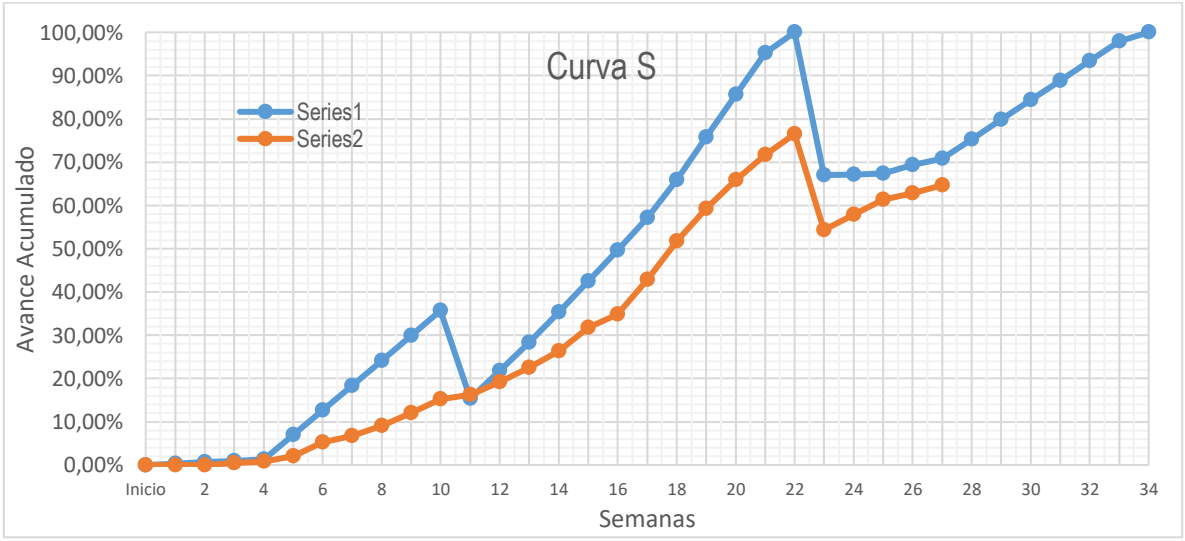

CONCLUSIONES:

- Para la fecha de corte del informe la actividad N° 1 se encuentra al 100%, ya que los diseños fueron aprobados por la Interventoría y no se recibieron observaciones ni de la Entidad contratante, ni del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio.

- Durante el mes de Julio se hizo entrega a la Entidad del aval de interventoría para el cambio de especificaciones técnicas para los siguientes ítems:

ITEM 14. Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos).

ITEM 15. Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna-sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos).

ITEM 16. Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos).

ITEM 17. Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)

ITEM 25. Mampostería en bloque de Arcilla N° 4 o similar, incluye mortero de pega

ITEM 26. Suministro e instalación calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega

ITEM 40: Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros

ITEM 41: Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros

- Con respecto a la actividad 2, a fecha del presente informe esta actividad debería estar al 100%, sin embargo, el contratista tiene un

atraso de 59 diagnósticos, equivalente a un 12% de atraso. Se espera que en la primera semana de noviembre el contratista termine esta actividad.

- Las actividades 3 y 4 se vienen desarrollando de manera satisfactoria y conforme a las especificiones técnicas y manuales de la entidad. Sin embargo se ha presentado atraso en la actividad 3, por lo cual a la fecha de corte del presente informe sólo se tenían 199 viviendas terminadas cuando la meta a corte del presente informe eran 214.

- A la fecha del actual informe mensual el contratista avanzó con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 286, que fueron avalados por la interventoría.

- Se han ejecutado las actividades cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato de obra y se ha estado haciendo un seguimiento permanente para evidenciar las razones de los atrasos y trabajando en las acciones para disminuir dichos atrasos.

- Se continúa con la implementación de los protocolos de bioseguridad por parte de las profesionales sociales y del equipo técnico que se encuentran trabajando en campo, manteniendo el distanciamiento social en las visitas de capacitación y socialización casa a casa, implementando el uso del tapabocas, el uso de alcohol. Cabe resaltar que se ha generado cultura en los beneficiarios referente al uso de tapabocas y autocuidado. Esto con el fin de evitar los contagios por COVID-19.

- Durante el mes de septiembre se formalizó con la entidad la adición y prórroga tanto al contrato de obra como al de interventoría, por el 50% del plazo y valor contractual inicial. El nuevo plazo es 11 de diciembre de 2022 y se intervendrán 108 viviendas más.

RECOMENDACIONES:

Se recomendó al Contratista seguir incrementar las cuadrillas de obra con el fin de terminar la ejecución de las 345 viviendas objeto del contrato dentro del plazo que vence el próximo 11 de diciembre de 2022.

De igual forma se solicitó al contratista agilizar la entrega de los materiales, y tratar de subsanar los motivos que han generado atraso en las ultimas semanas.

En todos los comités de obra se ha solicitado al contratista agilizar el recibo a satisfacción de las viviendas que ya se encuentran terminadas al 100%, ya que no se ha avanzado en esta actividad, pues de las 160 viviendas terminadas solo se han recibido 15, esto es una actividad que se debe hacer al momento de entregar la vivienda al beneficiario para ir cerrando los procesos y no asumir reparaciones posteriores por demoras en las entregas.

DIFICULTADES:

A corte del presente informe la dificultad que evidencia la interventoría en el desarrollo del contrato es que no se cuenta aún con el personal suficiente para la ejecución de la actividad 3, más aún si consideramos que sólo restan 42 días del plazo contractual, el Contratista ha venido resolviendo las demoras en la entrega de algunos materiales de obra buscando proveedores de otras zonas.

La otra dificultad que ha sido manifestada al contratista es la demora en la firma de las actas de recibo a satisfacción de las viviendas terminadas, por lo cual se solicitó al contratista definir las fechas en las que hará la entrega de los documentos correspondientes a cada entrega. Si en la primera semana de noviembre no se evidencian avances en esta actividad se reportará el incumplimiento a la Entidad para que se determine las acciones a tomar.

APORTES PARAFISCALES

CONTRATISTA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1714647839	9441549858	E	2022/10/20	2022/10/20	BANCOLOMBIA	0	$6,130,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10774359	ALVAREZ GENKY																		231001	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	1093752620	ANAYA NORELIS																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	1102815039	BLANCO RONAL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	MIN002	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1066181984	CASTILLO RAFAEL																		230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
5	CC	1049453183	ESCOBAR SINDY																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS048	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
6	CC	1049452239	ESCOBAR YEISON																		231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
7	CC	1118528862	GARZON OSWALDO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
8	CC	85474042	GUTIERREZ CARLOS																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF41	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
9	CC	1049453497	PINEDA HEIDER																		230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
10	CC	1069464406	PINEDO DUARTE																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
11	CC	1049453345	VALETH JESUS																		230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total	**Afiliados(11)**																						$19,800,000	$3,168,000			$19,800,000	$792,000			$19,800,000	$792,000			$19,800,000	$1,378,100		$0	$0		$6,130,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1714647839	9441549858	E	2022/10/20	2022/10/20	BANCOLOMBIA	0	$6,130,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,168,000	$0	$0	$3,168,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,200,000	$0	$0	$1,200,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,648,000	$0	$0	$1,648,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,378,100	$0	$0	$1,378,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,378,100	$0	$0	$1,378,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$792,000	$0	$0	$792,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	$792,000	$0	$0	$792,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$792,000	$0	$0	$792,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$352,000	$0	$0	$352,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				**11**	**$6,130,100**	**$0**	**$0**	**$6,130,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1714647839	9441549858	E	2022/10/20	2022/10/20	BANCOLOMBIA	0	$6,130,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10774359	ALVAREZ GENKY	231001	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	1093752620	ANAYA NORELIS	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC	1102815039	BLANCO RONAL	230301	30	$2,000,000	$320,000	MIN002	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	1066181984	CASTILLO RAFAEL	230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
5	CC	1049453183	ESCOBAR SINDY	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS048	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
6	CC	1049452239	ESCOBAR YEISON	231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
7	CC	1118528862	GARZON OSWALDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
8	CC	85474042	GUTIERREZ CARLOS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF41	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
9	CC	1049453497	PINEDA HEIDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
10	CC	1069464406	PINEDO DUARTE	25-14	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
11	CC	1049453345	VALETH JESUS	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					**$19,800,000**	**$3,168,000**			**$19,800,000**	**$792,000**			**$19,800,000**	**$792,000**			**$19,800,000**	**$1,378,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,168,000	$0	$0	$3,168,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,200,000	$0	$0	$1,200,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,648,000	$0	$0	$1,648,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,378,100	$0	$0	$1,378,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,378,100	$0	$0	$1,378,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$792,000	$0	$0	$792,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	$792,000	$0	$0	$792,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$792,000	$0	$0	$792,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$352,000	$0	$0	$352,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				**11**	**$6,130,100**	**$0**	**$0**	**$6,130,100**

2022/10/20 09:29 AM

INTERVENTORÍA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78380772

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7852394023**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2022	Periodo Cotización Salud	octubre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/10/11
Número Autorización	1701197661		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	RONALD JAVIER	Apellidos	ARRIETA MONTERROZA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	78380772
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 3.000.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	231001-COLFONDOS
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.000.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 480.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 480.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.000.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 120.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 120.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 3.000.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 208.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 3.000.000	$ 120.000

TOTAL PAGADO:	**$ 928.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80192920

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901108740
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AC CRA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	01 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7854244703**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2022	Periodo Cotización Salud	octubre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/10/11
Número Autorización	1700442403		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	CARLOS ANDRES	Apellidos	FORERO ANAYA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80192920
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 2.559.391	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 2.559.391
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 409.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 409.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 2.559.391
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 102.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 102.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 2.559.391
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 13.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 2.559.391	$ 102.400

TOTAL PAGADO:	**$ 627.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43160977

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	65 - OFICINA MEDELLIN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7852367573**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2022	Periodo Cotización Salud	octubre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/10/11
Número Autorización	1700489203		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MARCY ALEJANDRA	Apellidos	CORREA CASTAÑO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	43160977
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 4.673.760	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.673.760
FSP - Solidaridad	$ 23.400	Cotización Obligatoria	$ 747.900
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 23.400
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 794.700**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.673.760
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 187.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 187.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.673.760
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 325.300**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 4.673.760	$ 187.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.494.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 52885857

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901108740
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AC CRA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	01 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7854244703**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2022	Periodo Cotización Salud	octubre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/10/11
Número Autorización	1700442403		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	YIRA	Apellidos	LEMUS GOMEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	52885857
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 3.561.600	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.561.600
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 569.900
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 569.900**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS008-COMPENSAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.561.600
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 142.500
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 142.500**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 3.561.600
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 247.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 3.561.600	$ 142.500

TOTAL PAGADO:	**$ 1.102.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1085294161

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901108740
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AC CRA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	01 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7854244703**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2022	Periodo Cotización Salud	octubre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/10/11
Número Autorización	1700442403		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	EMMA FERNANDA	Apellidos	GRIJALBA BOLAÑOS
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1085294161
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.798.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.798.500
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 287.800
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 287.800**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS008-COMPENSAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.798.500
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 72.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 72.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 1.798.500
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 9.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 1.798.500	$ 72.000

TOTAL PAGADO:	**$ 441.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1102882556

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7852394023**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2022	Periodo Cotización Salud	octubre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/10/11
Número Autorización	1701197661		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MARIELIS VANESSA	Apellidos	OCHOA MENDEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1102882556
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 1.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.500.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 240.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 240.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	MUTUAL SER EPS-S
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.500.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 60.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 60.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.500.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 104.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 1.500.000	$ 60.000

TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1049454594

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	800173768
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	AVENIDA 28 # 37-38	Teléfono	2442900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**7852394023**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2022	Periodo Cotización Salud	octubre / 2022
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2022/10/11
Número Autorización	1701197661		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	LEYDIS KATHERINE	Apellidos	HERRERA PALOMINO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1049454594
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 1.400.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Dias	30	IBC	$ 1.400.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 224.000
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 224.000**

SALUD		Administradora	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA
Dias	30	IBC	$ 1.400.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	$ 56.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 56.000**

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Dias	30	IBC	$ 1.400.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo		**Total Aporte**	**$ 97.500**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF16-COMFACOR	30	4,000 %	$ 1.400.000	$ 56.000

TOTAL PAGADO:	**$ 433.500**

RELACIÓN CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO

enterritorio	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-12-07**

Informe No. **6** **Fecha Informe** **31/10/2022** **Periodo comprendido entre** **1/10/2022** **y** **31/10/2022**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2220587
OBJETO:	GRUPO IV: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A
SUPERVISOR:	ARQ. ERIKA GUTIÉRREZ GAITÁN

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
4/10/2022	GER-107-22/ 20224300373962	REMISIÓN INFORMES SEMANALES 21	INTERVENTORIA	ENTIDAD
4/10/2022	GER-108-22/ 20224300376892	REMISIÓN INFORMES SEMANALES 22	INTERVENTORIA	ENTIDAD
6/10/2022	GER-109-22	RESPUESTA A COMUNICADO CCR_CORDOBA_2220576_2022_095 recibido el día 6 de octubre de 2022 con asunto RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL NUMERO 2.	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
7/10/2022	GER-110-22/ 20224300379572	AVAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 2220576.	INTERVENTORIA	ENTIDAD
7/10/2022	GER-111-22/ 20224300379702	ENTREGA INFORME SEMANAL No. 23	INTERVENTORIA	ENTIDAD
7/10/2022	GER-112-22/ 20224300379872	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 5	INTERVENTORIA	ENTIDAD
13/10/2022	GER-113-22	REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO EN LA VINCULACIÓN DE PERSONAL NO CALIFICADO – OFICIO ARCA-INT/ENT276-GER-102-22 RESPUESTA A CCR_CORDOBA_2220576_2022_099	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
14/10/2022	GER-114-22/ 20224300391552	ALCANCE A COMUNICADO ARCA-INT/ENT276-GER-114-22 AVAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 2220576 Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.	INTERVENTORIA	ENTIDAD
18/10/2022	GER-115-22/ 20224300392672	ENTREGA INFORME SEMANAL No. 24	INTERVENTORIA	ENTIDAD
18/10/2022	GER-116-22/ 20224300412542	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 3 - CONTRATISTA.	INTERVENTORIA	ENTIDAD
21/10/2022	GER-117-22/ 20224300401152	REMISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5. DE INTERVENTORÍA. PERIODO FACTURADO DEL 27 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	INTERVENTORIA	ENTIDAD
22/10/2022	GER-118-22/ 20224300410412	AVAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 CONTRATO DE OBRA No. 2220576	INTERVENTORIA	ENTIDAD
28/10/2022	GER-119-22	REMISIÓN OBSERVAIONES AL INFORME MENSUAL No. 4 CONTRATISTA.	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
1/11/2022	GER-120-22	ATENCIÓN A OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_099	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
2/11/2022	GER-121-22 20224300418222	ENTREGA INFORME SEMANAL No 25	INTERVENTORIA	ENTIDAD
2/11/2022	GER-122-22 20224300418212	ENTREGA INFORME SEMANAL No 26	INTERVENTORIA	ENTIDAD
4/11/2022	GER-123-22 20224300423562	ENTREGA INFORME SEMANAL No 27	INTERVENTORIA	ENTIDAD

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre: Ing Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 18 de octubre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-115-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 24

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 24 cuyo periodo es del 03 de octubre del 2022 hasta 09 de octubre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 21 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 18/10/2022
HORA: 11:41:39 a. m.
20224300392672

INFORME SEMANAL 24

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **3/10/2022** al **9/10/2022** Fecha **9/10/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO				
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	BOLÍVAR	**MUNICIPIO**	CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO			
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN			
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2220576	
Contratista			CONSORCIO CONSTRUREDES	
Valor inicial	$		1.771.707.945,99	
Valor actual	$		2.654.032.619,99	
Variación del valor	$		882.324.674,00	
Fecha de Inicio			26/04/2022	
Plazo inicial (Días)			150 Días	
Plazo actual (Días)	226 Días		7,5 MESES - 226 DIAS	
Variación en plazo			76 Días	
Fecha Contractual de terminación			11/12/2022	
Tiempo Transcurrido (días)	166		73,45%	
Días remanentes del Contrato	63,00		27,88%	
Acumulado a última acta pagada	$		379.134.821,64	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		1.280.190.068,86	

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.			2220587	
Interventor			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.	
Valor inicial	$		202.479.313,00	
Valor actual	$		303.315.624,00	
Variación del valor	$		100.836.311,00	
Fecha de Inicio			26/04/2022	
Plazo inicial			150 Días	
Plazo actual	226 Días		7,5 MESES - 226 DIAS	
Variación en plazo			76 Días	
Fecha Contractual de terminación			11/12/2022	
Ejecución del Contrato	166		73,45%	
Días remanentes del Contrato	63,00		27,88%	
Acumulado a última acta pagada	$		48.595.035,13	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		39.483.466,03	

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.777.324.138,72	66,97%	$ 1.442.732.132,23	54,36%	-$ 334.592.006,49	-12,61%
Durante el Periodo	$ 5.616.192,73	0,21%	$ 93.248.518,24	3,51%	$ 87.632.325,51	3,30%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.782.940.331,45**	**67,18%**	**$ 1.535.980.650,46**	**57,87%**	**-$ 246.959.680,99**	**-9,31%**

Desviación en días: 14 Días




Observaciones al desempeño del proyecto


A la fecha de corte del presente informe se indican las siguientes cifras: un avance programado del 67,18% frente a un ejecutado del 57,87% lo cual representa un atraso de 9,31%. Este atraso se debe a que dentro del plazo inicialmente pactado no se terminaron las 217 viviendas de la meta inicial y el Contratista no habia entregado la reprogramación ajustada a la fecha de corte de este informe.

En cuanto a la actividad 2 a corte del 2 de octubre se tenian aprobados 237 diagnósticos, con la adición el contratista debe continuar con esta actividad para identificar las 108 viviendas nuevas a intervenir. Se espera la reprogramación de obra con el fin de hacer seguimiento a las entregas establecidas para cada semana.

En cuanto a la actividad 3 el contratista deberá aprovechar las dos primeras semanas del nuevo plazo para ponerse al día con las viviendas pendientes de la primera etapa del contrato, que de acuerdo a los compromisos debería tener 237 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 216 viviendas, de las cuales se han terminado 174 y se adelantan labores constructivas en 42 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. En el transcurso de la siguiente semana se dará inicio a la ejecución 11 viviendas las cuales ya tienen parte del material y se deberá mejorar los rendimientos para lograr tener más viviendas terminadas. Se solicitó al contratista entregar cronograma con las fechas de terminación de las viviendas del primer grupo

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

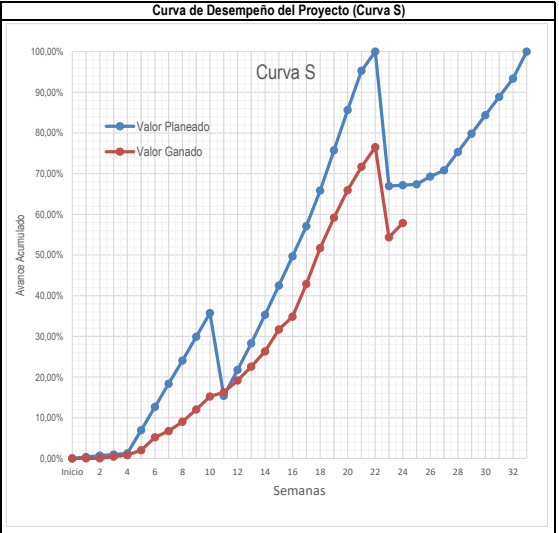

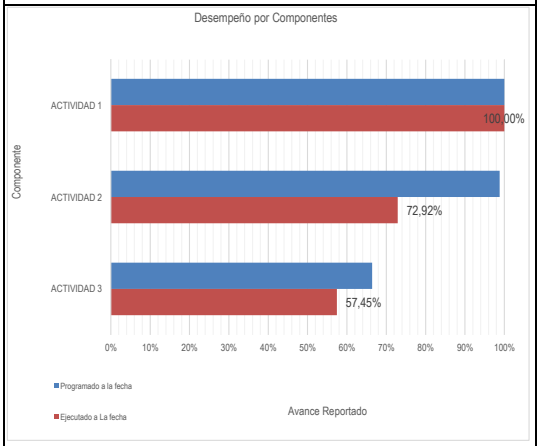

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **3/10/2022** al **9/10/2022** Fecha **9/10/2022**

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	66,97%	54,36%	-12,61%	
Durante el Periodo	0,21%	3,51%	3,30%	
Acumulado a la Fecha	**67,18%**	**57,87%**	**-9,31%**	

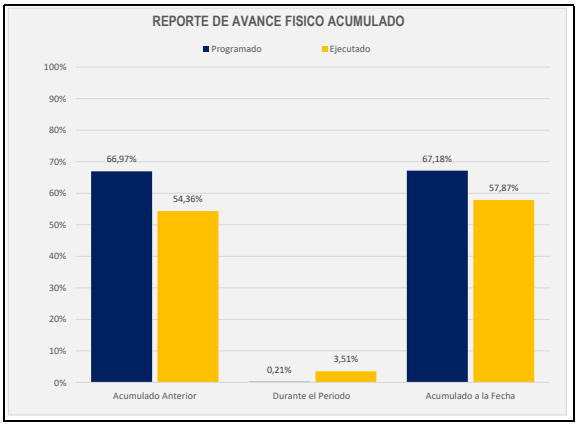


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1	$ 379.134.821,64	21,40%	12/09/2022	$ 379.134.821,64








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
3	$ 64.793.381,17	32,00%	3	$ 48.595.035,13	24,00%	9/09/2022	$ 16.198.346,04







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 98,83% vs EJECUTADO 72,92%
Comentario: A la fecha de corte del presente informe el contratista tenía 237 diagnósticos aprobados en actas, con la adición y la prórroga que se hizo al contrato de obra se deberá continuar con esta actividad para identificar las 108 nuevas viviendas objeto de la adición del contrato. Las cuales se deberán realizar en las siguientes semanas. Una vez el contratista entregue la reprogramación con las nuevas condiciones contractuales se hará el seguimiento al avance de esta actividad.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 66,39% vs 57,45% EJECUTADO
En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato, se debería tener 237 viviendas terminadas al 100% que corresponden a la meta inicial, sin embargo, a la fecha se han intervenido 216 viviendas, de las cuales se han terminado 174 y se adelantan labores constructivas en 42 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. Durante las últimas semanas se han registrado lluvias que han bajado los rendimientos de obra, además de las demoras en la entrega de materiales indispensables para la ejecución de las actividades.
A la meta de las 217 viviendas del objeto inicial, se suman las viviendas que se deben ejecutar para agotar el valor antes de la adición, es decir, otras 20 viviendas. La adición que se hizo al contrato de obra es para aproximadamente 108 viviendas. Es decir, en los próximos 2 meses y medio el contratista deberá ejecutar al 100% las 345 viviendas, Una vez se apruebe la reprogramación de la obra se hará el seguimiento con las metas propuestas por el contratista, para lo cual deberá disponer de todos los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para cumplir con el objeto del contrato. Se espera que el contratista termine lo más pronto posible las viviendas que corresponden a la meta inicial.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. En la presente semana no se aprobaron diagnósticos adicionales, la cifra sigue siendo los mismos 237.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
Con corte al 9 de octubre se han intervenido 216 viviendas, a la fecha deberían estar al 100% las 237 del alcance inicial, de las cuales solo 174 están terminadas indicándonos un atraso de 63 viviendas. El contratista tiene en ejecución 42 intervenciones y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras y poder finalizar este primer grupo de viviendas para concentrar los esfuerzos en las 108 viviendas que hacen parte de la adición.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo
A pesar de que se ha vinculado mayor personal de obra no se ha logrado mejorar los rendimientos en la ejecución de las viviendas debido a factores externos al Contratista, tales como: incremento de las lluvias en el Municipio, demoras en la entrega por parte del proveedor de la cerámica de piso y paredes y demoras en la entrega del material granular por parte del proveedor. Se solicitó al Contratista la entrega de los soportes que evidencien dichas demoras en estos insumos que afectan la normal ejecución de las obras. A esto se suma que el fuerte invierno ha afectado las vías de ingreso al Municipio por las cuales se reciben los materiales del proyecto.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 10 al 16 de octubre de 2022 el contratista deberá incrementar sus esfuerzos en las actividades 2 y 3, esto teniendo en cuenta las nuevas metas establecidas en el contrato de obra conforme a las adiciones realizadas. Se deberá continuar con la etapa de diagnóstico para la identificación y aprobación de las nuevas viviendas y con la terminación de las viviendas que se encuentran en ejecución y que hacen parte de la meta inicial del contrato, esto con el fin de poder continuar con la ejecución de las 108 nuevas viviendas dentro del plazo contractual.
Como a la fecha se presenta un atraso en la actividad 3 se deberá vincular más personal de obra para atender las necesidades del proyecto, ya que no hay lugar a más prórrogas, es decir, en los próximos 2 meses y medio se deberá dar cumplimiento al objeto contractual.


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **3/10/2022** al **9/10/2022** Fecha **9/10/2022**


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	51	8	59	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**51**	**8**	**59**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias torrenciales los dia 05 y 07 de octubre (se anexa reporte climatico)

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A			N/A		

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A			N/A	

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICION DE VIGAS Y COLUMNAS.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **3/10/2022** al **9/10/2022** Fecha **9/10/2022**






ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS






CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-071-22 con el asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES RECORRIDO DE CAMPO CÓRDOBA mediante el cual damos respuesta a las observaciones del informe de visita del 14 de julio 2022 en el barrio San Martin de Córdoba Bolívar

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-072-22 con el asunto: SOLICITUD REPROGRAMACIÓN DE OBRA mediante el cual solicitamos de manera urgente la reprogramación de obra contemplando la adición y prórroga del contrato en los términos establecidos, la cual es fundamental para el control y seguimiento de los avances en obra.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-073-22 con el asunto: REITERACIÓN SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION mediante el cual solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en varios comités de obra se han comprometido a la entrega semanal de por lo menos de 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-074-22 con el asunto: REMISIÓN DE INFORME TECNICO ESPECIALISTA HSE No. 7 mediante el cual se adjuntó informe HSE con observaciones para fines pertinentes.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-075-22 con el asunto: RESPUESTA A OBSERVACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ACTA PARCIAL No. 2 por medio del cual se da respuesta a observaciones producto de la revisión del acta parcial No.2

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-076-22 con el asunto: SOLICITUD RESPUESTA OBSERVACIONES RECORRIDO DE CAMPO VISITA MINISTERIO DE VIVIENDA con el cual se pide al contratista dar respuesta al informe con observaciones a la visita de supervisión del ministerio de vivienda.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-077-22 con el asunto: INFORME ESPECIALISTA DE PRESPUESTO Y PROGRAMACION No. 16 mediante el cual se realizan observaciones a la reprogramación de obra presentada por el contratista.

Marcy A. Correa C		Erika M. Gutierrez G	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría		Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	9/10/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																												
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES										
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3		
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	188	28	188	1	223	223	223	0	0	188	35	74	0	67	0	237	262	29	255	1	216	174	0	42	345		
	TOTAL	**217**	**0**	**188**	**28**	**188**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**74**	**0**	**67**	**0**	**237**	**262**	**29**	**255**	**1**	**216**	**174**	**0**	**42**	**345**		

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3/10/2022 Y EL 9/10/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 09/10/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x

SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ84-VE-176	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ84-VE-177	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.210.038,73	$8.210.038,73	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	133	B-C-SM-MZ84-VE-181	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	134	B-C-SM-MZ84-VE-182	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	153	B-C-SM-MZ46-VE-213	100%	Caseta t3	$8.311.308,81	$8.311.308,81	5/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	154	B-C-SM-MZ46-VE-214	100%	Adecuacion	$8.337.864,77	$8.337.864,77	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	155	B-C-SM-MZ46-VE-215	100%	Caseta t3	$8.081.818,61	$8.081.818,61	6/09/2022	TERMINADA	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	156	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$5.575.323,64	$5.575.323,64	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	157	B-C-SM-MZ46-VE-217	100%	Caseta t4	$8.310.190,06	$8.310.190,06	6/09/2022	TERMINADA	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ46-VE-218	100%	Adecuacion	$7.966.932,81	$7.966.932,81	7/09/2022	TERMINADA	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	159	B-C-SM-MZ46-VE-219	100%	Adecuacion	$4.519.608,59	$4.519.608,59	7/09/2022	TERMINADA	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	160	B-C-SM-MZ46-VE-220	100%	Adecuacion	$5.427.357,42	$5.427.357,42	8/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	161	B-C-SM-MZ46-VE-221	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	8/09/2022	TERMINADA	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	8/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	163	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	9/09/2022	TERMINADA	17/09/2022	23/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	164	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Caseta t2	$4.292.672,67	$4.292.672,67	10/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	165	B-C-SM-MZ23-VE-117	100%	Adecuacion	$4.772.651,25	$4.772.651,25	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	166	B-C-SM-MZ59-VE-187	100%	Adecuacion	$8.212.157,27	$8.212.157,27	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	167	B-C-SM-MZ34-VE-116	100%	Caseta t3	$7.989.636,90	$7.989.636,90	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	168	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	169	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	170	B-C-SM-MZ87-VE-189	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	171	B-C-SM-MZ18-VE-202	100%	Adecuacion	$8.298.564,37	$8.298.564,37	14/09/2022	TERMINADA	19/09/2022	25/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	172	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	14/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	173	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Adecuacion	$4.292.672,67	$4.292.672,67	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	174	B-C-SM-MZ75-VE-070	100%	Adecuacion	$4.222.499,91	$4.222.499,91	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	18	175	B-C-SM-MZ67-VE-078	100%	Adecuacion	$5.110.794,97	$5.110.794,97	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	176	B-C-SM-MZ34-VE-119	90%	Adecuacion	$7.021.881,94	$6.319.693,75	16/09/2022	EN EJECUCION	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	177	B-C-SM-MZ56-VE-190	90%	Adecuacion	$7.154.236,55	$6.438.812,90	17/09/2022	EN EJECUCION	22/09/2022	28/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	178	B-C-SM-MZ56-VE-191	90%	Caseta t3	$8.896.139,02	$8.006.525,12	17/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	179	B-C-SM-MZ31-VE-199	90%	Adecuacion	$4.691.093,17	$4.221.983,85	18/09/2022	EN EJECUCION	24/09/2022	30/09/2022	6	12	-6		x
SM	18	180	B-C-SM-MZ67-VE-183	90%	Caseta t3	$6.957.541,97	$6.261.787,77	18/09/2022	EN EJECUCION	26/09/2022	2/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	181	B-C-SM-MZ30-VE-200	90%	Caseta t3	$8.312.234,66	$7.481.011,19	19/09/2022	EN EJECUCION	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	182	B-C-SM-MZ31-VE-201	90%	Caseta t3	$6.950.167,16	$6.255.150,44	19/09/2022	EN EJECUCION	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	183	B-C-SM-MZ47-VE-105	90%	Adecuacion	$3.899.268,01	$3.509.341,21	20/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	14	184	B-C-SM-MZ68-VE-108	90%	Adecuacion	$3.617.504,69	$3.255.754,22	20/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	185	B-C-SM-MZ145-VE-208	90%	Adecuacion	$6.196.096,01	$5.576.486,41	21/09/2022	EN EJECUCION	26/09/2022	2/10/2022	5	11	-6		x

SM	12	186	B-C-SM-MZ66-VE-198	90%	Adecuacion	$5.360.187,87	$4.824.169,08	21/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	187	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	80%	Caseta t3	$9.273.205,89	$7.418.564,71	22/09/2022	EN EJECUCION	30/09/2022	6/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	188	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	80%	Adecuacion	$7.909.051,57	$6.327.241,26	22/09/2022	EN EJECUCION	28/09/2022	4/10/2022	6	12	-6		x
SM	17	189	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	80%	Adecuacion	$7.056.470,53	$5.645.176,42	23/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	6	12	-6		x
SM	15	190	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	80%	Caseta t3	$7.321.539,69	$5.857.231,75	23/09/2022	EN EJECUCION	1/10/2022	7/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	191	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	80%	Adecuacion	$5.983.563,40	$4.786.850,72	24/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	192	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	80%	Adecuacion	$7.900.843,94	$6.320.675,15	24/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	193	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	80%	Caseta t3	$7.343.027,38	$5.874.421,90	25/09/2022	EN EJECUCION	3/10/2022	9/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	194	B-C-SM-MZ98-VE-INC-008	70%	Caseta t3	$7.345.145,38	$5.141.601,77	26/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	195	B-C-SM-MZ87-VE-INC-009	70%	Adecuacion	$6.166.474,80	$4.316.532,36	27/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	196	B-C-SM-MZ48-VE-INC-010	70%	Adecuacion	$7.156.353,68	$5.009.447,58	27/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	197	B-C-SM-MZ38-VE-INC-013	70%	Caseta t3	$8.739.765,67	$6.117.835,97	28/09/2022	EN EJECUCION	6/10/2022	12/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	198	B-C-SM-MZ33-VE-INC-014	70%	Adecuacion	$7.094.395,09	$4.966.076,56	28/09/2022	EN EJECUCION	3/10/2022	9/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	199	B-C-SM-MZ55-VE-064	70%	Adecuacion	$7.807.428,21	$5.465.199,75	29/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	200	B-C-SM-MZ145-VE-161	70%	Adecuacion	$8.918.748,97	$6.243.124,28	29/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	201	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	70%	Adecuacion	$7.948.410,17	$5.563.887,12	30/09/2022	EN EJECUCION	5/10/2022	11/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	202	B-C-SM-MZ33-VE-INC-016	55%	Caseta t3	$7.602.156,55	$4.181.186,10	30/09/2022	EN EJECUCION	8/10/2022	14/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	203	B-C-SM-MZ85-VE-INC-019	55%	Caseta t3	$7.773.487,18	$4.275.417,95	1/10/2022	EN EJECUCION	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	204	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	55%	Caseta t3	$8.333.260,29	$4.583.293,16	1/10/2022	EN EJECUCION	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	205	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	55%	Caseta t3	$8.094.089,35	$4.451.749,14	2/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	206	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	55%	Caseta t3	$7.629.024,81	$4.195.963,65	2/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	207	B-C-SM-MZ33-VE-INC-032	55%	Caseta t3	$8.036.839,77	$4.420.261,87	3/10/2022	EN EJECUCION	11/10/2022	17/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	208	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	55%	Caseta t3	$7.811.643,60	$4.296.403,98	4/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	209	B-C-SM-MZ33-VE-INC-027	55%	Caseta T2	$8.012.216,20	$4.406.718,91	5/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	210	B-C-SM-MZ66-VE-INC-033	60%	Adecuacion	$6.628.918,24	$3.977.350,94	5/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	211	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	35%	Caseta t3	$7.997.347,42	$2.799.071,60	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	212	B-C-SM-MZ98-VE-INC-036	35%	Caseta t3	$7.885.031,34	$2.759.760,97	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	213	B-C-SM-MZ85-VE-INC-038	35%	Caseta t3	$8.272.191,01	$2.895.266,85	7/10/2022	EN EJECUCION	15/10/2022	21/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	214	B-C-SM-MZ93-VE-INC-039	45%	Adecuacion	$7.727.983,14	$3.477.592,41	7/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	215	B-C-SM-MZ93-VE-INC-040	45%	Adecuacion	$7.621.248,46	$3.429.561,81	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	216	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	45%	Adecuacion	$7.737.812,12	$3.482.015,45	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	217	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	35%	Caseta t3	$8.221.884,89	$2.877.659,71	8/10/2022	EN EJECUCION	16/10/2022	22/10/2022	8	14	-6		x
SM		218														
SM		219														

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		58.879.439,91	$		2.590.013.153,73	$	-	$	2.654.032.619,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		58.879.439,91	$		2.590.013.153,73	$	-	$	2.654.032.619,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	3,10%	11	$ 1.824.670,21	0,00%	0	$ -		$ -	**0,17%**	**$ 4.394.683,39**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	6,20%	22	$ 3.649.340,42	0,00%	0	$ -		$ -	**0,23%**	**$ 6.219.353,60**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	9,30%	33	$ 5.474.010,63	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 10.614.036,98**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	12,40%	44	$ 7.298.680,84	0,58%	2	$ 15.014.569,01		$ -	**1,03%**	**$ 27.453.276,20**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,49%	55	$ 9.123.351,05	1,16%	4	$ 30.029.138,01		$ -	**1,67%**	**$ 44.292.515,41**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	18,59%	66	$ 10.948.021,26	1,45%	5	$ 37.536.422,52		$ -	**2,02%**	**$ 53.624.470,13**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	21,69%	77	$ 12.772.691,47	1,74%	6	$ 45.043.707,02		$ -	**2,37%**	**$ 62.956.424,84**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,92%	92	$ 15.260.878,12	2,61%	9	$ 67.565.560,53		$ -	**3,31%**	**$ 87.966.465,00**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,14%	107	$ 17.749.064,77	3,19%	11	$ 82.580.129,54		$ -	**3,97%**	**$ 105.469.220,66**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	34,37%	122	$ 20.237.251,42	6,96%	24	$ 180.174.828,09		$ -	**7,74%**	**$ 205.552.105,86**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	38,60%	137	$ 22.725.438,07	10,72%	37	$ 277.769.526,63		$ -	**11,52%**	**$ 305.634.991,05**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	42,82%	152	$ 25.213.624,72	14,49%	50	$ 375.364.225,18		$ -	**15,29%**	**$ 405.717.876,25**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	47,05%	167	$ 27.701.811,37	17,39%	60	$ 450.437.070,21		$ -	**18,21%**	**$ 483.278.907,93**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	51,27%	182	$ 30.189.998,02	20,29%	70	$ 525.509.915,25		$ -	**21,13%**	**$ 560.839.939,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	55,50%	197	$ 32.678.184,67	23,48%	81	$ 608.090.044,79		$ -	**24,34%**	**$ 645.908.255,81**
14/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35	61,13%	217	$ 35.995.766,89	28,12%	97	$ 728.206.596,85		$ -	**28,99%**	**$ 769.342.390,09**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	237	$ 39.313.349,11	32,75%	113	$ 848.323.148,90		$ -	**33,64%**	**$ 892.776.524,36**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	70,22%	247	$ 41.343.096,19	37,68%	130	$ 975.946.985,46		$ -	**38,52%**	**$ 1.022.430.108,00**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,66%	257	$ 43.372.843,27	44,06%	152	$ 1.141.107.244,54		$ -	**44,82%**	**$ 1.189.620.114,16**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,49%	271	$ 46.214.489,17	50,43%	174	$ 1.306.267.503,62		$ -	**51,15%**	**$ 1.357.622.019,14**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	83,32%	285	$ 49.056.135,07	56,81%	196	$ 1.471.427.762,70		$ -	**57,48%**	**$ 1.525.623.924,12**
25/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	88,49%	300	$ 52.100.755,68	59,71%	**206**	$ 1.546.500.607,73		$ -	**60,43%**	**$ 1.603.741.389,76**
2/10/2022	**Semana 23**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,66%	315	$ 55.145.376,29	59,71%	206	$ 1.546.500.607,73		$ -	**60,54%**	**$ 1.606.786.010,37**
9/10/2022	**Semana 24**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**98,83%**	**330**	**$ 58.189.996,90**	63,19%	**218**	$ 1.636.588.021,78		**$ -**	**64,05%**	**$ 1.699.918.045,03**
16/10/2022	**Semana 25**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	66,67%	230	$ 1.726.675.435,82		$ -	**67,47%**	**$ 1.790.694.902,08**
23/10/2022	**Semana 26**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	73,33%	253	$ 1.899.342.979,40		$ -	**73,98%**	**$ 1.963.362.445,66**
30/10/2022	**Semana 27**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	80,00%	276	$ 2.072.010.522,98		$ -	**80,48%**	**$ 2.136.029.989,25**
6/11/2022	**Semana 28**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	87,25%	301	$ 2.259.692.635,57		$ -	**87,55%**	**$ 2.323.712.101,83**
13/11/2022	**Semana 29**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	94,49%	326	$ 2.447.374.748,16		$ -	**94,63%**	**$ 2.511.394.214,42**
20/11/2022	**Semana 30**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	100,00%	345	$ 2.590.013.153,73		$ -	**100,00%**	**$ 2.654.032.619,99**
27/11/2022	**Semana 31**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	345	$ 58.879.439,91	100,00%	345	$ 2.590.013.153,73		$ -	**100,00%**	**$ 2.654.032.619,99**
						$ -							

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 09-10-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**42**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

miércoles 05 de octubre, 2022

	Hoy 04 OCT	Mañana 05 OCT	Jueves 06 OCT	Viernes 07 OCT	Sábado 08 OCT	Domingo 09 OCT	Lunes 10 OCT
Hora	↑ 30° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 23°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°
08:00	24°	25°	25°	25°	25°	25°	26°
14:00	29°	30°	29°	29°	29°	29°	30°
20:00	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Lluvia	23.8 mm	5.9 mm	16 mm	14.1 mm	8.4 mm	1.2 mm	2.2 mm
Viento	↑ 9 km/h	↑ 10 km/h	↑ 10 km/h	↘ 7 km/h	→ 10 km/h	↘ 7 km/h	↑ 10 km/h
	05:48	05:48	05:48	05:48	05:48	05:48	05:48
	17:48	17:47	17:47	17:46	17:45	17:45	17:44

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23°	24°	25°	26°	27°	29°	29°	29°	28°	28°	27°	26°	25°	25°	25°

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 02 de noviembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-122-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No 26

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 26 cuyo periodo es del 17 de octubre del 2022 hasta 23 de octubre del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 20 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 2/11/2022
HORA: 9:58:29 a. m.
20224300418212

INFORME SEMANAL 26

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 26**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 26

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **17/10/2022** al **23/10/2022** | Fecha **23/10/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR — **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220576
Contratista		CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	2.654.032.619,99
Variación del valor	$	882.324.674,00
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial (Días)		150 Días
Plazo actual (Días)	226 Días	7,5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo		76 Días
Fecha Contractual de terminación		11/12/2022
Tiempo Transcurrido (días)	180	79,65%
Días remanentes del Contrato	49,00	21,68%
Acumulado a última acta pagada	$	821.329.766,06
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	1.404.101.290,40

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.		2220587
Interventor		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	303.315.624,00
Variación del valor	$	100.836.311,00
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial		150 Días
Plazo actual	226 Días	7,5 MESES - 226 DÍAS
Variación en plazo		76 Días
Fecha Contractual de terminación		11/12/2022
Ejecución del Contrato	180	79,65%
Días remanentes del Contrato	49,00	21,68%
Acumulado a última acta pagada	$	88.078.501,16
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	44.316.958,56

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 2.654.032.619,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.788.556.524,18	67,39%	$ 1.627.187.399,32	61,31%	-$ 161.369.124,86	-6,08%
Durante el Periodo	$ 50.648.545,01	1,91%	$ 38.973.704,87	1,47%	-$ 11.674.840,15	-0,44%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.839.205.069,19**	**69,30%**	**$ 1.666.161.104,18**	**62,78%**	**-$ 173.043.965,01**	**-6,52%**

Semáforo


Desviación en días: 10 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

A la fecha de corte del presente informe tenemos el siguiente reporte:
En cuanto a la actividad 2 a corte del 16 de octubre se tenían aprobados 256 diagnósticos, durante la semana del presente informe se aprobaron otros 30 diagnósticos para un total de 286, sin embargo, conforme a la reprogramación de obra deberían tener 345 diagnósticos aprobados, es decir, se presenta un atraso de 59 diagnósticos. El atraso para esta actividad corresponde al 12%.
El avance de la actividad 3 nos indica las siguientes cifras: un programado del 68,54% frente a un ejecutado del 62,13% lo cual representa un atraso de 6,41% Este atraso corresponde a 8 viviendas, ya que conforme a lo programado se deberían tener terminadas 199 viviendas y con corte al 23 de octubre se contaban con 191 viviendas terminadas.
El atraso general del proyecto equivale al 6,52%, lo que representa un leve incremento con relación a la semana anterior, aunque el incremento no es grande si preocupa a la Interventoría que no se estén tomando los controles respectivos para nivelar la programación de obra. Mas aún si se considera que estamos a 49 días de terminar el plazo contractual, plazo en el cual se deben terminar las 154 viviendas restantes objeto del contrato.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

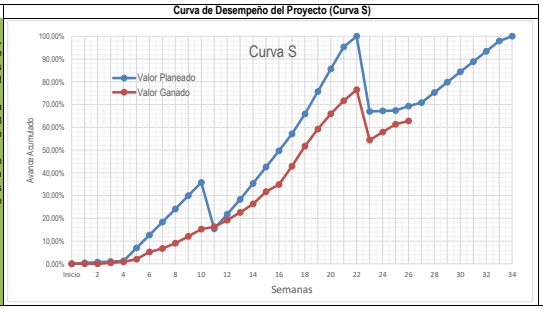




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	67,39%	61,31%	-6,08%	
Durante el Periodo	1,91%	1,47%	-0,44%	
Acumulado a la Fecha	**69,30%**	**62,78%**	**-6,52%**	

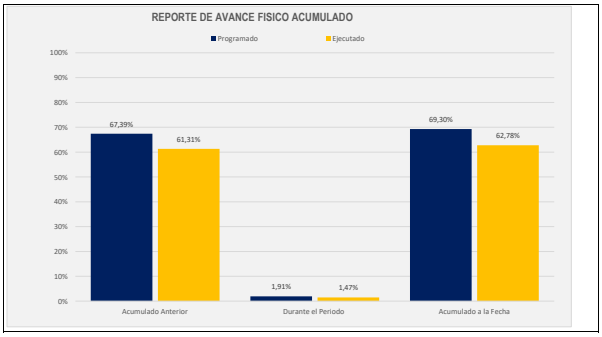


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
2	$ 821.329.766,06	46,36%	1	$ 379.134.821,64	21,40%	12/09/2022	$ 379.134.821,64








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
4	$ 88.078.501,16	43,50%	4	$ 88.078.501,16	43,50%		$ 39.483.466,03







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 88,00%
Lo cual nos indica un atraso del 12%
Comentario: A la fecha de corte del presente informe el contratista tiene 286 diagnósticos aprobados en actas, sin embargo, la cantidad programada es del 345 indicándonos un atraso de 59 diagnósticos por aprobar, la interventoría requerirá al Contratista para la entrega de los diagnósticos pendientes en el mes de octubre.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 68,54% vs 62,13% EJECUTADO
Lo cual nos indica un atraso del 6,41%
En cuanto a la actividad 3 y conforme a las nuevas condiciones del contrato la meta es de 345 viviendas, a la fecha se deben tener terminada 199 intervenciones según la reprogramación de obra, sin embargo, se han intervenido 233 viviendas, de las cuales se han terminado 191 y se adelantan labores constructivas en 42 más, el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo. En la última semana el atraso incrementó con base en el reporte anterior, es necesario que el contratista acelere la actividad 2 de diagnóstico con el fin de tener identificadas dichas viviendas de tal forma que no se constituya en un motivo de atraso para la actividad 3. Además de atender las solicitudes que ha venido haciendo la interventoría de incrementar los rendimientos en la ejecución de las obras, con el fin de aumentar el número de viviendas terminadas. La Interventoría no evidencia acciones de parte del contratista para controlar los atrasos del proyecto

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 26

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/10/2022** al **23/10/2022** Fecha **23/10/2022**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. En la presente semana se aprobaron 30 diagnósticos correspondientes a los 108 de la adición, con lo cual completan 286 diagnósticos aprobados.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
Con corte al 23 de octubre se han intervenido 233 viviendas de las cuales solo 191 están terminadas, El contratista tiene en ejecución 42 intervenciones y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras y poder finalizar este primer grupo de viviendas para concentrar los esfuerzos en las 108 viviendas que hacen parte de la adición.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 24 al 30 de octubre de 2022 el contratista debe tener terminadas 214 intervenciones de acuerdo a la reprogramación de obra, por lo cual deberá incrementar sus esfuerzos en las actividades 2 y 3, esto teniendo en cuenta las nuevas metas establecidas en el contrato de obra conforme a las adiciones realizadas. Se deberá continuar con la etapa de diagnóstico para la identificación y aprobación de las nuevas viviendas y con la terminación de las viviendas que se encuentran en ejecución y que hacen parte de la meta inicial del contrato, esto con el fin de poder continuar con la ejecución de las 108 nuevas viviendas dentro del plazo contractual.
Como a la fecha se presenta un atraso en la actividad 2 y 3 se deberá vincular más personal de obra para atender las necesidades del proyecto, ya que no hay lugar a más prórrogas, es decir, en las próximas semanas hasta la fecha del 11 de diciembre 2022 se deberá dar cumplimiento al objeto contractual.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	59	0	59	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	59	0	59	100,00%



OBSERVACIONES

En el presente periodo No presentaron lluvias.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A			N/A		

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A			N/A	

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETAS O ADECUACIONES, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 26

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/10/2022** al **23/10/2022** Fecha **23/10/2022**






ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS






CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO, LEVAMTE DE MAMPOSTERIA Y PEÑETE INTERNO

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-079-22 con el asunto: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_103 mediante del cual realizamos entrega de aval para 19 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 019
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-080-22 con el asunto: SOLICITUD PLANILLA DE AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA mediante el cual solicitamos la planilla de afiliación a la seguridad social de los obreros (maestros, oficiales y ayudantes).
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-081-22 con el asunto: REMISIÓN DE INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO No. 17 APROBACIÓN REPROGRAMACIÓN DE OBRA por medio del cual remitimos INFORME TECTNICO ESPECIALISTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUETO No.17, el especialista de la Interventoría realizó la revisión de la información entregada por el contratista relacionada con los ajustes a la reprogramación de obra conforme a la adición y prórroga del contrato, en la cual se evidencia que se atendieron las observaciones realizadas por la Interventoría, en razón a lo anterior se aprueba la reprogramación presentada y a partir de la fecha se realizará el seguimiento con esta versión.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-082-22 con el asunto: INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO No. 17 al contratista mediante el cual se da aprobación a la programación de obra.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-083-22 con el asunto: SOLICITUD CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION. Mediante el cual solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en varios comités de obra se han comprometido a la entrega semanal de por lo menos 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-084-22 con el asunto: RESPUESTA A OFICIO CON OBSERVACONES POR PARTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CORDOBA, BOLIVAR. Por medio del cual emitimos respuesta al comunicado recibido el día 27 de septiembre de 2022 por la PERSONERIA MUNICIPAL DE CORDOBA, BOLIVAR.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-085-22 con el asunto: REITERACIÓN Solicitud respuesta Observaciones recorrido de campo Visita Ministerio de Vivienda por medio del cual reiteramos solicitud de dar respuesta a la mayor brevedad a las observaciones del informe de visita de supervisión del Ministerio de Vivienda del 14 de julio 2022 en el barrio San Martin de Córdoba Bolívar.

Marcy A. Correa C		[signature]	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	23/10/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	188	28	188	1	223	223	223	0	0	188	35	107	0	97	0	256	295	29	285	1	233	191	0	42	345
	TOTAL	**217**	**0**	**188**	**28**	**188**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**188**	**35**	**107**	**0**	**97**	**0**	**256**	**295**	**29**	**285**	**1**	**233**	**191**	**0**	**42**	**345**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/10/2022 Y EL 23/10/2022 PLAZO: 7.5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 23/10/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	28/06/2022	TERMINADA	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x

SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ92-VE-168	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ92-VE-169	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$2.230.924,70	$2.230.924,70	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$8.930.810,61	$8.930.810,61	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.116.195,29	$8.116.195,29	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	133	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	134	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	136	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	137	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	138	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	139	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	141	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	142	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	143	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	144	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	145	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	146	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	147	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	148	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	149	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	150	B-C-SM-MZ46-VE-212	100%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.774.463,33	5/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-216	100%	Adecuacion	$8.311.308,81	$8.311.308,81	6/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	152	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	8/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	153	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	9/09/2022	TERMINADA	17/09/2022	23/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	154	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Caseta t2	$4.292.672,67	$4.292.672,67	10/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	155	B-C-SM-MZ23-VE-117	100%	Adecuacion	$4.772.651,25	$4.772.651,25	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	156	B-C-SM-MZ59-VE-187	100%	Adecuacion	$8.212.157,27	$8.212.157,27	11/09/2022	TERMINADA	16/09/2022	22/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	157	B-C-SM-MZ34-VE-116	100%	Caseta t3	$7.989.636,90	$7.989.636,90	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ30-VE-123	100%	Caseta t3	$8.084.933,32	$8.084.933,32	12/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	159	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	160	B-C-SM-MZ87-VE-189	100%	Adecuacion	$6.068.174,04	$6.068.174,04	13/09/2022	TERMINADA	18/09/2022	24/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	161	B-C-SM-MZ18-VE-202	100%	Adecuacion	$8.298.564,37	$8.298.564,37	14/09/2022	TERMINADA	19/09/2022	25/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	162	B-C-SM-MZ66-VE-065	100%	Caseta t3	$7.828.052,76	$7.828.052,76	14/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	8	14	-6		x
SM	15	163	B-C-SM-MZ66-VE-066	100%	Adecuacion	$4.292.672,67	$4.292.672,67	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	164	B-C-SM-MZ75-VE-070	100%	Adecuacion	$4.222.499,91	$4.222.499,91	15/09/2022	TERMINADA	20/09/2022	26/09/2022	5	11	-6		x
SM	18	165	B-C-SM-MZ67-VE-078	100%	Adecuacion	$5.110.794,97	$5.110.794,97	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	166	B-C-SM-MZ34-VE-119	100%	Adecuacion	$7.021.881,94	$7.021.881,94	16/09/2022	TERMINADA	21/09/2022	27/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	167	B-C-SM-MZ56-VE-190	100%	Adecuacion	$7.154.236,55	$7.154.236,55	17/09/2022	TERMINADA	22/09/2022	28/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	168	B-C-SM-MZ56-VE-191	100%	Caseta t3	$8.896.139,02	$8.896.139,02	17/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	169	B-C-SM-MZ31-VE-199	100%	Adecuacion	$4.691.093,17	$4.691.093,17	18/09/2022	TERMINADA	24/09/2022	30/09/2022	6	12	-6		x
SM	18	170	B-C-SM-MZ67-VE-183	100%	Caseta t3	$6.957.541,97	$6.957.541,97	18/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	171	B-C-SM-MZ30-VE-200	100%	Caseta t3	$8.312.234,66	$8.312.234,66	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	172	B-C-SM-MZ31-VE-201	100%	Caseta t3	$6.950.167,16	$6.950.167,16	19/09/2022	TERMINADA	27/09/2022	3/10/2022	8	14	-6		x
SM	13	173	B-C-SM-MZ47-VE-105	100%	Adecuacion	$3.899.268,01	$3.899.268,01	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	14	174	B-C-SM-MZ68-VE-108	100%	Adecuacion	$3.617.504,69	$3.617.504,69	20/09/2022	TERMINADA	25/09/2022	1/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	175	B-C-SM-MZ145-VE-208	100%	Adecuacion	$6.196.096,01	$6.196.096,01	21/09/2022	TERMINADA	26/09/2022	2/10/2022	5	11	-6		x
SM	12	176	B-C-SM-MZ66-VE-198	100%	Adecuacion	$5.360.187,87	$5.360.187,87	21/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	177	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	100%	Caseta t3	$9.273.205,89	$9.273.205,89	22/09/2022	TERMINADA	30/09/2022	6/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	178	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	100%	Adecuacion	$7.909.051,57	$7.909.051,57	22/09/2022	TERMINADA	28/09/2022	4/10/2022	6	12	-6		x
SM	17	179	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	100%	Adecuacion	$7.056.470,53	$7.056.470,53	23/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	6	12	-6		x
SM	15	180	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	100%	Caseta t3	$7.321.539,69	$7.321.539,69	23/09/2022	TERMINADA	1/10/2022	7/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	181	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	100%	Adecuacion	$5.983.563,40	$5.983.563,40	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	182	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	100%	Adecuacion	$7.900.843,94	$7.900.843,94	24/09/2022	TERMINADA	29/09/2022	5/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	183	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	100%	Caseta t3	$7.343.027,38	$7.343.027,38	25/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	184	B-C-SM-MZ98-VE-INC-008	100%	Caseta t3	$7.345.145,38	$7.345.145,38	26/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	185	B-C-SM-MZ87-VE-INC-009	100%	Adecuacion	$6.166.474,80	$6.166.474,80	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	186	B-C-SM-MZ48-VE-INC-010	100%	Adecuacion	$7.156.353,68	$7.156.353,68	27/09/2022	TERMINADA	2/10/2022	8/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	187	B-C-SM-MZ38-VE-INC-013	100%	Caseta t3	$8.739.765,67	$8.739.765,67	28/09/2022	TERMINADA	6/10/2022	12/10/2022	8	14	-6		x

SM	15	188	B-C-SM-MZ33-VE-INC-014	100%	Adecuacion	$7.094.395,09	$7.094.395,09	28/09/2022	TERMINADA	3/10/2022	9/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	189	B-C-SM-MZ55-VE-064	100%	Adecuacion	$7.807.428,21	$7.807.428,21	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	15	190	B-C-SM-MZ145-VE-161	100%	Adecuacion	$8.918.748,97	$8.918.748,97	29/09/2022	TERMINADA	4/10/2022	10/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	191	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	100%	Adecuacion	$7.948.410,17	$7.948.410,17	30/09/2022	TERMINADA	5/10/2022	11/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	192	B-C-SM-MZ33-VE-INC-016	100%	Caseta t3	$7.602.156,55	$7.602.156,55	30/09/2022	TERMINADA	8/10/2022	14/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	193	B-C-SM-MZ85-VE-INC-019	85%	Caseta t3	$7.773.487,18	$6.607.464,10	1/10/2022	EN EJECUCION	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	194	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	85%	Caseta t3	$8.333.260,29	$7.083.271,25	1/10/2022	EN EJECUCION	9/10/2022	15/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	195	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	85%	Caseta t3	$8.094.089,35	$6.879.975,95	2/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	196	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	85%	Caseta t3	$7.629.024,81	$6.484.671,09	2/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	197	B-C-SM-MZ33-VE-INC-032	85%	Caseta t3	$8.036.839,77	$6.831.313,80	3/10/2022	EN EJECUCION	11/10/2022	17/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	198	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	85%	Caseta t3	$7.811.643,60	$6.639.897,06	4/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	199	B-C-SM-MZ33-VE-INC-027	85%	Caseta T2	$8.012.216,20	$6.810.383,77	5/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	200	B-C-SM-MZ66-VE-INC-033	85%	Adecuacion	$6.628.918,24	$5.634.580,50	5/10/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	201	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	75%	Caseta t3	$7.997.347,42	$5.998.010,57	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	202	B-C-SM-MZ98-VE-INC-036	75%	Caseta t3	$7.885.031,34	$5.913.773,51	6/10/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	8	14	-6		x
SM	15	203	B-C-SM-MZ85-VE-INC-038	75%	Caseta t3	$8.272.191,01	$6.204.143,26	7/10/2022	EN EJECUCION	15/10/2022	21/10/2022	8	14	-6		x
SM	16	204	B-C-SM-MZ93-VE-INC-039	75%	Adecuacion	$7.727.983,14	$5.795.987,36	7/10/2022	EN EJECUCION	12/10/2022	18/10/2022	5	11	-6		x
SM	16	205	B-C-SM-MZ93-VE-INC-040	75%	Adecuacion	$7.621.248,46	$5.715.936,35	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	206	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	75%	Adecuacion	$7.737.812,12	$5.803.359,09	8/10/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	5	11	-6		x
SM	17	207	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	75%	Caseta t3	$8.221.884,89	$6.166.413,67	8/10/2022	EN EJECUCION	16/10/2022	22/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	208	B-C-SM-MZ96-VE-INC-046	65%	Caseta t3	$9.156.805,39	$5.951.923,50	9/10/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	209	B-C-SM-MZ95-VE-INC-049	65%	Caseta t3	$8.256.966,48	$5.367.028,21	10/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	210	B-C-SM-MZ32-VE-INC-050	65%	Caseta t3	$7.745.465,56	$5.034.552,61	11/10/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	211	B-C-SM-MZ36-VE-INC-051	65%	Adecuacion	$7.443.842,89	$4.838.497,88	12/10/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	212	B-C-SM-MZ30-VE-INC-052	65%	Caseta t3	$8.090.760,97	$5.258.994,63	13/10/2022	EN EJECUCION	21/10/2022	27/10/2022	8	14	-6		x
SM	17	213	B-C-SM-MZ94-VE-INC-053	65%	Adecuacion	$5.710.686,86	$3.711.946,46	13/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	214	B-C-SM-MZ-VE-INC-055	65%	Adecuacion	$7.242.404,18	$4.707.562,72	13/10/2022	EN EJECUCION	18/10/2022	24/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	215	B-C-SM-MZ-VE-INC-056	65%	Adecuacion	$7.673.332,15	$4.987.665,90	14/10/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	5	11	-6		x
SM	18	216	B-C-SM-MZ86-VE-INC-057	65%	Caseta t3	$7.705.011,19	$5.008.257,27	15/10/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	29/10/2022	8	14	-6		x
SM	18	217	B-C-SM-MZ86-VE-INC-058	65%	Caseta t2	$8.107.440,98	$3.648.348,44	16/10/2022	EN EJECUCION	24/10/2022	30/10/2022	8	14	-6		x
SM	19	218	B-C-SM-MZ48-VE-INC-011	45%	Adecuacion	$6.827.750,12	$3.648.348,44	17/10/2022	EN EJECUCION	22/10/2022	31/10/2022	5	14	-6		x
SM	17	219	B-C-SM-MZ91-VE-INC-062	45%	Adecuacion	$4.551.930,25	$3.648.348,44	17/10/2022	EN EJECUCION	22/10/2022	1/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	220	B-C-SM-MZ87-VE-INC-063	45%	Adecuacion	$7.258.523,54	$3.648.348,44	18/10/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	2/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	221	B-C-SM-MZ67-VE-INC-064	45%	Adecuacion	$5.250.910,34	$3.648.348,44	18/10/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	3/11/2022	5	14	-6		x
SM	17	222	B-C-SM-MZ91-VE-INC-065	45%	Caseta T3	$8.132.709,35	$3.648.348,44	19/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	4/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	223	B-C-SM-MZ21-VE-INC-066	45%	Caseta T3	$8.884.140,18	$3.648.348,44	19/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	5/11/2022	8	14	-6		x
SM	18	224	B-C-SM-MZ47-VE-INC-068	45%	Adecuacion	$5.141.678,32	$3.648.348,44	20/10/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	6/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	225	B-C-SM-MZ47-VE-INC-069	45%	Adecuacion	$5.804.814,20	$3.648.348,44	20/10/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	7/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	226	B-C-SM-MZ46-VE-INC-070	45%	Adecuacion	$7.533.082,62	$3.648.348,44	20/10/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	8/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	227	B-C-SM-MZ32-VE-INC-071	45%	Adecuacion	$4.494.495,27	$3.648.348,44	21/10/2022	EN EJECUCION	26/10/2022	9/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	228	B-C-SM-MZ32-VE-INC-072	45%	Adecuacion	$2.547.155,48	$3.648.348,44	21/10/2022	EN EJECUCION	26/10/2022	10/11/2022	5	14	-6		x
SM	18	229	B-C-SM-MZ32-VE-INC-073	45%	Adecuacion	$5.899.252,59	$3.648.348,44	22/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	11/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	230	B-C-SM-MZ95-VE-INC-025	45%	Caseta T3	$7.925.272,79	$3.648.348,44	22/10/2022	EN EJECUCION	30/10/2022	12/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	231	B-C-SM-MZ48-VE-INC-029	45%	Adecuacion	$8.123.075,86	$3.648.348,44	22/10/2022	EN EJECUCION	27/10/2022	13/11/2022	5	14	-6		x
SM	19	232	B-C-SM-MZ86-VE-INC-030	45%	Caseta T3	$8.938.581,32	$3.648.348,44	23/10/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	14/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	233	B-C-SM-MZ98-VE-INC-031	45%	Caseta T3	$7.166.340,15	$3.648.348,44	23/10/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	15/11/2022	8	14	-6		x
SM	19	234	B-C-SM-MZ32-VE-INC-017	45%	Caseta T3	$7.936.218,15	$3.648.348,44	23/10/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	16/11/2022	8	14	-6		x

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		58.879.439,91	$		2.590.013.153,73	$	-	$	2.654.032.619,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		58.879.439,91	$		2.590.013.153,73	$	-	$	2.654.032.619,99
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,00%**	**$**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,10%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	7,38%	24	$ 4.348.020,18	0,00%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,22%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	9,23%	30	$ 5.435.025,22	0,87%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**2,12%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	12,92%	42	$ 7.609.035,31	1,74%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**3,35%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,69%	51	$ 9.239.542,88	2,90%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**4,57%**	**$ 121.187.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	21,85%	71	$ 12.862.893,03	4,06%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**5,85%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	28,92%	94	$ 17.029.745,70	5,22%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**7,16%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,38%	115	$ 20.834.263,35	6,38%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**8,45%**	**$ 224.284.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	7,54%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**9,78%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,38%	141	$ 25.544.618,55	8,70%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**14,09%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	49,23%	160	$ 28.986.801,19	13,04%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**15,08%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	52,31%	170	$ 30.798.476,26	13,91%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**18,60%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35	55,08%	179	$ 32.428.983,83	17,39%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**20,38%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	62,46%	203	$ 36.777.004,01	19,13%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**24,57%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	23,19%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**27,83%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	26,38%	101	$ 770.397.786,44		$ -	**30,70%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	29,28%	116	$ 884.813.299,28		$ -	**35,01%**	**$ 929.266.674,74**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	33,62%	137	$ 1.044.995.017,25		$ -	**41,05%**	**$ 1.089.448.392,71**
25/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	39,71%	149	$ 1.136.527.427,52		$ -	**44,50%**	**$ 1.180.980.802,98**
2/10/2022	**Semana 23**	100,00%	$ 5.140.026,35	66,77%	217	$ 39.313.349,11	43,15%	160	$ 1.220.432.136,94		$ -	**47,66%**	**$ 1.264.885.512,40**
9/10/2022	**Semana 24**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,92%	237	$ 42.936.699,26	46,38%	174	$ 1.306.267.503,62		$ -	**51,03%**	**$ 1.354.344.229,23**
16/10/2022	Semana 25	100,00%	$ 5.140.026,35	78,77%	256	$ 46.378.880,00	50,43%	185	$ 1.349.246.419,91		$ -	**52,78%**	**$ 1.400.765.326,26**
23/10/2022	**Semana 26**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**88,00%**	**286**	**$ 51.811.905,00**	**63,19%**	**191**	**$ 1.404.101.290,40**		$ -	**55,05%**	**$ 1.461.055.221,75**
30/10/2022	**Semana 27**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			66,67%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
6/11/2022	**Semana 28**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			73,33%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
13/11/2022	**Semana 29**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			80,00%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
20/11/2022	**Semana 30**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			87,25%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
27/11/2022	**Semana 31**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			94,49%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
4/12/2022	**Semana 32**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			100,00%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**
11/12/2022	**Semana 33**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%			100,00%				$ -	**0,19%**	**$ 5.140.026,35**

TOTAL DIAGNOSTICOS APROBADOS **286**

TOTAL INTERVENCIONES TERMINADAS **191**

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 23-10-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**42**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 06 de octubre 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-109-22

Ingeniero
DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
Director de Obra
Consorcio Construredes

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: RESPUESTA A COMUNICADO CCR_CORDOBA_2220576_2022_095 recibido el día 6 de octubre de 2022 con asunto RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL NUMERO 2.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y luego de la revisión de la documentación remitida por el contratista de Obra el día 6 de Octubre de 2022 mediante comunicado CCR_CORDOBA_2220576_2022_095 RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL NUMERO 2, la interventoría se permite hacer las siguientes observaciones:

- FORMATO F-FI-06 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO

El valor bruto y la amortización no son los correctos, los valores a facturar son los que se muestran en el resumen del cuadro adjunto, este archivo también se envía en Excel para la verificación:

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

Actividad No. 3				
	100%			90%
	$ 362.363.468,36			$ 326.127.121,52
25,44%	$ 92.185.266,35		27,25%	$ 88.869.640,62
1,00%	$ 3.623.634,68		1,00%	$ 3.261.271,22
5,00%	$ 18.118.173,42		5,00%	$ 16.306.356,08
19,00%	$ 3.442.452,95		19,00%	$ 3.098.207,66
	$ 479.732.995,76			$ 437.662.597,10
ACTIVIDAD 1		ACTIVIDAD 2		
		$ 11.594.720,26		
$ 0,00		$ 9.743.462,40		
$ 0,00		$ 8.769.116,16		
$ 0,00		$ 1.851.257,86		
	ACT 1		$ 0,00	
	ACT 2		$ 11.594.720,26	
	ACT3		$ 479.732.995,76	
			$ 491.327.716,02	
	% ejecutado presente acta		27,73%	
	% facturado presente acta		24,96%	
	VALOR FACTURADO (ACT	90%	$ 442.218.303,32	$ 437.268.837,80
		IVA	$ 4.949.465,52	
		AMORTIZACIÓN 20%	$ 95.946.599,15	
		VALOR DE LA FACTURA	$ 346.271.704,170	

El formato debe venir diligenciado en todos los campos

- No se pasa la factura aún, solo la factura proforma con los valores que se indicaron en el punto anterior.
- EL ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL adjunta en el paquete no corresponde al archivo ajustado y que se envió por correo el día de ayer. El acta debe venir firmada por el Ing. Duarte

Se adjuntan formatos en Excel que deben incluirse con las respectivas firmas.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

Proyectó: Marcy Alejandra Correa

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 6/10/2022
HORA: 3:40:02 p. m.
20224300376892

ADMON

Bogotá D.C, 06 de octubre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-108-22

Señores:
Ingeniera
Erika Marcela Gutiérrez
Supervisora
Contrato de Interventoría N° 2220587
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENterritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20Bogotá.
Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 22.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 22 correspondiente al periodo del 19 de septiembre del 2022 al 25 de septiembre del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 19 foliosProyectó: Leydi Bibiana Castaño-Asistente Administrativa
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 22

INFORME SEMANAL 22

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** | Fecha **26/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220576
Contratista		CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	1.771.707.945,99
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial (Días)		150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	153	102,00%
Días remanentes del Contrato	0,00	0,00%
Acumulado a última acta pagada	$	379.134.821,64
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	1.119.057.724,53

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2220587
Interventor		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	202.479.313,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial		150 Días
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/09/2022
Ejecución del Contrato	153	102,00%
Días remanentes del Contrato	0,00	0,00%
Acumulado a última acta pagada	$	48.595.035,13
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	39.483.466,03

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.688.131.111,85	95,28%	$ 1.270.137.426,48	71,69%	-$ 417.993.685,37	-23,59%
Durante el Periodo	$ 83.576.834,14	4,72%	$ 85.169.095,71	4,81%	$ 1.592.261,57	0,09%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.771.707.945,99**	**100,00%**	**$ 1.355.306.522,19**	**76,50%**	**-$ 416.401.423,80**	**-23,50%**

Semáforo

Desviación en días: 35 Días




Observaciones al desempeño del proyecto


De acuerdo a la reprogramación de obra correspondiente al contrato inicial el seguimiento nos indica un avance del 100% frente a un ejecutado del 76,50% lo cual representa un atraso de 23,50%

De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, esto indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 217 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 197 viviendas, de las cuales se han terminado 149 y se adelantan labores constructivas en 48 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. En el transcurso de la siguiente semana se dará inicio a la ejecución de las demás viviendas las cuales ya tienen parte del material.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

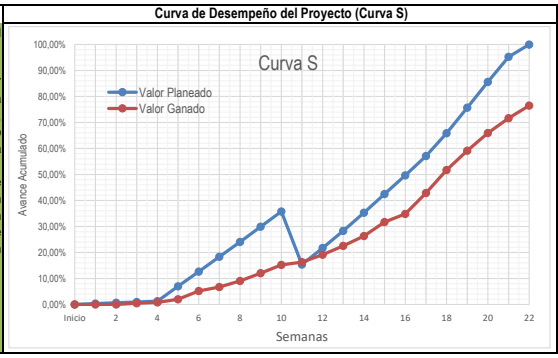

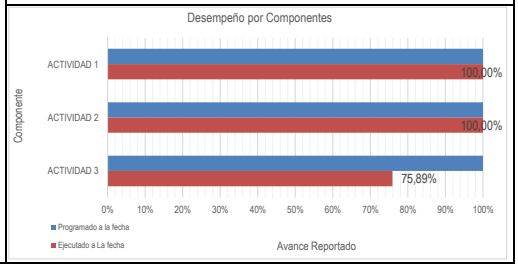


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	95,28%	71,69%	-23,59%	
Durante el Periodo	4,72%	4,81%	0,09%	
Acumulado a la Fecha	**100,00%**	**76,50%**	**-23,50%**	

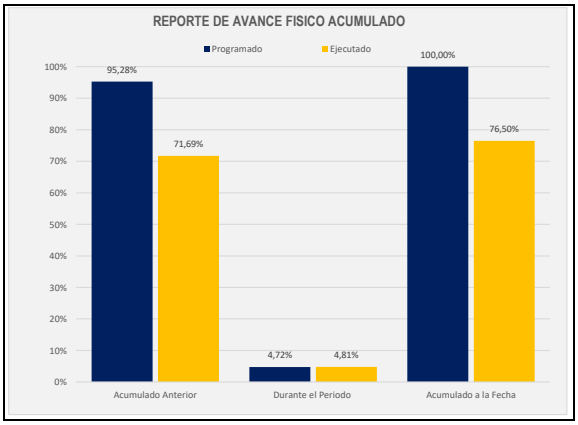

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1	$ 379.134.821,64	21,40%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 64.793.381,17	32,00%	3	$ 48.595.035,13	24,00%	9/09/2022	$ 16.198.346,04







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 100% vs 75,89% EJECUTADO
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra del contrato inicial debería tener 217 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 197 viviendas, de las cuales se han terminado 149 y se adelantan labores constructivas en 48 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. Durante las ultimas semanas se han registrado lluvias que han bajado los rendimientos de obra, además de las demoras en la entrega de materiales indispensables para la ejecución de las actividades.
La Entidad se encuentra formalizando la prórroga y adición al contrato de obra por el 50% del valor inicial y 2.5 meses, tiempo en el cual se ejecutarán otras 108 viviendas aproximadamente, paralelamente a la ejecución de estas nuevas viviendas el Contratista deberá ponerse al día con las viviendas que hacen parte del objeto inicial, es decir, las 217 viviendas de matriz más las 20 de inclusión que se aprobaron teniendo en cuenta que el promedio de intervención fue menor al estimado inicialmente se completa así 237, por tal motivo se solicitó al contratista la reprogramación total del proyecto, incluyendo la adición que esta en proceso, para lo cual el contratista se comprometió a vincular más personal de otra obra que están terminando en la zona y a presionar para la entrega oportuna de materiales.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual, la presente semana se realizó aprobación de 20 diagnósticos más completando así 237.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra del contrato inicial se debería tener 217 viviendas terminadas, y se han intervenido 197 viviendas, de las cuales solo 149 están terminadas indicándonos un atraso de 68 viviendas por terminar para completar las 217. El contratista tiene en ejecución 48 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo
A pesar de que se ha vinculado mayor personal de obra no se ha logrado mejorar los rendimientos en la ejecución de las viviendas debido a factores externos al Contratista, tales como: incremento de las lluvias en el Municipio, demoras en la entrega por parte del proveedor de la cerámica de piso y paredes y demoras en la entrega del material granular por parte del proveedor. Se solicitó al Contratista la entrega de los soportes que evidencien dichas demoras en estos insumos que afectan la normal ejecución de las obras. A esto se suma que el fuerte invierno ha afectado las vías de ingreso al Municipio por las cuales se reciben los materiales del proyecto.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 27 de septiembre al 02 de octubre de 2022 y teniendo en cuenta que ya se completaron los 217 diagnósticos inicialmente contemplados en el contrato de obra el contratista entregó 20 diagnósticos de inclusiones los cuales fueron aprobados por la interventoría, se espera que se presente por parte del contratista un reporte indicando el remanente en saldo para verificar si alcanza para otras intervenciones.En atención a la prórroga al Contrato de obra, el contratista deberá continuar con la ejecución de los diagnósticos para identificar las 108 nuevas viviendas a intervenir.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra, para lo cual dará inicio a la ejecución de las demás viviendas pendientes para completar la meta contractual. Adicionalmente, dede ir preparando la logística y los recursos necesarios para dar inicio a las nuevas viviendas que se adicionaron para la actividad N° 3, aproximadamente 108 viviendas


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	43	8	51	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**43**	**8**	**51**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias,torrenciales los dias 19 y 22 de septirmbre (se adjunta reporte climatologico)

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A					

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A				

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22 con el asunto SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION, solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en el comité de obra No. 17 del 01 de septiembre se comprometieron a la entrega para el día 06 de septiembre de las primeras 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-065-22 a COOSEPCOR con el asunto SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TREINTA Y TRES (33) DIAGNÓSTICOS APROBADOS.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-066-22 con el asunto SOLICITUD PROGRAMACION DE ENTREGAS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION mediante el cual se solicita presentar PROGRAMACIÓN de las entregas de las actas de recibo a satisfacción debidamente diligenciadas.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-067-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante el cual reiteramos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-068-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSIÓN, mediante el cual se remite para su debido tramite Cuatro (4) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-069-22 con el asunto SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN COMITÉ DE OBRA por medio del cual solicitamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 19 en el cual se consignaron los siguientes acuerdos.
- Aumento de las intervenciones en ejecución de obra.
- Entrega de actas de recibo a satisfacción de las intervenciones terminadas.
- Entrega del acta parcial No. 2 y sus anexos correspondientes.
- Entrega de la justificación del atraso por parte del proveedor de la cerámica y materiales pétreos (cantera)

	Marcy A. Correa C		
	Firma		**Firma**
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-062	8-sep-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	9	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-sep-22	SI	SI	13-sep-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-063	8-sep-22	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES	9	**Coopsercor**			8-sep-22	SI		13-sep-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-068	20-sep-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	20-sep-22	SI	SI	21-sep-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	26/09/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																												
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES														TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3		
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	187	29	187	1	223	223	223	0	0	187	35	49	0	49	0	237	236	29	236	1	197	149	0	48	217		
	TOTAL	**217**	**0**	**187**	**29**	**187**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**187**	**35**	**49**	**0**	**49**	**0**	**237**	**236**	**29**	**236**	**1**	**197**	**149**	**0**	**48**	**217**		

1 222

Valor comprometido Actividad 1	**$ 5.140.026,35**
Valor comprometido actividad 2	**$ 39.313.347,50**
Valor comprometido actividad 3	**$ 1.644.779.795,21**
Valor ejecutado actividad 3	**$ 1.310.853.148,34**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/09/2022 Y EL 26/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 26/09/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	80%	Adecuacion	$8.137.626,09	$6.510.100,87	28/06/2022	EN EJECUCION	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ84-VE-176	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ84-VE-177	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.210.038,73	$8.210.038,73	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	133	B-C-SM-MZ84-VE-181	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	134	B-C-SM-MZ84-VE-182	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	90%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.197.017,00	5/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	153	B-C-SM-MZ92-VE-216	90%	Caseta t3	$8.311.308,81	$7.480.177,93	5/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	154	B-C-SM-MZ33-VE-196	90%	Adecuacion	$8.337.864,77	$7.504.078,29	5/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	155	B-C-SM-MZ33-VE-193	85%	Caseta t3	$8.081.818,61	$6.869.545,82	6/09/2022	EN EJECUCION	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	156	B-C-SM-MZ33-VE-195	85%	Adecuacion	$5.575.323,64	$4.739.025,09	6/09/2022	EN EJECUCION	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	157	B-C-SM-MZ41-VE-197	85%	Caseta t4	$8.310.190,06	$7.063.661,55	6/09/2022	EN EJECUCION	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ76-VE-076	85%	Adecuacion	$7.966.932,81	$6.771.892,89	7/09/2022	EN EJECUCION	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	159	B-C-SM-MZ55-VE-036	85%	Adecuacion	$4.519.608,59	$3.841.667,30	7/09/2022	EN EJECUCION	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	160	B-C-SM-MZ45-VE-037	85%	Adecuacion	$5.427.357,42	$4.613.253,81	8/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	161	B-C-SM-MZ87-VE-189	85%	Adecuacion	$6.068.174,04	$5.157.947,93	8/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ30-VE-123	85%	Caseta t3	$8.084.933,32	$6.872.193,32	8/09/2022	EN EJECUCION	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	163	B-C-SM-MZ66-VE-065	85%	Caseta t3	$7.828.052,76	$6.653.844,85	9/09/2022	EN EJECUCION	18/09/2022	24/09/2022	9	15	-6		x
SM	15	164	B-C-SM-MZ66-VE-066	85%	Caseta t2	$4.292.672,67	$3.648.771,77	10/09/2022	EN EJECUCION	20/09/2022	26/09/2022	10	16	-6		x
SM	15	165	B-C-SM-MZ23-VE-117	65%	Adecuacion	$4.772.651,25	$3.102.223,31	11/09/2022	EN EJECUCION	22/09/2022	28/09/2022	11	17	-6		x
SM	11	166	B-C-SM-MZ59-VE-187	65%	Adecuacion	$8.212.157,27	$5.337.902,23	11/09/2022	EN EJECUCION	23/09/2022	29/09/2022	12	18	-6		x
SM	14	167	B-C-SM-MZ34-VE-116	65%	Caseta t3	$7.989.636,90	$5.193.263,99	12/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	13	19	-6		x
SM	12	168	B-C-SM-MZ30-VE-123	65%	Caseta t3	$8.084.933,32	$5.255.206,66	12/09/2022	EN EJECUCION	26/09/2022	2/10/2022	14	20	-6		x
SM	6	169	B-C-SM-MZ87-VE-146	65%	Adecuacion	$7.503.681,08	$4.877.392,70	13/09/2022	EN EJECUCION	28/09/2022	4/10/2022	15	21	-6		x
SM	11	170	B-C-SM-MZ87-VE-189	65%	Adecuacion	$6.068.174,04	$3.944.313,13	13/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	16	22	-6		x
SM	14	171	B-C-SM-MZ18-VE-202	65%	Adecuacion	$8.298.564,37	$5.394.066,84	14/09/2022	EN EJECUCION	1/10/2022	7/10/2022	17	23	-6		x
SM	13	177	B-C-SM-MZ66-VE-065	65%	Caseta t3	$7.828.052,76	$5.088.234,29	14/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	18	24	-6		x
SM	15	178	B-C-SM-MZ66-VE-066	65%	Adecuacion	$4.292.672,67	$2.790.237,24	15/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	19	25	-6		x
SM	13	179	B-C-SM-MZ75-VE-070	65%	Adecuacion	$4.222.499,91	$2.744.624,94	15/09/2022	EN EJECUCION	5/10/2022	11/10/2022	20	26	-6		x
SM	18	180	B-C-SM-MZ67-VE-078	65%	Adecuacion	$5.110.794,97	$3.322.016,73	16/09/2022	EN EJECUCION	7/10/2022	13/10/2022	21	27	-6		x
SM	12	181	B-C-SM-MZ34-VE-119	65%	Adecuacion	$7.021.881,94	$4.564.223,26	16/09/2022	EN EJECUCION	8/10/2022	14/10/2022	22	28	-6		x
SM	11	182	B-C-SM-MZ56-VE-190	65%	Adecuacion	$7.154.236,55	$4.650.253,76	17/09/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	23	29	-6		x
SM	14	183	B-C-SM-MZ56-VE-191	65%	Caseta t3	$8.896.139,02	$5.782.490,36	17/09/2022	EN EJECUCION	11/10/2022	17/10/2022	24	30	-6		x
SM	13	184	B-C-SM-MZ31-VE-199	65%	Adecuacion	$4.691.093,17	$3.049.210,56	18/09/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	25	31	-6		x
SM	18	185	B-C-SM-MZ67-VE-183	55%	Caseta t3	$6.957.541,97	$3.826.648,08	18/09/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	26	32	-6		x
SM	17	186	B-C-SM-MZ30-VE-200	55%	Caseta t3	$8.312.234,66	$4.571.729,06	19/09/2022	EN EJECUCION	16/10/2022	22/10/2022	27	33	-6		x
SM	13	187	B-C-SM-MZ31-VE-201	55%	Caseta t3	$6.950.167,16	$3.822.591,94	19/09/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	28	34	-6		x
SM	13	188	B-C-SM-MZ47-VE-105	55%	Adecuacion	$3.899.268,01	$2.144.597,41	20/09/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	29	35	-6		x
SM	14	189	B-C-SM-MZ68-VE-108	55%	Adecuacion	$3.617.504,69	$1.989.627,58	20/09/2022	EN EJECUCION	20/10/2022	26/10/2022	30	36	-6		x
SM	15	190	B-C-SM-MZ145-VE-208	55%	Adecuacion	$6.196.096,01	$3.407.852,81	21/09/2022	EN EJECUCION	22/10/2022	28/10/2022	31	37	-6		x
SM	12	191	B-C-SM-MZ66-VE-198	55%	Adecuacion	$5.360.187,87	$2.948.103,33	21/09/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	29/10/2022	32	38	-6		x
SM	15	192	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	55%	Caseta t3	$9.273.205,89	$5.100.263,24	22/09/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	31/10/2022	33	39	-6		x
SM	15	193	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	55%	Adecuacion	$7.909.051,57	$4.349.978,36	22/09/2022	EN EJECUCION	26/10/2022	1/11/2022	34	40	-6		x
SM	17	194	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	55%	Adecuacion	$7.056.470,53	$3.881.058,79	23/09/2022	EN EJECUCION	28/10/2022	3/11/2022	35	41	-6		x
SM	15	195	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	55%	Caseta t3	$7.321.539,69	$4.026.846,83	23/09/2022	EN EJECUCION	29/10/2022	4/11/2022	36	42	-6		x
SM	15	196	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	55%	Adecuacion	$5.983.563,40	$3.290.959,87	24/09/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	6/11/2022	37	43	-6		x
SM	16	197	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	55%	Adecuacion	$7.900.843,94	$4.345.464,17	24/09/2022	EN EJECUCION	1/11/2022	7/11/2022	38	44	-6		x
SM	16	198	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	55%	Caseta t3	$7.343.027,38	$4.038.665,06	25/09/2022	EN EJECUCION	3/11/2022	9/11/2022	39	45	-6		x
SM		199														
SM		200														

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	46,54%	101	$ 770.397.786,44		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	53,46%	116	$ 884.813.299,28		$ -	**52,45%**	**$ 929.266.674,74**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	63,13%	137	$ 1.044.995.017,25		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	100,00%	**217**	**$ 39.313.349,11**	**68,66%**	**149**	$ 1.136.527.427,52				

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 26-09-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	2
18	1	1	2
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**48**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

jueves 22 de septiembre, 2022

	Hoy 21 SEP	Mañana 22 SEP	Viernes 23 SEP	Sábado 24 SEP	Domingo 25 SEP	Lunes 26 SEP	Martes 27 SEP
Hora	↑ 29° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°
08:00	24°	25°	25°	26°	26°	26°	25°
14:00	29°	29°	29°	31°	32°	32°	31°
20:00	25°	24°	24°	25°	25°	26°	26°
Lluvia	14.3 mm	12.5 mm	8.4 mm	8.7 mm	8.2 mm	6.3 mm	8.9 mm
Viento	7 km/h	8 km/h	7 km/h	12 km/h	15 km/h	11 km/h	8 km/h
	05:49	05:49	05:48	05:48	05:48	05:48	05:48
	17:55	17:55	17:54	17:53	17:53	17:52	17:52

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24°	25°	26°	28°	29°	29°	29°	28°	27°	26°	25°	25°	24°	24°	24°

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** | Fecha **26/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220576
Contratista		CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	1.771.707.945,99
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial (Días)		150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	153	102,00%
Días remanentes del Contrato	0,00	0,00%
Acumulado a última acta pagada	$	379.134.821,64
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	1.119.057.724,53

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2220587
Interventor		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	202.479.313,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial		150 Días
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/09/2022
Ejecución del Contrato	153	102,00%
Días remanentes del Contrato	0,00	0,00%
Acumulado a última acta pagada	$	48.595.035,13
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	39.483.466,03

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.688.131.111,85	95,28%	$ 1.270.137.426,48	71,69%	-$ 417.993.685,37	-23,59%
Durante el Periodo	$ 83.576.834,14	4,72%	$ 85.169.095,71	4,81%	$ 1.592.261,57	0,09%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.771.707.945,99**	**100,00%**	**$ 1.355.306.522,19**	**76,50%**	**-$ 416.401.423,80**	**-23,50%**

Semáforo

Desviación en días: 35 Días




Observaciones al desempeño del proyecto


De acuerdo a la reprogramación de obra correspondiente al contrato inicial el seguimiento nos indica un avance del 100% frente a un ejecutado del 76,50% lo cual representa un atraso de 23,50%

De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, esto indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 217 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 197 viviendas, de las cuales se han terminado 149 y se adelantan labores constructivas en 48 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. En el transcurso de la siguiente semana se dará inicio a la ejecución de las demás viviendas las cuales ya tienen parte del material.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

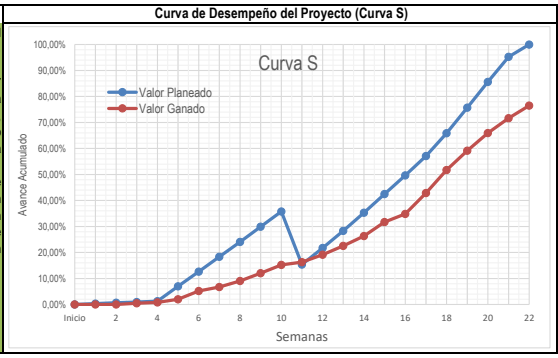

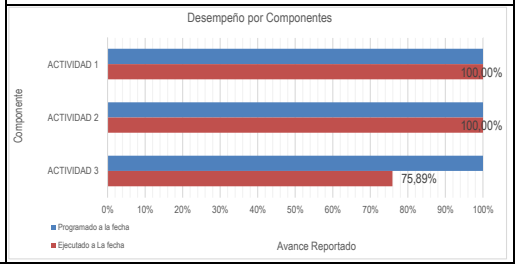


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	95,28%	71,69%	-23,59%	
Durante el Periodo	4,72%	4,81%	0,09%	
Acumulado a la Fecha	**100,00%**	**76,50%**	**-23,50%**	

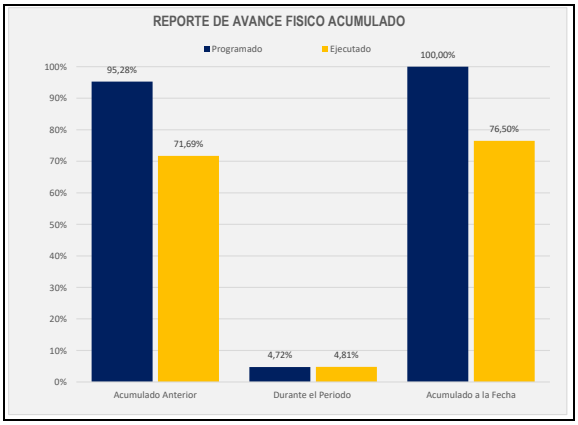

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1	$ 379.134.821,64	21,40%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 64.793.381,17	32,00%	3	$ 48.595.035,13	24,00%	9/09/2022	$ 16.198.346,04







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 100% vs 75,89% EJECUTADO
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra del contrato inicial debería tener 217 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 197 viviendas, de las cuales se han terminado 149 y se adelantan labores constructivas en 48 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. Durante las ultimas semanas se han registrado lluvias que han bajado los rendimientos de obra, además de las demoras en la entrega de materiales indispensables para la ejecución de las actividades.
La Entidad se encuentra formalizando la prórroga y adición al contrato de obra por el 50% del valor inicial y 2.5 meses, tiempo en el cual se ejecutarán otras 108 viviendas aproximadamente, paralelamente a la ejecución de estas nuevas viviendas el Contratista deberá ponerse al día con las viviendas que hacen parte del objeto inicial, es decir, las 217 viviendas de matriz más las 20 de inclusión que se aprobaron teniendo en cuenta que el promedio de intervención fue menor al estimado inicialmente se completa así 237, por tal motivo se solicitó al contratista la reprogramación total del proyecto, incluyendo la adición que esta en proceso, para lo cual el contratista se comprometió a vincular más personal de otra obra que están terminando en la zona y a presionar para la entrega oportuna de materiales.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual, la presente semana se realizó aprobación de 20 diagnósticos más completando así 237.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra del contrato inicial se debería tener 217 viviendas terminadas, y se han intervenido 197 viviendas, de las cuales solo 149 están terminadas indicándonos un atraso de 68 viviendas por terminar para completar las 217. El contratista tiene en ejecución 48 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras.
En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo
A pesar de que se ha vinculado mayor personal de obra no se ha logrado mejorar los rendimientos en la ejecución de las viviendas debido a factores externos al Contratista, tales como: incremento de las lluvias en el Municipio, demoras en la entrega por parte del proveedor de la cerámica de piso y paredes y demoras en la entrega del material granular por parte del proveedor. Se solicitó al Contratista la entrega de los soportes que evidencien dichas demoras en estos insumos que afectan la normal ejecución de las obras. A esto se suma que el fuerte invierno ha afectado las vías de ingreso al Municipio por las cuales se reciben los materiales del proyecto.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 27 de septiembre al 02 de octubre de 2022 y teniendo en cuenta que ya se completaron los 217 diagnósticos inicialmente contemplados en el contrato de obra el contratista entregó 20 diagnósticos de inclusiones los cuales fueron aprobados por la interventoría, se espera que se presente por parte del contratista un reporte indicando el remanente en saldo para verificar si alcanza para otras intervenciones.En atención a la prórroga al Contrato de obra, el contratista deberá continuar con la ejecución de los diagnósticos para identificar las 108 nuevas viviendas a intervenir.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra, para lo cual dará inicio a la ejecución de las demás viviendas pendientes para completar la meta contractual. Adicionalmente, dede ir preparando la logística y los recursos necesarios para dar inicio a las nuevas viviendas que se adicionaron para la actividad N° 3, aproximadamente 108 viviendas


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	43	8	51	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**43**	**8**	**51**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias,torrenciales los dias 19 y 22 de septirmbre (se adjunta reporte climatologico)

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A					

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
N/A				

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **19/09/2022** al **25/09/2022** Fecha **26/09/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22 con el asunto SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION, solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en el comité de obra No. 17 del 01 de septiembre se comprometieron a la entrega para el día 06 de septiembre de las primeras 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-065-22 a COOSEPCOR con el asunto SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TREINTA Y TRES (33) DIAGNÓSTICOS APROBADOS.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-066-22 con el asunto SOLICITUD PROGRAMACION DE ENTREGAS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION mediante el cual se solicita presentar PROGRAMACIÓN de las entregas de las actas de recibo a satisfacción debidamente diligenciadas.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-067-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante el cual reiteramos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-068-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSIÓN, mediante el cual se remite para su debido tramite Cuatro (4) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-069-22 con el asunto SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN COMITÉ DE OBRA por medio del cual solicitamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 19 en el cual se consignaron los siguientes acuerdos.
- Aumento de las intervenciones en ejecución de obra.
- Entrega de actas de recibo a satisfacción de las intervenciones terminadas.
- Entrega del acta parcial No. 2 y sus anexos correspondientes.
- Entrega de la justificación del atraso por parte del proveedor de la cerámica y materiales pétreos (cantera)

	Marcy A. Correa C		
	Firma		**Firma**
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-062	8-sep-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	9	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-sep-22	SI	SI	13-sep-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-063	8-sep-22	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES	9	**Coopsercor**			8-sep-22	SI		13-sep-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-068	20-sep-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	20-sep-22	SI	SI	21-sep-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	26/09/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																												
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES														TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3		
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	187	29	187	1	223	223	223	0	0	187	35	49	0	49	0	237	236	29	236	1	197	149	0	48	217		
	TOTAL	**217**	**0**	**187**	**29**	**187**	**1**	**223**	**223**	**223**	**0**	**0**	**187**	**35**	**49**	**0**	**49**	**0**	**237**	**236**	**29**	**236**	**1**	**197**	**149**	**0**	**48**	**217**		

1 222

Valor comprometido Actividad 1	**$ 5.140.026,35**
Valor comprometido actividad 2	**$ 39.313.347,50**
Valor comprometido actividad 3	**$ 1.644.779.795,21**
Valor ejecutado actividad 3	**$ 1.310.853.148,34**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/09/2022 Y EL 26/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 26/09/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-088	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-094	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	80%	Adecuacion	$8.137.626,09	$6.510.100,87	28/06/2022	EN EJECUCION	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x

SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ84-VE-176	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ84-VE-177	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.210.038,73	$8.210.038,73	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	133	B-C-SM-MZ84-VE-181	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	134	B-C-SM-MZ84-VE-182	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	100%	Caseta t3	$8.204.915,74	$8.204.915,74	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	100%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.853.199,32	30/08/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	100%	Adecuacion	$8.272.491,16	$8.272.491,16	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	100%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.742.842,11	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	100%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.326.983,38	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	100%	Adecuacion	$7.415.421,93	$7.415.421,93	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	100%	Adecuacion	$7.430.942,29	$7.430.942,29	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	100%	Adecuacion	$3.514.863,97	$3.514.863,97	1/09/2022	TERMINADA	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	100%	Adecuacion	$6.179.740,71	$6.179.740,71	2/09/2022	TERMINADA	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	100%	Caseta t4	$7.498.669,53	$7.498.669,53	2/09/2022	TERMINADA	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	100%	Caseta t3	$7.576.542,11	$7.576.542,11	3/09/2022	TERMINADA	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	100%	Adecuacion	$7.730.411,89	$7.730.411,89	3/09/2022	TERMINADA	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	90%	Adecuacion	$5.774.463,33	$5.197.017,00	5/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	153	B-C-SM-MZ92-VE-216	90%	Caseta t3	$8.311.308,81	$7.480.177,93	5/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	154	B-C-SM-MZ33-VE-196	90%	Adecuacion	$8.337.864,77	$7.504.078,29	5/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	155	B-C-SM-MZ33-VE-193	85%	Caseta t3	$8.081.818,61	$6.869.545,82	6/09/2022	EN EJECUCION	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	156	B-C-SM-MZ33-VE-195	85%	Adecuacion	$5.575.323,64	$4.739.025,09	6/09/2022	EN EJECUCION	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	157	B-C-SM-MZ41-VE-197	85%	Caseta t4	$8.310.190,06	$7.063.661,55	6/09/2022	EN EJECUCION	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ76-VE-076	85%	Adecuacion	$7.966.932,81	$6.771.892,89	7/09/2022	EN EJECUCION	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	159	B-C-SM-MZ55-VE-036	85%	Adecuacion	$4.519.608,59	$3.841.667,30	7/09/2022	EN EJECUCION	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	160	B-C-SM-MZ45-VE-037	85%	Adecuacion	$5.427.357,42	$4.613.253,81	8/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	161	B-C-SM-MZ87-VE-189	85%	Adecuacion	$6.068.174,04	$5.157.947,93	8/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ30-VE-123	85%	Caseta t3	$8.084.933,32	$6.872.193,32	8/09/2022	EN EJECUCION	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	163	B-C-SM-MZ66-VE-065	85%	Caseta t3	$7.828.052,76	$6.653.844,85	9/09/2022	EN EJECUCION	18/09/2022	24/09/2022	9	15	-6		x
SM	15	164	B-C-SM-MZ66-VE-066	85%	Caseta t2	$4.292.672,67	$3.648.771,77	10/09/2022	EN EJECUCION	20/09/2022	26/09/2022	10	16	-6		x
SM	15	165	B-C-SM-MZ23-VE-117	65%	Adecuacion	$4.772.651,25	$3.102.223,31	11/09/2022	EN EJECUCION	22/09/2022	28/09/2022	11	17	-6		x
SM	11	166	B-C-SM-MZ59-VE-187	65%	Adecuacion	$8.212.157,27	$5.337.902,23	11/09/2022	EN EJECUCION	23/09/2022	29/09/2022	12	18	-6		x
SM	14	167	B-C-SM-MZ34-VE-116	65%	Caseta t3	$7.989.636,90	$5.193.263,99	12/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	13	19	-6		x
SM	12	168	B-C-SM-MZ30-VE-123	65%	Caseta t3	$8.084.933,32	$5.255.206,66	12/09/2022	EN EJECUCION	26/09/2022	2/10/2022	14	20	-6		x
SM	6	169	B-C-SM-MZ87-VE-146	65%	Adecuacion	$7.503.681,08	$4.877.392,70	13/09/2022	EN EJECUCION	28/09/2022	4/10/2022	15	21	-6		x
SM	11	170	B-C-SM-MZ87-VE-189	65%	Adecuacion	$6.068.174,04	$3.944.313,13	13/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	16	22	-6		x
SM	14	171	B-C-SM-MZ18-VE-202	65%	Adecuacion	$8.298.564,37	$5.394.066,84	14/09/2022	EN EJECUCION	1/10/2022	7/10/2022	17	23	-6		x
SM	13	177	B-C-SM-MZ66-VE-065	65%	Caseta t3	$7.828.052,76	$5.088.234,29	14/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	18	24	-6		x
SM	15	178	B-C-SM-MZ66-VE-066	65%	Adecuacion	$4.292.672,67	$2.790.237,24	15/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	19	25	-6		x
SM	13	179	B-C-SM-MZ75-VE-070	65%	Adecuacion	$4.222.499,91	$2.744.624,94	15/09/2022	EN EJECUCION	5/10/2022	11/10/2022	20	26	-6		x
SM	18	180	B-C-SM-MZ67-VE-078	65%	Adecuacion	$5.110.794,97	$3.322.016,73	16/09/2022	EN EJECUCION	7/10/2022	13/10/2022	21	27	-6		x
SM	12	181	B-C-SM-MZ34-VE-119	65%	Adecuacion	$7.021.881,94	$4.564.223,26	16/09/2022	EN EJECUCION	8/10/2022	14/10/2022	22	28	-6		x
SM	11	182	B-C-SM-MZ56-VE-190	65%	Adecuacion	$7.154.236,55	$4.650.253,76	17/09/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	23	29	-6		x
SM	14	183	B-C-SM-MZ56-VE-191	65%	Caseta t3	$8.896.139,02	$5.782.490,36	17/09/2022	EN EJECUCION	11/10/2022	17/10/2022	24	30	-6		x
SM	13	184	B-C-SM-MZ31-VE-199	65%	Adecuacion	$4.691.093,17	$3.049.210,56	18/09/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	25	31	-6		x
SM	18	185	B-C-SM-MZ67-VE-183	55%	Caseta t3	$6.957.541,97	$3.826.648,08	18/09/2022	EN EJECUCION	14/10/2022	20/10/2022	26	32	-6		x
SM	17	186	B-C-SM-MZ30-VE-200	55%	Caseta t3	$8.312.234,66	$4.571.729,06	19/09/2022	EN EJECUCION	16/10/2022	22/10/2022	27	33	-6		x
SM	13	187	B-C-SM-MZ31-VE-201	55%	Caseta t3	$6.950.167,16	$3.822.591,94	19/09/2022	EN EJECUCION	17/10/2022	23/10/2022	28	34	-6		x
SM	13	188	B-C-SM-MZ47-VE-105	55%	Adecuacion	$3.899.268,01	$2.144.597,41	20/09/2022	EN EJECUCION	19/10/2022	25/10/2022	29	35	-6		x
SM	14	189	B-C-SM-MZ68-VE-108	55%	Adecuacion	$3.617.504,69	$1.989.627,58	20/09/2022	EN EJECUCION	20/10/2022	26/10/2022	30	36	-6		x
SM	15	190	B-C-SM-MZ145-VE-208	55%	Adecuacion	$6.196.096,01	$3.407.852,81	21/09/2022	EN EJECUCION	22/10/2022	28/10/2022	31	37	-6		x
SM	12	191	B-C-SM-MZ66-VE-198	55%	Adecuacion	$5.360.187,87	$2.948.103,33	21/09/2022	EN EJECUCION	23/10/2022	29/10/2022	32	38	-6		x
SM	15	192	B-C-SM-MZ30-VE-INC-001	55%	Caseta t3	$9.273.205,89	$5.100.263,24	22/09/2022	EN EJECUCION	25/10/2022	31/10/2022	33	39	-6		x
SM	15	193	B-C-SM-MZ36-VE-INC-002	55%	Adecuacion	$7.909.051,57	$4.349.978,36	22/09/2022	EN EJECUCION	26/10/2022	1/11/2022	34	40	-6		x
SM	17	194	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	55%	Adecuacion	$7.056.470,53	$3.881.058,79	23/09/2022	EN EJECUCION	28/10/2022	3/11/2022	35	41	-6		x
SM	15	195	B-C-SM-MZ30-VE-INC-004	55%	Caseta t3	$7.321.539,69	$4.026.846,83	23/09/2022	EN EJECUCION	29/10/2022	4/11/2022	36	42	-6		x
SM	15	196	B-C-SM-MZ21-VE-INC-005	55%	Adecuacion	$5.983.563,40	$3.290.959,87	24/09/2022	EN EJECUCION	31/10/2022	6/11/2022	37	43	-6		x
SM	16	197	B-C-SM-MZ93-VE-INC-006	55%	Adecuacion	$7.900.843,94	$4.345.464,17	24/09/2022	EN EJECUCION	1/11/2022	7/11/2022	38	44	-6		x
SM	16	198	B-C-SM-MZ87-VE-INC-007	55%	Caseta t3	$7.343.027,38	$4.038.665,06	25/09/2022	EN EJECUCION	3/11/2022	9/11/2022	39	45	-6		x
SM		199														
SM		200														

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	46,54%	101	$ 770.397.786,44		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	53,46%	116	$ 884.813.299,28		$ -	**52,45%**	**$ 929.266.674,74**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	63,13%	137	$ 1.044.995.017,25		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	100,00%	**217**	**$ 39.313.349,11**	**68,66%**	**149**	$ 1.136.527.427,52				

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 26-09-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	2
18	1	1	2
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**48**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

jueves 22 de septiembre, 2022

	Hoy 21 SEP	Mañana 22 SEP	Viernes 23 SEP	Sábado 24 SEP	Domingo 25 SEP	Lunes 26 SEP	Martes 27 SEP
Hora	↑ 29° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°
08:00	24°	25°	25°	26°	26°	26°	25°
14:00	29°	29°	29°	31°	32°	32°	31°
20:00	25°	24°	24°	25°	25°	26°	26°
Lluvia	14.3 mm	12.5 mm	8.4 mm	8.7 mm	8.2 mm	6.3 mm	8.9 mm
Viento	7 km/h	8 km/h	7 km/h	12 km/h	15 km/h	11 km/h	8 km/h
	05:49	05:49	05:48	05:48	05:48	05:48	05:48
	17:55	17:55	17:54	17:53	17:53	17:52	17:52

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24°	25°	26°	28°	29°	29°	29°	28°	27°	26°	25°	25°	24°	24°	24°

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 5/10/2022
HORA: 8:58:12 a. m.
20224300373962

ADMON

Bogotá D.C, 04 de octubre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-107-22

Señores:
Ingeniera
Erika Marcela Gutiérrez
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 21.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 21 correspondiente al periodo del 12 de septiembre del 2022 al 18 de septiembre del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 22 folios
Proyectó: Leydi Bibiana Castaño-Asistente Administrativa
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 21

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 21	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** | Fecha **18/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220576
Contratista		CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	1.771.707.945,99
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial (Días)		150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	145	96,67%
Días remanentes del Contrato	8,00	5,33%
Acumulado a última acta pagada	$	379.134.821,64
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	1.026.342.899,26

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2220587
Interventor		ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	202.479.313,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		26/04/2022
Plazo inicial		150 Días
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		26/09/2022
Ejecución del Contrato	145	96,67%
Días remanentes del Contrato	8,00	5,33%
Acumulado a última acta pagada	$	48.595.035,13
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	39.483.466,03

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.516.997.594,34	85,62%	$ 1.168.441.390,38	65,95%	-$ 348.556.203,96	-19,67%
Durante el Periodo	$ 171.133.517,51	9,66%	$ 101.776.101,45	5,74%	-$ 69.357.416,06	-3,91%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.688.131.111,85**	**95,28%**	**$ 1.270.217.491,83**	**71,69%**	**-$ 417.913.620,02**	**-23,59%**

Semáforo

Desviación en días: 35 Días




Observaciones al desempeño del proyecto


De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un avance del 95,28% frente a un ejecutado del 71,69% lo cual representa un atraso de 23,59%

De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, esto indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 196 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 183 viviendas, de las cuales se han terminado 137 y se adelantan labores constructivas en 46 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. En el transcurso de la siguiente semana se dará inicio a la ejecución de las demás viviendas

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

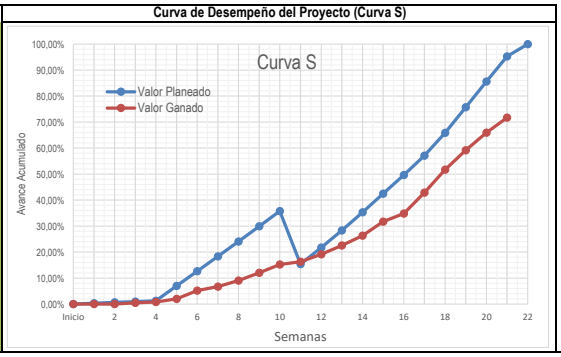

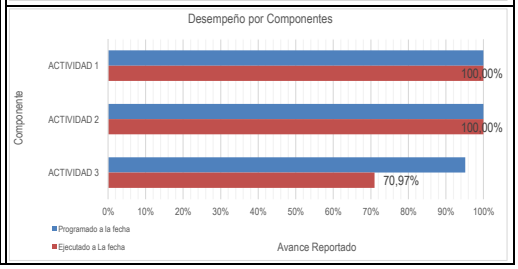


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	85,62%	65,95%	-19,67%	
Durante el Periodo	9,66%	5,74%	-3,91%	
Acumulado a la Fecha	**95,28%**	**71,69%**	**-23,59%**	

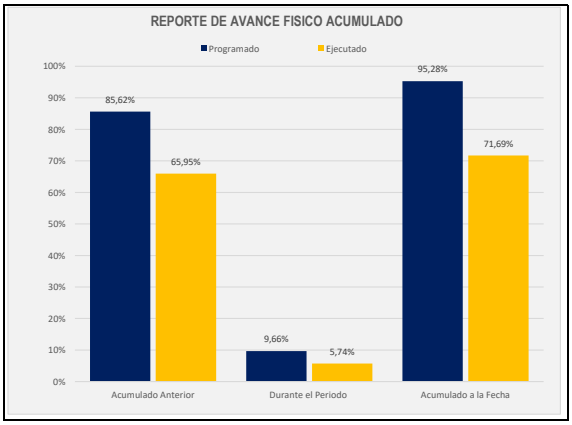

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1	$ 379.134.821,64	21,40%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 64.793.381,17	32,00%	3	$ 48.595.035,13	24,00%	9/09/2022	$ 16.198.346,04







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **18/09/2022**

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 85,62% vs 65,95% EJECUTADO
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 196 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 183 viviendas, de las cuales se han terminado 137 y se adelantan labores constructivas en 46 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual, la presente semana se realizó aprobación de 20 diagnósticos más completando así 237.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 196 viviendas terminadas, y se han intervenido 183 viviendas, de las cuales solo 137 están terminadas indicándonos un atraso de 59. El contratista tiene en ejecución 46 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras.
En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo
A pesar de que se ha vinculado mayor personal de obra no se ha logrado mejorar los rendimientos en la ejecución de las viviendas debido a factores externos al Contratista, tales como: incremento de las lluvias en el Municipio, demoras en la entrega por parte del proveedor de la cerámica de piso y paredes y demoras en la entrega del material granular por parte del proveedor. Se solicitó al Contratista la entrega de los soportes que evidencien dichas demoras en estos insumos que afectan la normal ejecución de las obras. A esto se suma que el fuerte invierno ha afectado las vías de ingreso al Municipio por las cuales se reciben los materiales del proyecto.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 19 al 26 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta que ya se completaron los 217 diagnósticos inicialmente contemplados en el contrato de obra el contratista entregó 20 diagnósticos de inclusiones los cuales fueron aprobados por la interventoría, se espera que se presente por parte del contratista un reporte indicando el remanente en saldo para verificar si alcanza para otras intervenciones.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra, para lo cual dará inicio a la ejecución de las demás viviendas pendientes para completar la meta contractual.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

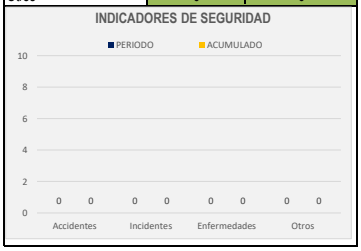

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	37	6	43	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**37**	**6**	**43**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias,torrenciales los dias 13 y 14 de septirmbre (se adjunta reporte climatologico)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **18/09/2022**

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 224	OLGA BECERRA PUERTA	13/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 225	YUBELIS VERGARA GUERRA	13/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
PQR 226	FIDELIA JOSEFA RAMOS RODRIGUEZ	13/09/2022	PQRS	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 21

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **12/09/2022** al **18/09/2022** Fecha **18/09/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE , LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-062-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSIÓN. se remite para su debido tramite Nueve (9) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-063-22 con el asunto SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. De acuerdo al debido proceso para el trámite de las inclusiones al Programa de Conexiones Intradomiciliarias, solicitamos comedidamente su colaboración con el envío de los certificados que aún no han sido generados por COOSEPCOR.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22 con el asunto SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION, solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en el comité de obra No. 17 del 01 de septiembre se comprometieron a la entrega para el día 06 de septiembre de las primeras 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-065-22 a COOSEPCOR con el asunto SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TREINTA Y TRES (33) DIAGNÓSTICOS APROBADOS.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-066-22 con el asunto SOLICITUD PROGRAMACION DE ENTREGAS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION mediante el cual se solicita presentar PROGRAMACIÓN de las entregas de las actas de recibo a satisfacción debidamente diligenciadas.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-067-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante el cual reiteramos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 21

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 12/09/2022 al 18/09/2022 Fecha 18/09/2022

Marcy A. Correa C			
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES PLANEACION MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	19/09/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																											
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldía	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldía	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	187	29	187	1	223	219	219	4	4	169	50	49	0	49	0	237	236	29	236	1	183	137	0	46	196
	TOTAL	**217**	**0**	**187**	**29**	**187**	**1**	**223**	**219**	**219**	**4**	**4**	**169**	**50**	**49**	**0**	**49**	**0**	**237**	**236**	**29**	**236**	**1**	**183**	**137**	**0**	**46**	**196**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/09/2022 Y EL 18/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÓN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 18/09/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		x
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		x
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		x
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		x
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		x
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	45%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.661.931,74	28/06/2022	EN EJECUCION	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	TERMINADA	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		x
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	TERMINADA	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	TERMINADA	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		x
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	TERMINADA	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	TERMINADA	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	TERMINADA	16/08/2022	22/08/2022	5	11	-6		x

SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	TERMINADA	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	TERMINADA	14/08/2022	20/08/2022	5	11	-6		x
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	TERMINADA	23/08/2022	29/08/2022	8	14	-6		x
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	TERMINADA	24/08/2022	30/08/2022	5	11	-6		x
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	8	14	-6		x
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	8	14	-6		x
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	TERMINADA	2/09/2022	8/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	TERMINADA	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	TERMINADA	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	TERMINADA	26/08/2022	1/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	TERMINADA	21/08/2022	27/08/2022		6	-6		x
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	100%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.887.962,53	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	100%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.841.298,86	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	100%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.814.305,69	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	100%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.602.086,12	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	100%	Caseta t3	$8.240.626,46	$8.240.626,46	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	100%	Caseta t2	$8.314.938,30	$8.314.938,30	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	100%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.662.197,96	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	100%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.665.155,76	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	100%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	TERMINADA	27/08/2022	2/09/2022	5	11	-6		x
SM	5	128	B-C-SM-MZ84-VE-176	100%	Adecuacion	$6.476.015,92	$6.476.015,92	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	8	129	B-C-SM-MZ84-VE-177	100%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.842.321,91	23/08/2022	TERMINADA	28/08/2022	3/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	130	B-C-SM-MZ84-VE-178	100%	Adecuacion	$6.456.971,29	$6.456.971,29	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	131	B-C-SM-MZ84-VE-179	100%	Adecuacion	$7.013.453,53	$7.013.453,53	24/08/2022	TERMINADA	29/08/2022	4/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	132	B-C-SM-MZ84-VE-180	100%	Adecuacion	$8.210.038,73	$8.210.038,73	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	133	B-C-SM-MZ84-VE-181	100%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.924.848,88	25/08/2022	TERMINADA	30/08/2022	5/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	134	B-C-SM-MZ84-VE-182	100%	Adecuacion	$7.097.058,66	$7.097.058,66	26/08/2022	TERMINADA	31/08/2022	6/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	100%	Adecuacion	$7.943.448,36	$7.943.448,36	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	100%	Adecuacion	$7.982.813,63	$7.982.813,63	27/08/2022	TERMINADA	1/09/2022	7/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	100%	Adecuacion	$7.475.616,81	$7.475.616,81	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	100%	Adecuacion	$7.034.505,34	$7.034.505,34	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	100%	Adecuacion	$5.856.785,90	$5.856.785,90	29/08/2022	TERMINADA	3/09/2022	9/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	95%	Caseta t3	$8.204.915,74	$7.794.669,95	30/08/2022	EN EJECUCION	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	95%	Caseta t3	$7.853.199,32	$7.460.539,35	30/08/2022	EN EJECUCION	7/09/2022	13/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	95%	Adecuacion	$8.272.491,16	$7.858.866,60	30/08/2022	EN EJECUCION	4/09/2022	10/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	95%	Adecuacion	$6.742.842,11	$6.405.700,00	31/08/2022	EN EJECUCION	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	95%	Adecuacion	$6.326.983,38	$6.010.634,21	31/08/2022	EN EJECUCION	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	85%	Adecuacion	$7.415.421,93	$6.303.108,64	31/08/2022	EN EJECUCION	5/09/2022	11/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	85%	Adecuacion	$7.430.942,29	$6.316.300,95	1/09/2022	EN EJECUCION	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	85%	Adecuacion	$3.514.863,97	$2.987.634,37	1/09/2022	EN EJECUCION	6/09/2022	12/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	85%	Adecuacion	$6.179.740,71	$5.252.779,60	2/09/2022	EN EJECUCION	7/09/2022	13/09/2022	5	11	-6		x
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	85%	Caseta t4	$7.498.669,53	$6.373.869,10	2/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	8	14	-6		x
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	75%	Caseta t3	$7.576.542,11	$5.682.406,58	3/09/2022	EN EJECUCION	11/09/2022	17/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	75%	Adecuacion	$7.730.411,89	$5.797.808,92	3/09/2022	EN EJECUCION	8/09/2022	14/09/2022	5	11	-6		x
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	75%	Adecuacion	$5.774.463,33	$4.330.847,50	5/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	153	B-C-SM-MZ92-VE-216	75%	Caseta t3	$8.311.308,81	$6.233.481,61	5/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	8	14	-6		x
SM	11	154	B-C-SM-MZ33-VE-196	75%	Adecuacion	$8.337.864,77	$6.253.398,58	5/09/2022	EN EJECUCION	10/09/2022	16/09/2022	5	11	-6		x
SM	13	155	B-C-SM-MZ33-VE-193	75%	Caseta t3	$8.081.818,61	$6.061.363,96	6/09/2022	EN EJECUCION	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	10	156	B-C-SM-MZ33-VE-195	75%	Adecuacion	$5.575.323,64	$4.181.492,73	6/09/2022	EN EJECUCION	11/09/2022	17/09/2022	5	11	-6		x
SM	10	157	B-C-SM-MZ41-VE-197	75%	Caseta t4	$8.310.190,06	$6.232.642,55	6/09/2022	EN EJECUCION	14/09/2022	20/09/2022	8	14	-6		x
SM	12	158	B-C-SM-MZ76-VE-076	75%	Adecuacion	$7.966.932,81	$5.975.199,61	7/09/2022	EN EJECUCION	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	159	B-C-SM-MZ55-VE-036	75%	Adecuacion	$4.519.608,59	$3.389.706,44	7/09/2022	EN EJECUCION	12/09/2022	18/09/2022	5	11	-6		x
SM	14	160	B-C-SM-MZ45-VE-037	75%	Adecuacion	$5.427.357,42	$4.070.518,07	8/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	11	161	B-C-SM-MZ87-VE-189	75%	Adecuacion	$6.068.174,04	$4.551.130,53	8/09/2022	EN EJECUCION	13/09/2022	19/09/2022	5	11	-6		x
SM	12	162	B-C-SM-MZ30-VE-123	75%	Caseta t3	$8.084.933,32	$6.063.699,99	8/09/2022	EN EJECUCION	16/09/2022	22/09/2022	8	14	-6		x
SM	13	163	B-C-SM-MZ66-VE-065	75%	Caseta t3	$7.828.052,76	$5.871.039,57	9/09/2022	EN EJECUCION	18/09/2022	24/09/2022	9	15	-6		x
SM	15	164	B-C-SM-MZ66-VE-066	75%	Caseta t2	$4.292.672,67	$3.219.504,50	10/09/2022	EN EJECUCION	20/09/2022	26/09/2022	10	16	-6		x
SM	15	165	B-C-SM-MZ23-VE-117	55%	Adecuacion	$4.772.651,25	$2.624.958,19	11/09/2022	EN EJECUCION	22/09/2022	28/09/2022	11	17	-6		x
SM	11	166	B-C-SM-MZ59-VE-187	55%	Adecuacion	$8.212.157,27	$4.516.686,50	11/09/2022	EN EJECUCION	23/09/2022	29/09/2022	12	18	-6		x
SM	14	167	B-C-SM-MZ34-VE-116	55%	Caseta t3	$7.989.636,90	$4.394.300,30	12/09/2022	EN EJECUCION	25/09/2022	1/10/2022	13	19	-6		x
SM	12	168	B-C-SM-MZ30-VE-123	55%	Caseta t3	$8.084.933,32	$4.446.713,33	12/09/2022	EN EJECUCION	26/09/2022	2/10/2022	14	20	-6		x
SM	6	169	B-C-SM-MZ87-VE-146	55%	Adecuacion	$7.503.681,08	$4.127.024,59	13/09/2022	EN EJECUCION	28/09/2022	4/10/2022	15	21	-6		x
SM	11	170	B-C-SM-MZ87-VE-189	55%	Adecuacion	$6.068.174,04	$3.337.495,72	13/09/2022	EN EJECUCION	29/09/2022	5/10/2022	16	22	-6		x
SM	14	171	B-C-SM-MZ18-VE-202	55%	Adecuacion	$8.298.564,37	$4.564.210,40	14/09/2022	EN EJECUCION	1/10/2022	7/10/2022	17	23	-6		x
SM	13	177	B-C-SM-MZ66-VE-065	55%	Caseta t3	$7.828.052,76	$4.305.429,02	14/09/2022	EN EJECUCION	2/10/2022	8/10/2022	18	24	-6		x
SM	15	178	B-C-SM-MZ66-VE-066	55%	Adecuacion	$4.292.672,67	$2.360.969,97	15/09/2022	EN EJECUCION	4/10/2022	10/10/2022	19	25	-6		x
SM	13	179	B-C-SM-MZ75-VE-070	55%	Adecuacion	$4.222.499,91	$2.322.374,95	15/09/2022	EN EJECUCION	5/10/2022	11/10/2022	20	26	-6		x
SM	18	180	B-C-SM-MZ67-VE-078	55%	Adecuacion	$5.110.794,97	$2.810.937,23	16/09/2022	EN EJECUCION	7/10/2022	13/10/2022	21	27	-6		x
SM	12	181	B-C-SM-MZ34-VE-119	55%	Adecuacion	$7.021.881,94	$3.862.035,07	16/09/2022	EN EJECUCION	8/10/2022	14/10/2022	22	28	-6		x
SM	11	182	B-C-SM-MZ56-VE-190	55%	Adecuacion	$7.154.236,55	$3.934.830,10	17/09/2022	EN EJECUCION	10/10/2022	16/10/2022	23	29	-6		x
SM	14	183	B-C-SM-MZ56-VE-191	55%	Caseta t3	$8.896.139,02	$4.892.876,46	17/09/2022	EN EJECUCION	11/10/2022	17/10/2022	24	30	-6		x
SM	13	184	B-C-SM-MZ31-VE-199	55%	Adecuacion	$4.691.093,17	$2.580.101,24	18/09/2022	EN EJECUCION	13/10/2022	19/10/2022	25	31	-6		x
SM																

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	46,54%	101	$ 770.397.786,44		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	53,46%	116	$ 884.813.299,28		$ -	**52,45%**	**$ 929.266.674,74**
18/09/2022	**Semana 21**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**63,13%**	**137**	**$ 1.727.254.570,53**		$ -	100,00%	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	63,13%	137					

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 18-09-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
TOTAL	**30**	**30**	**46**

REPORTE DE CLIMA

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

miércoles 14 de septiembre, 2022

	Hoy 13 SEP	Mañana 14 SEP	Jueves 15 SEP	Viernes 16 SEP	Sábado 17 SEP	Domingo 18 SEP	Lunes 19 SEP
Hora	30° 24°	32° 24°	30° 24°	30° 24°	30° 24°	29° 24°	29° 24°
08:00	25°	26°	26°	25°	25°	25°	25°
14:00	30°	31°	30°	29°	30°	28°	28°
20:00	26°	26°	25°	25°	25°	25°	25°
Lluvia	3.2 mm	2.3 mm	8.4 mm	10.3 mm	10 mm	15.3 mm	20.1 mm
Viento	8 km/h	10 km/h	9 km/h	10 km/h	7 km/h	7 km/h	7 km/h
	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49
	18:00	18:00	17:59	17:58	17:58	17:57	17:57

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mañana: 22 23 00 01 02

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02
29°	30°	30°	30°	29°	28°	27°	26°	26°	26°	25°	25°	25°	25°	24°

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

martes 13 de septiembre, 2022

	Lunes 12 SEP	Hoy 13 SEP	Mañana 14 SEP	Jueves 15 SEP	Viernes 16 SEP	Sábado 17 SEP	Domingo 18 SEP
Hora	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 25°	↑ 30° ↓ 23°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°
08:00	--	25°	26°	26°	25°	25°	25°
14:00	--	30°	32°	30°	30°	30°	29°
20:00	26°	26°	26°	25°	25°	25°	25°
Lluvia	7.4 mm	5.3 mm	0.9 mm	6.4 mm	17.4 mm	16.1 mm	9.7 mm
Viento	↑ 6 km/h	↙ 11 km/h	↑ 11 km/h	↑ 9 km/h	↘ 9 km/h	↘ 11 km/h	↑ 7 km/h
	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49
	18:01	18:00	18:00	17:59	17:58	17:58	17:57

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy: 22	23	Mañana: 00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
25°	25°	25°	25°	24°	24°	24°	24°	24°	24°	25°	26°	26°	27°	29°
↓	↙	↖	↑	↗	↗	↗	↗	↑	↑	↑	↑	↑	↑	←

Córdoba, Bolívar octubre 13 de 2022

ADMON

ARCA-INT/ENT276-GER-113-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
ING. DUARTE JOSE PINEDO
L.C.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)

TEMA: REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO EN LA VINCULACIÓN DE PERSONAL NO CALIFICADO – OFICIO ARCA-INT/ENT276-GER-102-22 RESPUESTA A CCR_CORDOBA_2220576_2022_099

Cordial saludo Ing. Duarte;

De acuerdo al oficio CCR_CORDOBA_2220576_2022_099 recibido por esta Interventoría el 10 de octubre de 2022 en respuesta al comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-102-22 de fecha septiembre 20 de 2022, se realiza el siguiente requerimiento:

En el oficio ARCA-INT/ENT276-GER-102-22 Se menciona dos (2) de las obligaciones que el Contratista debe dar cumplimiento:

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
7.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

10. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma.

11. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un diez por ciento (10%) del personal no calificado, a personal femenino

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

7.2.2.OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

6. Presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de cada actividad del contrato, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido y ofertado para la ejecución del contrato. En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.
7. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal mínimo ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado en el numeral 2.4. del documento de caracterización de necesidad, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en los términos y condiciones. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con ENTerritorio o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
8. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en el desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.
9. Mantener al frente durante el desarrollo de la obra, al director y demás personal aprobado por ENTerritorio. El director deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.
10. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma.
11. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un diez por ciento (10%) del personal no calificado, a personal femenino

De acuerdo a lo anterior, es fundamental que ustedes den a conocer el proceso y vinculaciones que se han realizado, dando cumplimiento a las anteriores obligaciones, cada una con los respectivos soportes que demuestren dicha atención.

Es de anotar que su oficio menciona la publicación de una convocatoria para “vinculación a personal femenino no calificado en el Municipio de Córdoba, mediante volante informativo instalado en las carteleras informativas ubicadas en las instalaciones de la Alcaldía Municipal y establecimiento comercial ubicado en la Calle 10 Carrera 6, Barrio San Martín”

Sin embargo, en el seguimiento de esta Interventoría a dichas carteleras se evidenció que la pieza informativa NO se encuentra presente como ustedes lo manifiestan.

Imagen 1. Cartelera informativa Alcaldía Municipal



Fuente: ARCA arquitectura e Ingeniería

Imagen 2. Cartelera informativa ubicada en la Calle 10 Carrera 6



Fuente: ARCA arquitectura e Ingeniería

Dado a conocer lo anterior, se requiere el cumplimiento inmediato a los parámetros contractuales aceptados por ustedes en su contrato de obra, so pena de incurrir en un posible incumplimiento, teniendo en cuenta que no se presentan los soportes solicitados por esta Interventoría

Agradecemos su atención.

Cordialmente;

Marcy A. Correa C

Ing. Marcy A. Correa
Directora de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.

CC Archivo
Proyectó: Fernanda Grijalba

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 7/10/2022
HORA: 3:11:43 p. m.
20224300379572

ADMON

Bogotá D.C, 07 de octubre 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-110-22

Señores:
Arquitecta
Erika Marcela Gutierrez Gaitán
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: AVAL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 2220576.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y luego de la revisión dela documentación remitida por el contratista de Obra el día 06 de octubre de 2022 mediante comunicado CCR_CORDOBA_2220576_2022_095 RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL NUMERO 2 y después de subsanar las observaciones realizadas, la interventoría verifica que la documentación cumplen con lo estipulado en el contrato de obra No. 2220576, por lo cual, esta interventoría da aval al acta presentada y por lo tanto es remitida a ENTerritorio para trámite correspondiente.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

Anexo: 42 Folios
Proyectó: Marcy Alejandra Correa Castaño

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, D.C. Septiembre 22 de 2022 CCR_CORDOBA_2220576_2022_095

Señor:
Ing Marcy Correa.
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005

ASUNTO: RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL NUMERO 2

Cordial Saludo,

Por medio del presente nos permitimos presentar radicado de acta parcial de obra número 2, para su respectivo trámite y aprobación.

Atentamente,

DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
Director de Obra
Consorcio Construredes

ANEXO 2. F-FI-06 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO

enterritorio	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO**	CÓDIGO:	F-FI-06
		VERSIÓN:	2
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	1/07/2021

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: CONSORCIO CONSTRUREDES

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] **NÚMERO DOCUMENTO:** 9.015.686.776 **DV:** 5

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

TELÉFONO: 3114143542 **CORREO ELECTRÓNICO** cconstruredes@gmail.com

FUNCIONAMIENTO [ ] **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** [ ] **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** [ ]

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	$ 442.194.944,42
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO _____ **No. CONTRATO** 2220576 **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** _____

No. PROCESO CONTRACTUAL _____

FACTURA No. 00000002 **CUENTA DE COBRO** [ ] **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** _____ **No.** _____

ANTICIPO:	SI [ ]	NO [X]	% [ ]	VALOR $		OTROS DESCUENTOS POR VALOR $	
RETEGARANTIA:	SI [ ]	NO [X]	% [ ]	VALOR $		ESPECIFIQUE:	
AMORTIZA:	SI [X]	NO [ ]	% [ ]	VALOR $	$ 95.946.599,15	ESPECIFIQUE:	

2, PERIODO DE COBRO

INICIO	FIN	DESEMBOLSO Nº	VALOR BRUTO $
1/08/2022	31/08/2022	3	442.194.944,42

3. APROBACIONES

	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio
FIRMA:			
NIT / C.C.:	800.173.768-1/ C.C. 79.482.309		899.999.316 - 1/ C.C. 52.008.866 - Supervisor
NOMBRE:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA - Federico Cardona		ENTerritorio - Erika Marcela Gutierrez Pérez

OBSERVACIONES:

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) **o GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

CARLOS ANDRÉS BRAVO

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.
ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL

a.	**Nombre del beneficiario / Razón social:** después de las palabras "...beneficiario:_", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
b.	**Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c.	**Numero de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (**Dígito de verificación**) respectivo.
d.	**Pertenece al regimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" **o las que lo sustituyan y/o modifiquen**
e.	**Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
f.	**Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico.
g.	**Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))
h.	**Número de convenio o contrato interadministrativo:** escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
i.	**No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).
j.	**Número de contrato:** escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k.	**Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
l.	**Valor variable:** escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m.	**Factura No.**: escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
n.	**Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o.	**Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p.	**Anticipo**: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q.	**Retegarantia:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
r.	**Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s.	**Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
t.	**Especifique:** si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

2, PERIODO DE COBRO

a.	**Fecha de Inicio:** Fecha que inicia el cobro del mes
b.	**Fecha de Fin:** Fecha donde termina el cobre del mes
c.	**Desembolso N°:** Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar
d.	**Valor Bruto;** Es el valor total del mes a cobrar

3. APROBACIONES

a.	**Aprueba Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
b.	**Avala Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
c.	**Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
d.	**Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

ANEXO 3. FACTURA PROFORMA

CONSORCIO CONSTRUREDES
NIT:901568676-5 CR 24 # 15 - 17 SAN MARCOS - SUCRE
TEL:3114143542 E-mail: cconstruredes@gmail.com
Miembros:

INMAQ SAS	NIT 800.21.,251-2	65%
GEOINGENIERIA LTDA	NIT 900.019.772-6	35%

FACTURA DE VENTA
F No. 00000005

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - EnTERRITORIO

NIT: 899999316-1 **DIRECCION**: CL 26 # 13 - 19 P 30 **TELEFONO**:3116838389
CIUDAD: BOGOTA D.C. **Fecha:** 07 10 2022
vence: 30 10 2022

PAGO ACTA AVANCE Nº 02 DEL CONTRATO DE OBRA No.2220576

ITEM	DESCRIPCION / SERVICIO		CANT	IVA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ACT 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS		0	19%	$ -	$ -
2	ACT 2. DIAGNÓSTICO Y CONSULTORIA GRAL DE LA INTERVENCIÓN.		64	19%	$ 8.769.116,16	$ 8.769.116,16
3	ACT 3. COSTO DIRECTO OBRAS		64		$ 326.127.121,52	$ 326.127.121,52
4	ADMINISTRACIÓN	25,44%			$ 82.966.739,72	$ 82.966.739,72
5	IMPREVISTOS	1%			$ 3.261.271,22	$ 3.261.271,22
6	UTILIDAD	5%			$ 16.306.356,08	$ 16.306.356,08

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No. 531000010-20 A NOMBRE DE CONSORCIO CONSTRUREDES NIT 901.568.676-5

SUBTOTAL	$ 437.430.604,69
IVA	$ 4.764.339,73
TOTAL	$ 442.194.944,42
AMORTIZACION 20%	$ 95.946.599,15
NETO	**$ 346.248.345,27**

SON: cuatroscientos cuarenta y dos millones ciento noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con 42/100

1.) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO) 2.) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DIFERENTE A LA DEL COMPRADOR, IMPLICA QUE

VENDEDOR

NIT. 901,568,676-5

RECIBI Y ACEPTO LA FACTURA

CC/NIT.

ANEXO 4. PRE-ACTA (MATRIZ 3 MOMENTOS – EJECUCIÓN)

IDENTIFICACION INMUEBLE

	CODIGO INMUEBLE	BARRIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	DIRECCION	2.1 (ML)	2.2 (ML)	2.3 (ML)
2	B-C-SM-MZ55-VE-048	SAN MARTIN	CRISTIAN DAVID BENITEZ VERGARA	1.049.453.937	CL 11 # 6 - 37	25,00	5,00	10,00
2	B-C-SM-MZ55-VE-060	SAN MARTIN	ROSARIO ISABEL CASERES ALVAREZ	22.853.794	CL 10 # 6-52	34,00	4,00	3,00
2	B-C-SM-MZ68-VE-077	SAN MARTIN	IRLENA SOFIA GONZALEZ TERAN	57,445,250	KR 8 # 7 - 20	30,00	15,50	11,50
2	B-C-SM-MZ89-VE-080	SAN MARTIN	AUDITH JUDITH SANCHEZ PIÑA	22,855,984	CL 11 # 6 - 36	36,00	14,00	3,00
2	B-C-SM-MZ-VE-082	SAN MARTIN	ONASIS DE LA CRUZ PEREZ MARTINEZ	73.316.850	CRA 6 CL 11-27	30,00	7,00	5,00
2	B-C-SM-MZ69-VE-085	SAN MARTIN	ERMIDA ESTHER HENAO ESCOVAR	22.853.647	CL 6 CR 7 - 22	38,50	3,50	8,00
2	B-C-SM-MZ69-VE-086	SAN MARTIN	LUIS ALFONSO HENAO ESCOBAR	3.831.589	CL 6 CR 7 - 22	28,00	12,50	4,00
2	B-C-SM-MZ69-VE-088	SAN MARTIN	ARTURO EDUARDO ALVAREZ MEZA	6.813.964	CL 5 CR 6-5	55,80	24,10	11,80
2	B-C-SM-MZ-VE-091	SAN MARTIN	SEGUNDO RAFAEL CARDENAS DIAZ	73.315.437	CL 6 CRA 8-16	30,50	22,30	6,50
2	B-C-SM-MZ-VE-092	SAN MARTIN	JORGE ISAAC GONZALEZ CRUZATE	73.316.344	CL 2 CRA 4-299	46,00	8,00	10,00
2	B-C-SM-MZ-VE-096	SAN MARTIN	ARELVIS ESTHER TORRES CANTILLO	39.090.314	CL 6 CRA 8-44	39,00	4,00	15,00
2	B-C-SM-MZ68-VE-097	SAN MARTIN	MOISES JOSE VERGARA VEGA	3.831.916	CR 7 # 7 - 75	24,30	12,00	5,00
2	B-C-SM-MZ58-VE-100	SAN MARTIN	PEDRO RAFAEL PORTO FONSECA	12.548.951	CL 7 CR 6 - 36	12,50	9,00	7,00
2	B-C-SM-MZ59-VE-102	SAN MARTIN	JOAQUIN JENITH ANAYA CABALLERO	73.315.081	CL 7 CR 6 - 35	28,00	19,60	3,60
2	B-C-SM-MZ47-VE-103	SAN MARTIN	PETRONA ISABEL MEDINA DE CRUZATE	22.854.084	CL 8 CR 5A - 1	30,00	25,70	3,50
2	B-C-SM-MZ47-VE-104	SAN MARTIN	TEOTISTA HORTENSIA ESCOBAR MARTINEZ	22.853.685	CL 8 CR 5A - 23	32,30	26,30	6,50
2	B-C-SM-MZ58-VE-107	SAN MARTIN	FELIX MANUEL RIVERA BALLESTA	3.831.482	CL 8 # 6 - 27	34,00	11,40	10,50
2	B-C-SM-MZ47-VE-110	SAN MARTIN	ALFREDO JOSE ESCOBAR HERNANDEZ	73.315.246	CL 7 CR 5A - 74	32,00	25,50	10,30
2	B-C-SM-MZ47-VE-111	SAN MARTIN	MARGARITA LUCIA NARVAEZ SEVILLA	22.856.586	CL 7 CR 5A - 50	24,30	22,80	9,50
2	B-C-SM-MZ47-VE-112	SAN MARTIN	YARINA ISABEL DE ANGEL PADILLA	22.855.582	CL 7 5 - 50	29,00	12,70	10,50
2	B-C-SM-MZ47-VE-113	SAN MARTIN	JESIE DEL SOCORRO ESTRADA PALENCIA	22.856.754	CL 7 # 5A-22	40,00	20,00	7,50
2	B-C-SM-MZ47-VE-114	SAN MARTIN	MARTINA MARIA ESTRADA PALENCIA	22.854.513	CL 7 CR 5 - 20	21,50	16,50	6,50
2	B-C-SM-MZ47-VE-115	SAN MARTIN	ELSA REGINA ORTEGA DE GUISADO	22.854.219	CL 7 # 5A-10	16,00	15,50	8,50
2	B-C-SM-MZ21-VE-118	SAN MARTIN	JAIDER ANTONIO SENCIO BARRIOS	73.317.318	CL 8 # 3 - 4	28,00	11,00	7,50
2	B-C-SM-MZ30-VE-120	SAN MARTIN	DORGY MARGOTH VILLAMIZAR PADILLA	22.854.629	CR 5A CL 10 - 32	25,20	12,80	6,00
2	B-C-SM-MZ30-VE-121	SAN MARTIN	AMALFI ESTHER NIETO REALES	22.855.136	CL 11 4A - 69	27,00	16,00	8,00
2	B-C-SM-MZ30-VE-122	SAN MARTIN	RODRIGO RAFAEL TORRES CASERES	73.316.822	CL 11 4A - 59	26,50	20,50	6,00
2	B-C-SM-MZ87-VE-124	SAN MARTIN	FRANCISCO MIGUEL CABARCAS DE LA HOZ	85.485.870	CL 11 4A - 70	14,30	13,30	6,10
2	B-C-SM-MZ30-VE-125	SAN MARTIN	JOSE FRANCISCO VERGARA TORRES	73.317.470	CL 11 KR 4A - 19	25,00	10,00	7,50
2	B-C-SM-MZ30-VE-126	SAN MARTIN	MELISSA PAOLA DURANGO HERNANDEZ	1,049.454,476	CL 11 4A - 29	24,00	9,60	12,00
2	B-C-SM-MZ87-VE-127	SAN MARTIN	FELIPE MANUEL VERGARA VILLA	3.831.622	CL 11 4A-32	26,00	9,30	9,70
2	B-C-SM-MZ87-VE-128	SAN MARTIN	JOSE GREGORIO MARTINEZ MEZA	73.352.002	CR 4A 11 - 15	43,00	17,70	11,00
2	B-C-SM-MZ87-VE-129	SAN MARTIN	SANDRA PAOLA GUISADO FERNABDEZ	22.855.631	CL 12 4A - 27	21,00	12,00	10,50
2	B-C-SM-MZ66-VE-131	SAN MARTIN	ANDY XIOMARA ESCUDERO PEREZ	1.003.190.169	CRA 8 CL 9-3	24,00	20,50	4,60
2	B-C-SM-MZ67-VE-133	SAN MARTIN	MANUEL DEL CRISTO BOHORQUEZ ALVAREZ	3.831.621	CL 9 # 7 - 53	29,50	21,40	5,90
2	B-C-SM-MZ66-VE-134	SAN MARTIN	MYRIAM MARLENE TEHERAN DE CAUSADO	22.853.475	CL 9 # 7 - 46	38,00	13,70	20,50
2	B-C-SM-MZ56-VE-135	SAN MARTIN	ERASMO MANUEL PEREZ DIAZ	73.315.730	CL 9 # 6 - 88	38,00	15,30	10,50
2	B-C-SM-MZ56-VE-136	SAN MARTIN	ALEJANDRO PEREZ PADILLA	15.245.173	CL 9 6-75	38,50	23,90	9,00
2	B-C-SM-MZ-VE-137	SAN MARTIN	ISIDRO MANUEL HENAO ESCOBAR	73.316.151	CL 9 # 6-66	30,00	12,00	13,00
2	B-C-SM-MZ56-VE-138	SAN MARTIN	TOMAS FONSECA GONZALEZ	5.120.199	CL 9 6-58	42,00	20,00	10,50
2	B-C-SM-MZ56-VE-139	SAN MARTIN	OSCAR DAVID BECERRA RIVERA	72.297.061	CL 9 CRA 6-38	16,00	3,50	8,00
2	B-C-SM-MZ56-VE-140	SAN MARTIN	INES BENEDICTA PADILLA PALENCIA	22.853.700	CL 9 6-46	26,00	23,00	4,00
2	B-C-SM-MZ31-VE-142	SAN MARTIN	APOLER ROMAN CALVO HOYOS	3.831.874	CL 9 4A-39	42,60	24,10	7,50
2	B-C-SM-MZ32-VE-143	SAN MARTIN	EDWIN GABRIEL PUELLO CHAMORRO	73.316.258	CR 4A CL 8 - 45	32,80	21,80	7,50
2	B-C-SM-MZ87-VE-145	SAN MARTIN	MANUELA SEGUNDA VILLA AYOLA	22.858.537	CL 12 # 4A - 3	26,00	13,70	7,90
2	B-C-SM-MZ87-VE-146	SAN MARTIN	FIDEL ENRIQUE HENAO ESCOBAR	12.586.040	CL 12 # 4A - 39	38,00	25,80	4,50
2	B-C-SM-MZ87-VE-147	SAN MARTIN	ANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ	26.842.705	CL 12 4A - 49	43,00	16,00	8,00
2	B-C-SM-MZ87-VE-148	SAN MARTIN	JORGE LUIS RODRIGUEZ MIRANDA	12.698.121	CR 5A 11 - 48	20,00	10,70	10,70
2	B-C-SM-MZ89-VE-149	SAN MARTIN	ROBERT JAVITH VERGARA JEREZ	73.317.298	CL 12 5A-39	32,00	10,00	8,50
2	B-C-SM-MZ89-VE-150	SAN MARTIN	PABLO EMILIO CAUSADO SANCHEZ	3.831.454	CRA 6A 11-30	32,50	12,00	5,50
2	B-C-SM-MZ89-VE-151	SAN MARTIN	ELVIDA NAVARRO NAVARRO	33.204.357	CR 6A # 11 - 20	44,00	43,00	7,00
2	B-C-SM-MZ56-VE-152	SAN MARTIN	ELVER DAVID OCHOA MEDINA	72.099.587	CL 9 CRA 6-22 APTO 101	36,00	18,50	4,00
2	B-C-SM-MZ76-VE-153	SAN MARTIN	OSCAR ALFREDO TORRES CANTILLO	73.315.785	CL 7 8 - 30	34,80	18,00	5,50
2	B-C-SM-MZ075-VE-154	SAN MARTIN	RONALD ALBERTO MANJARRES PORTO	1.049.452.013	CL 9 # 8-50	35,00	20,00	6,00
2	B-C-SM-MZ75-VE-155	SAN MARTIN	ONEIDA MARIA DIPPE DE FRANCO	29.207.395	CR 9 CL 8 - 70	62,00	30,50	13,00
2	B-C-SM-MZ75-VE-156	SAN MARTIN	ESPERANZA ESTHER QUIROZ VERA	22.856.301	CL 10 CRA 8-25	43,00	11,30	10,20
2	B-C-SM-MZ145-VE-157	SAN MARTIN	MAIRA SOL ROSALES QUIROZ	22.855.489	CL 10 # 7	53,00	26,00	7,80
2	B-C-SM-MZ75-VE-158	SAN MARTIN	MARIEL JOSE ROSALES QUIROZ	73.316.691	CRA 9 CL 8-72	38,80	18,00	8,00
2	B-C-SM-MZ-VE145-160	SAN MARTIN	ANA AYDEE MEDINA DE URIBE	22.853.289	CL 10 # 7 - 2	48,00	20,50	7,50
2	B-C-SM-MZ-VE145-162	SAN MARTIN	IDALUZ GUERRA VEGA	22.854.666	CL 10 7 - 44	42,00	23,50	5,50
2	B-C-SM-MZ84-VE-165	SAN MARTIN	SIXTA ISABEL VILLAMIZAR PADILLA	22.854.587	CRA 8 CL 10-29	42,00	23,00	6,70
2	B-C-SM-MZ91-VE-167	SAN MARTIN	SERGIO ALFONSO CRUZATE ROMERO	3.831.686	CL 11 7A - 34	30,00	14,50	10,80
2	B-C-SM-MZ77-VE-179	SAN MARTIN	MARIS LUZ JULIO VERGARA	45.523.464	CR 8 CL 6 - 23	27,00	12,10	6,50
2	B-C-SM-MZ-VE87-180	SAN MARTIN	IGNACIA MARIA CRUZ ROMERO	22.853.408	CR 8 CL 8 - 40	27,00	21,30	4,50
		ACUMULADO	ACUMULADO			2088,20	1056,70	510,10
		PROMEDIO	PROMEDIO			32,63	16,51	7,97

Administracion	Imprevistos	Utilidad	Iva	Salario Minimo	No. Inmuebles para	Costo Validación
25,44%	1,0%	5,0%	19%	$ 1.000.000,00		

VM: Valor Maximo Ayuda — VM INTRADOMICILIARIA: $ 8.250.000,00 — VM INTRADOMICILIARIA + DOMICILIARIA + DIAGNOSTICO: $ 10.000.000

Constant values for every row: DIAGNOSTICO (Sin IVA) $ 152.241,60; DIAGNOSTICO (Incluido IVA) $ 181.167,51; Validación (Sin IVA) $ 19.904,84; Validación (Con IVA) $ 23.686,76; DIAGNÓSTICO + VALIDACIÓN (Sin IVA) $ 172.146,44; DIAGNÓSTICO + VALIDACIÓN (Incluido IVA) $ 204.854,27.

Verificacion dato archivo diagnosticos	diferencias	INTRADOMICILIARIA (sin AIU)	DOMICILIARIA (sin AIU)	Sumatoria	INTRADOMICILIARIA (Incluye AIU)	DOMICILIARIA (Incluye AIU)	INTRA+DOMC+DIAGNOS	CONSOLIDADO EJECUTADO - DESCUENTOS
6.887.962,53	189.753,12	4.834.926,91	69.790,32	4.904.717,23	6.400.959,73	92.395,40	6.698.209,41	6.698.209,41
9.444.985,91	411.528,60	5.738.845,82	929.787,04	6.668.632,86	7.597.657,98	1.230.945,06	9.033.457,31	9.033.457,31
7.841.298,85	189.753,11	5.555.023,84	69.790,32	5.624.814,16	7.354.296,06	92.395,40	7.651.545,74	7.651.545,74
7.814.305,68	244.545,84	5.493.247,35	69.790,32	5.563.037,67	7.272.510,17	92.395,40	7.569.759,84	7.569.759,84
9.602.086,12	894.584,85	5.337.228,10	1.085.195,80	6.422.423,90	7.065.956,28	1.436.690,72	8.707.501,27	8.707.501,27
6.566.494,57	261.326,35	4.326.318,71	281.517,19	4.607.835,90	5.727.613,34	372.700,61	6.305.168,22	6.305.168,22
8.441.178,67	230.238,34	5.317.303,76	730.045,78	6.047.349,55	7.039.578,45	966.507,61	8.210.940,33	8.210.940,33
7.465.862,82	152.429,41	5.273.731,24	95.691,78	5.369.423,02	6.981.892,79	126.686,35	7.313.433,41	7.313.433,41
8.240.626,45	189.753,11	5.856.653,57	69.790,32	5.926.443,89	7.753.623,66	92.395,40	8.050.873,34	8.050.873,34
8.314.938,30	434.298,97	5.728.068,33	69.790,32	5.797.858,65	7.583.389,66	92.395,40	7.880.639,33	7.880.639,33
7.662.197,96	285.031,06	5.156.607,07	260.956,66	5.417.563,74	6.826.832,10	345.480,53	7.377.166,90	7.377.166,90
8.172.428,90	230.238,34	5.192.486,74	651.864,26	5.844.351,00	6.874.333,19	863.003,10	7.942.190,56	7.942.190,56
7.970.674,95	398.878,39	5.481.835,04	82.741,05	5.564.576,09	7.257.401,41	109.540,88	7.571.796,56	7.571.796,56
8.805.748,19	398.878,39	5.758.100,24	437.243,46	6.195.343,71	7.623.148,91	578.866,62	8.406.869,80	8.406.869,80
8.549.349,69	286.948,88	5.695.885,36	390.334,55	6.086.219,91	7.540.782,63	516.763,91	8.262.400,81	8.262.400,81
8.247.586,35	292.144,38	5.784.570,06	69.790,32	5.854.360,38	7.658.192,30	92.395,40	7.955.441,97	7.955.441,97
7.990.185,62	316.833,34	5.067.602,86	573.682,74	5.641.285,60	6.708.999,43	759.498,58	7.673.352,28	7.673.352,28
6.954.066,54	296.533,13	4.804.202,53	69.790,32	4.873.992,85	6.360.283,73	92.395,40	6.657.533,41	6.657.533,41
8.318.089,48	189.753,11	5.915.164,81	69.790,32	5.984.955,13	7.831.086,69	92.395,40	8.128.336,37	8.128.336,37
6.827.279,62	278.235,92	4.722.255,48	69.790,32	4.792.045,80	6.251.794,03	92.395,40	6.549.043,70	6.549.043,70
5.043.864,79	284.480,21	3.370.447,09	69.790,32	3.440.237,41	4.462.134,91	92.395,40	4.759.384,58	4.759.384,58
7.850.343,92	189.753,13	5.535.954,51	95.691,78	5.631.646,29	7.329.050,18	126.686,35	7.660.590,79	7.660.590,79
8.322.147,74	189.753,12	5.918.230,19	69.790,32	5.988.020,51	7.835.144,95	92.395,40	8.132.394,62	8.132.394,62
8.148.709,56	189.753,12	5.721.093,22	135.921,79	5.857.015,01	7.574.155,31	179.946,86	7.958.956,44	7.958.956,44
8.665.155,76	230.238,33	5.365.411,77	851.117,54	6.216.529,32	7.103.268,65	1.126.794,52	8.434.917,43	8.434.917,43
7.765.616,43	189.753,12	5.497.857,57	69.790,32	5.567.647,89	7.278.613,64	92.395,40	7.575.863,31	7.575.863,31
8.106.560,84	189.753,11	5.755.387,91	69.790,32	5.825.178,23	7.619.558,06	92.395,40	7.916.807,73	7.916.807,73
7.971.802,84	189.753,12	5.653.599,25	69.790,32	5.723.389,57	7.484.800,04	92.395,40	7.782.049,72	7.782.049,72
8.100.577,84	189.753,12	5.750.868,68	69.790,32	5.820.659,00	7.613.575,04	92.395,40	7.910.824,72	7.910.824,72
8.057.934,94	189.753,12	5.718.658,62	69.790,32	5.788.448,94	7.570.932,15	92.395,40	7.868.181,82	7.868.181,82
7.998.497,32	189.753,11	5.673.762,77	69.790,32	5.743.553,09	7.511.494,53	92.395,40	7.808.744,21	7.808.744,21
7.523.102,18	286.222,80	5.241.808,07	69.790,32	5.311.598,39	6.939.629,70	92.395,40	7.236.879,38	7.236.879,38
8.132.932,40	189.753,13	5.762.356,77	82.741,05	5.845.097,82	7.628.784,12	109.540,88	7.943.179,27	7.943.179,27
8.139.325,77	160.626,52	5.776.235,85	95.691,78	5.871.927,63	7.647.158,64	126.686,35	7.978.699,25	7.978.699,25
6.390.026,30	284.238,18	4.387.445,01	69.790,32	4.457.235,33	5.808.538,45	92.395,40	6.105.788,12	6.105.788,12
8.426.367,53	294.209,67	5.838.177,47	149.664,20	5.987.841,67	7.729.163,16	198.140,43	8.132.157,86	8.132.157,86
7.522.231,25	281.979,27	5.244.355,55	69.790,32	5.314.145,87	6.943.002,31	92.395,40	7.240.251,98	7.240.251,98
7.922.709,35	211.116,43	5.574.478,67	95.691,78	5.670.170,45	7.380.052,31	126.686,35	7.711.592,92	7.711.592,92
8.275.053,66	189.753,12	5.882.657,96	69.790,32	5.952.448,28	7.788.050,87	92.395,40	8.085.300,54	8.085.300,54
7.984.245,73	202.609,08	5.627.385,78	95.691,78	5.723.077,56	7.450.096,04	126.686,35	7.781.636,65	7.781.636,65
7.415.285,53	140.099,74	5.257.791,86	82.741,05	5.340.532,91	6.960.790,65	109.540,88	7.275.185,79	7.275.185,79
8.097.289,18	169.226,33	5.737.987,94	95.691,78	5.833.679,72	7.596.522,24	126.686,35	7.928.062,85	7.928.062,85
7.456.473,74	290.434,06	5.188.299,73	69.790,32	5.258.090,05	6.868.790,01	92.395,40	7.166.039,68	7.166.039,68
8.877.043,95	230.238,34	5.881.076,57	495.501,22	6.376.577,79	7.785.957,27	655.994,07	8.646.805,61	8.646.805,61
8.314.813,04	189.753,12	5.912.689,97	69.790,32	5.982.480,29	7.827.810,25	92.395,40	8.125.059,92	8.125.059,92
7.503.681,08	-804.749,51	6.051.197,91	69.790,32	6.120.988,23	8.011.180,92	92.395,40	8.308.430,59	8.308.430,59
8.285.180,86	215.053,53	5.871.196,96	69.790,32	5.940.987,28	7.772.877,66	92.395,40	8.070.127,33	8.070.127,33
8.170.302,31	189.753,11	5.803.534,65	69.790,32	5.873.324,97	7.683.299,52	92.395,40	7.980.549,20	7.980.549,20
8.178.886,20	140.099,73	5.821.622,37	95.691,78	5.917.314,15	7.707.245,86	126.686,35	8.038.786,47	8.038.786,47
8.339.015,84	140.099,73	5.955.526,07	82.741,05	6.038.267,12	7.884.520,97	109.540,88	8.198.916,11	8.198.916,11
7.760.503,35	317.153,77	5.397.764,11	69.790,32	5.467.554,43	7.146.099,90	92.395,40	7.443.349,58	7.443.349,58
8.292.567,48	1.046.722,15	5.222.678,99	95.691,78	5.318.370,77	6.914.304,71	126.686,35	7.245.845,33	7.245.845,33
6.803.533,69	278.671,57	4.703.990,06	69.790,32	4.773.780,38	6.227.612,44	92.395,40	6.524.862,12	6.524.862,12
7.419.892,36	282.301,96	5.166.810,73	69.790,32	5.236.601,05	6.840.340,72	92.395,40	7.137.590,40	7.137.590,40
7.958.081,38	307.714,74	5.554.133,22	69.790,32	5.623.923,54	7.353.116,97	92.395,40	7.650.366,64	7.650.366,64
8.011.976,60	222.935,03	5.620.028,32	108.642,51	5.728.670,83	7.440.355,49	143.831,82	7.789.041,57	7.789.041,57
9.653.914,01	334.081,75	5.685.809,57	1.199.134,90	6.884.944,47	7.527.443,29	1.587.534,70	9.319.832,26	9.319.832,26
6.846.229,60	244.545,84	4.736.115,37	95.691,78	4.831.807,15	6.270.143,14	126.686,35	6.601.683,76	6.601.683,76
9.325.691,24	325.691,50	5.717.861,30	925.499,58	6.643.360,88	7.569.876,57	1.225.268,90	8.999.999,74	8.999.999,74
7.000.723,74	327.143,67	3.718.251,30	1.167.862,30	4.886.113,60	4.922.592,90	1.546.132,89	6.673.580,07	6.673.580,07
8.259.418,86	189.753,13	5.831.996,11	108.642,51	5.940.638,62	7.720.979,64	143.831,82	8.069.665,73	8.069.665,73
7.334.345,73	281.333,86	5.102.924,84	69.790,32	5.172.715,16	6.755.762,20	92.395,40	7.053.011,87	7.053.011,87
8.930.810,61	230.238,34	5.374.418,26	1.042.771,86	6.417.190,12	7.115.192,33	1.380.525,67	8.700.572,27	8.700.572,27
8.116.195,29	189.753,12	5.762.665,23	69.790,32	5.832.455,55	7.629.192,50	92.395,40	7.926.442,17	7.926.442,17
		347.412.601,95	14.950.866,39	362.363.468,34	459.939.543,72	19.793.452,01	492.843.668,99	492.843.668,99

Totals of constant columns: $ 9.743.462,58 — $ 11.594.720,47 — $ 1.515.952,61 — $ 11.017.372,34 — $ 13.110.673,25

479.732.995,73

ANEXO 5. F-GG-32 - ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 2220576

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUREDES (N.I.T 901568676 - 5)

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS. (N.I.T 800.173.768 -1)

PERÍODO A PAGAR: **1 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

En Bogotá DC, a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2022 se reunieron el Ing. Duarte Jose Pineda Director de Obra del Contratista y la Ing. Marcy Correa Castaño Directora de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS													
1,1	ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.	GL	1,00	$ 4.319.349,87	$ 4.319.349,87	1,00	0,00	1,00	4.319.349,9	$ -	$ 4.319.349,87	0,00	$ -
	SUBTOTAL (ACTIVIDAD 1)				$ 4.319.349,87				4.319.349,87	$ -	$ 4.319.349,87		-
	IVA 19%				$ 820.676,48				820.676,48	$ -	$ 820.676,48		-
	TOTAL (ACTIVIDAD 1)				**$ 5.140.026,35**				**$ 5.140.026,35**	**$ -**	**$ 5.140.026,35**		**-**
ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.													
1,2	ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	217,00	$ 152.241,60	$ 33.036.427,82	60,00	64,00	124,00	9.134.496,0	$ 9.743.462,40	$ 18.877.958,40	93,00	$ 14.158.469,42
	SUBTOTAL (ACTIVIDAD 2)				$ 33.036.427,82				$ 9.134.496,00	$ 9.743.462,40	$ 18.877.958,40		14.158.469,42
	IVA 19%				$ 6.276.921,29				$ 1.735.554,00	$ 1.851.257,86	$ 3.586.812,10		$ 2.690.109,19
	TOTAL (ACTIVIDAD 2)				**$ 39.313.349,11**				**$ 10.870.050,00**	**$ 11.594.720,26**	**$ 22.464.770,50**		**$ 16.848.578,61**
ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO													
	2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS												
	REDES HIDROSANITARIAS												
2,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML		$ 10.170,51	$ -	1.848,10	2088,20	3.936,30	18.796.119,5	$ 21.238.058,98	$ 40.034.178,51		$ -
2,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML		$ 43.860,81	$ -	1.021,90	1056,70	2.078,60	44.821.361,7	$ 46.347.717,93	$ 91.169.079,67		$ -
2,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML		$ 21.402,93	$ -	447,00	510,10	957,10	9.567.109,7	$ 10.917.634,59	$ 20.484.744,30		$ -
	PUNTOS HIDROSANITARIOS - No incluye aparatos							-					
2,4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und		$ 94.202,36	$ -	44,00	62,00	106,00	4.144.903,8	$ 5.840.546,32	$ 9.985.450,16		$ -
2,5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und		$ 112.904,76	$ -	50,00	61,00	111,00	5.645.238,0	$ 6.887.190,36	$ 12.532.428,36		$ -
2,6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und		$ 85.214,13	$ -	44,00	62,00	106,00	3.749.421,7	$ 5.283.276,06	$ 9.032.697,78		$ -
2,7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und		$ 89.406,34	$ -	42,00	41,00	83,00	3.755.066,3	$ 3.665.659,94	$ 7.420.726,22		$ -
2,8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und		$ 142.030,87	$ -	27,00	56,00	83,00	3.834.833,5	$ 7.953.728,72	$ 11.788.562,21		$ -
	APARATOS							-					
2,9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und		$ 147.311,27	$ -	45,00	58,00	103,00	6.629.007,2	$ 8.544.053,66	$ 15.173.060,81		$ -
2,101	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und		$ 114.887,70	$ -	46,00	58,00	104,00	5.284.834,2	$ 6.663.486,60	$ 11.948.320,80		$ -
2,11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und		$ 185.296,96	$ -	42,00	41,00	83,00	7.782.472,3	$ 7.597.175,36	$ 15.379.647,68		$ -
2,12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und		$ 177.856,36	$ -	26,00	52,00	78,00	4.624.265,4	$ 9.248.530,72	$ 13.872.796,08		$ -
	CAJAS DE INSPECCIÓN							-					
2,13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M		$ 175.509,36	$ -	77,40	81,50	158,90	13.584.424,5	$ 14.304.012,84	$ 27.888.437,30		$ -
	3. ADECUACIONES							-					
	UNIDADES SANITARIAS							-					
3,1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und		$ 2.596.959,72	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										CÓDIGO:			F-GG-32
											VERSIÓN:			01
	GERENCIA DE PROYECTOS										VIGENCIA:			2020-10-20
3,2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und		$ 2.305.691,80	$ -	4,00	4,00	8,00	9.222.767,2	$ 9.222.767,20	$ 18.445.534,40		$ -
3,3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und		$ 2.927.724,89	$ -	26,00	32,00	58,00	76.120.847,1	$ 93.687.196,48	$ 169.808.043,62		$ -
3,4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und		$ 3.012.931,39	$ -	-	1,88	1,88	-	$ 5.678.188,58	$ 5.678.188,58		$ -
	CIMENTACIÓN							-					
3,5	Relleno compactado con material de sitio	M3		$ 12.187,55	$ -	9,41	38,64	48,05	114.684,8	$ 470.878,18	$ 585.563,03		$ -
3,6	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3		$ 36.557,30	$ -	2,98	0,00	2,98	108.940,8	$ -	$ 108.940,75		$ -
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS							-					
3,7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3		$ 547.962,74	$ -	23,87	25,39	49,26	13.079.870,6	$ 13.912.773,97	$ 26.992.644,57		$ -
3,8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG		$ 4.953,42	$ -	3.406,00	3241,00	6.647,00	16.871.348,5	$ 16.054.034,22	$ 32.925.382,74		$ -
3,9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2		$ 52.948,33	$ -	96,35	137,20	233,55	5.101.614,0	$ 7.264.510,88	$ 12.366.124,83		$ -
3,10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2		$ 53.858,79	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,11	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3		$ 180.903,59	$ -	24,00	28,00	52,00	4.341.686,2	$ 5.065.300,52	$ 9.406.986,68		$ -
	MAMPOSTERÍA							-					
3,12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2		$ 26.760,01	$ -	126,09	185,53	311,62	3.374.169,7	$ 4.964.784,66	$ 8.338.954,32		$ -
3,13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und		$ 5.988,18	$ -	8,00	8,00	16,00	47.905,4	$ 47.905,44	$ 95.810,88		$ -
	MORTEROS							-					
3,14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2		$ 12.398,76	$ -	183,32	306,97	490,29	2.272.940,7	$ 3.806.047,36	$ 6.078.988,04		$ -
3,15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2		$ 12.851,95	$ -	218,61	217,60	436,21	2.809.564,8	$ 2.796.584,32	$ 5.606.149,11		$ -
3,16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2		$ 15.479,97	$ -	41,76	58,93	100,69	646.455,9	$ 912.157,23	$ 1.558.613,16		$ -
	ELEMENTOS							-					
3,17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	Und		$ 293.930,52	$ -	12,00	17,00	29,00	3.527.166,2	$ 4.996.818,84	$ 8.523.985,08		$ -
3,18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und		$ 45.618,89	$ -	52,00	60,00	112,00	2.372.182,3	$ 2.737.133,40	$ 5.109.315,68		$ -
3,19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und		$ 188.625,09	$ -	31,00	32,00	63,00	5.847.377,8	$ 6.036.002,88	$ 11.883.380,67		$ -
3,201	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und		$ 18.970,82	$ -	60,00	64,00	124,00	1.138.249,2	$ 1.214.132,48	$ 2.352.381,68		$ -
3,21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2		$ 49.939,55	$ -	-	11,08	11,08	-	$ 553.330,21	$ 553.330,21		$ -
3,22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	ML		$ 18.894,82	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und		$ 30.580,27	$ -	46,00	54,00	100,00	1.406.692,4	$ 1.651.334,58	$ 3.058.027,00		$ -
	ACABADOS							-					
3,24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2		$ 31.418,61	$ -	13,64	0,00	13,64	428.549,8	$ -	$ 428.549,84		$ -
3,25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2		$ 19.876,75	$ -	69,99	17,90	87,89	1.391.173,7	$ 355.793,83	$ 1.746.967,56		$ -
3,26	Recuperación de piso esmaltado	M2		$ 15.405,26	$ -	12,30	9,60	21,90	189.484,7	$ 147.890,50	$ 337.375,20		$ -
3,27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2		$ 30.290,43	$ -	62,10	106,89	168,99	1.881.035,7	$ 3.237.804,64	$ 5.118.840,34		$ -
3,28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2		$ 36.709,45	$ -	50,85	64,97	115,82	1.866.675,5	$ 2.385.012,97	$ 4.251.688,50		$ -
3,29	Estuco blanco en polvo para muros	M2		$ 4.777,63	$ -	600,69	822,90	1.423,59	2.869.874,6	$ 3.931.511,73	$ 6.801.386,29		$ -
	4. ACOMETIDAS							-					
	CONEXIONES							-					
4,1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	Und		$ 121.071,76	$ -	3,00	2,00	5,00	363.215,3	$ 242.143,52	$ 605.358,80		$ -
4,2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und		$ 132.377,90	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
4,3	Suminitro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und		$ 28.070,96	$ -	2,00	1,00	3,00	56.141,9	$ 28.070,96	$ 84.212,88		$ -
4,4	Suminitro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und		$ 27.279,28	$ -	1,00	1,00	2,00	27.279,3	$ 27.279,28	$ 54.558,56		$ -
4,5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	ML		$ 78.181,52	$ -	66,80	96,90	163,70	5.222.525,5	$ 7.575.789,29	$ 12.798.314,83		$ -
4,6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	ML		$ 12.950,73	$ -	84,00	54,00	138,00	1.087.861,3	$ 699.339,42	$ 1.787.200,74		$ -
4,7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und		$ 69.790,32	$ -	59,00	64,00	123,00	4.117.628,9	$ 4.466.580,48	$ 8.584.209,36		$ -
	INTERVENCIONES VARIAS							-					

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

4,8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2		$ 162.285,76	$ -	20,35	11,04	31,39	3.302.515,2	$ 1.791.634,79	$ 5.094.150,01		$ -
	CAJAS DE INSPECCIÓN							-					
4,9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	M		$ 238.957,93	$ -	11,20	8,00	19,20	2.676.328,8	$ 1.911.663,44	$ 4.587.992,26		$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**1.304.671.478,60**				**306.103.811,74**	**$ 362.363.468,36**	**$ 668.467.280,10**		**$ 636.204.198,50**
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**422.583.091,93**				**99.147.024,63**	**$ 117.369.527,40**	**$ 216.516.552,02**		**$ 206.066.539,91**
	ADMINISTRACIÓN	**25,44%**			331.908.424,16				77.872.809,71	$ 92.185.266,35	$ 170.058.076,06		$ 161.850.348,10
	IMPREVISTOS	**1,00%**			13.046.714,79				3.061.038,12	$ 3.623.634,68	$ 6.684.672,80		$ 6.362.041,99
	UTILIDAD	**5,00%**			65.233.573,93				15.305.190,59	$ 18.118.173,42	$ 33.423.364,00		$ 31.810.209,93
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19,00%**			12.394.379,05				2.907.986,21	$ 3.442.452,95	$ 6.350.439,16		$ 6.043.939,89
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**1.727.254.570,53**				**405.250.836,37**	**$ 479.732.995,76**	**$ 884.983.832,12**		**$ 842.270.738,41**
VALOR TOTAL (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)					**1.771.707.945,99**				**421.260.912,71**	**$ 491.327.716,02**	**$ 912.588.628,97**		**$ 859.119.317,02**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 1.771.707.945,99**	**V/R ANTICIPO (ACTIVIDAD 3):**	**$ 345.450.914,11**
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO (ACTIVIDAD 3) :**	**20%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 1.771.707.945,99	**% RETEGARANTIA:**	

% EJECUTADO PRESENTE ACTA:	**27,73%**
% FACTURADO PRESENTE ACTA:	**90% DEL ACTA**
	24,96%

FORMA DE PAGO: ENTerritorio realizará pagos mensuales, hasta el noventa por ciento (90%) del valor de cada acta de recibo parcial, de conformidad con las actas parciales mensuales de obra e informe mensual del CONTRATISTA debidamente aprobados por la interventoría, acompañados de la respectiva factura o cuenta de cobro.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de las 3 Actividades, se pagará una vez se haya liquidado el contrato, previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción y la entrega de los documentos señalados en la actividad de entrega de obras señalado en este estudio y de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio vigente durante la ejecución del contrato, dicha entrega será realizada a la interventoría y a ENTerritorio, así como de la aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el anexo "ESQUEMA DE GARANTÍAS Y

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3) (90%)	% PAGADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	RETENCIÓN GARANTÍA (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (ACTIVIDAD 3)	SALDO POR AMORTIZAR (ACTIVIDAD 3)	VALOR NETO A PAGAR (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	SALDO POR PAGAR (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	% PAGADO ACUMULADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)
1	**COBRO ACTA PARCIAL No. 1 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)**		**$ 379.145.500,44**	**21,40%**		**$ 81.050.167,27**	**$ 264.400.746,84**	**$ 298.095.333,17**	**$ 1.473.612.612,82**	**21,40%**
2	**COBRO ACTA PARCIAL No. 2 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)**		**$ 442.218.303,32**	**24,96%**		**$ 95.946.599,15**	**$ 168.454.147,69**	**$ 346.271.704,170**	**$ 1.127.340.908,65**	**24,96%**
TOTAL			**$ 442.218.303,32**	**24,96%**	**$ -**	**$ 176.996.766,42**	**$ 432.854.894,53**	**$ 644.367.037,34**	**$ 1.127.340.908,65**	**46,36%**

OK

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/08/2022

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CONSTRUREDES
NIT: 901568676 - 5

Aprobó
INTERVENTOR:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre: ING. MARCY CORREA CASTAÑO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA.
NIT: 800.173.768 -1

Avaló

DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: ARQ. ERIKA GUTIERREZ GAITAN
SUPERVISOR - ENTerritorio

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las
Nota 2: Instrucciones para la firma
Nota 3: La vivienda identificada con código B-C-SM-MZ-VE-082 corresponde a una caseta tipo 4, que conforme al item contractual Incluye cubierta con teja en fibrocemento, sin embargo, esta caseta se construyó al interior de la vivienda por lo cual no se requirió la cubierta, en atención a lo anterior se retiro de este item los costos correspondientes a la cubierta, por lo cual no se paga la Unidad sino 0.88
Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de
Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA

ANEXO 6 F-GG-03 – PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO POR LA FIRMA INTERVENTORA PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO


enterritorio	**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**	CÓDIGO:	**F-GG-03**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA :	**2022- 09-30**

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	**FECHA**	18 Abril 22
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO No.	2220576		
OBJETO	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DELPROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.727.254.570,53		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUREDES		
INTERVENTOR	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
PLAZO	CINCO (5) MESES		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	20,00 %	$ 345.450.914,11	

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios	$ 17.272.545,71	5,00%
2	Transporte	$ 17.272.545,71	5,00%
3	Impuesto de Guerra	$ 17.272.545,71	5,00%
4	Compra de materiales	$ 293.633.277	85,00%
TOTAL		**$ 345.450.914,11**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	**CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE**	**Nombre**	**FEDERICO CARDONA PABON**
Cargo	Representante Legal Contratista de Obra CONSORCIO CONSTRUREDES NIT 901568676-5	**Cargo**	Representante Legal Arca Arquitectura e Ingeniería S.A

AVALÓ	
Firma	
Nombre	
Cargo	Designado Entidad Territorial

Nota 1:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos

Nota 2:

Este formato puede utilizarse para otro tipo de contratos diferentes a obra, en cuyo caso deben firmar en constancia los representantes legales del contratista y su correspondienteinterventor.

Nota 3: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS)

Original: Enterritorio

Copias: Contratista, Interventoría

ANEXO 7. F-GG-36 – CONTROL DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

	CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	CÓDIGO:	F-GG-36
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30/09/2022			**Informe correspondiente al mes de : Septiembre**		**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220576							
OBJETO:	CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR							
VALOR DE CONTRATO:	$1.771.707.945,99							
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES							
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA							
PLAZO:	5 MESES							
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$345.450.914,11			Como % del valor del Contrato	20% de la actividad N° 3			
ADICIÓN #1 ANTICIPO:				Como % del valor del Contrato				
ADICIÓN #2 ANTICIPO:				Como % del valor del Contrato				
TOTAL ANTICIPO:	$345.450.914,11			Como % del valor del Contrato				
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA** X	% AVANCE FISICO OBRA:	54,35	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :	46,36	
PÓLIZA No.	11 - 45 - 101112033			FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :	27/05/2023	VALOR ASEGURADO :	$354.450.914,10	
VALOR AMORTIZADO:	$176.996.766,42			PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$168.454.147,69			

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	N° FACTURA	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO
23/08/2022	00000001	$379.145.500,44	$81.050.167,27
6/10/2022	00000002	$442.218.303,32	$95.946.599,15
TOTAL		$ 821.363.803,76	$ 176.996.766,42

Relacionar información de las cuentas bancarias abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra el saldo de anticipo:

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha: 30/09/2022
Fiduciaria de Occidente S.A.	FIDEICOMISO No. 317678	$ 1,41
	TOTAL DISPONIBLE	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

APROBÓ

Firma

Nombre ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITÁN
Cargo Supervisor del Contrato

APROBÓ

Firma

Nombre CARLOS ANDRÉS BRAVO
Cargo Gerente del Convenio

ANEXO 8. F-GG-31 – INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. (ADJUNTAR SOPORTES)

enterritorio	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	CÓDIGO:	F-GG-31
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30/09/2022		**Informe correspondiente al mes de : Septiembre**			**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220576						
OBJETO:	CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR						
VALOR DE CONTRATO:	$1.771.707.945,99						
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES						
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA						
PLAZO:	5 MESES						
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$345.450.914,11		Como % del valor del Contrato		20% de la actividad N° 3		
ADICIÓN #1 ANTICIPO:			Como % del valor del Contrato				
ADICIÓN #2 ANTICIPO:			Como % del valor del Contrato				
TOTAL ANTICIPO:	$345.450.914,11		Como % del valor del Contrato				
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**	**FIDUCIA**	% AVANCE FISICO OBRA:	54,35	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :		46,36
POLIZA No.	11 - 45 - 101112033		FECHA VENCIMIENTO POLIZA :	27/05/2023	VALOR ASEGURADO :		$354.450.914,11
VALOR AMORTIZADO:	$176.996.766,42		PENDIENTE POR AMORTIZAR:		$168.454.147,69		

SALDO DE ANTICIPO AL PERIODO ANTERIOR	$ 137.788.300,24

LOS SIGUIENTES SON LOS PAGOS HECHOS CON CARGO AL ANTICIPO DEL CONTRATO, TODOS ELLOS EXCLUSIVAMENTE PARA COSTOS Y GASTOS DEL CONTRATO.

PAGO DE SALARIOS Y JORNALES (Con cargo al anticipo)				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
11/07/2022	2	Salario Junio	Duarte Pinedo			$3.760.000,00	$3.760.000,00
30/07/2022	2	Salario Julio	Duarte Pinedo			$3.760.000,00	$7.520.000,00
30/07/2022	2	Salario Julio	Norelis Anaya			$2.040.000,00	$9.560.000,00
30/07/2022	2	Salario	Oswaldo Garzon			$3.360.000,00	$12.920.000,00
30/07/2022	2	Salario	Ronal Blanco			$3.340.000,00	$16.260.000,00
30/07/2022	2	Salario	Rafael Castillo			$1.012.545,00	$17.272.545,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$17.272.545,00	
Nuevo acumulado por este concepto						$17.272.545,00	

COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
							$0,00
							$0,00
							$0,00
							$0,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$0,00	
Nuevo acumulado por este concepto							

TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
3/06/2022	2	Transporte de Cerámica				$1.782.000,00	$1.782.000,00
15/06/2022	2	Transporte de Herramientas y Equipos Menores				$5.000.000,00	$6.782.000,00
15/06/2022	2	Transporte de Materiales Petreos				$1.875.000,00	$8.657.000,00
29/06/2022	2	Transporte de Combos cerámicos				$1.188.000,00	$9.845.000,00
22/07/2022	2	Transporte de Combos cerámicos				$1.188.000,00	$11.033.000,00
30/07/2022	2	Transporte de Puertas Metalicas y Bloques				$6.239.545,00	$17.272.545,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$17.272.545,00	
Nuevo acumulado por este concepto							

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							$191.218.812,00
30/07/2022	2	Compra de cemento gris 50 kg Argos	G Y J FERRETERÍA SA	800130426 - 3		$10.599.925,00	$201.818.737,00
15/07/2022	2	Compra de Acero	ConcreAceros	900507746 - 8		$17.983.295,00	$219.802.032,00
26/07/2022	2	Compra de Medidores	ACUATUBOS SAS	800226360-1		$8.108.898,00	$227.910.930,00
26/07/2022	2	Compra Tub y Accesorios PVC	Ingrid del CarmenOchoa Valeth	22854952-1		$54.845.055,00	$282.755.985,00
23/06/2022	2	Compra de Puertas Metalicas	METALICAS Y ALUMINIOS WILLIAMS	901038925-0		$10.877.292,00	$293.633.277,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$293.633.277,00	
Nuevo acumulado por este concepto							

OTROS - Exclusivamente del Proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	ACTA DE AVANCE Nº	CONCEPTO	Beneficiario	C.C. o NIT	Cheque	Valor	Acumulado
Total pagado por este concepto al informe anterior							
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período y exclusivamente para costos y gastos de proyecto							
Nuevo acumulado por este concepto							

TOTAL GIRADO EN EL PERIODO CON CARGO AL ANTICIPO DURANTE EL PERÍODO INFORMADO:	0
NUEVO TOTAL DE ANTICIPO INVERTIDO EXCLUSIVAMENTE EN EL PROYECTO POR EL CONTRATISTA CON AVAL DEL INTERVENTOR:	$354.450.914,11
NUEVO SALDO DE ANTICIPO A CARGO DEL CONTRATISTA Y DISPONIBLE EN CUENTA QUE AUN NO HA SIDO INVERTIDO EN EL PROYECTO:	$1,41
Nuevo saldo de anticipo en numero:	**$1,41**
Nuevo saldo de anticipo en letras:	**CERO PESOS**

El saldo de anticipo indicado, se encuentra disponible en las siguientes cuentas abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a nombre de :

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha: 30/09/2022
Fiduciaria de Occidente S.A.	FIDEICOMISO No. 317678	$ 1,41
	TOTAL DISPONIBLE	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

ELABORÓ

Firma

Nombre

Cargo Representante Legal o Director de Obra

APROBÓ

Firma Harcy A. Correa C

Nombre

Cargo Representante Legal o Director de Interventoría

APROBÓ

Firma

Nombre

Cargo Designado Ente Territorial (si aplica)

Nota 1: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe aprobar ir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

ANEXO 9. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764029176151

(415)7707212489984(8020) 001876402917615 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5				

11. Razón social
CONSORCIO CONSTRUREDES

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sincelejo

Cód. 2 3

24. Dirección
CR 24 15 17 BRR CENTRO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Sucre	San Marcos

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-05-21 / 09:31:46 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 85474042 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CONSTRUREDES

997. Fecha formalización 2022-05-21 09:31:46

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764029176151

(415)7707212489984(8020) **001876402917615 1**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5				

11. Razón social
CONSORCIO CONSTRUREDES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO CONSTRUREDES CR 24 15 17 BRR CENTRO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CRED	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ANEXO 10. CERTIFICACIÓN BANCARIA (VIGENTE NO MAYOR A 30 DÍAS)

Certificado
Bancario

Martes, 20 de septiembre de 2022

Señor(a)
ENTERRITORIO

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO CONSTRUREDES identificado(a) con NIT 901568676, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	53100001020	2022/03/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ANEXO 11. RUT ACTUALIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

¡Bienvenido, ahora eres usuario activo de la DIAN!

Trabajaremos juntos por una Colombia más honesta

Queremos decirte que puedes contar con nuestro apoyo y orientación para el cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias asumidas en este nuevo rol.

Entendemos que ahora tienes algunas dudas frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias, por eso aquí estamos para responderte:

1. **¿El RUT tiene fecha de vencimiento?**
   No, el RUT no tiene fecha de vencimiento, el RUT está actualizado o desactualizado.

2. **¿Cuándo debes actualizar el RUT?**
   Cuando cambien los datos registrados en este documento. Esta actualización debes realizarla dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la novedad.

3. **¿Debes crear una cuenta en la página de la DIAN?**
   Sí, es muy importante, así podrás ingresar a los servicios en línea de forma ágil, oportuna y eficiente, además, tendrás acceso a información de tu interés.

4. **¿Qué beneficios tienes al crear la cuenta?**
   Podrás obtener la copia de tu RUT, actualizarlo, consultar la información reportada por terceros, diligenciar y presentar las declaraciones tributarias, entre otros.

5. **¿Estás obligado a cumplir deberes formales de manera virtual?**
   Si la respuesta es SÍ, debes activar el Instrumento de Firma Electrónica (IFE), con esta podrás presentar las declaraciones, actualizar el RUT, solicitar la autorización de numeración de facturación, enviar la información exógena, entre otras.

6. **¿Si necesitas orientación en temas tributarios, qué puedes hacer?**
   Acudir a nuestros aliados estratégicos denominados Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), los cuales brindan orientación acertada y confiable gratuita.

Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a través de los siguientes medios:

Página web: www.dian.gov.co
Línea de atención: 057(1) 3556922
Puntos de atención.

¡Muchas gracias por creer en Colombia!
