FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 9

FECHA			DIA	17	MES	NOVIEMBRE		AÑO	2022
SEMANA N°	9	DEL	jueves, 17 de noviembre de 2022			AL	miércoles, 23 de noviembre de 2022		
FECHA INICIO :	25-sep-21		FECHA TERMINACION INICIAL :	15-nov-22		NUEVO PLAZO DE EJECUCION	15-may-22		
No. 2 PRORROGAS			No. SUSPENCIONES			OFICIOS RADICADOS EN LA SEMANA			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ARMAS COMBINADAS (ESACE) DEL EJERCITO EN BOGOTA.				
INTERVENTOR	CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	NIT O C.C.	900844978-4	CONTRATO N°	209-2022
CONTRATISTA	NESTOR RJAS TORRES	NIT O C.C.	3249514-5	CONTRATO N°	196-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO		
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO SEMANAL		ACTIVIDADES DESCRITAS POR ITEMS EJECUTADOS REFERENTES AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LOS MOTIVOS DE ATRASO	ACUERDOS PLAN DE CONTINGENCIA PROPUESTO
PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
INSTALACIONES ELECTRICAS	100,00%	100,00%				
CUBIERTA	100,00%	100,00%				
CIELO RASOS	100,00%	100,00%				
PINTURA	100,00%	80,00%				
ASEO	100,00%	100,00%				

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 171.644.227,01	SEMANA	$ 8.582.211,35	$ -		5,00%	100,00%
		ACUMULADO	$ 171.644.227,01				


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Residente	1	Oficial	2,00
Profesional HSQ	1	Ayudantes	4,00
Maestro	0	Ornamentacion	0,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)		FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0,00				NO

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

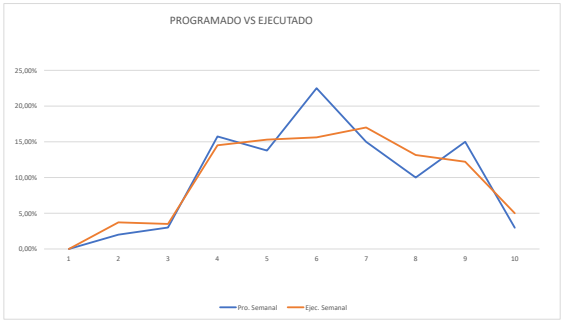

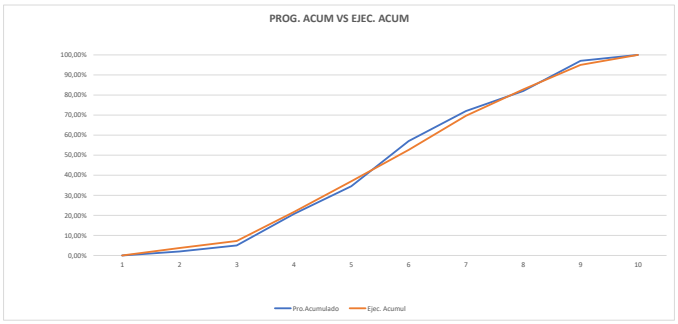

Semana	inicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fecha	25/09/2021	29/09/2022	6/10/2022	13/10/2022	20/10/2022	27/10/2022	3/11/2022	10/11/2022	17/11/2022	24/11/2022			
Pro. Semanal	0,00%	2,00%	3,00%	15,74%	13,78%	22,50%	15,00%	10,00%	15,00%	2,98%			
Pro.Acumulado	0,00%	2,00%	5,00%	20,74%	34,52%	57,02%	72,02%	82,02%	97,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Ejec. Semanal	0,00%	3,72%	3,50%	14,51%	15,30%	15,62%	17,00%	13,15%	12,20%	5,00%			
Ejec. Acumul	0,00%	3,72%	7,22%	21,73%	37,03%	52,65%	69,65%	82,80%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Balance	0,00%	1,72%	2,22%	0,99%	2,51%	-4,37%	-2,37%	0,78%	-2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DESCRIPCION:

Se culminan actividades y se hace entrega del frente de obra a la unidad beneficiaria el día 22 de noviembre de 2022.

NESTOR ROJAS TORRES

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

Original: CENAC DE INGENIEROS
1 era copia: Interventor
2 da copia: Contratista


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL No. 9

SEMANA N°	6	**DEL**	jueves, 17 de noviembre de 2022		**AL**	jueves, 24 de noviembre de 2022	
FECHA INICIO :	**sep 22 2022**		**FECHA TERMINO :**	**15 nov. 2022**	**PAG**	Pág. 2 de 2	
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ARMAS COMBINADAS (ESACE) DEL EJERCITO EN BOGOTA.**						
INTERVENTOR	**CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**		**NIT O C.C.**	**900844978-4**	**CONTRATO N°**	**209-022**	
CONTRATISTA	**NESTOR RJAS TORRES**		**NIT O C.C.**	**3249514-5**	**CONTRATO N°**	**196-2022**	

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO




UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE

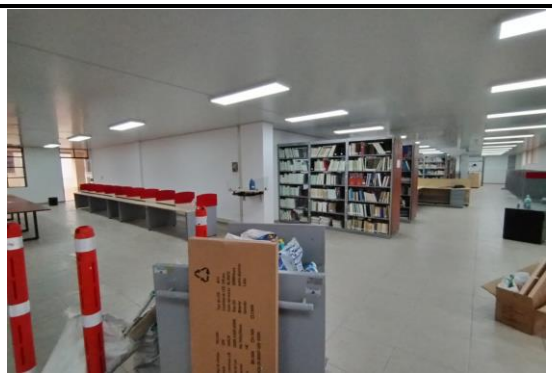

UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE

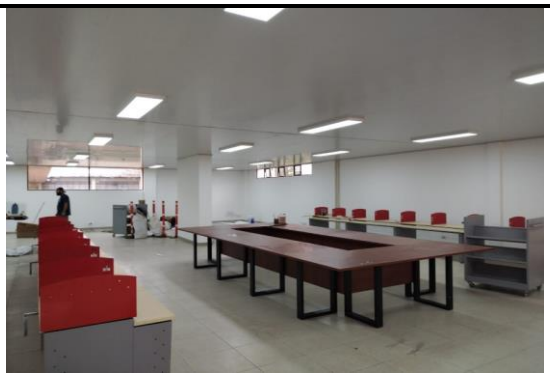

UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE





UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE

UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE




UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE




UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE




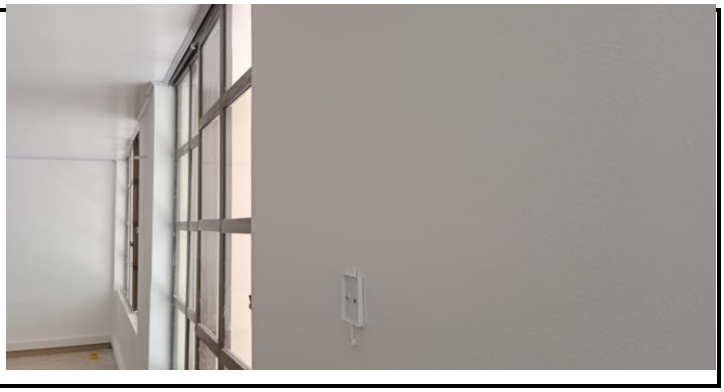

UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE

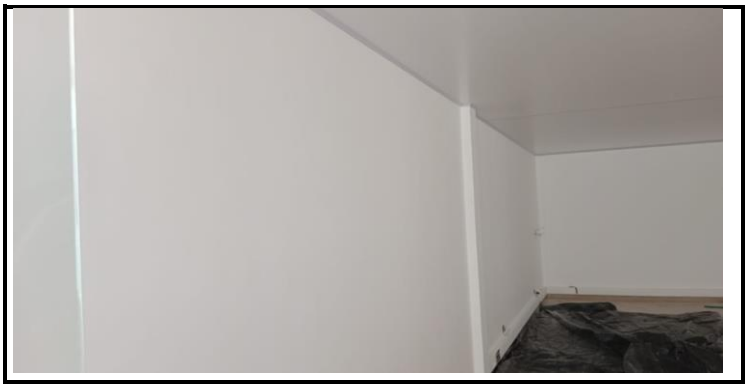

UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
