Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0003 FECHA 28/09/(2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

TIEMPO NUBLADO **TEMPERATURA** 20°C
PRECIPITACIONES LLOVIZNAS

Personal presente:

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO

upervición y/o Supervición : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA

Personal de obra **Cantidad** **6** **Horas hombre** 40

No	Cantidad	Tareas realizadas	Personal	Horas-homb
1	1		MAESTRO DE OBRA	8
2	1		OFICIAL DE OBRA	8
3	2		AYUDANTE DE OBRA	8
4	1		SISO	8
5	1		INGENIERO AUXILIAR	8

Breve Resumen de actividades:

Demoliciones de enchapes, pisos, retiro de escombros a sitio ubicacdo en la zona del parqueadero

Impedimentos:

Enchapes dobles. Se averió un tubo en la zona de Vestier, la placa de entre piso existente teien fisuras, como consecuenca el agua paso al sotano, el inconveniente fue solucionado,.

Materiales:

Material	cantidad	Unidad	Uso

Maquinaria:

Equipo, Maquina	Uso	Entrada	Salida	Pausa	Causa pausa
Destornillador	Desmonte de mobiliario	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
taladro	Desmonte de mobiliario	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
pulidora	cortes de muros	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
rotomartillo	Demolición de murios	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
Carretilla	Retiro de escombros	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa

Raimur Aguirre Zapata

Vo Bo Interventoría y/o supervisión

Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0003 FECHA 28/09/(2022


OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

Estado de avance de la obra

Se realiza el 100% de demolición de pisos de los consultorios 1 y 2, se completa el 100% de demolición de enchapes de la zona de residuos y vestier, Completo el 100% del demoliciones de pisos y enchapes zona de Residuos, se inicia demolición de pisos zona de consultorio 3

Registro Fotografico:



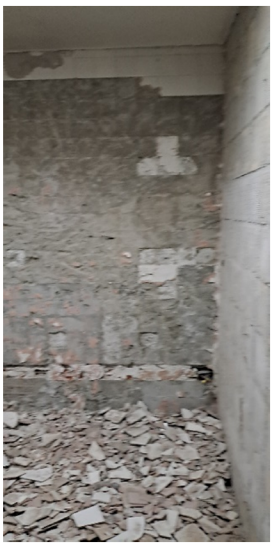







Raimur Aguirre Zapata

VoBo Interventoría y/o supervisión
