SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA No. 001
CONVENIO/CONTRATO DE OBRA No. 007 DE 2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022

SUPERVISOR/INTERVENTOR: MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ

APOYO A LA SUPERVISIÒN: JORGE HERNAN HENAO LEON CC. 7´560.922

CONTRATISTA: ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO CC. 7´523.688

OBJETO: OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

1. DATOS GENERALES	
Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. Proceso	019 DE 2022
Tipo de Contrato	OBRA
Secretaría que genera la necesidad y responsable de la elaboración del estudio previo.	INFRAESTRUCTURA
Dependencia que genera el proceso	PDA
No. Del contrato	007 DE 2022
Fecha de suscripción del contrato	03-08-2022
Contratista	ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
NIT / CC	7´523.688
Valor Inicial del Contrato	$103´009.386,11
Forma de pago	PAGOS PARCIALES
Plazo Inicial del contrato	UN MES (30 DIAS) CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Fecha de inicio:	05/09/2022
Fecha de terminación inicial	04/10/2022
Fecha de suspensión:	
Fecha de reinicio:	

Powered by CamScanner

Fecha de terminación final:	04/10/2022
Modificación No.	
Supervisor por parte del departamento	MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ


2. DATOS FINANCIEROS	
No. y Valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No. 2977 $104´551.141,66
No. y valor Registro Presupuestal	
Adición (Modificatorio No. _____ de 20_____	
Valor Total del Contrato	$103´009.386,11

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:


EL CONTRATO SE DESARROLLO EN FORMA NORMAL, TANTO EN TIEMPO COMO EN PRESUPUESTO. PARA EL SEGUIMIENTO SE HICIERON COMITES DE OBRA SEMANALES EN DONDE SE HACIA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOS COMPROMISOS PARA LAS SIGUIENTES SEMANAS.
SE DIO INICIO CON LA SOCIALIZACION, LUEGO SE EMPRENDIERON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE COMPONIAN EL CONTRATO (EXCAVACIONES, ROTURA DE PAVIMENTO, INSTALACION TUBERIA, CAJAS DE INSPECCION, LLENOS, CONSTRUCCION CAMARAS Y DEMAS ACTIVIDADES) A UN RITMO NORMAL Y EN TIEMPO Y PRESUPUESTO, LOGRANDO TERMINAR LA OBRA EN LOS 30 DIAS QUE SE TENIAN DE PLAZO PARA ELLO.


4. REGISTRO FOTOGRAFICO

Powered by CamScanner

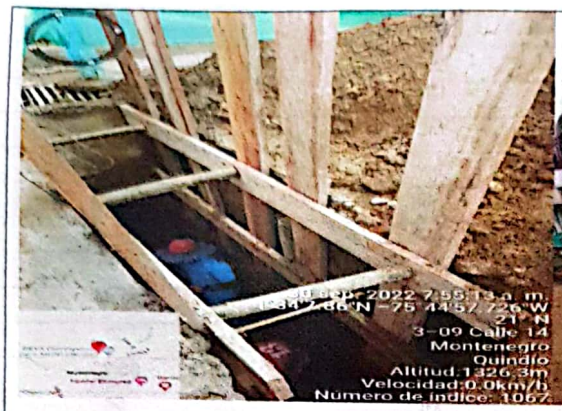



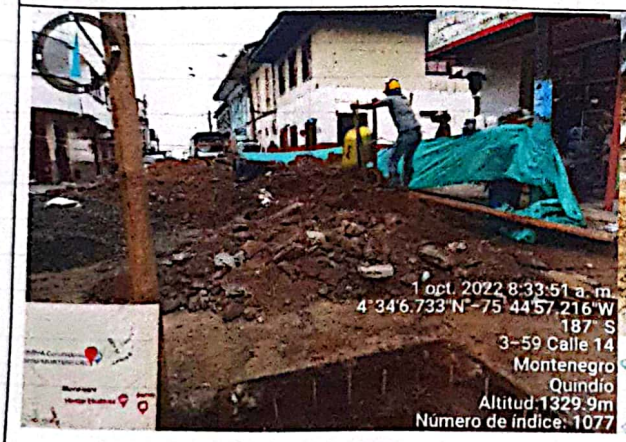

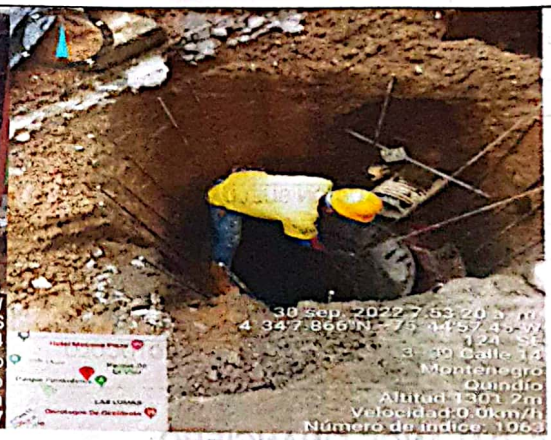

5. RESUMEN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

Ítem	Descripción	Un	Cantidad ejecutada
	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	116,50
	SEÑALIZACION PREVENTIVA	ML	120
	CORTE DE PAVIMENTO	ML	255

Powered by CamScanner

	DEMOLICION DE PAVIMENTO	M2	95
	DEMOLICION ANDEN	M2	12
	PASOS PEATONALES PROVISIONALES	UN	12
	MANEJO DE AGUAS	ML	40
	EXCAVACION 0-2M	M3	128,47
	EXCAVACION 2-4M	M3	52,30
	LLENO COMPACTADO MAT. DE SITIO	M3	142,50
	LLENO COMPACTADO MAT. DE PRESTAMO	M3	0,00
	CAMA PARA CIMENTACION	M3	23,47
	ENTIBADO TIPO B	M2	50
	TUBERIA PERFILADA D=6"	ML	65,20
	TUBERIA PERFILADA D=12"	ML	56
	KIT SILLA YEE 12"	UN	12
	CUERPO CAMARA D=1,2M	ML	4,90
	CAJA DE INSPECCION 0,80X0,80M	UN	12
	LOSA TAPA 1,6X1,6X0,2M	UN	2
	ANDEN EN CONCRETO E=0,10M	M2	12
	BASE Y CAÑUELA	UN	2
	BRAZO DE CAIDA D=12"	UN	1
	EMPALME CAMARAS EXISTENTES	UN	2
	SUB BASE GRANULAR	M3	15,65
	REPOSICION PAVIMENTO MR-42 E=0,20M	M2	76,10
	RESTITUCION SUELO CEMENTO	M3	0,00
	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	114,90
	INSPECCION INTERNA DE LA RED	ML	50,10
	REPOSICION ANDENES EN CERAMICA Y TABLON	M2	4
	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	GL	0,00

6. BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR INICIAL	$103´009.386,11	$102´957.737,13	$51.648,98
ACTA No. 01	$103´009.386,11	$102´957.737,13	$51.648,98
TOTAL	$103´009.386,11	$102´957.737,13	$51.648,98

. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

Powered by CamScanner

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **arquitecto Milton César Torres Hernández**, en su calidad de supervisor y el ingeniero Jorge Hernán Henao León en su calidad de apoyo a la supervisión, dejan constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado MARIA EDILMA MARTINEZ OSORIO con tarjeta profesional No. 19266-T donde certifica que ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO con CEDULA 7'523.688 de armenia, se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo. **(si aplica)**

VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATISTA:

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO	$125.000		$69.600	9441444295	SEPTIEMBRE
ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO	$62.100		$34.700	9442967120	SEPTIEMBRE

INGRESO BASE DE COTIZACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN PROPUESTA.

Nombre(s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO	$125.000		$69.600	9441444295	SEPTIEMBRE
ALEJANDRA CANO-SOCIAL	$56.700	$26.700	$11.700	9441414048	0CTUBRE

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	X
TRANSFERENCIA	

Powered by CamScanner

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta

Nota: para el pago de cuentas con recursos nacionales, la forma de pago no puede efectuarse mediante cheque.

Para constancia, se firma en el Municipio de Armenia Departamento del Quindío, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE del año dos mil VEINTIDOS (2022).

MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ
Director PDA
Departamento del Quindío
Supervisor / Interventor

JORGE HERNAN HENAO LEON
Contratista
Departamento del Quindío
Apoyo a la Supervisión

ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
Contratista



VoBo. Secretario Despacho

Elaboró:
HERBERTO VIGOYA(jurídico)
JULIA ESPERANZA PAREJA (técnico)

Falta Firma de publicación del Secop
