PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente **Tarea #347054**

Nombre del cliente
SCADE 20 DE JULIO -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

Fecha 14/11/2022 a las 8:01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA


1) MARCA:	POWERCOM
2) CAPACIDAD:	10KVA
3) SERIE	10037510911
4) MODELO	ULT-10K
5) REALIZADO POR:	Ruben Dario Pulido
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
7) VENTILADORES:	BUENO
8) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
9) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
10) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
11) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
12) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
13) FUSIBLES:	BUENO
14) ENTRADA A-B:	211 VAC
15) SALIDA A-B:	220 VAC
16) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento correctivo desinstalando baterías antiguas e instalado baterías nuevas cambiando el banco de baterías internas marca FULLIBATTERY 12V 9Ah. La UPS asume de forma satisfactoria la carga hacia el banco de baterías. La UPS queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
17) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 9Ah
18) NUMERO DE BATERIAS:	60 unidades

19) REGISTRO FOTOGRAFICO:







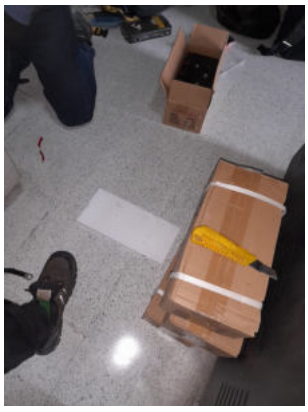
















ON
OFF
SELEC
ULTIMATE
Series II









226.0
ON
OFF
SELECT
ULTIMATE
Series II
PCM





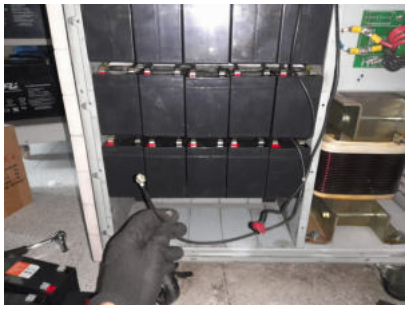







60.0
ON
OFF
SELECT
ULTIMATE
Series II



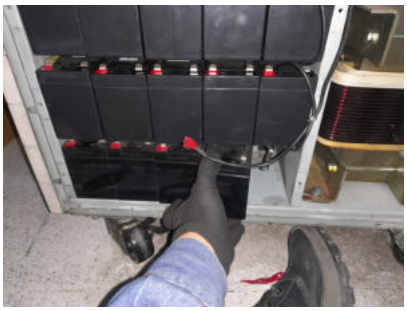














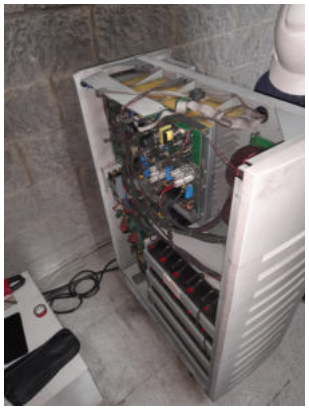









20) FIRMA DEL SUPERVISOR:	Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802
21) FIRMA DEL TECNICO	



Firmado por: Ruben Pulido, Documento: 1030620505
