UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 DE 1 al 28 de febrero de 2022
(indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 8
(Es consecutivo debe ser igual al consecutivo del acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 181.706.605,00

CONTRATO No: 988 de 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANIA (LA LEJA – SARAVENA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACA Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1013 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV-WSP 188

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses desde mandato inicial)

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses desde las ampliaciones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/07/2021
(Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
(Indique la suspensión que corresponda con el numero del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
(Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 362.133.900.815,00
(Gestión contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 22.040.662.599,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 384.174.563.414,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23
EXPLANACIONES (Items 1,4,5,6,7)	$ 32.127.546,26	10,76%	0,44%	% P	0,60%	0,70%	0,40%	0,10%	0,10%	0,10%	0,18%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%	0,46%	0,53%	0,59%	0,68%	0,77%	0,85%	0,95%	0,95%	1,04%	1,09%	1,17%	1,25%	1,33%	1,35%	1,42%	1,47%	1,53%
	$ 32.934.289,92	10,29%	$ 1.419.930,00	$ P	$712.4	$993.718	$514.460	$114.462	$102.296	$465.988	$629.288	$703.141	$883.678	$1.071.122	$1.263.934	$1.476.988	$1.689.699	$1.901.420	$2.170.898	$2.452.848	$2.728.202	$3.033.702	$1.170.639	$1.322.847	$1.489.474	$1.746.642	$1.999.072	$2.264.627	$2.334.286	$4.509.126	$1.710.492	$4.902.996
				$ E	$1.419.930	$1.981.648	$2.496.108	$2.610.570	$2.712.866	$3.178.854	$3.808.142	$4.511.283																				
				% E	0,03%	0,05%	0,08%	0,12%	0,12%	0,12%	0,14%	0,14%																				
SUBBASES Y AFIRMADOS (Item B, 9, 10, 11, 12)	$ 24.664.107,51	8,22%	0,33%	% P			0,96%	0,96%	0,97%	0,18%	0,18%	0,20%	0,35%	0,35%	0,36%	0,42%	0,48%	0,54%	0,63%	0,76%	0,78%	0,88%	0,90%	0,96%	0,99%	1,07%	1,14%	1,26%	1,29%	1,28%	1,34%	1,40%
	$ 30.006.491,51	9,38%	$ 1.050.074,52	$ P			$288.513	$288.513	$854.765	$625.448	$627.847	$590.601	$804.579	$975.897	$1.161.999	$1.344.689	$1.543.101	$1.734.304	$1.977.885	$2.234.787	$2.486.160	$2.764.000	$2.989.756	$3.097.481	$3.179.254	$3.410.386	$3.638.361	$3.893.815	$3.948.968	$4.106.477	$4.261.725	$4.467.098
				$ E			$288.513	$577.026	$1.431.791	$2.057.239	$2.685.086	$3.275.687																				
				% E			0,05%	0,46%	0,50%	0,14%	0,30%	0,33%																				
BASES (Items 13, 14)	$ 18.958.110,00	6,31%	0,00%	% P			-	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,13%	0,16%	0,17%	0,21%	0,25%	0,29%	0,33%	0,37%	0,43%	0,47%	0,53%	0,55%	0,58%	0,61%	0,65%	0,70%	0,74%	0,76%	0,80%	0,83%	0,86%
	$ 19.019.190,00	5,94%	$ -	$ P			$0	$273.936	$284.226	$284.226	$399.681	$541.148	$645.058	$663.652	$686.009	$697.505	$813.187	$1.038.296	$1.188.727	$1.351.584	$1.517.340	$1.687.001	$1.785.910	$1.853.588	$1.950.304	$2.058.892	$2.239.314	$2.363.217	$2.436.068	$2.560.668	$2.655.349	$2.756.500
				$ E																												
				% E																												
PAVIMENTOS (Items 15, 16, 17, 18, 19)	$ 88.149.697,02	29,36%	0,00%	% P					0,02%	0,39%	0,49%	0,59%	0,76%	0,90%	1,06%	1,24%	1,43%	1,63%	1,82%	2,00%	2,20%	2,55%	2,66%	2,79%	2,93%	3,15%	3,35%	3,58%	3,66%	3,85%	3,95%	4,13%
	$ 88.434.413,38	27,63%	$ -	$ P					$47.898	$1.153.865	$0	$0	$0	$2.876.148	$3.393.597	$3.953.505	$4.547.602	$5.111.000	$5.828.134	$6.596.331	$7.358.587	$8.145.039	$8.513.739	$8.932.431	$9.369.858	$10.088.772	$10.734.082	$11.500.169	$11.809.628	$12.361.490	$12.918.508	$13.495.333
				$ E																												
				% E																												
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Items 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 44, 45)	$ 31.722.694,46	10,57%	0,004%	% P						0,18%	0,23%	0,28%	0,34%	0,41%	0,47%	0,54%	0,61%	0,70%	0,79%	0,88%	0,97%	1,02%	1,07%	1,12%	1,20%	1,28%	1,35%	1,43%	1,51%	1,57%
	$ 33.843.397,16	10,58%	$ 17.486,85	$ P						$585.385	$722.043	$807.465	$1.102.787	$1.298.846	$1.518.680	$1.746.452	$1.995.996	$2.236.818	$2.520.930	$2.816.378	$3.117.456	$3.418.780	$3.705.219	$3.914.630	$4.109.288	$4.382.188	$4.630.266	$4.904.020	$5.164.655	$5.398.396
				$ E	$12.487	$12.487	$12.487	$12.487	$12.487	$0	$12.487																					
				% E	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,00%	0,00%																					
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$ 3.180.523,99	1,06%	0,00%	% P						0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,12%	0,13%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,16%
	$ 3.439.895,92	1,07%	$ -	$ P						$0	$0	$0	$0	$111.876	$130.454	$154.173	$176.898	$198.897	$220.740	$243.193	$267.582	$284.164	$294.867	$303.185	$317.062	$334.466	$361.576	$381.792	$403.192	$423.764	$443.998	$457.101
				$ E																												
				% E																												
OBRAS VARIAS (Items: 55, 56)	$ 86.843.260,58	27,14%	0,83%	% P	0,03%	0,03%	0,01%	0,02%	0,03%	0,36%	0,46%	0,53%	0,73%	0,89%	1,04%	1,22%	1,40%	1,57%	1,78%	2,02%	2,20%	2,53%	2,61%	2,74%	2,88%	3,09%	3,29%	3,48%	3,57%	3,73%	3,88%	4,04%
	$ 192.182,66	0,060%	$ -	$ P	$26.731	$56.731	$56.731	$56.660	$66.708	$1.199.283	$1.492.472	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$26.731	$83.462	$140.193	$196.853	$263.561	$1.462.844	$2.955.316	$2.955.316																				
				% E	0,007%	0,064%	0,05%	0,062%	0,059%	0,407%	0,06%																					
TRANSPORTES (Items 57, 58)	$ 24.775.972,00	8,25%	0,83%	% P	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%	0,13%	0,16%	0,17%	0,21%	0,26%	0,31%	0,36%	0,41%	0,46%	0,53%	0,59%	0,65%	0,73%	0,77%	0,80%	0,86%	0,91%	0,97%	1,02%	1,05%	1,10%	1,14%	1,19%
	$ 2.657.485,60	0,857%	$ -	$ P	$26.666	$56.396	$56.396	$56.360	$66.243	$593.643	$648.705	$643.875	$685.934	$829.572	$978.904	$1.143.299	$1.311.730	$1.475.179	$1.683.306	$1.869.706	$2.131.872	$2.348.072	$2.455.628	$2.573.531	$2.782.392	$2.953.388	$3.090.203	$3.256.841	$3.356.865	$3.507.767	$3.649.748	$3.797.597
				$ E	$26.666	$83.062	$139.458	$195.818	$262.061	$855.704	$1.504.409	$2.148.284																				
				% E	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,095%	0,83%	0,83%																				
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,00%	0,00%	% P																												
	$ -	0,00%	$ -	$ P																												
				$ E																												
				% E																												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 300.223.516,81**	100%	1,67%																													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 320.028.720,97**	100%	$ 5.332.159,03																													

REPROGRAMACION 1

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE SIMBOLO	PROGRAMADO	EJECUTADO	Reprogramación 1
BARRAS	#¡VALOR!	$ 1.419.930,00	1.419.930,00
CURVAS			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,03%	0,08%	0,10%	0,09%	0,09%	0,47%	0,56%	0,38%	0,56%	0,57%	0,59%	0,64%	0,68%	0,64%	0,81%	0,86%	0,87%	0,88%	0,42%	0,46%	0,51%	0,78%	0,78%	0,85%	0,36%	0,58%	0,55%	0,58%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$80.139,8	$226.701,2	$288.257,2	$198.874,6	$173.266,5	$2.149.126,5	$1.080.047,4	$1.202.879,3	$1.746.489,1	$1.827.358,5	$1.873.606,4	$2.061.349,6	$2.114.435,2	$2.036.184,7	$2.566.729,1	$2.740.165,6	$2.787.423,0	$2.864.851,6	$1.330.640,1	$1.470.032,6	$1.619.145,1	$2.516.396,1	$2.545.032,9	$2.064.865,5	$1.092.921,3	$1.692.295,5	$1.752.421,5	$1.870.302,4	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,03%	0,10%	0,20%	0,30%	0,38%	1,45%	1,76%	2,13%	2,68%	3,25%	3,84%	4,48%	5,16%	5,79%	6,60%	7,45%	8,32%	9,21%	9,63%	10,09%	10,60%	11,38%	12,16%	12,77%	13,13%	13,72%	14,26%	14,84%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$80.139,8	$306.841,0	$595.098,2	$793.972,8	$967.239,4	$4.547.480,4	$5.628.530,8	$6.832.410,1	$8.580.879,2	$10.408.237,7	$12.281.744,0	$14.343.093,6	$16.457.566,2	$18.493.746,8	$21.064.477,9	$23.834.642,9	$26.622.065,9	$29.486.917,5	$30.869.557,6	$32.289.590,2	$33.907.735,3	$36.424.131,3	$38.772.164,2	$40.857.029,7	$42.116.951,0	$44.010.271,4	$45.772.692,9	$47.642.995,3	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,12%	0,28%	0,13%	0,44%	0,00%	0,67%	0,39%	0,00%	0,67%	0,39%	0,00%																		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 346.894,76	$ 142.920,46	$ 401.804,04	$ 1.311.051,13	$ 186.728,98	$2.149.126,5	$ 433.279,0	$ 681.286,60																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,12%	0,40%	0,53%	0,97%	0,97%	1,63%	2,02%	2,02%	1,63%	2,02%	2,02%																		
	VALOR (Miles de Pesos)	$346.894,7	$490.757,2	$892.583,2	$2.203.634,3	$2.388.363,3	$4.537.489,8	$5.100.862,4	$5.833.159,03																						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31.704.542.709 $ 33.790.030.707	$ 76.370,08	0,124%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 1.150.000,00 $ 1.150.000,00	$ -	0,000%
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 2.434.031.973 $ 2.594.057.416	$ 39.545,79	0,062%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00	$ -	0,000%
PR — REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 285.000,00 $ 285.000,00	$ -	0,000%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye IVA) (I)	$ 20.528.411,20 $ 20.528.411,20	$ -	0,000%
VALOR IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (19%)	$ 3.900.398,13 $ 3.900.398,13	$ -	0,0000%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 408.000,00 $ 408.000,00	$ -	0,000%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (L)	$ 61.920.384,01 $ 66.155.842,45	$ 118.915,87	0,185%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (E)			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 362.133.900,82**	**$ 5.451.074.902**	**1,65%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 384.184.563,41**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.


OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista.
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ

Aprueba Firma:
Nombre: OSCAR JIMÉNEZ CELY
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-34513 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

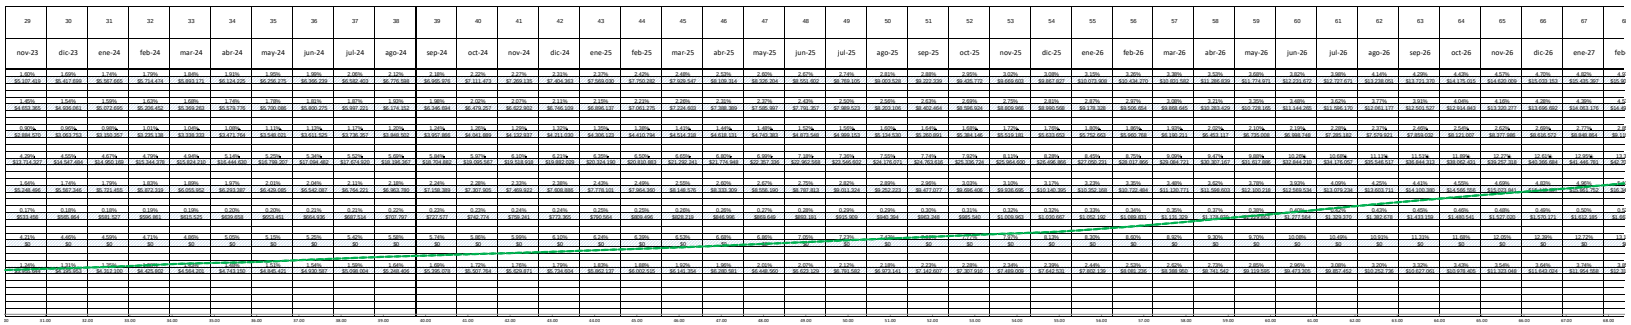

CODIGO	MEPI-MNS-IN-S-FR-2
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	01/03/2022 (Día / Mes / Año)

