INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

CONSORCIO ICAYECO-189

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº.990 – 2021

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 02

## MODULO 2-CORREDOR PALETARA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

BOGOTÁ, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1. DE 1 |

**INFORME MENSUAL NO.** 3 **MES O PERIODO:** AGOSTO DE 2021

| No. | CONTENIDO | FORMATO | ADJUNTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | FOLIO |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | | X | 1 a 4 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | | X | 5 |
| 2.1 | Localización | | | X | 5 |
| 2.2 | Inventario y estado inicial de la vía | | | X | 5 a 7 |
| 2.3 | Características técnicas del proyecto | | | X | 12 a 13 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | | X | 14 |
| 3.1 | Información general del contrato | | | X | 14 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | | X | 14 a 18 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | | X | 19 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | | X | 19 a 30 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | | X | 31 |
| 4.1 | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MINFRA-MN-IN-15-FR-3 | X | | 64 a 65 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 | X | | 66 a 69 |
| 4.3 | Personal Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 | X | | 70 a 73 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-8 | X | | 74 a 76 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | X | | 77 a 78 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MINFRA-MN-IN-15-FR-11 | X | | 79 a 82 |
| 4.7 | Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-12 | X | | 83 a 144 |
| 4.8 | Informe Avance Físico-Financiero | MINFRA-MN-IN-15-FR-14 | X | | 145 a 147 |
| 4.9 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-15 | X | | 148 a 160 |
| 4.10 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-17 | | | |
| 4.11 | Otros documentos seguimiento mensual | | | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MINFRA-MN-IN-2-FR-1 | X | | 161 a 164 |
| | | MINFRA-MN-IN-2-FR-2 | X | | |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MINFRA-MN-IN-6-FR-1 | X | | |
| | | MINFRA-MN-IN-6-FR-2 | X | | 166 a 168 |
| | • Actas de comité de obra | MINFRA-MN-IN-14-FR-1 | X | | 169 a 175 |
| | • Acta de reunión | MINFRA-MN-IN-14-FR-2 | X | | 176 a 180 |
| | • Informe Semanal | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | X | | 181 a 190 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | X | 35 |
| 5.1 | Información general del contrato | | | X | 35 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | | X | 36 |
| 5.3 | Informes especialistas | | X | | 191 a 216 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | | X | 37 |
| 5.5 | Información otros programas y aplicativos | | | | |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | 39 |
| 6.1 | Equipo Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-5 | X | | 217 a 226 |
| 6.2 | Personal Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-7 | X | | 227 a 228 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 | X | | 229 a 232 |
| 6.4 | Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | X | | 233 a 253 |
| 6.5 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-16 | X | | 254 a 260 |
| 6.6 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-18 | | X | 40 |
| 6.7 | Otros documentos seguimiento mensual | | | | 42-52 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MINFRA-MN-IN-3-FR-1 | X | | 261 a 262 |
| | | MINFRA-MN-IN-3-FR-2 | X | | |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | | X | 54 |
| **8** | **Anexos** | | | | |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | X | | 263 a 268 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | X | | 269 a 271 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales | | X | | 272 a 278 |

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

**FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

# HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS |
| **OBJETO DEL PROYECTO:** | **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO ICAYECO-189 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº.** | 990-2021 |
| **CONTRATISTA:** | COSORCIO SAN SEBASTIAN 064 |
| **CONTRATO DE OBRA Nº** | 1006-2021 – CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ) |
| **NOMBRE DEL DOCUMENTO:** | INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 03<br>PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 |

| Control de Distribución del Documento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Área o Entidad | Copia Nº. | **Tipo de Copia Controlada C** No Controlada NC | Fecha |
| Víctor Andres Gutierrez Pineda | INVIAS - BOGOTÁ | 1 | C | 05 /Septiembre/2021 |
| Jose Adrián Valencia Castrillon | INVIAS - CAUCA | 2 | C | 05 /Septiembre/2021 |
| Elsa Campo Lopez | CONSORCIO ICAYECO | 3 | C | 05 /Septiembre/2021 |

| Control de Modificaciones | | |
|---|---|---|
| Versión | Descripción de Modificaciones | Fecha |
| 2 | Cambio en los periodos de corte del informe | 08/Septiembre/2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complementa | | | Elaboró: | Carolina Martinez | |
| Reemplaza | | | | | |
| Versión | 2 | 8 /Septiembre/2021 | Revisó: | Elsa Campo López | |
| | | | | Antonio Jesús Díaz Moreno | |
| | **Número** | **Fecha** | | **Nombre** | **Firma** |

## TABLA DE CONTENIDO

**1. INTRODUCCIÓN ..... 1**
**2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARA ..... 5**
2.1. LOCALIZACIÓN ..... 5
2.1.1. Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos ..... 5
2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA ..... 5
2.2.1. Módulo 2 - Corredor del Paletera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos ..... 5
2.2.2. Características Técnicas del Proyecto ..... 12
**3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ..... 14**
3.1. INFORMACIÓN GENERAL ..... 14
3.1.1. MÓDULO 2 - CORREDOR DEL PALETERA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS-SOMBRERILLOS. ..... 14
3.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 15
3.2.1. Módulo 2 - Corredor del Paletera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos ..... 15
3.3. SEGUIMIENTO A LOS ÍTEMS NO PREVISTOS ..... 19
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..... 19
3.4.1. Estado de Gestión de Sostenibilidad ..... 20
3.4.2. Estado de Gestión Ambiental ..... 23
3.4.3. Estado de Gestión Social ..... 23
3.4.4. Estado De Gestión Siso ..... 24
3.4.5. Reuniones Ejecutadas en el Período ..... 25
3.4.6. Requerimientos al Contratista ..... 30
**4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS ..... 31**
**4.1. Resumen mensual estado general del proyecto ..... 31**
4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra ..... 31
4.3. Personal contrato de obra ..... 31
4.4. Informe financiero y presupuestal contratos de obra ..... 31
4.4.1. Módulo 2. contrato no. 1006 de 2021 Paletará. ..... 31
4.5. Estado general del tiempo ..... 31
4.6. Resumen ensayos de laboratorio ..... 32
4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra ..... 32
4.8. Informe de avance físico - financiero ..... 32
4.9. Seguimiento garantías y seguros contratos de obra ..... 32
4.10. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra ..... 32
4.11. Otros documentos de seguimiento mensual ..... 33
4.11.1. Seguimiento a la inversión del anticipo ..... 33
4.11.2. Seguimiento programa de obra ..... 33
4.11.3. Seguimiento al programa de inversiones ..... 33
4.11.4. Actas de comité ..... 33
4.11.5. Actas de reunión ..... 33
4.11.6. Informe semanal de interventoría ..... 34
**5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 35**
5.1. Información general del contrato ..... 35

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor ..... 36
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS ..... 37
5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC ..... 37
**6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 39**
6.1. Equipo contrato de interventoría ..... 39
6.2. Personal contrato de interventoría ..... 39
6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría ..... 39
6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría ..... 39
6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría ..... 39
6.6. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría ..... 40
6.6.1. Informes de gestión al plan de calidad ..... 40
6.6.2. Evaluación del sistema de calidad ..... 40
6.6.3. Conclusión ..... 41
6.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ..... 41
6.7. Otros documentos de seguimiento mensual interventoría ..... 42
6.7.1. Seguimiento a la inversión del anticipo ..... 42
6.7.2. Seguimiento a la Gestión Ambiental ..... 42
6.7.3. Seguimiento a la Gestión Social ..... 48
6.7.4. Seguimiento a la Gestión SISO - CONTRATISTA ..... 52
**7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 54**
**8. ANEXOS ..... 56**
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO ..... 56
8.2. Registro Fotográfico Avance De Obra ..... 56
8.3. Registro fotográfico de las actividades socio-ambientales y prediales ..... 56

## LISTADO DE TABLAS

*Tabla 1 - Características Técnicas del Proyecto corredor del Paleteará..... 12*
*Tabla 2 – Cronograma de Entrega Estudios y Diseños del Proyecto corredor del Paleteará ..... 13*
*Tabla 3 - Vigencias Presupuestales –Corredor Paletara..... 15*
*Tabla 4 - Actividades Ejecutadas Y Supervisadas..... 15*
*Tabla 5 - Comunicaciones sostenibilidad..... 23*
*Tabla 6 - Relacion de Requerimientos Social al contratista..... 30*
*Tabla 7 - Comités Técnicos..... 33*
*Tabla 8 - Reuniones..... 33*
*Tabla 9 - Informes Semanales..... 34*
*Tabla 10 - Cuadro de Interventoria - PRESUPUESTO OFICIAL..... 35*
*Tabla 11 - Cuadro Resumen Contratos de Obra Adjudicados..... 36*
*Tabla 12 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoría..... 37*
*Tabla 13 – Registros Presupuestales Contrato de Interventoría..... 38*
*Tabla 14 - Equipo de Interventoría..... 39*
*Tabla 15 – Requerimientos al contratista..... 47*
*Tabla 16 – Permisos ambientales tramitados por el contratista..... 48*
*Tabla 17 - Relacion de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista..... 49*

## LISTADO DE FIGURAS

*Figura 1 Localización Detallada - Modulo 2..... 6*
*Figura 2 Descripción Corredor 2002 ..... 8*
*Figura 3 Tramo a intervenir ..... 9*
*Figura 4 Recorrido Planta La Golondrina Azul ..... 10*
*Figura 5 Recorrido Cantera Triturados Arroyohondo..... 11*
*Figura 6 Localización Cantera Triturados Arroyohondo..... 12*
*Figura 7 Sección Transversal Típica – zona Parque Nacional Natural Puracé..... 13*

## LISTADO DE ANEXOS

| | |
|---|---|
| ANEXO 1 | RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR- |
| ANEXO 2 | MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATOS DE OBRA – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-4 |
| ANEXO 3 | PERSONAL CONTRATO DE OBRA – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-6 |
| ANEXO 4 | INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA –FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-8 |
| ANEXO 5 | ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-10 |
| ANEXO 6 | RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-11 |
| ANEXO 7 | CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-13 |
| ANEXO 8 | INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-14 |
| ANEXO 9 | SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-15 |
| ANEXO 10 | SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA – FORMATO MINFRA-MN-IN-2-FR-1 |
| ANEXO 11 | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES – FORMATO MINFRA-MN-IN-6-FR-1 |
| ANEXO 12 | ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – FORMATO MINFRA-MN-IN-14-FR-1 |
| ANEXO 13 | ACTA DE REUNIÓN – FORMATO MINFRA-MN-IN-14-FR-2 |
| ANEXO 14 | INFORMES SEMANALES – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-2 |
| ANEXO 15 | EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-5 |
| ANEXO 16 | PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-7 |
| ANEXO 17 | INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-9 |
| ANEXO 18 | CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-12 |
| ANEXO 19 | SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA – FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-16 |
| ANEXO 20 | SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA – FORMATO MINFRA-MN-IN-3-FR-1 |
| ANEXO 21 | CONTROL DE CORRESPONDENCIA |
| ANEXO 22 | INFORME DE ESPECIALISTAS INTERVENTORÍA |

## 1. INTRODUCCIÓN

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta materia.

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación territorial.

Durante los últimos años, a través del Instituto Nacional de Vías se han orientado esfuerzos para mejorar las condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los departamentos del centro del país con los puertos del Atlántico y Pacífico colombianos, a pesar de estos esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliación y mejoramiento de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido intervenidos a través de diferentes programas de obra pública y que cuentan con intervenciones y necesidades que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecución de obras civiles, en tal sentido, en marco de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integración nacional, territorial y competitividad del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuará con el mejoramiento de la red vial nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidación territorial, las metodologías que permitan e incentiven el uso de tecnologías alternativas y el aprovechamiento total del potencial de la infraestructura existente.

Así mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como también la consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de seguridad y economía.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, así como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Estos propósitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivación económica liderada por el gobierno nacional tras los impactos económicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que la pandemia evidenció la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotación de la producción nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la importancia de la puesta en marcha y terminación de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vías para la Legalidad, Visión 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el programa de Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, en donde se presenta como el instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, con Innovación, Sostenibilidad y Optimización Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento económico del país.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

Así, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

El programa de obra pública denominado “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”, genera beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

Así mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generará el programa de obra “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”:

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que todos los sectores de la economía han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigación del aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este aislamiento generó la suspensión temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecución y además obligó a pensar las estrategias que debían ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecución de las obras bajo condiciones de bioseguridad óptimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar proyectos que impulsen la activación de la economía, razón por la cual se pone a disposición del mercado de infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la presente licitación pública.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivación económica y social, que nace en tiempos de pandemia y se ejecutará entre 2020 y 2022, en estos dos años, el Gobierno le pondrá el acelerador a los proyectos de infraestructura conectando al país motivando la generación de nuevos empleos, el desarrollo de la economía de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, así como de los proveedores de materiales bienes o servicios para las obras. Es así como la transformación de la infraestructura impactará positivamente esta reactivación económica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el país.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitución Política, le corresponde a las Entidades el propender por el uso eficiente y adecuado del recurso público dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razón por la cual el enfoque del programa " Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" tiene entre otras virtudes el lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y así mismo se evidencien segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecución de los proyectos del programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" aplicará los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovación, desarrollo progresivo y optimización técnica de tal manera que, promuevan la consolidación de estos corredores a través de la priorización de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando así la transformación de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" tienen además un enfoque ajustado con las líneas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las políticas de inclusión de género y la reducción de brechas en la ocupación laboral de la población femenina en contraste con la población masculina, por esta circunstancia se verán reflejados, requerimientos especiales qué apuntan a repotencializar no solamente los sectores económicos, sino además a las poblaciones que requieren un impulso que al final redunden en una reducción de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relación entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad, como un círculo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en los otros dos. Por esa razón, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas históricamente afectadas por la violencia o por la existencia de economía ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexión con el resto del país.

Con la ejecución del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y facilite su incorporación en las dinámicas económicas de mayor escala del país.

Con fundamento en lo anterior, con el propósito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en el PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"para la cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Mediante Concurso de Méritos Abierto **CMADT-189-2020,** el Instituto Nacional de Vías adelantó el proceso de contratación de la Interventoría para ejecutar el Proyecto: Dentro de ese proceso, la interventoría fue adjudicada a al **"CONSORCIO ICAYECO 189"** mediante contrato Nº990 DE 2021.

El Intitulo Nacional de Vias INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de carácter público: el **LP-DT-064-2020**, para la **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**, el cual fue adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 por valor de $.300.149.391.398,00

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARA

## 2.1. LOCALIZACIÓN

### 2.1.1. Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la región sur-occidental de Colombia entre 2°12'15" Norte y los 76°29'47" latitud Oeste.

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional, establece conexión entre los departamentos de Huila y Cauca mediante las poblaciones de Popayán, Coconuco y el corregimiento de Paletará, en el municipio de Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila.

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del presente proyecto.

## 2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

### 2.2.1. Módulo 2 - Corredor del Paletera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos.

El presente contrato tiene como alcance la intervencion del corredor vial "Popayan – Isnos - Sombrerillos" en el Departamento del Cauca y Huila, al cual correspone a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:

- Actualización de Diseños.
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 30.0 kilometros.
- Mantenimiento y rehabilitacion.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuación:

- Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados del corredor vial El Paletará: "Popayan – Isnos - Sombrerillos".
- Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial.

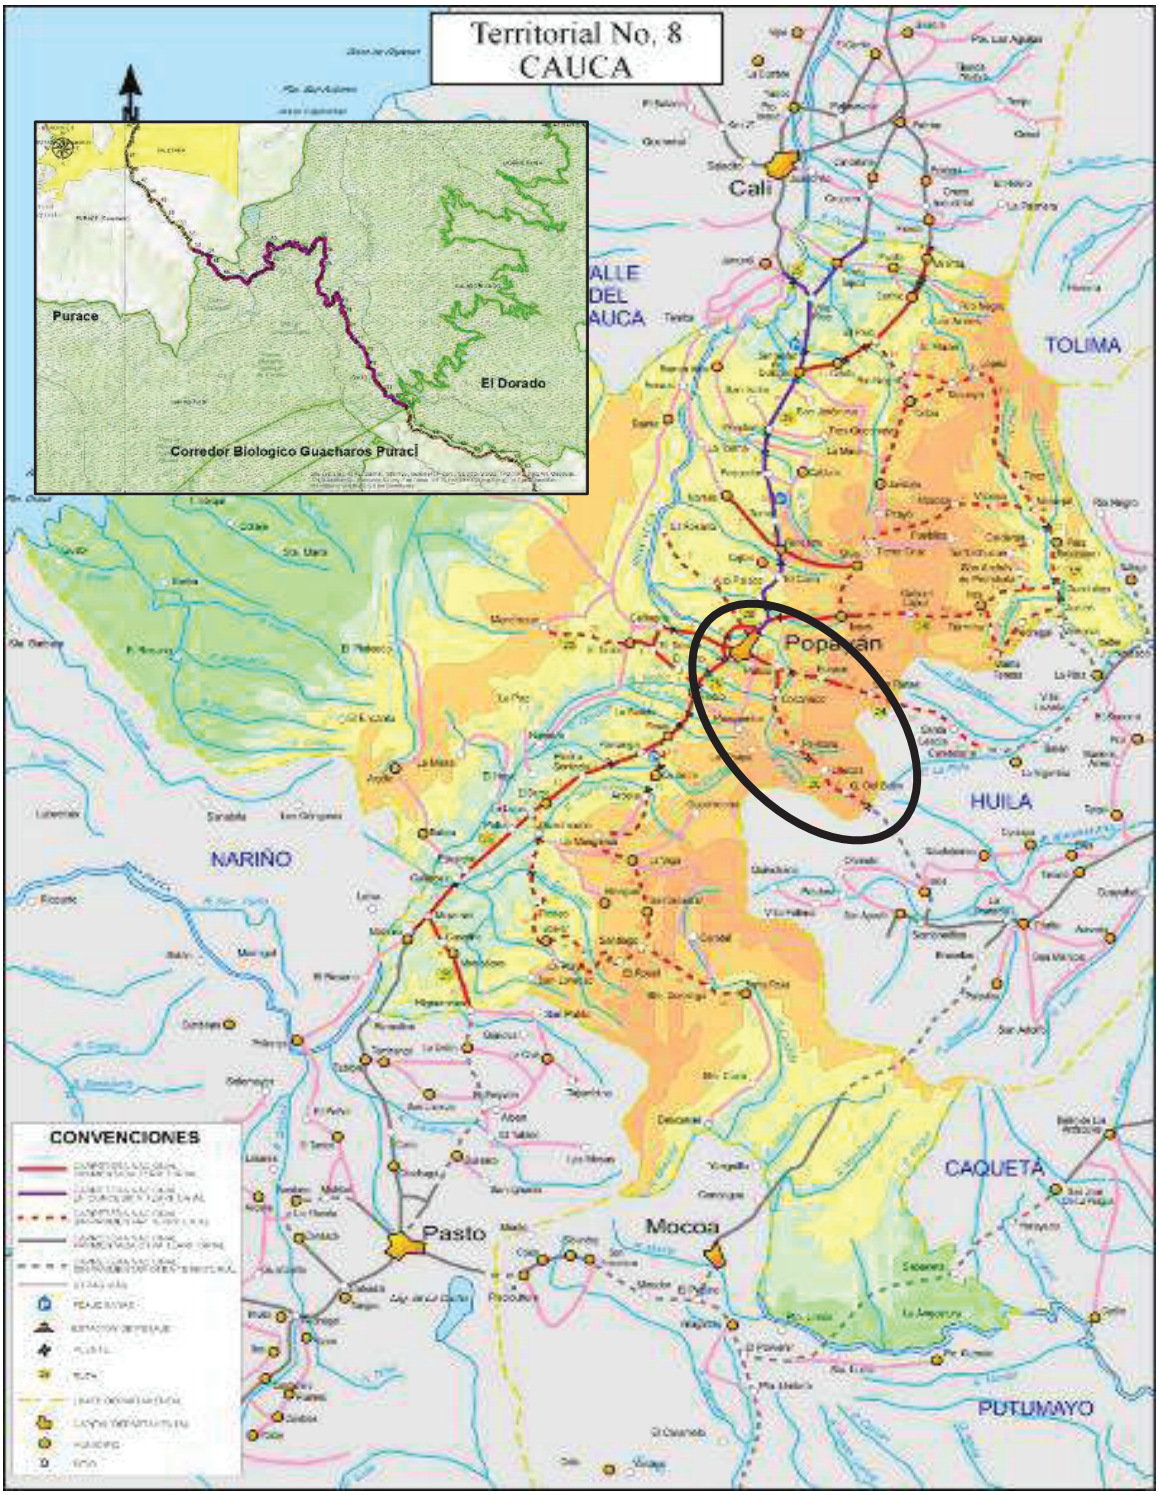



*Figura 1 Localización Detallada - Modulo 2*

- Mejoramiento y pavimentacion de 30.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado, priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempeño hidraulico, asi como tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros pavimentados.

- Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del corredor vial El Paletará: “Popayan – Isnos - Sombrerillos”.

- Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial El Paletará: “Popayan – Isnos – Sombrerillos

El corredor Popayán – Patico – Paletara – Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la Ruta 2002 en la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el departamento del Huila. Dicho eje vial está ubicado en la región sur occidental de Colombia, región andina, comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del Cauca

El proyecto denominado Corredor del Paletará PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la vía que conduce de Popayán a Isnos. La longitud total de la vía que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente.

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletará corresponden a mantenimiento, y mejoramiento de la vía actual, nivelación de la superficie de afirmado, colocación de sub-base y estructura en concreto hidráulico y el mejoramiento de las obras hidráulicas, entre otras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad vial y comodidad a los usuarios.

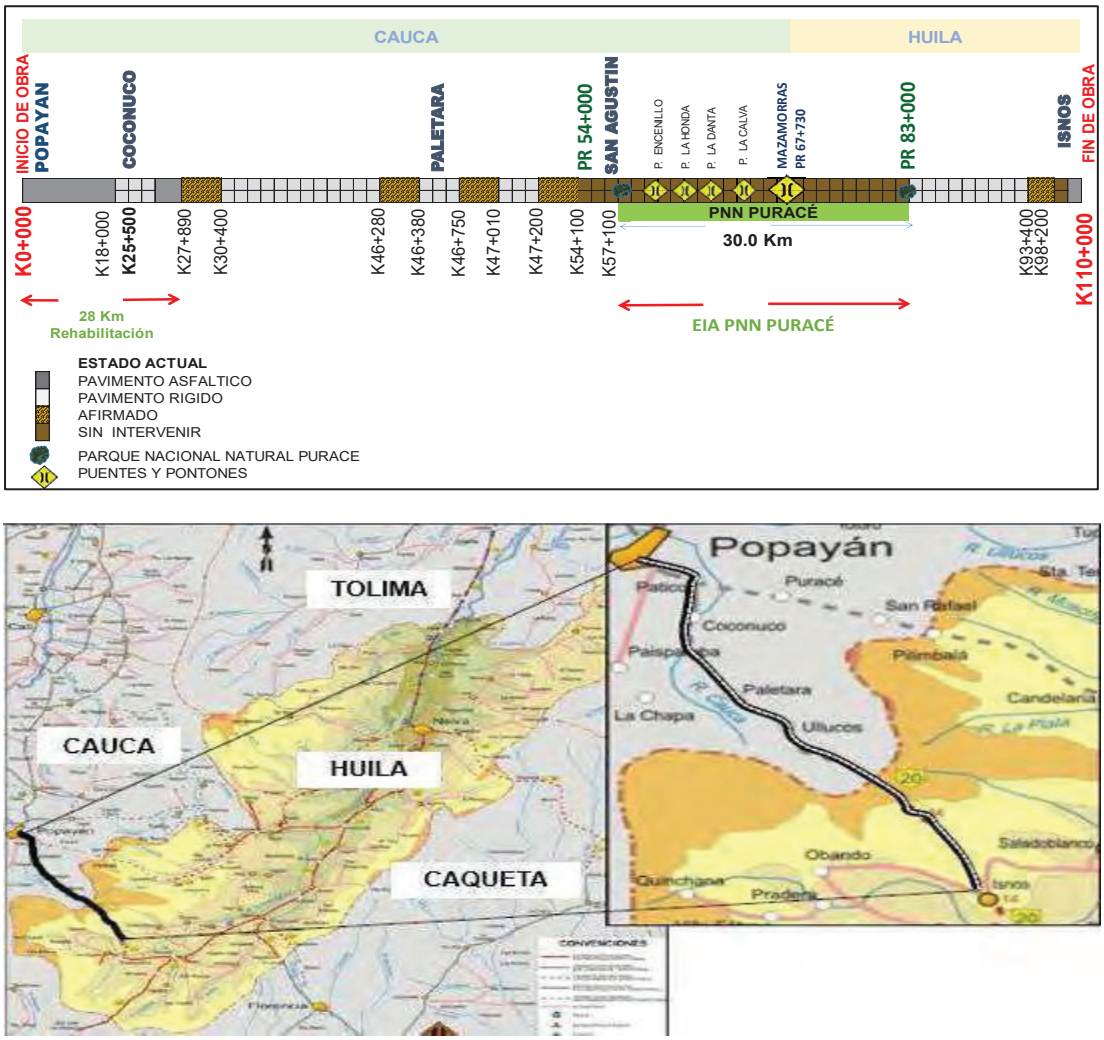






Figura 2 Descripción Corredor 2002

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayán donde se encuentra el K0+000 del proyecto, capital del Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de Coconuco y Paletará, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000, ubicado en el departamento del Huila.

El corredor vial Popayán – Patico – Paletara - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por el Instituto Nacional de Vías e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilómetros, discriminada así: Tramo Popayán – Patico, 18.0 Kilómetros. Tramo Patico – Coconuco 8.0 Kilómetros. Tramo Coconuco – Paletara 21.5 Kilómetros. Tramo Paletara — Puente Rio Mazamorras 20,87 Kilómetros. Tramo Puente Rio Mazamorras – Isnos 42,63 Kilómetros.

El tramo Popayán – Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el kilometro 27, presentando en mayoría una estructura de tipo flexible en estado deteriorado , y con una sección transversal típica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido,bermacunetas de 1.0 m de ancho.

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento está compuesta por pavimentos hidraulico en algunos sectores y en otros capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la sección transversal de características típicas de una vía dey b una calzada con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por sentido. Como se puede evaluar en la Figura 2.




*Figura 3 Tramo a intervenir*

### 2.2.1.1. Fuentes de Materiales

Del corredor de Paleteará, es necesario analizar las posibles fuentes de materiales que pueden ser empleadas dentro del desarrollo del contrato, es por ello que en la actualidad se han identificado dos (2) posibles fuentes que de una u otra forma se espera suministren agregados ya sea para concreto y/o para bases, subbases y rellenos e inclusive para mezclas asfálticas.

A continuación, exponemos el estado actual de fuentes de materiales que se están trabajando a la fecha:

**CANTERA GOLONDRINA AZUL.**

Cantera de Golondrina Azul ubicada en el Km 21 de vía Popayán – Coconuco en el Municipio de Popayán Departamento del Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según resolución 0707 del 30 de septiembre 1997.

Con Certificado de la Agencia Nacional de Minería de la LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, cuyo titular es el señor(a)/entidad CANTERAS LTDA., para la exploración y explotación de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCION, en un área ubicada en jurisdicción del municipio de POPAYÁN, ubicado en el departamento de CAUCA, bajo el código N° 20173 a AGREGADOS PURACE.

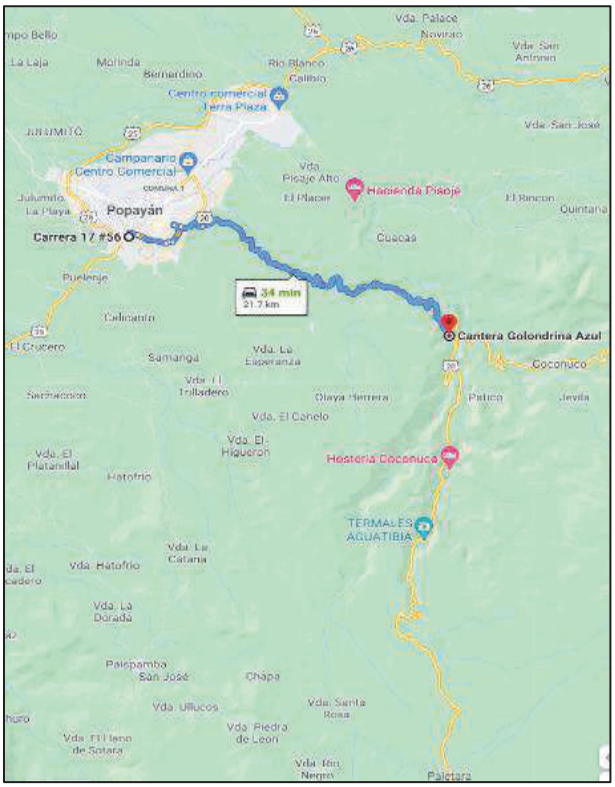



*Figura 4 Recorrido Planta La Golondrina Azul*

## CANTERA TRITURADOS ARROYOHONDO

Cantera TRITURADOS ARROYOHONDO ubicado en el Kilómetro 4, antigua vía Cali – Yumbo de propiedad de LA SOCIEDAD PEREA JARAMILLO Y CIA SCS en el corregimiento de Arroyohondo jurisdicción del municipio de Yumbo, con aprobación del Plan de Manejo Ambiental por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, por la resolución 000345 de 10 de agosto de 2006.

Con licencia Especial- Contrato de Concesión Minera No. 15862 expedida por el ministerio de Minas y Energía para explotación de una cantera de roca basáltica y diabasa con una extensión superficiaria de 12.94 has con MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (D 2655) Vigencia Desde: 05/04/1993 Hasta: 08/04/2027

La Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle Cauca - CVC, RESOLUCIÓN 0710 No. 0713-000609 DE 03 de agosto 2020 por medio de la cual se otorgó PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS que se generan en la planta asfáltica de la sociedad PEREA Y CIA S.A.S. identificada con NIT No. 800.006.785-2, representada legalmente por el señor RICARDO PÉREA REYES identificado con cedula de ciudadanía No. 94.452.627 expedida en Cali, ubicada en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No 370-63512, el cual se encuentra ubicado en la calle 10 # 31-70, Corregimiento de Arroyohondo, Jurisdicción del Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca.

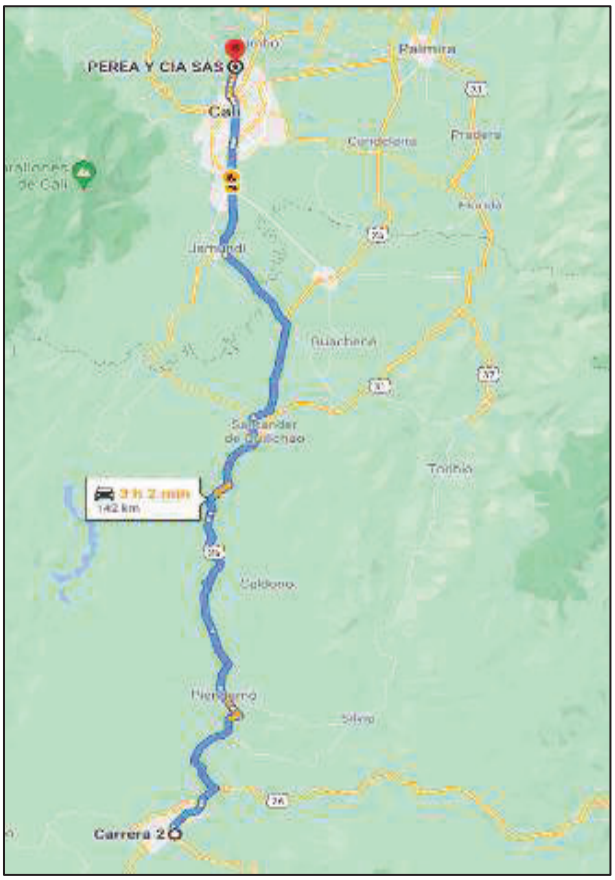



*Figura 5 Recorrido Cantera Triturados Arroyohondo*





Figura 6 Localización Cantera Triturados Arroyohondo

### 2.2.2. Características Técnicas del Proyecto

**Nota:** los estudios y diseños se encuentran en fase de perfeccionamiento, por lo tanto, algunos de los parámetros finales de construcción no han sido plenamente definidos.

*Tabla 1 - Características Técnicas del Proyecto corredor del Paleteará*

| PARAMETROS DE DISEÑO | |
|---|---|
| **Tipo de terreno** | Montañoso |
| **Velocidad de Diseño** | 30.0 Km/h |
| **Velocidad Especifica** | 30.0 Km/h |
| **Ancho de Calzada** | Por definir |
| **Ancho de cuneta** | Por definir |
| **Tipo de Curvas** | Circulares |
| **Radio Mínimo** | 21.0 m |
| **Peralte máximo** | 8.0 % |
| **Longitud mínima de curvas verticales** | 30.0 m |
| **Sobreancho** | Rc < 65.0 m |

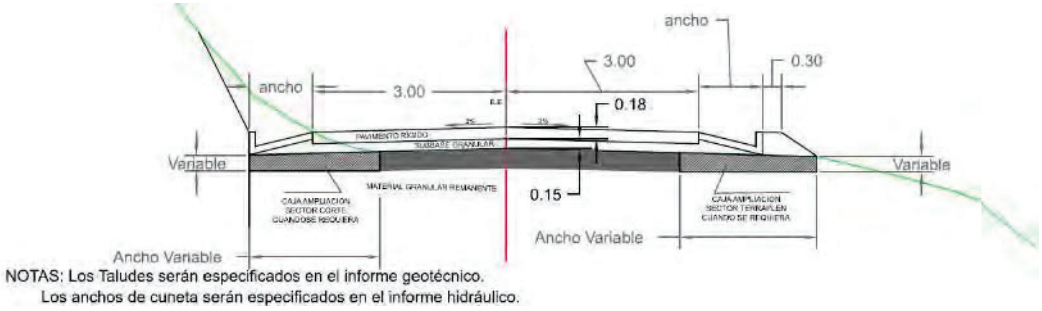



*Figura 7 Sección Transversal Típica – zona Parque Nacional Natural Puracé*

*Tabla 2 – Cronograma de Entrega Estudios y Diseños del Proyecto corredor del Paleteará*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PRECONSTRUCCION** | | | | |
| **TRAMO** | **DESCRIPCION** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** | **LONG A INTERVENIR (Km)** |
| **GENERAL** | ENTREGA INFORME INICIAL AJUSTES DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD - MEDIANTE COMUNICADO CSS064-OBRA-CL-017-21 DEL 29/07/2021 | 28/06/2021 | 28/07/2021 | GENERAL |
| **GENERAL** | ESTRUCTURACION DISEÑOS FASE II PROYECTO | 28/06/2021 | 26/09/2021 | GENERAL |
| **ESTRUCTURACION DISEÑOS FASE III PROYECTO-CONSTRUCCION** | | | | |
| **TRAMO 1: Del PR00+000 al PR27+890** | | | | |
| **TRAMO 2: Del PR54+100 al PR83+100** | | | | |
| **SECTOR** | **DESCRIPCION** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** | **LONG A INTERVENIR(KM)** |
| **MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN** | | | | |
| **I** | **TRAMO 1** K00-K3 POPAYAN-PATICO | 28/06/2021 | 12/09/2021 | 3 |
| **II** | **TRAMO 1** K03-K8 POPAYAN-PATICO | 28/08/2021 | 15/12/2021 | 5 |
| **III** | **TRAMO 1** K08-K13 POPAYAN-PATICO | 16/12/2021 | 22/05/2022 | 5 |
| **IV** | **TRAMO 1** K13-K18 POPAYAN-PATICO | 1/05/2022 | 13/10/2022 | 5 |
| **V** | **TRAMO 1** K18-K23 POPAYAN-PATICO | 28/11/2022 | 22/04/2023 | 5 |
| **VI** | **TRAMO 1** K23-K28 POPAYAN-PATICO | 5/04/2023 | 12/08/2023 | 5 |
| **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN** | | | | |
| **VII** | **TRAMO 2** K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE | 6/08/2021 | 30/06/2022 | 5 |
| **VIII** | **TRAMO 2** K59-K64 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE | 27/02/2022 | 28/12/2022 | 5 |
| **IX** | **TRAMO 2** K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE | 26/09/2022 | 29/06/2023 | 5 |
| **X** | **TRAMO 2** K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE | 28/04/2023 | 27/12/2023 | 5 |
| **XI** | **TRAMO 2** K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE | 26/01/2024 | 28/06/2024 | 5 |
| **XII** | **TRAMO 2** K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE | 26/07/2024 | 25/02/2025 | 5 |
| | | **TOTAL, Km PROGRAMADOS** | | **58** |

## 3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

### 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

#### 3.1.1. MÓDULO 2 - CORREDOR DEL PALETERA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS-SOMBRERILLOS.

El contrato de obra Nº 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2 se adjudicó a CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de $300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064, con NIT. 901.476.491-4

Integrado por: ALCA INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35%,

ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participación del 25%,

INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una participación del 20%

HORACIO VEGA CÁRDENAS con C.C 91.209.970 con una participación del 20%).

**CRONOLOGÍA**

| | |
|---|---|
| ADJUDICADA | Resolución 880 del 05 de abril de 2021 |
| LICITACIÓN PÚBLICA: | LP-DT-064-2020, |
| CIERRE DEL PROCESO: | 15 DE FEBRERO DE 2021 |
| FECHA DE ADJUDICACIÓN: | 05 DE ABRIL DE 2021 |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 28 DE JUNIO DE 2021 |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | CIENTO CATORCE (114) MESES |
| PLAZO DEL CONTRATO | CIENTO CATORCE (114) MESES |

**PRORROGAS: NA**

**VALOR DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $300.149.391.398,00 |
| ADICIONAL | $ 0,00 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | $300.149.391.398,00 |

**MODIFICACIONES AL CONTRATO: N.A**

Alcance del Proyecto:

*Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletará (Solución Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila*

*Tabla 3 - Vigencias Presupuestales –Corredor Paletara*

| VIGENCIAS PRESUPUESTALES | | |
|---|---|---|
| Año | | Valor |
| 2021 | $ | 6.125.861.986 |
| 2022 | $ | 18.376.470.588 |
| 2023 | $ | 27.564.705.882 |
| 2024 | $ | 13.782.352.941 |
| 2025 | $ | 27.564.705.882 |
| 2026 | $ | 36.752.941.176 |
| 2027 | $ | 27.564.705.882 |
| 2028 | $ | 41.347.058.824 |
| 2029 | $ | 45.941.176.471 |
| 2030 | $ | 55.129.411.766 |
| **Total** | **$** | **300.149.391.398** |

Se encuentra en trámite la revisión a los diseños, solicitud de permisos y licencias ambientales y entrega de documentación a la Interventoría, según lo señalado en el pliego de condiciones

## 3.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Para la elaboración del presente informe se hace la relación de las actividades desarrolladas en el mes, incluyendo tanto las ejecutadas por el Contratista de obra como las de Interventoría, resumiendo las actividades ejecutadas de la siguiente manera, permitiendo un mejor entendimiento del desarrollo del proyecto.

### 3.2.1. Módulo 2 - Corredor del Paletera, Popayán - San José de Isnos-Sombrerillos.

*Tabla 4 - Actividades Ejecutadas Y Supervisadas*

| DÍA | ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS<br>Módulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos |
|---|---|
| 28/07/2021 | · Elaboración del inventario de alcantarillas para el tramo del Parque Nacional Natural Puracé. |
| | · Sondeos para el estudio geotécnico entre el PR 0+000 al PR 12+890. |
| 29/07/2021 | · Elaboración del inventario de alcantarillas para el tramo del Parque Nacional Natural Puracé. |
| | · Sondeos para el estudio geotécnico entre el PR 0+000 al PR 12+890. |
| | · Se realiza la instalación de la Valla informativa en el PR 54+100 MD. |

| DÍA | ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS<br>Módulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos |
|---|---|
| 30/07/2021 | · Elaboración del inventario de alcantarillas para el tramo del Parque Nacional Natural Puracé. |
| | · Sondeos para el estudio geotécnico entre el PR 0+000 al PR 12+890. |
| 1/08/2021 | · Domingo, No se registran Actividades |
| 2/08/2021 | · Elaboración del inventario de alcantarillas para el tramo del Parque Nacional Natural Puracé. |
| | · Sondeos para el estudio geotécnico entre el PR 0+000 al PR 12+890. |
| | · La Interventoría inicia el chequeo de la topografía realizada y entregada por el contratista. |
| 3/08/2021 | · Elaboración del inventario de alcantarillas para el tramo del Parque Nacional Natural Puracé. |
| | · Sondeos para el estudio geotécnico entre el PR 0+000 al PR 12+890. |
| | · La Interventoría continúa el chequeo de la topografía realizada y entregada por el contratista. |
| 4/08/2021 | · Elaboración del inventario de alcantarillas para el tramo del Parque Nacional Natural Puracé. |
| | · Sondeos para el estudio geotécnico entre el PR 0+000 al PR 12+890. |
| | · Se realiza socialización del proyecto en el Centro Educativo el Sendero- Sede Liceo Nacional Alejandro Humbold PR 2+300. |
| | · La Interventoría continúa el chequeo de la topografía realizada y entregada por el contratista. |
| | · Continua la actividad de “tapahuecos” entre el PR 5+000 al PR 6+000. |
| 5/08/2021 | · Elaboración Del inventario de alcantarillas para el tramo del Parque Nacional Natural Puracé. |
| | · Sondeos para el estudio geotécnico entre el PR 0+000 al PR 12+890. |
| | · La Interventoría continúa el chequeo de la topografía realizada y entregada por el contratista. |
| 6/08/2021 | · Visita con los especialistas en diseño geométrico del contratista e interventoría, para tener una idea de las condiciones de la geometría de la vía y definir algunas de las generalidades del diseño geométrico como la velocidad de diseño, vehículo de diseño y algunos sitios críticos entre el PR 0+000 al PR 27+890. |
| | · La interventoría viene chequeando los puntos de la topografía que se utilizara para el diseño geométrico donde se encontraron desplazamientos en planta y perfil. |
| | · Continua la actividad de “tapahuecos” entre el PR 6+000 al PR 7+800. |
| 7/08/2021 | · sábado festivo, No se registran Actividades |
| 8/08/2021 | · Domingo, No se registran Actividades |
| 9/08/2021 | · Inicia el levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 10/08/2021 | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 11/08/2021 | · Llega la motoniveladora, carrotanque al PR 54+100 equipo con el que se va a dar inicio al mantenimiento de la vía en la Zona del Parque nacional Natural Puracé. |
| | · Se realiza recorrido por el corredor desde el PR 0+000 al PR 83+000 con el Gestor Técnico del Proyecto, con el fin de verificar presencia de la maquinaria e inicio de las actividades de mantenimiento. |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 0+000 al PR 2+000 |

| DÍA | ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS<br>Módulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos |
|---|---|
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| | · Continua la actividad de "tapahuecos" entre el PR 7+500 al PR 8+000. |
| 12/08/2021 | · Inician las actividades de conformación de la calzada de la vía en la Zona del Parque nacional Natural Puracé. |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 13/08/2021 | · Conformación de las cunetas con motoniveladora en el PR 54+500 AL PR 54+700 |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 2+000 al PR 4+000 |
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 14/08/2021 | · Conformación y compactación de la calzada el PR 56+300 al PR 57+300 |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 4+000 al PR 6+000 |
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 15/08/2021 | · Domingo, No se registran Actividades |
| 16/08/2021 | · Lunes festivo, No se registran Actividades |
| 17/08/2021 | · Conformación y compactación de la calzada el PR 56+300 AL PR 57+300 |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 4+000 AL PR 6+000 |
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 18/08/2021 | · Conformación y compactación de la calzada el PR 57+300 al PR 58+300 |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 4+000 al PR 8+000 |
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| | · Se realiza reunión de socialización en el centro poblado del corregimiento de Paletará |
| 19/08/2021 | · Conformación y compactación de la calzada el PR 54+100 al PR 54+250, con adición de material. |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 7+000 al PR 10+500 |
| | · Se realiza toma de muestra de material de afirmado por parte de la Interventoría para realizar ensayos de laboratorio. |
| 20/08/2021 | · Conformación y compactación de la calzada el PR 54+250 al PR 54+400, con adición de material. |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 8+000 al PR 10+500 |
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 21/08/2021 | · Conformación y compactación de la calzada el PR 54+400 al PR 54+500, con adición de material. |

| DÍA | ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS<br>Módulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos |
|---|---|
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 8+000 al PR 10+500 |
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 22/08/2021 | · Domingo, No se registran Actividades |
| 23/08/2021 | · Conformación y compactación de la calzada el PR 54+220 al PR 54+680. |
| | · Conformación y compactación con adición de material entre el PR 54+500 al PR 54+780. |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 8+000 al PR 12+000. |
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 24/08/2021 | · Conformación y compactación de la calzada el PR 54+600 al PR 55+200. |
| | · Conformación y compactación con adición de material entre el PR 54+600 al PR 55+100. |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 8+000 al PR 12+000. |
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 25/08/2021 | · Conformación y compactación de la calzada el PR 55+200 al PR 55+700. |
| | · Conformación y compactación con adición de material entre el PR 54+600 al PR 55+350. |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 9+000 al PR 12+000. |
| | · Elaboración de las actas de vecindad entre el PR 0+000 al PR 2+000 |
| 26/08/2021 | · Conformación y compactación de la calzada el PR 55+700 al PR 56+000. |
| | · Conformación y compactación con adición de material entre el PR 55+350 al PR 55+650. |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 10+000 al PR 12+000. |
| | · Se realiza vista por parte de la especialista de pavimentos de la Interventoría en los tramos a intervenir para verificar el estado del pavimento y de la capa de rodadura de la zona del Parque Nacional Natural Puracé. |
| 27/08/2021 | · Conformación y compactación con adición de material entre el PR 55+240 al PR 55+510. |
| | · Levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografía entre el PR 11+000 al PR 12+000. |
| | · Se realiza vista por parte de la Gestor Social y Gestor Ambiental de contrato |
| 28/08/2021 | · Conformación y compactación con adición de material entre el PR 55+600 al PR 55+750. |
| 29/08/2021 | · Domingo, No se registran Actividades |
| | · Conformación y compactación con adición de material entre el PR 55+600 al PR 55+750. |
| | · Inicia la instalación de los puntos de Georreferenciación en el tramo de la zona del Parque Nacional Natural Puracé |
| 31/08/2021 | · Conformación y compactación con adición de material entre el PR 55+870 al PR 56+130. |
| | · Inicia la instalación de los puntos de Georreferenciación en el tramo de la zona del Parque Nacional Natural Puracé |

### 3.3. SEGUIMIENTO A LOS ÍTEMS NO PREVISTOS

Hasta la fecha de cierre del presente informe no se han incluido Ítems no previstos en el presupuesto de obra.

### 3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el mes objeto del presente informe no se ha presentado ejecución de obra, de acuerdo a la programación presentada por parte del contratista, para el mes de agosto se iniciarán las intervenciones en el proyecto.

- Modulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

La interventoría continúa realizando el seguimiento a cada una de las actividades desarrolladas por los contratistas, se revisan semanalmente el avance de cada proyecto de acuerdo al programa de obra entregados.

A continuación, se muestra el avance de Estudios y Diseños y programación parcial de entregas

**Por parte del Contratista:**

- 24 de agosto de 2021: **Diseño Geométrico:** Entrega del diseño en **Planta** del eje de proyecto para los primeros seis (6) km de vía, teniendo en cuenta que se ha presentado la necesidad **para el contratista**, de ajustar la totalidad de la topografía luego de que la Interventoría reportara errores en la toma de datos que llevaron a proyecciones inadecuadas del diseño

- 26 de agosto de 2021: **Diseño de Pavimento:** Entrega del informe de procesamiento de la información de geotécnica de campo y diagnóstico general de la estructura, con proyecto de intervención.

- 26 de agosto de 2021: **Geología:** Entrega de informe de Geología para Ingeniería, revisión sobre la geología regional y la geología local del proyecto para las zonas de intervención entre Popayán y Coco nuco.

- 27 de agosto de 2021: **Diseño Geométrico:** Entrega del diseño en **Planta y Perfil** del eje de proyecto para los primeros seis (6) km.

- 1 de septiembre de 2021: **Estudio de Hidráulica:** Entrega del informe de diseño de Hidráulica e Hidrología

- 1 de septiembre de 2021: **Geotecnia**: Entrega de Informe diagnóstico de las 36 zonas de afectación geotécnica detectadas entre Popayán y Coconuco, con proyecto de intervención priorizando las correspondientes a los primeros kilómetros de intervención.

- 10 de septiembre de 2021: **Estructuras** Entrega de informe y cartilla de diseño de muros tipo y muros de confinamiento para contenciones genéricas y posibilidad de aplicación a un porcentaje a determinar de las 36 media lunas detectadas en el tramo Popayán – Coconuco.

**Por Parte de la Interventoría:**

- La definición en reunión de las anteriores fechas para entregas.
- No se conformarán sobreanchos a lo largo del proyecto, Salvo en las curvas del K4+700 (Restaurante) y ascenso (K4+900) que en conjunto se observaron válidas por la condición del trazado actual.
- Se ratifica que no se acepta el planteamiento de intervención con estructura de pavimento hidráulico para el sector Popayán – Coconuco
- Se solicita la remisión de los resultados de deflectometría y exploración geotécnica para diseño de pavimentos a fin de lograr avance en la revisión por parte del especialista de la Interventoría.
- Se cita a los Especialistas en Pavimentos y Geometría del Contratista para acompañar visita de campo con la Interventoría el día 26 de agosto de 2021, a fin de revisar lo efectivamente avanzado y validar posibles alternativas en campo.

La interventoría estima un avance de ejecución en la entrega de los volúmenes de Estudios y Diseños del corredor del Paletará en 5% de los primeros seis (6) km de vía

### 3.4.1. Estado de Gestión de Sostenibilidad

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcción, periodo de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el contrato 0679 de 2009.

El periodo de pre construcción para el área ambiental se concentra en un avance documental y desarrollo de instrumentos de planeación de la Gestión Ambiental, que permita dar inicio al desarrollo de las obras cumpliendo con toda la normatividad y Políticas del INVIAS vigentes.

A través de reuniones y oficios el área de sostenibilidad de Interventoría se ha centrado en el requerimiento al Contratista de la presentación de los documentos exigidos y detallados por el Apéndice G del Pliego de Condiciones que dio origen al contrato N° 1006, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento y revisión de Plan de Trabajo de Sostenibilidad
- Requerimiento TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra, especialmente la de requisitos iniciales como es el Plan de Trabajo en Sostenibilidad, documento que una vez revisado fue devuelto al Contratista con observaciones mediante correspondencia y oficial.

De igual manera en el mes de agosto de 2021 se ha participado en los diferentes comités programados por INVIAS e Interventoría con el objetivo de definir los parámetros iniciales de las intervenciones programadas en el sector comprendido entre el PR54+100 hasta el PR83+000 correspondiente al paso por el Parque Nacional

Natural Puracé. Dentro de las reuniones programadas se resalta las mesas de trabajo de los días 25 y 26 de agosto de 2021 y recorrido del 27 de agosto de 2021 por el corredor vial a intervenir especialmente el sector del PNN Puracé.

**REUNIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

- El día 26 de agosto de 2021 se desarrolló de forma presencial reunión con funcionarios de INVIAS: Gestor Ambiental y Social de la SMAGS; INTERVENTORÍA: Especialista Ambiental, Profesional Ambiental, Profesional Social; CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Profesional Ambiental y Consultor de EIA donde se trataron los siguientes temas:

  *Presentación de las partes.*

  En la reunión participan funcionarios del INVIAS, especialmente la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social SMAGS y el Director Territorial INVIAS, por parte de Interventoría está presente la Directora de Interventoría y el equipo socio ambiental incluyendo los especialistas ambiental y sostenibilidad, por parte del Contratista, está presente el Director de Proyecto, Coordinadora, equipo ambiental y el consultor seleccionado para la elaboración del EIA.

  *Necesidad de Licencia Ambiental*

  De acuerdo con lo establecido en el decreto 1076 de 2015 que establece:

  *"… ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. "Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades":*

  *12. Los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales:*

  *a) Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por realizarse al interior de estas, en el marco de las actividades allí permitidas;*

  *b) Los proyectos, obras o actividades señalados en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, localizados en las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales previamente determinadas, siempre y cuando sean compatibles con el plan de manejo ambiental de dichas zonas. …"*

  Y lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.2.5.4.4. Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

  *"… Cuando las actividades de mejoramiento que se relacionan en el presente decreto se pretendan realizar al interior de las áreas protegidas públicas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP o las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales debidamente delimitadas, se deberá tramitar y obtener la correspondiente licencia ambiental, en el marco de las actividades permitidas. …"*

*Presentación de Cronograma*

El Contratista de Obra mediante Comunicación CSS064-OBRA-CL-056-21 en respuesta a los oficios de interventoría ICA-PAL-0019 y ICA-PAL-0021, radicó el 25 de agosto de 2021 el cronograma de permisos ambientales incluido las actividades del trámite del Estudio de Impacto Ambiental y proceso de Licenciamiento Ambiental, sin embargo conforme a su presentación la Interventoría solicita el ajuste, en el sentido de adaptar los tiempos y definir la fecha de entrega de los estudios y diseños definitivos a ejecutar en el PNN Puracé, de igual manera se solicita presentar las sub actividades para las tareas de sustracción de reserva, consulta previa e ICAHN.

Se estima que el proceso de licenciamiento ambiental incluidos todos los tramites que implica su obtención es de aproximadamente 18 meses, los cuales contempla los tiempos definidos por la normatividad vigente y en muchos casos están sujetos a los tiempos de la Autoridad Ambiental.

De igual manera es definitivo que para el inicio del estudio de impacto ambiental la entrega y aprobación de los estudios y diseños que permitan definir el polígono o polígonos que determinen el área de influencia directa AID y el área de intervención. Para la definición del AID es necesario tener toda la información de las instalaciones provisionales como Zona RCD, Plantas de Procesamiento de Materiales y campamentos.

Los estudios y diseños, deberán atender lo dispuesto en Auto 141 de 2015 de la ANLA, mediante el cual se hacían observaciones al Estudio de Impacto Ambiental presentado por el contrato 0679 de 2009.

*Concepto de Sostenibilidad*

En el marco del cumplimiento con lo consignado dentro del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO MODULO 1 Adenda 2, en donde se específica dentro del numeral 3.2 Actividades generales a desarrollar dentro del contrato lo siguiente;

> *"...El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS"..."*

Se considera necesario que los criterios de sostenibilidad considerados en la política, sean incorporados dentro de la planeación y realización del Estudio de Impacto Ambiental, si bien, dentro del contrato se requiere que, en un capítulo se especifique el alcance de estos criterios dentro del EIA, no se especifica esto dentro de los términos de referencia, de tal forma que, la interventoría manifiesta la necesidad de desarrollar un volumen donde se explica el desarrollo de la política de sostenibilidad del INVIAS dentro de los capítulos a los que haya lugar dentro del estudio de impacto ambiental; sin necesidad que esta información sea remitida a ANLA dentro del trámite.

## REQUERIMIENTOS A CONTRATISTA

De acuerdo con las obligaciones contractuales de Contratista e Interventoría, se ha solicitado al contratista el cumplimiento de sus obligaciones principalmente en los siguientes temas:

*Tabla 5 - Comunicaciones sostenibilidad*

| Fecha Radicado | Consecutivo | Asunto | PLAZO DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| **6/08/2021** | ICA-PAL-0015 | Revisión Plan de Trabajo Sostenibilidad V1 | SIN PLAZO |
| **31/08/2021** | ICA-PAL-0025 | Respuesta CSSS064-OBRA-CL-056-21 Revisión cronograma EIA | SIN PLAZO |

### 3.4.2. Estado de Gestión Ambiental

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el Contrato 0679 de 2009.

El período de pre construcción para el área ambiental se concentra en un avance documental y desarrollo de instrumentos de planeación de la Gestión Ambiental, que permita dar inicio al desarrollo de las obras cumpliendo con toda la normatividad y políticas del INVIAS - vigentes.

A través de reuniones y oficios, el área ambiental de Interventoría se ha centrado en el requerimiento al Contratista de la presentación de los documentos exigidos y detallados por el Apéndice D del Pliego de Condiciones que dio origen al Contrato No. 1006, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento y revisión del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental del INVIAS - PAGA.
- Requerimiento y revisión del cronograma de permisos y autorizaciones (Hoja de Ruta).
- Requerimiento y revisión del Plan de Trabajo Ambiental.
- Requerimiento y revisión ambientales para inicio de obras de mantenimiento y rehabilitación.

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra, especialmente la de requisitos iniciales como es el Plan de Trabajo Ambiental, PAGA y Hoja de Ruta, documentos que una vez revisados fueron devueltos al Contratista con observaciones mediante correspondencia y de manera oficial.

De igual manera, en el mes de agosto de 2021 se ha participado en los diferentes comités programados por INVIAS e Interventoría, con el objetivo de definir los parámetros iniciales de las intervenciones programadas en el sector comprendido entre el PR54+100 hasta el PR83+000 correspondiente al paso por el Parque Nacional Natural Puracé. Dentro de las reuniones programadas, se resalta las mesas de trabajo de los días 25 y 26 de agosto de 2021 y recorrido del 27 de agosto de 2021 por el corredor vial a intervenir, especialmente el sector del PNN Puracé.

### 3.4.3. Estado de Gestión Social

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el Contrato 0679 de 2009.

El período de pre construcción para el componente social se concentra en un avance documental y desarrollo de instrumentos de planeación de la Gestión Social, ejecución de las actividades iniciales como las reuniones de inicio (Socialización), Actas de Vecindad, instalación de oficinas de Atención a la Comunidad, SAU,

requerimientos que permita dar inicio al desarrollo de las obras cumpliendo con toda la normatividad y políticas del INVIAS - vigentes.

A través de reuniones y oficios, el componente social de Interventoría se ha centrado en el requerimiento al Contratista de la presentación de los documentos exigidos y detallados por el Apéndice E del Pliego de Condiciones que dio origen al Contrato No. 1006, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento y revisión del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental del INVIAS - PAGA.
- Requerimiento ARN.
- Requerimiento y revisión del Plan de Generación de Empleo.

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra, especialmente la de requisitos iniciales como es el documento PAGA, certificación ante la ARN, Plan de Generación de Empleo, trámites ante el ICANH y el Ministerio del Interior; documentos que una vez revisados fueron devueltos según el caso, al Contratista con observaciones mediante correspondencia y de manera oficial.

De igual manera, en el mes de agosto de 2021 se ha participado en los diferentes comités programados por INVIAS e Interventoría, con el objetivo de definir los parámetros iniciales de las intervenciones programadas en el sector comprendido entre el PR54+100 hasta el PR83+000 correspondiente al paso por el Parque Nacional Natural Puracé. Dentro de las reuniones programadas, se resalta las mesas de trabajo de los días 25 y 26 de agosto de 2021 y recorrido del 27 de agosto de 2021 por el corredor vial a intervenir, especialmente el sector del PNN Puracé.

Estado de Gestión Predial

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcción a la fecha no se cuenta con los estudios y diseños que permitan identificar las posibles afectaciones en materia predial.

De igual manera por la naturaleza de las intervenciones propuestas, las cuales corresponden a actividades de mantenimiento y rehabilitación se estima tener unas afectaciones mínimas en materia predial y en puntos específicos donde los diseños pueden proponer mejorar la vía existente, caso para el cual se exigirá el cumplimiento y ejecución de todo el proceso de gestión predial que permita ejecutar las obras. Para los 30 km de intervención al interior del Parque Nacional Natural Puracé no se tiene contemplado ningún tipo de afectación predial, puesto que al interior del área protegida no se presenta propiedad privada.

### 3.4.4. Estado De Gestión Siso

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas y con la participación activa de todos los niveles de la empresa mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo se debe tener en cuenta la planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial), tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. Por

todo lo anterior mediante oficio ICA-PAL-00007 se solicita presentar un plan de trabajo, indicando las actividades a implementar del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

**PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD**

Mediante oficio ICA-PAL-0010 se emiten observaciones y se informa que este debe estar acompañado del certificado de la ARL y hasta la fecha de corte el contratista ha presentado el protocolo con los respectivos ajustes.

- ✓ Actividades Realizadas

El contratista ha establecido medidas para prevención y control de COVID-19, en la sede administrativa entre estas actividades tenemos:

- Limpieza y desinfección
- Lavado de Manos
- Distanciamiento físico

Una de las actividades de control sobre la implementación del protocolo en la oficina es asegurar el abastecimiento de los elementos de bioseguridad, garantizando a los trabajadores su distribución constante para su protección, esto se logra mediante requisición al Consorcio sobre los elementos como tapabocas, alcohol al 70%, gel antibacterial, jabón líquido para manos bolsas negras para la disposición de tapabocas.

El 18 de agosto el contratista realizo reunión de socialización, y se informa que se instauraron las medidas de bioseguridad:

- ✓ **Inducción Al Personal**

El contratista realiza proceso de inducción al personal que hasta la fecha se encuentra vinculado, en este da a conocer los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, los posibles riesgos de exposición y las medidas d intervención a estos.

- ✓ **Entrega de elementos de protección personal**

El contratista a la fecha ha proporcionado Elementos de Protección Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales

### 3.4.5. Reuniones Ejecutadas en el Período

- El día 13 de agosto de 2021, se desarrolló reunión virtual con funcionarios de INVIAS: oficina de Gerencia de Grandes Proyectos, Gestor Ambiental de la SMAGS; INTERVENTORÍA: Especialista Ambiental, Profesional Ambiental, Profesional Social; CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Profesional Ambiental, donde se trataron los siguientes temas:

Se informa sobre el objeto del contrato mejoramiento y pavimentación de los 30 Km del PNN Puracé; informan sobre la selección y contratación del consultor para el EIA del PNN Puracé: Ucros Abogados & Asociados. Una vez se cuente con diseño geométrico aprobado ajustado a las observaciones del Auto 141 de 2015, se procederá con el Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo en las siguientes semanas se adelantarán los monitoreos ajustados a la normatividad actual.

En los 30 Km al interior del PNN Puracé, se está haciendo conformación de banca existente con adición de material en algunos sectores, una vez se cuente con el licenciamiento ambiental, se podrá hacer la intervención con pavimentación.

Interventoría solicita al Contratista que se reporte las visitas en materia ambiental para hacer el correspondiente acompañamiento. De igual manera, Interventoría afirma los cambios en normatividad ambiental para el ajuste y desarrollo del EIA.

Interventoría solicita informar si ya han radicado al ANLA y PNN la información requerida en el marco del Permiso de Investigación Científica para hacer la colecta de flora y fauna, que de acuerdo con la normatividad vigente se debe informar de las colectas de flora y fauna al ANLA con mínimo 15 días de anticipación. El Contratista responde que se cumplirá con lo dispuesto en la normatividad vigente y que el Consultor cuenta con el Permiso de Investigación Científica - PIC, para todo el territorio nacional.

Interventoría informa que los días 25 y 26 de agosto de 2021 se tiene programada la reunión de inicio para todas las labores del EIA.

SMAGS de INVIAS manifiesta que es adecuado proceder con el estudio de impacto ambiental y licenciamiento ambiental para la intervención del corredor en el PNN Puracé, sin embargo solicita presentar concepto al respecto.

Gerencia de Grandes Proyectos GGP de INVIAS solicita la siguiente información:

1. ¿Por qué se negó la licencia? **RTA** (Contratista) A partir del Auto 141 de 2015 se conocen las razones por las cuales se negó la licencia, este Auto presenta la posición de PNN respecto al proyecto, en resumen, la restricción más importante es el ancho de calzada, el cual tenía intervenciones laterales en el PNN. De igual manera, Incoder informó que en el polígono no había presencia de comunidades étnicas, sin embargo por el hecho de tener instalaciones temporales en el poblado de Paletará, se debe conceptuar nuevamente con el Ministerio del Interior. La forma de la sección de la cuneta debe ser reevaluada para el paso de fauna especialmente las ranas.

2. ¿Cuál es el Concepto PNN respecto al proyecto? **RTA** (Contratista) A partir del Auto 141 de 2015 se conoce el concepto de PNN, donde se informa que el ancho debe ser ajustado al existente, de igual manera PNN informa que no es permitido el aprovechamiento forestal al interior del Parque como las grandes razones de negar la Licencia Ambiental.

3. ¿Hay sustracción en el marco de la Ley 2da de 1959? **RTA** (Contratista) Si aplica sustracción de reserva forestal.

Interventoría solicita elevar las consultas ante las diferentes Entidades con el nuevo sistema de coordenadas CTM12 establecido por el IGAC, de igual manera solicita al Contratista que el 20 de agosto

de 2021 presente un análisis de las actividades que se puedan desarrollar al interior del PNN Puracé, especialmente teniendo en cuenta las actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación. Interventoría presentará al INVIAS el 23 de agosto de 2021 el resumen de actividades permitidas al interior del Parque. De igual manera se solicita el cronograma del EIA - ajustado a los términos de Ley.

SMAGS de INVIAS requiere que todas las actividades permitidas al interior del Parque sean coordinadas con lo contenido en el documento PAGA.

Finalmente las partes participantes acuerdan los términos de las reuniones y recorridos planteados para los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2021, en el marco de la presentación oficial de los lineamientos que permitirán la intervención del sector comprendido entre el PR54+100 y el PR83+000 al interior del PNN Puracé.

- El día 20 de agosto de 2021 se desarrolló reunión con funcionarios de INVIAS: Gestor Ambiental y Social de la SMAGS; INTERVENTORÍA: Especialista Ambiental, Profesional Ambiental, Profesional Social; CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Profesional Ambiental, donde se trataron los siguientes temas:

  *Concepto sobre actividades constructivas al interior del PNN Puracé*

  El Contratista a través de su Consultor presenta e informa que para las actividades de mantenimiento, no existe en la normatividad ambiental vigente un permiso específico para esta actividad, de igual manera informa que por su bajo impacto no es objeto de permiso o autorización por parte de alguna autoridad ambiental. Informa que Parques Nacionales ha estado informado de las actividades de mantenimiento a través del Jefe del Parque Nacional Natural Puracé Isaac Bedoya, quien ha mostrado estar de acuerdo con la ejecución de estas actividades.

  Respecto a la pavimentación al interior del Parque informa que conforme a la normatividad ambiental, los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por realizarse al interior de éstas, requieren licenciamiento ambiental.

  *Concepto sobre consulta previa*

  Teniendo en cuenta lo planteado en comités de obra y reuniones anteriores, se pregunta al Consultor, sobre la pertinencia de adelantar la consulta ante el Ministerio del Interior, respecto al trámite de determinación de procedencia y oportunidad de la Consulta Previa, teniendo en cuenta que el proyecto requiere de dos intervenciones principales, la Rehabilitación y el Mantenimiento, entre el PR0 y el PR18 y la pavimentación al interior del PNN Puracé, entre el PR54 y el PR83. Al respecto el Consultor manifiesta que en primera instancia, solo los proyectos objeto de licenciamiento ambiental requieren adelantar el proceso de Consulta Previa y para el trámite del licenciamiento ambiental, se efectuará el proceso consultivo con el Resguardo Indígena de Paletará, quienes en reunión de inicio, solicitaron la necesidad de adelantar dicho proceso en su territorio; que aunque está por fuera del área del PNN Puracé, se asume por esta comunidad indígena como un espacio de vida. Para el tramo de la rehabilitación y mantenimiento, no se considera adelantar el trámite de consulta ante el Ministerio del Interior, siendo que se plantean actividades cuya intervención se realizará sobre la estructura existente por lo cual no se contempla cambio del trazado actual y tampoco se incluye la construcción de nuevas calzadas, según lo manifestado por el Consorcio San Sebastián 064.

*Concepto sobre trámites ICAHN*

Teniendo en cuenta que, en el proyecto ejecutado por la Unión Temporal Corredores Arteriales, bajo el Contrato No. 0679 de 2009, contó con un Programa de Arqueología Preventiva aprobado por el ICAHN, que se presentó a la ANLA; el Consorcio San Sebastián 064, considera oportuno el aprovechamiento de este insumo dentro del actual proyecto. La SMAGS del INVIAS, solicita que esta información sea avalada o refrendada por el ICAHN. Al respecto, el Contratista informa que ha realizado el trámite en distintas comunicaciones y que el ICAHN ha solicitado información adicional, que el Contratista ha suministrado y se encuentra a la espera de la respuesta definitiva de dicho Instituto.

Se ratifica por todas las partes asistentes, el compromiso y agenda de la reunión y recorrido a ejecutar los días 25, 26 y 27 de agosto de 2021, donde el Contratista presentará el cronograma para el desarrollo del EIA.

- El día 26 de agosto de 2021 se desarrolló de forma presencial reunión con funcionarios de INVIAS: Gestores Ambiental y Social de la SMAGS; INTERVENTORÍA: Especialista Ambiental, Profesional Ambiental, Profesional Social; CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Profesional Ambiental y Consultor del EIA, donde se trataron los siguientes temas:

  *Presentación de las partes*

  En la reunión participan funcionarios del INVIAS, especialmente de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social SMAGS y el Director Territorial; por parte de Interventoría, la Directora de Interventoría y el equipo socio ambiental incluyendo los Especialistas Ambiental y de Sostenibilidad; por parte del Contratista, el Director de Proyecto, la Coordinadora, el equipo ambiental y el Consultor seleccionado para la elaboración del EIA.

  *Necesidad de Licencia Ambiental*

  De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, que establece:

  > *"… ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. "Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades":*
  >
  > *12. Los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales:*
  >
  > *a) Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por realizarse al interior de éstas, en el marco de las actividades allí permitidas;*
  >
  > *b) Los proyectos, obras o actividades señalados en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente Decreto, localizados en las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales previamente determinadas, siempre y cuando sean compatibles con el plan de manejo ambiental de dichas zonas. …"*

  Y lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.2.5.4.4. Sistema Nacional de Áreas Protegidas:

*"… Cuando las actividades de mejoramiento que se relacionan en el presente Decreto se pretendan realizar al interior de las áreas protegidas públicas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP- o las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales debidamente delimitadas, se deberá tramitar y obtener la correspondiente licencia ambiental, en el marco de las actividades permitidas. …"*

*Presentación del Cronograma*

El Contratista de Obra mediante Comunicación CSS064-OBRA-CL-056-21 en respuesta a los oficios de Interventoría ICA-PAL-0019 y ICA-PAL-0021, radicó el 25 de agosto de 2021 el cronograma de permisos ambientales incluidas las actividades del trámite del Estudio de Impacto Ambiental y proceso de Licenciamiento Ambiental; sin embargo, conforme a su presentación, la Interventoría solicita el ajuste, en el sentido de adaptar los tiempos y definir la fecha de entrega de los estudios y diseños definitivos a ejecutar en el PNN Puracé, de igual manera se solicita presentar las sub actividades para las tareas de sustracción de reserva, consulta previa y concepto del ICAHN.

Se estima que el proceso de licenciamiento ambiental incluidos todos los trámites que implica su obtención, es de aproximadamente de 18 meses, los cuales contemplan los tiempos definidos por la normatividad vigente y en muchos casos están sujetos a los tiempos de la Autoridad Ambiental.

De igual manera, es definitivo para el inicio del estudio de impacto ambiental la entrega y aprobación de los estudios y diseños que permitan definir el polígono o polígonos que determinen el área de influencia directa -AID- y el área de intervención. Para la definición del AID, es necesario tener toda la información de las instalaciones provisionales como Zonas RCD, Plantas de Procesamiento de Materiales y Campamentos, entre otros.

Los estudios y diseños, deberán atender lo dispuesto en Auto 141 de 2015 de la ANLA, mediante el cual se hacían observaciones al Estudio de Impacto Ambiental presentado por el Contrato No. 0679 de 2009.

*Concepto de Sostenibilidad*

En el marco del cumplimiento con lo consignado dentro del ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO MÓDULO 1 Adenda 2, en donde se específica dentro del numeral 3.2 las actividades generales a desarrollar dentro del Contrato, lo siguiente;

*"...El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución No. 000405 del 13 de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS"..."*

Se considera necesario que los criterios de sostenibilidad considerados en la política, sean incorporados dentro de la planeación y realización del Estudio de Impacto Ambiental, si bien, dentro del Contrato se requiere que, en un Capítulo se especifique el alcance de estos criterios dentro del EIA, no se especifica esto dentro de los términos de referencia, de tal forma que, la Interventoría manifiesta la necesidad de desarrollar un volumen donde se explica el desarrollo de la Política de Sostenibilidad del INVIAS dentro de los capítulos a los que haya lugar dentro del estudio de impacto ambiental; sin necesidad que esta información sea remitida a ANLA dentro del trámite.

### 3.4.6. Requerimientos al Contratista

De acuerdo con las obligaciones contractuales del Contratista e Interventoría, se ha solicitado al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones, principalmente en los siguientes temas:

*Tabla 6 - Relacion de Requerimientos Social al contratista*

| RADICADO | OFICIO/COMITÉ | REQUERIMIENTO | PLAZO DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 4/08/2021 | ICA-PAL-0011 | Solicitud Tramite ARN Huila | |
| 4/08/2021 | ICA-PAL-0012 | Solicitud adecuación y ubicación SAU | |
| 4/08/2021 | ICA-PAL-0013 | Solicitud programación Actas de Vecindad | |
| 6/08/2021 | ICA-PAL-0016 | Solicitud del estado de la gestión, adelantada ante el Ministerio del Interior y el ICANH. | |
| 6/08/2021 | ICA-PAL-0017 | Observaciones Programa de Generación de Empleo | |
| 3/08/2021 | ICA-PAL-0009 | Permisos para EIA - PNN Puracé | 8/08/2021 |
| 6/08/2021 | ICA-PAL-0015 | Revisión Plan de Trabajo Sostenibilidad V1 | Sin plazo |
| 12/08/2021 | ICA-PAL-0019 | Respuesta CSS064-OBRA-CL-27-21 revisión cronograma EIA | 15/08/2021 |
| 19/08/2021 | ICA-PAL-0020 | Solicitud señalización preventiva sector Parque Nacional Puracé | 25/08/2021 |
| 19/08/2021 | ICA-PAL-0021 | Respuesta comunicación CSS064-OBRA-CL-28-21<br>Cronograma de permisos ambientales (Hoja de Ruta) | 25/08/2021 |
| 23/08/2021 | ICA-PAL-0022 | Respuesta CSS064-OBRA-CL-29-21 revisión PAGA V1 | 27/08/2021 |
| 31/08/2021 | ICA-PAL-0025 | Respuesta CSSS064-OBRA-CL-056-21 Revisión cronograma EIA | Sin plazo |

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS

### 4.1. Resumen mensual estado general del proyecto

Durante el periodo correspondiente al presente informe el proyecto se realizaron actividades en el módulo 2 – Corredor Popayán - San José De Ismos-Sombrerillos se diligencia el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3, de acuerdo a la información disponible (Ver Anexo 1). por estar en la etapa de pre construcción

A continuación, vemos el resumen de las actividades que se desarrollaron en materia social y ambiental, predial y de bioseguridad en cada uno de los contratos de obra que se encuentran en ejecución:

### 4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

En el presente informe, no se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista dado que hasta el momento se encuentra en etapa de preconstrucción se relacionan los equipos de topografía utilizados, se diligencia el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 (Ver Anexo 2), de acuerdo a la información disponible.

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

### 4.3. Personal contrato de obra

Mediante el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en obra de los contratistas en:

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

### 4.4. Informe financiero y presupuestal contratos de obra

**PRESUPUESTO GENERAL**

#### 4.4.1. Módulo 2. contrato no. 1006 de 2021 Paletará.

PRESUPUESTO DE OBRA (Inicial) $300.149. millones.

Durante el presente mes la ejecución el proyecto se diligencia el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8, de acuerdo a la información disponible (Ver Anexo 4), para este apartado.

### 4.5. Estado general del tiempo

El registro del estado del tiempo se encuentra reportado en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10(Ver Anexo 5), mediante el cual se presenta el seguimiento realizado por el personal de interventoría en los sectores que se encontraron en ejecución:

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

### 4.6. Resumen ensayos de laboratorio

Se anexa el formato MINFRA-MN-IN-15-11, en el cual se encuentran relacionados los ensayos que se llevaron a cabo durante el periodo correspondiente al presente informe con el objetivo de realizar el respectivo chequeo por parte de la interventoría (Ver anexo 6); adicionalmente se anexan los resultados de los ensayos entregados por el contratista.

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

### 4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-12 (Ver anexo 7), se realizó la revisión de planillas y afiliaciones de seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal de obra reportado por los contratistas de obra y verificado por el personal de la interventoría en el periodo que abarca el presente informe.

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

### 4.8. Informe de avance físico - financiero

Mediante el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 (Ver anexo 8) se reporta el avance de cada del contrato de obra. Adicionalmente en el ítem 4.1 del presente informe se reportaron las actividades ambientales, sociales y de seguridad social e industrial en el periodo correspondiente al presente informe.

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

### 4.9. Seguimiento garantías y seguros contratos de obra

El seguimiento a las garantías contractuales se encuentra registrado en el formado MINFRA-MN-IN-15-15, de acuerdo al Manual de Interventoría. (Ver anexo 9)

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

### 4.10. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra

El Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra se revisa mes a mes de acuerdo al Plan de Inspección y Ensayo ajustado de acuerdo a las actividades a desarrollar por el contratista; dicho registro se realizó mediante el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.

- Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021

## 4.11. Otros documentos de seguimiento mensual

### 4.11.1. Seguimiento a la inversión del anticipo

El contratista entrego el Plan de Inversión del Anticipo el cual e reviso y aprobó por parte de la interventoría y fue radicado al INVIAS, para el trámite respectivo, a la fecha de este informe no hay desembolso. dicho registro se realizó mediante el formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1 y (MINFRA-MN-IN-2-FR-2 Ver anexo 10).

### 4.11.2. Seguimiento programa de obra

Hasta la fecha de cierre del presente informe, el programa de inversiones se encuentra en revisión por parte de la Interventoría y la ejecución en adelante, de acuerdo a la aprobación de la documentación inicial y el avance de obra, se diligenciará el formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1 o MINFRA-MN-IN-6-FR-2, según sea el caso, para este apartado. (Ver anexo 11).

### 4.11.3. Seguimiento al programa de inversiones

Se realiza la revisión del avance del contrato de obra y al final del periodo de corte se verifico con los programas de obra e Inversión la ejecución y el porcentaje de avance del mismo, se diligencia el formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1 (Ver anexo 11).

### 4.11.4. Actas de comité

En el periodo correspondiente al presente informe se relacionan actas de comité a agosto de 2021. formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1 (Ver anexo 12).

*Tabla 7 - Comités Técnicos*

| COMITÉ TECNICO Nº | FECHA |
|---|---|
| 03 | 5 de agosto de 2021 |
| 04 | 19 de agosto de 2021 |

### 4.11.5. Actas de reunión

En el periodo correspondiente al presente informe se realizaron (3) reunión del área ambiental, con participación del Contratista y la Interventoría MINFRA-MN-IN-14-FR-2 (Ver Anexo 13)

*Tabla 8 - Reuniones*

| REUNION Nº | FECHA |
|---|---|
| 02 | 13 de agosto de 2021 |
| 03 | 20 de agosto de 2021 |
| 04 | 26 de agosto de 2021 |

### 4.11.6. Informe semanal de interventoría

Los Informes Semanales consolidados que sirven de soporte al estado y avance de cada una de las obras que se encuentran en ejecución, correspondientes al periodo de ejecución se encuentran en el Anexo 14 – Informes Semanales, diligenciados en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2, los cuales fueron enviados cada semana al correo electrónico de Gestor Técnico del Contrato, Supervisor del Proyecto del INVIAS.

En el siguiente cuadro se relacionan cada uno de los informes enviados y el periodo al cual corresponden

*Tabla 9 - Informes Semanales*

| INFORME SEMANAL Nº. | PERIODO |
|---|---|
| 6 | 2 de agosto de 2021 al 8 de agosto de 2021 |
| 7 | 9 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2021 |
| 8 | 16 de agosto de 2021 al 22 de agosto de 2021 |
| 9 | 23 de agosto de 2021 al 29de agosto de 2021 |
| | |

## 5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.1. Información general del contrato

El Instituto Nacional de Vías realizó el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolución No. 1115 del 27 de abril de 2021, se ordenó la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO ICAYECO 189 . NIT. 901.480.839-9**.**

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor multiplicador de 2.36 y con un plazo: ciento catorce (114) meses.

La orden de iniciación del contrato de Interventoría se impartió mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de junio de 2021.

La fecha de terminación del contrato está prevista para el 31 DE AGOSTO DE 2030

**CRONOLOGÍA:**

| | |
|---|---|
| CONCURSO DE MERITOS: | CMADT-189-2020, |
| FECHA DE ADJUDICACIÓN: | Resolución Número 1115 del 27 de abril de 2021, |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 28 DE JUNIO 2021 |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | CIENTO CATORCE (114) MESES |
| VENCIMIENTO ESTIMADO DEL CONTRATO: | 31 DE AGOSTO DE 2030 |

Las garantías contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de Interventoría (Ver Anexo 19).

*Tabla 10 - Cuadro de Interventoria - PRESUPUESTO OFICIAL*

| PROYECTO | AÑO | VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO | | VALOR TOTAL INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| | | ANILLO DE MACIZO | PALETARA | |
| PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 | 2021 | $ 546.292.646 | $ 1.623.229.650 | $ 2.169.522.296 |
| | 2022 | $ 546.292.646 | $ 1.623.522.570 | $ 2.169.815.216 |
| | 2023 | $ 819.438.969 | $ 2.435.283.720 | $ 3.254.722.689 |
| | 2024 | $ 1.638.877.938 | $ 1.217.626.264 | $ 2.856.504.202 |
| | 2025 | $ 1.638.877.938 | $ 2.435.273.323 | $ 4.074.151.261 |
| | 2026 | $ 2.458.316.907 | $ 3.247.027.631 | $ 5.705.344.538 |
| | 2027 | $ 2.731.463.230 | $ 2.435.259.459 | $ 5.166.722.689 |

| PROYECTO | AÑO | VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO | | VALOR TOTAL INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| | | ANILLO DE MACIZO | PALETARA | |
| | 2028 | $ 2.731.463.230 | $ 3.652.906.517 | $ 6.384.369.747 |
| | 2029 | $ 3.004.609.553 | $ 4.058.785.405 | $ 7.063.394.958 |
| | 2030 | $ 3.004.609.556 | $ 4.870.550.108 | $ 7.875.159.664 |
| | | **$ 19.120.242.613** | **$ 27.599.464.647** | **$ 46.719.707.260** |

*Tabla 11 - Cuadro Resumen Contratos de Obra Adjudicados*

| CORREDOR | TRAMO | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|---|
| | | Long(km) | Presupuesto (millones) | FIRMA |
| **MODULO 1- CORREDOR DEL ANILLO DEL MACIZO** | Anillo del Macizo | 232.5 | Inicial Acumulado $ 46.719.707.260 Para todo el Contrato | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| **MODULO 2 - CORREDOR DEL PALETERA** | El Paletará: "Popayán – Isnos - Sombrerillos". | 110 | | |

## 5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor

Las actividades desarrolladas por esta Interventoría se encuentran descritas en los cuadros del Numeral 3.2 del Presente informe

El contratista ha realizado la entrega de Estudios y Diseños, de manera parcial, en los primeros de 6 km. Esta interventoría continúa realizando chequeos de las coordenadas de los puntos medidos en tiempo real y levantamientos topográficos con equipo convencional y GPS de alta precisión.

Se adelantó el acompañamiento por parte de la interventoría en las jornadas de mantenimiento con el fin de acondicionar la vía entre PR54+000 AL PR 56+130, Parque Nacional Natural Puracé, donde se adelantan actividades de conformación de la subrasante condición de material.

La interventoría continúa actividades de revisión de los estudios y diseños, se revisa el cumplimiento de la obligaciones ambientales y sociales.

Seguimiento a los compromisos adquiridos por las diferentes partes involucradas en el desarrollo del contrato en los comités quincenales tratados con el Supervisor y Gestor del proyecto INVIAS, contratista e interventoría, con el tratamiento de aspectos técnicos, administrativos y financieros, ambientales, sociales y prediales.

Los días 25, 26 y 27 de agosto se llevó a cabo reunión de seguimiento con los especialistas de la Interventoría y el contratista y los Gestores Social y Ambiental de la Gerencia de Grandes Proyectos con el fin del inicio de las labores del estudio de impacto ambiental que se va a desarrollar a lo largo del corredor a intervenir,

El contratista dentro del periodo reportado, continua con el levantamiento de actas de vecindad de inicio, en el tramo 1 con el acompañamiento de la Interventoría.

Dadas las condiciones actuales para la intervención del proyecto no se contempla gestión predial hasta el momento.

## 5.3. INFORMES ESPECIALISTAS

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revisión de Estudios y Diseños. Ver Anexo 15).

- Especialista Ambiental (Mauricio Joya)
- Especialista en Sostenibilidad (Diego Ruiz)
- Especialista de Pavimentos (Sandra Benavides)
- Especialista en diseño geométrico (Diego Beltrán)

## 5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La distribución aprobada de las vigencias para el soporte financiero del contrato se encuentra de la siguiente manera:

*Tabla 12 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoría*

| PROYECTO | AÑO | VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO | | VALOR TOTAL INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|
| | | ANILLO DE MACIZO | PALETARA | |
| PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 | 2021 | $ 546.292.646 | $ 1.623.229.650 | $ 2.169.522.296 |
| | 2022 | $ 546.292.646 | $ 1.623.522.570 | $ 2.169.815.216 |
| | 2023 | $ 819.438.969 | $ 2.435.283.720 | $ 3.254.722.689 |
| | 2024 | $ 1.638.877.938 | $ 1.217.626.264 | $ 2.856.504.202 |
| | 2025 | $ 1.638.877.938 | $ 2.435.273.323 | $ 4.074.151.261 |
| | 2026 | $ 2.458.316.907 | $ 3.247.027.631 | $ 5.705.344.538 |
| | 2027 | $ 2.731.463.230 | $ 2.435.259.459 | $ 5.166.722.689 |
| | 2028 | $ 2.731.463.230 | $ 3.652.906.517 | $ 6.384.369.747 |
| | 2029 | $ 3.004.609.553 | $ 4.058.785.405 | $ 7.063.394.958 |
| | 2030 | $ 3.004.609.556 | $ 4.870.550.108 | $ 7.875.159.664 |
| | | **$ 19.120.242.613** | **$ 27.599.464.647** | **$ 46.719.707.260** |

*Tabla 13 – Registros Presupuestales Contrato de Interventoría*

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 423821 | C-2401-0600-90-0-2401008-02 | 54 | Nación | Contrato Principal | $ 538.921.940,00 |
| | 423821 | C-2401-0600-90-0-2401023-02 | 54 | Nación | Contrato Principal | $ 7.370.706,00 |
| | 423821 | C-2401-0600-113-0-2401008-02 | 54 | Nación | Contrato Principal | $ 1.623.229.650,00 |

# 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 6.1. Equipo contrato de interventoría

El equipo utilizado para las actividades que desarrolla esta Interventoría es el siguiente:

*Tabla 14 - Equipo de Interventoría*

| Equipo | Cantidad |
|---|---|
| Vehículo >2000cc | 1 |
| Van de pasajeros | 1 |
| Equipos de topografía | 1 |

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-5 se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 16).

## 6.2. Personal contrato de interventoría

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 17)

## 6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA (Inicial): **$46.719.707.260**

VALOR DEL CONTRATO No. 990-2021 DE INTERVENTORÍA $46.719.707.260

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 18) se registra la información financiera detallada del Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe.

## 6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-13 se realiza el control a los Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver Anexo 19).

## 6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-7 (Ver Anexo 20) se realiza la revisión de planillas de seguridad social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoría, en el periodo que abarca el presente informe.

## 6.6. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

### 6.6.1. Informes de gestión al plan de calidad

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO 189, este se hace dentro de sus actividades la gestión de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo controlado del mismo en relación con los aspectos especificados en el plan de calidad.

El elemento de desarrollo y control lo constituye el plan de calidad para el Proyecto que contiene todas las actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestión de calidad, desarrollada por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestión de calidad realiza el manejo documental del proyecto; además se presentan los aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Interventoría – Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18(Ver Anexo 21)

**Control de documentos**

- **Archivo Físico y Magnéticos**: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su característica según el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoría como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturación. La gestión de calidad procura el mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

- **Presentación de documentos**: El informe mensual se presenta siguiendo los parámetros de calidad y se enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente de acuerdo con el manual de interventoría. La presentación de los informes hace parte de la gestión de calidad.

**Control de los Registros de Calidad**

- Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantiza la ejecución de las actividades que debe realizar la interventoría. Estos registros de calidad están a la disposición del cliente para su revisión.

### 6.6.2. Evaluación del sistema de calidad

**Auditorías internas de calidad**

- Durante el periodo no se realizaron auditorías internas. Se está trabajando en las recomendaciones hechas por el auditor interno.

**Acciones Correctivas y Preventivas**

- Durante el período no se generaron no conformidades que ameritaran acciones correctivas.

### 6.6.3. Conclusión

La gestión de calidad durante el mes de agosto continuó concentrada en la coordinación de las respuestas oportunas a las solicitudes presentadas por el cliente y al seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista a los compromisos adquiridos en el contrato.

Mediante el diligenciamiento del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 se hará el Seguimiento al Plan de Calidad de la Interventoría.

### 6.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

La seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores, estableciendo medidas de prevención de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se establecerán medidas preventivas y de control.

#### 6.6.4.1. Protocolo de bioseguridad

El virus SARS-COVID-19, se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo se han afectado todos los aspectos de la vida diaria y las diferentes actividades económicas, sociales y entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisión del virus, ante la emergencia sanitaria declarada por el virus SARS Cov 2, causante de la enfermedad por Covid – 2019, por esta razón el CONSORCIO ICAYECO - 189 ha establecido estrategias que permiten velar por la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores, frente la contingencia del COVID-19;

De acuerdo a lo anterior se informa que se encuentra en proceso de elaboración el protocolo de Bioseguridad, y de esta forma se buscara garantizar las medidas de bioseguridad mediante el control de los peligros y riesgos propios de sus labores, desarrollando actividades de promoción y prevención dando cumplimiento a la normatividad vigente de riesgos laborales

Con el fin de tomar acciones de mitigación y de propagación contamos con los elementos para:

a) LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA AREAS
b) LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANOS
c) INSPECCIONES PUESTO DE TRABAJO

#### 6.6.4.2. Evaluaciones Médicas Ocupacionales

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se realizaron exámenes Médico Ocupacionales, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición.

#### 6.6.4.3. Plan de emergencias

Se encuentra en elaboración el plan de emergencias, el cual permite a la organización reaccionar con rapidez, controlar el desarrollo de determinados sucesos en un centro de trabajo y evitar que se produzcan daños graves a las personas, patrimonio de la organización y el medio ambiente. Este documento nos permitirá proporcionar las medidas y acciones ante un evento.

### 6.7. Otros documentos de seguimiento mensual interventoría

### 6.7.1. Seguimiento a la inversión del anticipo

Mediante los registros MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2, se realiza el Seguimiento a la inversión del Anticipo del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver Anexo 21).

### 6.7.2. Seguimiento a la Gestión Ambiental

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el Contrato 0679 de 2009.

El período de pre construcción para el área ambiental se concentra en un avance documental y desarrollo de instrumentos de planeación de la Gestión Ambiental, que permita dar inicio al desarrollo de las obras cumpliendo con toda la normatividad y políticas del INVIAS - vigentes.

A través de reuniones y oficios, el área ambiental de Interventoría se ha centrado en el requerimiento al Contratista de la presentación de los documentos exigidos y detallados por el Apéndice D del Pliego de Condiciones que dio origen al Contrato No. 1006, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento y revisión del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental del INVIAS - PAGA.
- Requerimiento y revisión del cronograma de permisos y autorizaciones (Hoja de Ruta).
- Requerimiento y revisión del Plan de Trabajo Ambiental.
- Requerimiento y revisión ambientales para inicio de obras de mantenimiento y rehabilitación.

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra, especialmente la de requisitos iniciales como es el Plan de Trabajo Ambiental, PAGA y Hoja de Ruta, documentos que una vez revisados fueron devueltos al Contratista con observaciones mediante correspondencia y de manera oficial.

De igual manera, en el mes de agosto de 2021 se ha participado en los diferentes comités programados por INVIAS e Interventoría, con el objetivo de definir los parámetros iniciales de las intervenciones programadas en el sector comprendido entre el PR54+100 hasta el PR83+000 correspondiente al paso por el Parque Nacional Natural Puracé. Dentro de las reuniones programadas, se resalta las mesas de trabajo de los días 25 y 26 de agosto de 2021 y recorrido del 27 de agosto de 2021 por el corredor vial a intervenir, especialmente el sector del PNN Puracé.

## REUNIONES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

- El día 13 de agosto de 2021, se desarrolló reunión virtual con funcionarios de INVIAS: oficina de Gerencia de Grandes Proyectos, Gestor Ambiental de la SMAGS; INTERVENTORÍA: Especialista Ambiental, Profesional Ambiental, Profesional Social; CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Profesional Ambiental, donde se trataron los siguientes temas:

  Se informa sobre el objeto del contrato mejoramiento y pavimentación de los 30 Km del PNN Puracé; informan sobre la selección y contratación del consultor para el EIA del PNN Puracé: Ucros Abogados & Asociados. Una vez se cuente con diseño geométrico aprobado ajustado a las observaciones del Auto 141 de 2015, se procederá con el Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo en las siguientes semanas se adelantarán los monitoreos ajustados a la normatividad actual.

  En los 30 Km al interior del PNN Puracé, se está haciendo conformación de banca existente con adición de material en algunos sectores, una vez se cuente con el licenciamiento ambiental, se podrá hacer la intervención con pavimentación.

  Interventoría solicita al Contratista que se reporte las visitas en materia ambiental para hacer el correspondiente acompañamiento. De igual manera, Interventoría afirma los cambios en normatividad ambiental para el ajuste y desarrollo del EIA.

  Interventoría solicita informar si ya han radicado al ANLA y PNN la información requerida en el marco del Permiso de Investigación Científica para hacer la colecta de flora y fauna, que de acuerdo con la normatividad vigente se debe informar de las colectas de flora y fauna al ANLA con mínimo 15 días de anticipación. El Contratista responde que se cumplirá con lo dispuesto en la normatividad vigente y que el Consultor cuenta con el Permiso de Investigación Científica - PIC, para todo el territorio nacional.

  Interventoría informa que los días 25 y 26 de agosto de 2021 se tiene programada la reunión de inicio para todas las labores del EIA.

  SMAGS de INVIAS manifiesta que es adecuado proceder con el estudio de impacto ambiental y licenciamiento ambiental para la intervención del corredor en el PNN Puracé, sin embargo solicita presentar concepto al respecto.

  Gerencia de Grandes Proyectos GGP de INVIAS solicita la siguiente información:

  1. ¿Por qué se negó la licencia? **RTA** (Contratista) A partir del Auto 141 de 2015 se conocen las razones por las cuales se negó la licencia, este Auto presenta la posición de PNN respecto al proyecto, en resumen, la restricción más importante es el ancho de calzada, el cual tenía intervenciones laterales en el PNN. De

igual manera, Incoder informó que en el polígono no había presencia de comunidades étnicas, sin embargo por el hecho de tener instalaciones temporales en el poblado de Paletará, se debe conceptuar nuevamente con el Ministerio del Interior. La forma de la sección de la cuneta debe ser reevaluada para el paso de fauna especialmente las ranas.

2. ¿Cuál es el Concepto PNN respecto al proyecto? **RTA** (Contratista) A partir del Auto 141 de 2015 se conoce el concepto de PNN, donde se informa que el ancho debe ser ajustado al existente, de igual manera PNN informa que no es permitido el aprovechamiento forestal al interior del Parque como las grandes razones de negar la Licencia Ambiental.

3. ¿Hay sustracción en el marco de la Ley 2da de 1959? **RTA** (Contratista) Si aplica sustracción de reserva forestal.

Interventoría solicita elevar las consultas ante las diferentes Entidades con el nuevo sistema de coordenadas CTM12 establecido por el IGAC, de igual manera solicita al Contratista que el 20 de agosto de 2021 presente un análisis de las actividades que se puedan desarrollar al interior del PNN Puracé, especialmente teniendo en cuenta las actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación. Interventoría presentará al INVIAS el 23 de agosto de 2021 el resumen de actividades permitidas al interior del Parque. De igual manera se solicita el cronograma del EIA - ajustado a los términos de Ley.

SMAGS de INVIAS requiere que todas las actividades permitidas al interior del Parque sean coordinadas con lo contenido en el documento PAGA.

Finalmente las partes participantes acuerdan los términos de las reuniones y recorridos planteados para los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2021, en el marco de la presentación oficial de los lineamientos que permitirán la intervención del sector comprendido entre el PR54+100 y el PR83+000 al interior del PNN Puracé.

- El día 20 de agosto de 2021 se desarrolló reunión con funcionarios de INVIAS: Gestor Ambiental y Social de la SMAGS; INTERVENTORÍA: Especialista Ambiental, Profesional Ambiental, Profesional Social; CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Profesional Ambiental, donde se trataron los siguientes temas:

  *Concepto sobre actividades constructivas al interior del PNN Puracé*

  El Contratista a través de su Consultor presenta e informa que para las actividades de mantenimiento, no existe en la normatividad ambiental vigente un permiso específico para esta actividad, de igual manera informa que por su bajo impacto no es objeto de permiso o autorización por parte de alguna autoridad ambiental. Informa que Parques Nacionales ha estado informado de las actividades de mantenimiento a través del Jefe del Parque Nacional Natural Puracé Isaac Bedoya, quien ha mostrado estar de acuerdo con la ejecución de estas actividades.

  Respecto a la pavimentación al interior del Parque informa que conforme a la normatividad ambiental, los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por realizarse al interior de éstas, requieren licenciamiento ambiental.

*Concepto sobre consulta previa*

Teniendo en cuenta lo planteado en comités de obra y reuniones anteriores, se pregunta al Consultor, sobre la pertinencia de adelantar la consulta ante el Ministerio del Interior, respecto al trámite de determinación de procedencia y oportunidad de la Consulta Previa, teniendo en cuenta que el proyecto requiere de dos intervenciones principales, la Rehabilitación y el Mantenimiento, entre el PR0 y el PR18 y la pavimentación al interior del PNN Puracé, entre el PR54 y el PR83. Al respecto el Consultor manifiesta que en primera instancia, solo los proyectos objeto de licenciamiento ambiental requieren adelantar el proceso de Consulta Previa y para el trámite del licenciamiento ambiental, se efectuará el proceso consultivo con el Resguardo Indígena de Paletará, quienes en reunión de inicio, solicitaron la necesidad de adelantar dicho proceso en su territorio; que aunque está por fuera del área del PNN Puracé, se asume por esta comunidad indígena como un espacio de vida. Para el tramo de la rehabilitación y mantenimiento, no se considera adelantar el trámite de consulta ante el Ministerio del Interior, siendo que se plantean actividades cuya intervención se realizará sobre la estructura existente por lo cual no se contempla cambio del trazado actual y tampoco se incluye la construcción de nuevas calzadas, según lo manifestado por el Consorcio San Sebastián 064.

*Concepto sobre trámites ICAHN*

Teniendo en cuenta que en el proyecto ejecutado por la Unión Temporal Corredores Arteriales, bajo el Contrato No. 0679 de 2009, contó con un Programa de Arqueología Preventiva aprobado por el ICAHN, que se presentó a la ANLA; el Consorcio San Sebastián 064, considera oportuno el aprovechamiento de este insumo dentro del actual proyecto. La SMAGS del INVIAS, solicita que esta información sea avalada o refrendada por el ICAHN. Al respecto, el Contratista informa que ha realizado el trámite en distintas comunicaciones y que el ICAHN ha solicitado información adicional, que el Contratista ha suministrado y se encuentra a la espera de la respuesta definitiva de dicho Instituto.

Se ratifica por todas las partes asistentes, el compromiso y agenda de la reunión y recorrido a ejecutar los días 25, 26 y 27 de agosto de 2021, donde el Contratista presentará el cronograma para el desarrollo del EIA.

- El día 26 de agosto de 2021 se desarrolló de forma presencial reunión con funcionarios de INVIAS: Gestores Ambiental y Social de la SMAGS; INTERVENTORÍA: Especialista Ambiental, Profesional Ambiental, Profesional Social; CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Profesional Ambiental y Consultor del EIA, donde se trataron los siguientes temas:

  *Presentación de las partes*

  En la reunión participan funcionarios del INVIAS, especialmente de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social SMAGS y el Director Territorial; por parte de Interventoría, la Directora de Interventoría y el equipo socio ambiental incluyendo los Especialistas Ambiental y de Sostenibilidad; por parte del Contratista, el Director de Proyecto, la Coordinadora, el equipo ambiental y el Consultor seleccionado para la elaboración del EIA.

*Necesidad de Licencia Ambiental*

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, que establece:

> *"… ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. "Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades":*
>
> *12. Los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales:*
>
> *a) Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por realizarse al interior de éstas, en el marco de las actividades allí permitidas;*
>
> *b) Los proyectos, obras o actividades señalados en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente Decreto, localizados en las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales previamente determinadas, siempre y cuando sean compatibles con el plan de manejo ambiental de dichas zonas. …"*

Y lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.2.5.4.4. Sistema Nacional de Áreas Protegidas:

> *"… Cuando las actividades de mejoramiento que se relacionan en el presente Decreto se pretendan realizar al interior de las áreas protegidas públicas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP- o las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales debidamente delimitadas, se deberá tramitar y obtener la correspondiente licencia ambiental, en el marco de las actividades permitidas. …"*

*Presentación del Cronograma*

El Contratista de Obra mediante Comunicación CSS064-OBRA-CL-056-21 en respuesta a los oficios de Interventoría ICA-PAL-0019 y ICA-PAL-0021, radicó el 25 de agosto de 2021 el cronograma de permisos ambientales incluidas las actividades del trámite del Estudio de Impacto Ambiental y proceso de Licenciamiento Ambiental; sin embargo, conforme a su presentación, la Interventoría solicita el ajuste, en el sentido de adaptar los tiempos y definir la fecha de entrega de los estudios y diseños definitivos a ejecutar en el PNN Puracé, de igual manera se solicita presentar las sub actividades para las tareas de sustracción de reserva, consulta previa y concepto del ICAHN.

Se estima que el proceso de licenciamiento ambiental incluidos todos los trámites que implica su obtención, es de aproximadamente de 18 meses, los cuales contemplan los tiempos definidos por la normatividad vigente y en muchos casos están sujetos a los tiempos de la Autoridad Ambiental.

De igual manera, es definitivo para el inicio del estudio de impacto ambiental la entrega y aprobación de los estudios y diseños que permitan definir el polígono o polígonos que determinen el área de influencia directa -AID- y el área de intervención. Para la definición del AID, es necesario tener toda la información de

las instalaciones provisionales como Zonas RCD, Plantas de Procesamiento de Materiales y Campamentos, entre otros.

Los estudios y diseños, deberán atender lo dispuesto en Auto 141 de 2015 de la ANLA, mediante el cual se hacían observaciones al Estudio de Impacto Ambiental presentado por el Contrato No. 0679 de 2009.

*Concepto de Sostenibilidad*

En el marco del cumplimiento con lo consignado dentro del ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO MÓDULO 1 Adenda 2, en donde se específica dentro del numeral 3.2 las actividades generales a desarrollar dentro del Contrato, lo siguiente;

> *"...El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución No. 000405 del 13 de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS"..."*

Se considera necesario que los criterios de sostenibilidad considerados en la política, sean incorporados dentro de la planeación y realización del Estudio de Impacto Ambiental, si bien, dentro del Contrato se requiere que, en un Capítulo se especifique el alcance de estos criterios dentro del EIA, no se especifica esto dentro de los términos de referencia, de tal forma que, la Interventoría manifiesta la necesidad de desarrollar un volumen donde se explica el desarrollo de la Política de Sostenibilidad del INVIAS dentro de los capítulos a los que haya lugar dentro del estudio de impacto ambiental; sin necesidad que esta información sea remitida a ANLA dentro del trámite.

**REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA**

De acuerdo con las obligaciones contractuales del Contratista e Interventoría, se ha solicitado al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones, principalmente en los siguientes temas:

***Tabla 15 –*** *Requerimientos al contratista*

| Fecha Radicado | Consecutivo | Asunto | PLAZO DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| **3/08/2021** | ICA-PAL-0008 | Solicitud documento PAGA | 4/08/2021 |
| **3/08/2021** | ICA-PAL-0009 | Permisos para EIA - PNN Puracé | 8/08/2021 |
| **6/08/2021** | ICA-PAL-0015 | Revisión Plan de Trabajo Sostenibilidad V1 | Sin plazo |
| **12/08/2021** | ICA-PAL-0019 | Respuesta CSS064-OBRA-CL-27-21 revisión cronograma EIA | 15/08/2021 |
| **19/08/2021** | ICA-PAL-0020 | Solicitud señalización preventiva sector Parque Nacional Puracé | 25/08/2021 |
| **19/08/2021** | ICA-PAL-0021 | Respuesta comunicación CSS064-OBRA-CL-28-21 Cronograma de permisos ambientales (Hoja de Ruta) | 25/08/2021 |
| **23/08/2021** | ICA-PAL-0022 | Respuesta CSS064-OBRA-CL-29-21 revisión PAGA V1 | 27/08/2021 |
| **31/08/2021** | ICA-PAL-0025 | Respuesta CSSS064-OBRA-CL-056-21 Revisión cronograma EIA | Sin plazo |

### 6.7.2.1. Aprobación Documento Paga

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-29-21 el Contratista de Obra entregó el documento PAGA en su primera versión, sin embargo una vez revisado por el equipo socio ambiental de interventoría, se conceptuó que este documento no cumplía con lo requerido en la Guía Ambiental, y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto de /2021 mediante comunicación ICA-PAL-0022.

### 6.7.2.2. Permisos Ambientales

Durante el período correspondiente al presente informe el estado de permisos ambientales tramitados por el Contratista de Obra ante autoridades locales y Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC es el siguiente:

***Tabla 16 –*** *Permisos ambientales tramitados por el contratista*

| Permiso Ambiental | No Radicado/Fecha | Autoridad | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|
| **Concesión de aguas personales** | SG-5044-2021 | CRC | Radicado | Pendiente, auto de inicio, pago derechos, visita, concepto y resolucion |
| **Zona RCD PR9+200** | Sin radicar CRC | CRC/Alcaldía Popayán | Con concepto de uso de suelo Radicación: 20211910277851 | Pendiente topografía, diseños y geotecnia. Pendiente radicar CRC visita, concepto y viabilidad |
| **Zona RCD PR13+700** | Sin radicar CRC | CRC/Alcaldía Popayán | Con concepto de uso de suelo Radicación: 20211910277891 | Pendiente topografía, diseños y geotecnia. Pendiente radicar CRC visita, concepto y viabilidad |

### 6.7.3. Seguimiento a la Gestión Social

Dentro de la Gestión Social inicial, el Contratista ha efectuado las siguientes actividades:

**Reunión de Socialización:** a la fecha el Contratista ha realizado tres (3) reuniones de inicio (Socialización), en el periodo reportado, el 18 de agosto de 2021 se efectuó, con el Resguardo Indígena de Paletará, sector del PNNP, mantenimiento y pavimentación; la comunidad en dicha reunión manifestó la importancia de adelantar un proceso de consulta previa, con el Resguardo.

**Ubicación oficina SAU:** el Contratista cuenta con tres (3) oficinas de atención al usuario. Ubicadas: en el barrio Campamento en la Carrera 17 No. 18AN 64; y en el periodo reportado, atendiendo el requerimiento realizado por la interventoría en la comunicación ICA-PAL-0012, del 4 de agosto de 2021, fueron ubicados dos (2) oficinas más, en la Vereda, El Sendero en el PR2+400, para el tramo de Rehabilitación y Mejoramiento y en la casa del Cabildo del Resguardo Indígena de Paletará, sector del PNNP, PR54+000 al PR83+000. De esta manera el

Consorcio San Sebastián 064, da cumplimiento, a la solicitud de la interventoría de ubicar oficinas de atención al usuario en el corredor vial y de fácil acceso a la comunidad aledaña del AID.

Igualmente, en el mismo periodo fueron ubicados dos (2) buzones satélites, uno, en el SAU de la Vereda, El Sendero y el otro en la Casa del Cabildo del Resguardo Indígena de Paletará. Las oficinas de atención cuentan con aviso de identificación, formato de PQRS, directorio de emergencias y de actores; los buzones se encuentran debidamente señalizados.

**Actas de vecindad de inicio:** en el periodo reportado se continua con un total de 13 actas de vecindad de inicio, que se adelantan en el sector del PR0+000 al PR27+890. Mejoramiento y Rehabilitación. Municipios de Popayán y Puracé (Coconuco).

**Trámite ICANH:** el Contratista inicio desde el mes de julio de 2021, el trámite de solicitud ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y a la fecha continua a la espera de la respuesta. Se presenta una relación de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del ICANH, donde ha requerido información que el Contratista ha suministrado.

*Tabla 17 - Relacion de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista*

| FECHA | COMUNICADO/ OFICIO | REMITE | ENVIADO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 24-jun.-21 | CSS064-OP-VR-01-21 | Carlos Alfonso Morales Rigueros Representante Legal CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | INCANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria contactenos@icanh.gov.co | Solicitud información sobre manejo patrimonio Histórico-Permiso de intervención |
| 30-jun.-21 | CANH 130 - 5497 - 30/06/2021 No. Recibido 5020 | Juan Manuel Díaz Ortiz Coordinador Área de Arqueología -ICANH | Carlos Alfonso morales Rigueros Representante Legal-CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | Respuesta a *"Solicitud información sobre manejo Patrimonio Histórico - Permiso de Intervención"* - Radicado interno No. 5020. |
| 8-jul.-21 | CSS064-OP-VR-05-21 | Carlos Alfonso Morales Rigueros Representante Legal-CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | INCANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria contactenos@icanh.gov.co | Respuesta oficio ICANH 130-5497 del 30/06/2021 |
| 22-jul.-21 | ICANH 130 - 6082 - 22/07/2021 No. Recibido 5361 | Juan Manuel Díaz Ortiz Coordinador Área de Arqueología -ICANH | Carlos Alfonso morales Rigueros Representante Legal-CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | Respuesta a "oficio ICANH 130-5497 del 30/06/2021" - Rad. 5361. |
| 27-jul.-21 | CSS064-OP-VR-06-21 | Carlos Alfonso Morales Rigueros Representante Lega CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA INCANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria contactenos@icanh.gov.co | Respuesta oficio ICANH 130-6082 del 22/07/2021 |

**Trámite ARN**: en el periodo reportado, la interventoría en la comunicación ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicitó al Contratista el trámite ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastián 064,

en la comunicación CSS064-OBRA-CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, informó que en lo que resta del año 2021 no realizaran actividades que requieran mano de obra en el sector de San José de Isnos, por lo tanto el trámite lo realizaran cuando se tengan claras las intervenciones en el sector y que las mismas requieran mano de obra no calificada.

**Tramite Ministerio del Interior:** en la comunicación ICA-PAL-0012 del 6 de agosto de 2021, la interventoría solicitó al Contratista el estado actual del trámite ante dicho Ministerio y en la comunicación CSS064-OBRA-CL-033-21 del 11 de agosto de 2021, el Consorcio manifestó que para el sector de mejoramiento y rehabilitación, que comprende el PR0+000 al PR27+890, intervención que se realizará sobre la estructura existente, razón por la cual no se contemplan cambios en el trazado actual y tampoco este tramo incluye la construcción de nuevas calzadas, en este sentido, sugirieron no consultar ante el Ministerio del Interior.

Para el sector del PR54+000 al PR83+100, (Sector que atraviesa el espacio de vida del Parque Nacional Natural Puracé), en el que el Contratista contempla obras de mantenimiento y pavimentación y que, según lo manifestado por el Consorcio San Sebastián 064, debe ser objeto de un licenciamiento previo a la intervención, una vez se cuente con los estudios y diseños aprobados, se podrá validar el polígono de afectación y con este elevar la consulta ante dicho Ministerio.

La interventoría al respecto programó los días 25, 26 y 27 de agosto de 2021, reuniones con la SMAGS del INVIAS, Consorcio San Sebastián, Consultor, Territorial INVIAS, Cauca, e Interventoría, con el objeto de unificar criterios entre las partes, respecto al actuar frente a la intervención del Parque Nacional Natural Puracé (PNNP). Conclusiones que se describen en el informe del componente ambiental.

Al respecto del tema de la consulta previa, la interventoría informó, en comité de obra efectuado el 19 de agosto de 2021, que, en la reunión de inicio, realizada el 18 de agosto del presente, con la Comunidad Indígena de Paletará, esta manifestó que se requería adelantar el proceso consultivo, ante la posibilidad de la ejecución de obras de pavimentación en el sector del parque, teniendo en cuenta que este es para los indígenas un espacio de vida, en el que se ubican sitios sagrados, como la Laguna del Buey y se cumplen con actividades propias de su cosmovisión

### 6.7.3.1. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - INTERVENTORIA

La seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores, estableciendo medidas de prevención de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se establecerán medidas preventivas y de control.

**Protocolo de bioseguridad**

El virus SARS-COVID-19, se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo se han afectado todos los aspectos de la vida diaria y las diferentes actividades económicas, sociales y entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisión del virus, ante la emergencia sanitaria declarada por el virus SARS Cov 2, causante de la enfermedad por Covid – 2019, por esta razón el CONSORCIO ICAYECO - 189 ha establecido estrategias que permiten velar por la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores, frente la contingencia del COVID-19;

De acuerdo a lo anterior se informa que contamos con protocolo de bioseguridad y con certificado de la ARL de fecha 26 de agosto 2021, permitiendo de esta forma establecer las medidas de bioseguridad.

Con el fin de tomar acciones de mitigación y de propagación contamos con los elementos para:

d) Limpieza y desinfección para áreas
e) Limpieza y desinfección de manos
f) Inspecciones puesto de trabajo

**Registro de condiciones de salud general.**

Mediante ayudas tecnológicas se hace registro de condiciones de salud a nuestros colaboradores, permitiendo de esta manera desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud.

**Evaluaciones medico ocupacionales**

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se han realizado 20 exámenes Médico Ocupacionales, permitiendo de esta forma monitorear el estado de salud de nuestros colaboradores.

**Plan de emergencias**

Se encuentra en elaboración el plan de emergencias, el cual permite a la organización reaccionar con rapidez, controlar el desarrollo de determinados sucesos en un centro de trabajo y evitar que se produzcan daños graves a las personas, patrimonio de la organización y el medio ambiente. Este documento nos permitirá proporcionar las medidas y acciones ante un evento.

**Inducción**

Se realiza proceso de inducción al personal, permitiendo de esta forma busca garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.

**Entrega de EPP**

Con el objetivo de cuidar y velar por la seguridad de los nuestros colaboradores se hace entrega de los EPP necesarios para la ejecución de sus determinadas actividades permitiendo de esta forma establecer las condiciones de seguridad, indicando que es de obligatorio cumplimiento su para su uso.

### 6.7.4. Seguimiento a la Gestión SISO - CONTRATISTA

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas y con la participación activa de todos los niveles de la empresa mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo se debe tener en cuenta la planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial), tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

**Protocolo de bioseguridad**

Se informa que el contratista radico ante a la interventoría mediante oficio MACIZO 2030-P-0049, el protocolo de bioseguridad con la respectiva certificación de la ARL COLPATRIA, se informa que se encuentra en revisión por la interventoría.

El contratista suministra elementos para tener una higiene y desinfección, entre estos tenemos: jabón, alcohol y gel antibacterial al personal y una vez realice actividades en obra deberá establecer puntos de desinfección para el personal

Con el fin de verificar el estado de salud el contratista realiza tomas de Temperatura al inicio de las labores, permitiendo de esta forma identificar casos sospechosos, se realizan tomas de presión arterial y el estado de saturación.

El contratista ha establecido medidas para prevención y control de COVID-19, en la sede administrativa entre estas actividades tenemos:

- Limpieza y desinfección
- Lavado de Manos
- Distanciamiento físico

**Reportes de accidentes y reportes COVID**

Se indica que, para el periodo en cuestión, no se registraron accidentes de trabajo, casos de aislamiento, ni enfermedad general

**Inducción al personal**

El contratista realiza proceso de inducción al personal que hasta la fecha se encuentra vinculado, en este da a conocer los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, los posibles riesgos de exposición y las medidas d intervención a estos.

## Programa de capacitación y entrenamiento

El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Estas capacitaciones permitirán valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades laborales.

- Con el fin de tomar medidas preventivas el contratista realiza charlas al personal frente a la situación que vivimos hoy en día COVID-19, en esta se indica no formar ni estar en medio de aglomeraciones de personas

- Permitiendo crear conciencia a la hora de realizar labores, se dictan Realizan charlas en: seguridad al personal; exceso de confianza.

## Entrega de elementos de protección personal

El contratista a la fecha ha proporcionado Elementos de Protección Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El MODULO 2 que corresponde al contrato Nº1006 de 2021 fue adjudicado el 05 de abril de 2021 de 2021. El contrato Nº990 de 2021 de Interventoría de VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 fue adjudicado el 27 de abril de 2021, y se dio orden de inicio por parte del INVIAS para los dos contratos el día 28 de junio de 2021.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo entre contratista e interventoría para definir las generalidades del diseño geométrico para el tramo comprendido entre el PR0+000 al PR27+890.

El contratista para el mes de agosto realiza entrega de Estudios y Diseños de manera parcial, del tramo comprendido entre el PR 0+000 al PR6+000 de los siguientes volúmenes: Diseño Geométrico: entrega diseño en planta y perfil del eje, Diseño de Pavimento: entrega del informe de procesamiento de la información de geotécnica de campo y diagnóstico general de la estructura, Geología: entrega el informe de Geología para Ingeniería, revisión sobre la geología regional y la geología local del proyecto para las zonas de intervención entre Popayán y Coconuco, y el Diseño Geométrico: entrega del diseño en Planta y Perfil del eje de proyecto, información que a la fecha se encuentra en revisión por parte de la Interventoría

La interventoría ha realizado chequeos de topografía en el tramo consistentes, inicialmente, en la verificación de los puntos de amarre a coordenadas nacionales y el establecimiento de una poligonal de amarre entre parejas de puntos con el propósito de densificar los sitios de armado y facilitar actividades posteriores de replanteo. Conforme con la revisión topográfica se proyecta recorrido conjunto al primer tramo de posible intervención, a fin de verificar la propuesta de trazado que buscará ajustarse a la condición existente en el tramo para optimizar recursos, y atender de manera específica los sitios que por su geometría pudieran ser restrictivos y requieran mejora.

El contratista adelantó labores de mantenimiento entre el PR6+000 AL PR8+000 mediante jornadas de tapahuecos.

El contratista adelantó labores de mantenimiento con adición de material a entre el PR54+100 al PR56+130.

El acta de obra correspondiente a este mes se encuentra en revisión por parte de la interventoría con un valor de $122.682.994

Se recomienda al Contratista cumplir con las especificaciones técnicas para el diseño y construcción de todas de las obras propuestas que estarán dentro de la normatividad vigente, las normas ambientales, la seguridad industrial y las buenas prácticas de la construcción, los reglamentos y especificaciones.

**Ambiental y social**

El proyecto vial se encuentra en etapa de pre construcción, etapa definitiva para la obtención de los permisos ambientales y la planeación de la ejecución de la gestión ambiental, para lo cual se ha requerido al Contratista el cumplimiento y gestión oportuna de los mismos.

La gestión ambiental se soporta en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y la Normatividad Vigente en materia ambiental; por ende, la entrega de los documentos elaborados cumpliendo los requerimientos mínimos

permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de esta manera se espera que a partir de la presentación del documento PAGA, se logre direccionar las actividades en manera ambiental.

Hasta la fecha, las intervenciones propuestas al interior del PNN Puracé requerirán de licencia ambiental de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y demás legislación ambiental vigente; sin embargo, se encuentra en estudio la revisión de alternativas que permitan la intervención de este sector dando cumplimiento a la normatividad existente.

Es necesario que los criterios de sostenibilidad considerados en la política del INVIAS, sean incorporados dentro de la planeación y realización del Estudio de Impacto Ambiental del Corredor del Paletará, así como del PAGA para el corredor de MACIZO, de tal forma que se desarrolle un volumen donde se explica el desarrollo de la política de sostenibilidad del INVIAS dentro de los capítulos a los que haya lugar dentro del estudio de impacto ambiental; sin necesidad que esta información sea remitida a ANLA dentro del trámite.

En el periodo reportado, el día 18 de agosto de 2021, se realizó la reunión de inicio, con el Resguardo Indígena de Paletará, sector del PNNP, PR54+000 al PR83+100, en la que participaron representantes de la Territorial Cauca, INVIAS, Contratista, Interventoría y Comunidad en general, permitiendo así el acercamiento con los pobladores del AID, logrando abrir espacios de concertación y diálogo.

La interventoría requirió al Contratista respecto a la realizar la solicitud de certificación ante la ARN Territorial Huila, a lo que el Consorcio informó que en lo que resta del año 2021, no realizaran actividades que requieran mano de obra en el sector de San José de Isnos.

En cuanto a oficinas de atención al usuario, en el mes de agosto de 2021, el Consorcio San Sebastián 064, instalo dos (2) SAU, uno, en la Vereda El Sendero y en la casa del Cabildo Indígena de Paletará; así mismo instalo igual número de buzones en dichas oficinas.

En el mes de agosto del presente, el Contratista dentro del periodo reportado, continuo con el levantamiento de actas de vecindad de inicio, en el tramo 1, PR0+000 al PR27+890, municipios de Popayán y Puracé (Coconuco), tramo de rehabilitación y mejoramiento.

Los días 25, 26 y 27 de agosto de 2021, el componente social de la Interventoría, participó de las reuniones que se programaron con el objeto de unificar criterios en cuanto a la intervención del Parque Nacional Natural Puracé, en las que se manifestó lo expresado por la comunidad del Resguardo Indígena de Paletará, en cuanto a la necesidad de adelantar el proceso consultivo ante la pavimentación de dicho PNNP.

# 8. ANEXOS

## 8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante el mes de julio de 2021, se enviaron comunicaciones al contratista de obra del Corredor Del Paletera. – Contrato 1006 de 2021, referentes al seguimiento de las obligaciones contractuales relacionadas al Anexo 22

## 8.2. Registro Fotográfico Avance De Obra

El registro fotográfico de las labores llevadas a cabo por parte del Contratista puede consultarse en el Anexo 23.

## 8.3. Registro fotográfico de las actividades socio-ambientales y prediales

El registro fotográfico de las labores socio ambientales y prediales puede consultarse en el Anexo 24.

# ANEXOS INFORME

# LISTADO DE ANEXOS


*ANEXO 1 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-3 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL PROYECTO*

*ANEXO 2 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO OBRA*

*ANEXO 3 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTRATO OBRA*

*ANEXO 4 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL OBRA*

*ANEXO 5 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO*

*ANEXO 6 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO*

*ANEXO 7 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL OBRA*

*ANEXO 8 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-14 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO*

*ANEXO 9 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS OBRA*

*ANEXO 10 ..... MINFRA-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO*

*ANEXO 11 ..... MINFRA-MN-IN-6-FR-1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES*

*ANEXO 12 ..... MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA*

*ANEXO 13 ..... MINFRA-MN-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION*

*ANEXO 14 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-CORREDOR PALETARA*

*ANEXO 15 ..... INFORME ESPECIALISTAS*

*ANEXO 16 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO INTERVENTORIA*

*ANEXO 17 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA*

*ANEXO 18 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORIA*

*ANEXO 19 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-13- CONTROL DE APORTES INTERVENTORIA*

*ANEXO 20 ..... MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEGUIMIENTO GARANTIAS INTERVENTORIA*

*ANEXO 21 ..... MINFRA-MN-IN-3-FR-1 PLAN INVERS ANTICIPO MENSUALI INTERVENTORIA*

*ANEXO 22 ..... RELACION DE LA CORRESPONDENCIA - AGOSTO*

*ANEXO 23 ..... REGISTRO FOTOGRAFICO - AVANCE DE LA OBRA*

*ANEXO 24 ..... REGISTRO .FOTOGRAFICO SOCIO – AMBIENTAL Y PREDIAL*

# ANEXO 1
# MINFRA-MN-IN-15-FR-3 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL PROYECTO

**UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DEL CAUCA - INVIAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **PERIODO MES:** 1 A 31 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL: | CIENTO CATORCE (114) MESES | PLAZO ACUMULADO: | CIENTO CATORCE (114) MESES |
| FECHA DE NICIACION: | 27-jun-21 | FECHA DE SUSPENSIÓN: | |
| FECHA DE TERMINACION: | 31-ago-30 | FECHA DE REANUDACIÓN: | |
| VALOR INICIAL (incluido IVA) : | $ 300.149.391.398,00 | VALOR ADICIÓNALES: | |
| VALOR ACUMULADO: | $ 300.149.391.398,00 | AMORTIZACION ANTICIPO: | $ - |
| ANTICIPO CONCEDIDO: | $ - | | |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 990-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (INVIAS)

**ALCANCE FISICO DEL CONTRATO**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| E. Pavimento | KM | |
| Construcción | | |
| Pavimentación | KM | |
| Puentes | | |
| Otros | KM | |

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| E. Pavimento | KM | |
| Construcción | | |
| Pavimentación | KM | |
| Puentes | | |
| Otros | | |

**AVANCE FINANCIERO**

| | Inversión Programada (P) | INVERSION EJECUTADA OBRA (incluido IVA) Obra (B) | Ajustes (A) | Total (C=A+B) | E/P | Costos de Interventi (I) | C/B | I/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **En el mes:** | $ 273.633.314,40 | $ 122.682.994,00 | $ - | $ 122.682.994,00 | $ - | $ 122.841.748,00 | $ 1,00 | $ 1,00 |
| **Acumulado:** | $ 301.729.528,40 | $ 150.984.526,00 | $ - | $ 150.984.526,00 | $ - | $ 197.346.684,00 | $ 1,00 | $ 1,31 |

150984526
$ 27.599.464.697

| | E/V | Meses Ejecutados | Plazo Ejecutado/Total | Meses Faltantes | Saldo Contrato | Plazo Adicional Estimado | Presupuesto disponible | Valor Programado para los meses faltantes del año. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | 0,0004 | 2 | 114 | 112 | $ 299.998.406.872,00 | MESES | $ 299.998.406.872,00 | $ 299.998.406.872,00 |
| **Interventor:** | 0,0042 | 2 | 114 | 112 | $ 27.402.118.013,00 | MESES | $ 27.402.118.013,00 | $ 27.402.118.013,00 |

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

| VIGENCIAS PRESUPUESTALES Año | Valor |
|---|---|
| 2021 | $ 6.125.861.986 |
| 2022 | $ 18.376.470.588 |
| 2023 | $ 27.564.705.882 |
| 2024 | $ 13.782.352.941 |
| 2025 | $ 27.564.705.882 |
| 2026 | $ 36.752.941.176 |
| 2027 | $ 27.564.705.882 |
| 2028 | $ 41.347.058.824 |
| 2029 | $ 45.941.176.471 |
| 2030 | $ 55.129.411.766 |
| **Total** | **$ 300.149.391.398** |

| *OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | Valor sin IVA |
|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| GESTIÓN PREDIAL | |
| GESTIÓN SOCIAL | |
| GESTIÓN AMBIENTAL | |
| OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN | |
| **VALOR TOTAL** | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**ULTIMAS GARANTIAS Y SEGUROS APROBADOS**

| Amparo | VIGENCIA Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Cumplimiento | 9-jun-21 | 31-dic-25 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 9-jun-21 | 31-dic-25 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 9-jun-21 | 31-dic-28 |
| Calidad de Estudios y Diseños | Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños. | |
| Estabilidad y Calidad de Obra | Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría. | |

| Seguro | VIGENCIA Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 9-jun-21 | 31 de diciembre de 202 |
| Otros | | |

**Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:** 11/06/2021 Póliza Única de Cumplimiento No: 400.033.869 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 400.033.867

**PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**N/A**

**CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

**CONCEPTO ESPECIALISTA AMBIENTAL**

Hasta la fecha, las intervenciones propuestas al interior del PNN Puracé requerirán de licencia ambiental de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y demás legislación ambiental vigente; sin embargo, se encuentra en estudio la revisión de alternativas que permitan la intervención de este sector dando cumplimiento a la normatividad existente.

La gestión ambiental se soporta en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y la Normatividad Vigente en materia ambiental; por ende, la entrega de los documentos elaborados cumpliendo los requerimientos mínimos permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de esta manera se espera que a partir de la presentación del documento PAGA, ambiental.

se logre direccionar las actividades en manera

**CONCEPTO ESPECIALISTA SOSTEIBILIDAD**

Es necesario que los criterios de sostenibilidad considerados en la política del INVIAS, sean incorporados dentro de la planeación y realización del Estudio de Impacto Ambiental del Corredor del Paletará, así como del PAGA para el corredor de MACIZO, de tal forma que se desarrolle un volumen donde se explica el desarrollo de la política de sostenibilidad del INVIAS dentro

de los capítulos a los que haya lugar dentro de los estudio de impacto ambiental; sin necesidad que esta información sea remitida a ANLA dentro del trámite.

**CONCEPTO ESPECIALISTA HIDRAULICO**

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de preconstrucción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el Contrato 0679 de 2009.

El período de pre construcción para el área de hidrología, hidráulica y socavación se concentra en un avance documental, que permita dar inicio al desarrollo de las obras cumpliendo con toda la normatividad y Políticas del INVIAS vigentes.

**CONCEPTO ESPECIALISTA PAVIMENTOS: .**

Se realizó visita de campo al tramo Popayán – Paletará el pasado 26 de agosto, en la misma se pudo establecer el estado del pavimento de acuerdo con su condición superficial, el cual entre el Km 0+000 y el Km 6+000 (Sector Coconucó) presenta un elevado estado de deterioro con presencia de daños tipo piel de cocodrilo de severidad y extensión alta,

así como sectores con alta densidad de parches.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA**

*El contratista para el mes de agosto realiza entrega de Estudios y Diseños de manera parcial, del tramo comprendido entre el PR 0+000 al PR6+000 de los siguientes volúmenes: Diseño Geométrico: entrega diseño en planta y perfil del eje, Diseño de Pavimento: entrega del informe de procesamiento de la información de geotécnica de campo y diagnóstico general de la estructura,

Geología: entrega el informe de Geología para Ingeniería, revisión sobre la geología regional y la geología local del proyecto para las zonas de intervención entre Popayán y Coconuco, y el Diseño Geométrico: entrega del diseño en Planta y Perfil del eje de proyecto, información que a la fecha se encuentra en revisión por parte de la Interventoría

*La interventoría ha realizado chequeos de topografía en el tramo consistentes, inicialmente, en la verificación de los puntos de amarre a coordenadas nacionales y el establecimiento de una poligonal de amarre entre parejas de puntos con el propósito de densificar los sitios de armado y facilitar actividades posteriores de replanteo. Conforme con la revisión topográfica se proyecta recorrido conjunto al primer tramo de posible

intervención, a fin de verificar la propuesta de trazado que buscará ajustarse a la condición existente en el tramo para optimizar recursos, y atender de manera específica los sitios que por su geometría pudieran ser restrictivos y requieran mejora.

*El contratista adelantó labores de mantenimiento entre el PR6+000 AL PR8+000 mediante jornadas de tapahuecos.

*El proyecto vial se encuentra en etapa de pre construcción, etapa definitiva para la obtención de los permisos ambientales y la planeación de la ejecución de la gestión ambiental, para lo cual se ha requerido al Contratista el cumplimiento y gestión oportuna de los mismos.

*Se recomienda al Contratista cumplir con las especificaciones técnicas para el diseño y construcción de todas las obras propuestas que estarán dentro de la normatividad vigente, las normas ambientales, la seguridad industrial y las buenas prácticas de la construcción, los reglamentos y especificaciones.

Firma

**Elsa Campo Lopez**
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202-01710 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# ANEXO 2
# MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO OBRA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**MES DEL INFORME MENSUAL:** AGOSTO DE 2021 **CONTRATO No.** 1006-2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 **SECTOR:** Modulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. (Abscisas alcance del contrato )

| MAQUINARIA Y EQUIPO | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **CORREDOR DEL PALETERA, POPAYÁN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL AUTOMATICO LEICA SERIE 2212704- MODELO SPRINTER 250M | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| CAMIONETA DOBLECABINA-NISSAN-ICW 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| CAMIONETA DOBLECABINA-NISSAN-TKK 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| MOTONIVELADORA -CATERPILLAR-120H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VIBROCOMPACTADOR -DYNAPAC -CA25OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| CAMION CISTERNA-HINO-TTT 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA SENCILLA CON TANQUE-CHEVROLET FTR- SWN - 088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE--INTERNATIONAL-SLP - 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-MACK-TJV - 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-CHEVROLET-WRC - 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-INTERNATIONAL-VKK - 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-INTERNATIONAL-ESP - 027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-INTERNATIONAL-SRO - 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-SZZ-019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-CHEVROLET-WRC - 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-WGO-657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-WQR-065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-TFO-758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-XLZ-390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-XZL-391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| VOLQUETA DOBLETROQUE-WKK-461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| EXCAVADORA HIDRAULICA-CATERPILLAR-329LME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**CONVENCIONES:**

Firma
Nombre: **JORGE LUIS ZUNIGA DAZA**
Director de Obra
Matrícula No.: **19202-33505**

Firma
Nombre: **DIEGO MAMBUSCAY**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **19202-123532 CAU**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ARFOR Ingeniería
**Carrera 76 # 65ª – 68** Bogotá D.C
**Teléfono:** (1) 438 1646
**Celular/ Whatsapp:** +57 3174045226
**E-mail:** info@arforingenieria.com
**www.arforingenieria.com**

Bogotá D.C., marzo 26 de 2021

## CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 0376

**Datos de Contacto:**

| | |
|---|---|
| **CIUDAD** | Bogotá D.C. |
| **SEÑOR (ES)** | MORENO & MORENO TOPOGRAFÍA S.A.S. |
| **N° IDENTIFICACIÓN** | NIT: 900.951.719-1 |
| **TELÉFONO** | 321 404 1036 |

**Datos del Equipo:**

| | |
|---|---|
| **EQUIPO** | NIVEL DIGITAL |
| **FABRICANTE** | LEICA |
| **MODELO** | SPRINTER 250M |
| **N° DE SERIE** | 2212704 |

Por medio del presente certificamos que el equipo descrito fue revisado en nuestro laboratorio, cumple con las especificaciones del fabricante y sus características técnicas se encuentran dentro de los rangos tolerables. Asimismo certificamos que el equipo se encuentra en perfectas condiciones óptico-mecánicas.

**VERIFICACIÓN REALIZADA CON COLIMADOR DE ALTA PRECISIÓN**
**MARCA: SANWEI F550/D3**
**S/N: 18675120022**
**RESOLUCIÓN: 3"**
**PROCEDIMIENTO BAJO NORMA DIN 18723**

| PARAMETROS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Precisión por km doble de nivelación (lectura electrónica)** | +/- 1.0mm |
| **Precisión por km doble de nivelación (lectura óptica)** | +/- 2.5mm |
| **Aumento** | 24x |
| **Distancia de enfoque mínima** | 0.5 m |
| **Rango de medición** | 2.0m – 100m |
| **Sistema compensador** | Rango +/- 10' precisión de ajuste +/- 0.8" |
| **Poder de resolución** | 3" |
| **Apertura del objetivo** | 36 mm |
| **Campo de visión** | 2°00' |
| **Limbo graduado** | 360° - 400° |
| **Precisión del nonio** | 1° |
| **Temperatura de trabajo** | -10°C ~ +50°C |

ARFOR Ingeniería NIT: 901.156.879-5 SERVICIO TÉCNICO www.arforingenieria.com

ARFOR Ingeniería

**Carrera 76 # 65ª – 68** Bogotá D.C
**Teléfono:** (1) 438 1646
**Celular/ Whatsapp:** +57 3174045226
**E-mail:** info@arforingenieria.com
**www.arforingenieria.com**

## CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 0376

**Periodos:**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CALIBRACIÓN** | 26/03/2021 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | 26/09/2021 |

ARFOR Ingeniería NIT: 901.156.879-5 SERVICIO TÉCNICO www.arforingenieria.com

Se realizaron los procesos de prueba y ajuste teniendo en cuenta los parámetros técnicos de niveles automáticos de precisión de topografía. Por tanto, se emite el presente certificado de calibración con vigencia de seis (6) meses, en donde al final del periodo se recomienda realizar un nuevo control.

Para cualquier comentario, favor comunicarse con nuestro laboratorio al (1) 438 1646 o visítenos en la Carrera 76 # 65ª – 68 en Bogotá D.C

Cordialmente,

***Departamento Técnico***
***ARFOR Ingeniería SAS***

**Nota Aclaratoria:**

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario antes de dar salida al instrumento de nuestro laboratorio, si así lo amerita, por lo anterior ARFOR Ingeniería SAS, no asume ninguna responsabilidad del trabajo realizado por efecto de mal manejo, transporte inadecuado o no verificación del instrumento por parte del usuario.

ELABORÓ: MAURICIO FORERO (Director Técnico)

# ANEXO 3
# MINFRA-MN-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTRATO OBRA

# Consorcio San Sebastian 064

Popayán, 30 de agosto de 2021 CSS064-OBRA-CL-46-21

Señores:
**CONSORCIO ICAYECO 189**
Atención: Ingeniera **ELSA CAMPO LÓPEZ**
Director de Interventoría
Calle 4 No 7 – 32 (Oficina 301-302) b. Centro – Popayán - Cauca
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO INVIAS 1006-2021 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ASUNTO: Certificados pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, yo CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS, identificado con cedula de ciudadanía 80.410.780 de Bogotá D.C y en mi calidad de Representante Legal, CERTIFICO que el Consorcio San Sebastián 064 identificada con Nit. 901.476.491-4, HA CANCELADO LOS PAGOS DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, FONDO DE PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR del periodo correspondiente al mes de agosto de 2021.

Atentamente,

CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS
C.C. 80.410.780 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA MERCEDES RODRIGUEZ SILVA
C.C. 51.993.882 de Bogotá
CONTADOR PÚBLICO T.P 48171 – T

Anexo: Acta No 2
Elaboró: ASL
Revisó: BG
Folios: 1

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PERSONAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | 5 | 9 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA.

## CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

**MES DEL INFORME:** AGOSTO 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** 1006 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN BESATIAN **SECTOR:** CORREDOR DEL PALETERA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS-SOMBRERILLOS.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA** 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO -189

| NOMBRE | CARGO | DIAS AL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/08/2021 | 2/08/2021 | 3/08/2021 | 4/08/2021 | 5/08/2021 | 6/08/2021 | 7/08/2021 | 8/08/2021 | 9/08/2021 | 10/08/2021 | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 14/08/2021 | 15/08/2021 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021 | 21/08/2021 | 22/08/2021 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 28/08/2021 | 29/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | |
| Bladimir guacharna acosta | Director de obra | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Claudia Zoraida Muñoz Chavez | Coordinadora de proyecto | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Jorge Luis Zúñiga | Ingeniero residente | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Daniela valencia | Administradora de obra | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Mirtha Yolanda Burbano Apraez | Residente social | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Hugo Javier Solís | Residente ambiental y sst | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Jhon Alejandro Suarez | Auxiliar de ingeniería | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Diana catalina Burbano | Inspectora sst | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Benjamín castro Orozco | Conductor camioneta | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Ricardo Londoño castillo | Conductor camioneta | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Vidal Oswaldo Hoyos Guzman | Conductor turbo | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Jaime Andres Perdomo Pardo | Operado motoniveladora | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Aquilino Díaz | Operador vibrocompactador | | | | | | | | | | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Eduvan Montenegro | Ayudante de obra | | | | | | | | | | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Hernán Darío Mapallo | Ayudante de obra | | | | | | | | | | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Yeferson Alexis Muñoz Olave | Ayudante de obra | | | | | | | | | | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Jhon Fredy Urrea Guaña | Ayudante de obra | | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| José Elver muñoz | Ayudante de obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Marco Fidel Avirama | Conductor volqueta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Danny Alexander bedoya | Conductor volqueta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | |
| Hemerson Alberto Quintero Carmona | Conductor volqueta | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | |

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**PERSONAL CONTRATO DE OBRA**

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhon Jairo Cardona Aguilar | Conductor volqueta | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Alejandrao Zapata Monsalve | Conductor volqueta | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Kevin Esmith parra | Conductor volqueta | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Luis Eduardo Urbano | Conductor volqueta | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| José Hemán López | Conductor volqueta | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Edier muñoz | Conductor volqueta | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Galvis Quisoboni | Conductor volqueta | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Ancizar tenorio | Conductor volqueta | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| José Manuel paz | Conductor volqueta | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Anuar Esmar prado | Conductor volqueta | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Néstor naun camayo | Conductor volqueta | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Wilson Rengifo Perez | Conductor volqueta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | x | |
| Alveiro Antonio Sánchez Montilla | Conductor volqueta | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Edgar Quijano Ordoñez | Topografo | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Diana Ruth Quijano Quilindo | Topografo | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Filemón Gómez | Cadenero 1 | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Gregory Sánchez | Cadenero 1 | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |
| Enar Díaz | Topografo | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |

**NOTA:**
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: **JORGE LUIS ZUÑIGA DAZA**
Director de Obra
Matrícula No.: **19202-33505**

Firma
Nombre: **DIEGO MAMBUSCAY**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **19202-123532 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# ANEXO 4
# MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL OBRA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-8 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | 5 | 9 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1006 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

**MES INFORME MENSUAL:** 01/08/2021 AL 31/08/2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** RUTA 2002

**SECTOR:** POPAYAN-PATICO-PALETARA-SAN JOSE DE ISNOS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 467521 | "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 | 54 | Nación | 1006 de 2021/ N.A. | $ 6.125.861.986,00 |
| | | | TOTAL | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 150.984.526,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año) | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | Obra | jun-21 | $ - | | $ - | 0 | 0 | $ 6.125.861.986,00 | $ - | $ 300.149.391.398,00 | | | | |
| 2 | Obra | jul-21 | $ 28.096.214,00 | $ 205.318,00 | $ 28.301.532,00 | 0 | 0 | $ 6.097.560.454,00 | $ 28.301.532,00 | $ 300.121.089.866,00 | | | | |
| 3 | Obra | ago-21 | $ 121.792.968,00 | $ 890.026,00 | $ 122.682.994,00 | 0 | 0 | $ 5.974.877.460,00 | $ 150.984.526,00 | $ 299.998.406.872,00 | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 149.889.182,00** | **$ 1.095.344,00** | **$ 150.984.526,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 5.974.877.460,00** | **$ 150.984.526,00** | **$ 299.998.406.872,00** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 149.889.182,00 | $ 1.095.344,00 | $ 150.984.526,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $ - | | $ - |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | $ - | | $ - |
| AJUSTES | | | $ - |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - | | $ - |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | $ - | | $ - |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | $ - | | $ - |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | $ - | | $ - |
| IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | $ - | | $ - |
| **VALOR TOTAL** | $ 149.889.182,00 | | $ 150.984.526,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **BLADIMIR GACHARNÁ ACOSTA**
Director de Obra
Matrícula No.: **25202-094656**

Firma
Nombre: **ELSA CAMPO LÓPEZ**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **19202-01710 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaacabrer | ALVARO ANDRES CABRERA COTRINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-06-11-4:09 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 65121 de fecha 2021-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 467521 | **Fecha Registro:** | 2021-06-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 6.125.861.986,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 6.125.861.986,00 | **Saldo x Obligar:** | 6.125.861.986,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901476491 | **Razon Social:** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 477819031 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Registro Previo |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 35195494 | **Nombre:** | CATALINA TELLEZ POSADA | **Cargo:** | DIRECTOR DE CONTRATACION |

| CAJA MENOR | | | | VIATICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de comisión:** | | **Numero:** | 1006/2021 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2021-06-09 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | C-2401-0600-113-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA | Nación | 54 | CSF | | 6.125.861.986,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 6.125.861.986,00 | 0,00 | 6.125.861.986,00 | 6.125.861.986,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CON 1006/2021 PLAZO31AGOSTO2030 MEMO DO41362 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓ |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-06-11 | 6.125.861.986,00 | 6.125.861.986,00 | NINGUNO |

Pedro Rincón

Firmado digitalmente por
PEDRO JULIO RINCON CUSBA



FOLIO 76

105

# ANEXO 5
# MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | |
| | | VERSIÓN | | |
| | | FECHA | | DE |

| FECHA | 05 | 09 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1006 DE 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** AGOSTODE 2021

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**SECTOR:** RUTA 2002 · POPAYAN - PALETARA - ISNOS -

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 17 | 17 | 10 | 16 | 16 | 14 | 15 | 9 | 10 | 13 | 8 | 17 | 15 | 11 | 16 | 16 | 13 | 14 | 9 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 22 | 21 | 429 |
| Lluvias moderadas | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 88 |
| Lluvias intensas | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 14 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 227 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: **JORGE LUIS ZUÑIGA DAZA**
Director de Obra
Matrícula No.: **19202-33505**

Firma
Nombre: **DIEGO MAMBUSCAY**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **19202-123532 CAU**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# ANEXO 6
# MINFRA-MN-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORTORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 DE . 1 . |

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1006 de 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS CAUCA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ago-21

**CARRETERA Y/O PROYECTO:**

**SECTOR:** RUTA 2002 · POPAYAN - PALETARA - ISNOS - SOMBRERILLOS

**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**

| No. | Fecha del Ensayo | Descripción/Ensayo | Unidad | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación /Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SELECCIÓN MATERIALES SUB BASE GRANULAR** | | | | | | | | | | |
| 1 | 31-ago-21 | Material Para Sub Base, tipo SG-38 /Granulometria | Art. 320.2 INV E - 123 | | PLANTA-CANTERA GOLONDRINA AZUL | 1 | Banda granulométrica según Art. 320.2 -13 | GRADACION = OK<br>PASA 200= 22,9 % | SI | |
| 3 | 31-ago-21 | Material Para Sub Base, tipo SG-38/Límites de consistencia | Art. 320.2 INV E - 125-126 | | PLANTA-CANTERA GOLONDRINA AZUL | 1 | Limite liquido<= 25%<br>Indice de plasticidad <=6% | Límite Líquido:20%<br>Indice de Plasticidad: 3,0% | SI | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo para el mes de ensayo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: BLADIMIR GACHARNÁ ACOSTA
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-094656

Firma
Nombre: ELSA CAMPO LÓPEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-01710 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

| GRANULOMETRIA DE MATERIALES | | Código: | CT-GDM-CE01 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 1 |
| | | Páginas: | 1de 1 |
| NORMAS DE REFERENCIA: | INV- E-123 - 213 A-300 A-330/2013 | Fecha Formato: | 20-may-2014 |

FECHA INFORME: *1- -2021*

OBRA: *CORREDOR DEL PALETARA SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE*

SECTOR : *PR 0 000 AL PR 110 000*

INTERVENTOR: *CONSORCIO ICAYECO 189*

CONSTRUCTOR: *CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064*

SOLICITÓ: *CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064*


FECHA ENTRADA: *31- -2021* ODS Nº:

MATERIAL: *SUB BASE GRANULAR*

CANTERA: *CANTERA GOLONDRINA A UL*

DESCRIPCION: *MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE COLOR GRIS CON PRESENCIA DE GRAVAS CAF S*

| (g) | | | ESPECIFICACION INVIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5262,0 | 5091,0 | % Pasa | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR | OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO |
| Tamiz | Peso retenido (g) | | | | |
| 4" (100) | 0,0 | 100,0 | | | |
| 3" (75) | 0,0 | 100,0 | | | |
| 2" (50) | 0,0 | 100,0 | 100 | 100 | CUMPLE |
| 1 1/2" (37,5) | 0,0 | 100,0 | 100 | 100 | CUMPLE |
| 1" (25,4) | 437,0 | 91,7 | 75 | 95 | CUMPLE |
| 1/2" (12.5) | 1291,0 | 67,2 | 55 | 85 | CUMPLE |
| 3/8" (9,5) | 451,0 | 58,6 | 45 | 75 | CUMPLE |
| N°4 (4,75) | 1002,0 | 39,5 | 30 | 60 | CUMPLE |
| N°10 (2,00) | 876,0 | 22,9 | 20 | 45 | CUMPLE |
| N°40 (0,425) | 694,0 | 9,7 | 8 | 30 | CUMPLE |
| N°200 (0,075) | 340,0 | 3,2 | 2 | 15 | CUMPLE |
| P200 (g) | 68,0 | | | | |

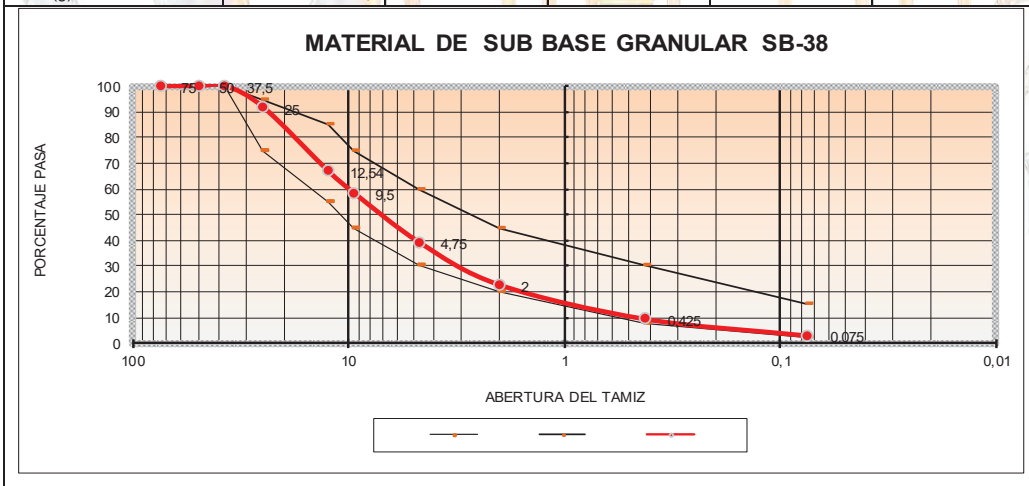


OBSERVACIONES: MUESTRA INGRESADA AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| Geot. Luis Carlos Ponce | Ing. Hugo Daza Delgado | |

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

| LIMITES DE CONSISTENCIA | | Código: | CT-LDC-CE01 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 1 |
| | | Páginas: | 1de 1 |
| NORMAS DE REFERENCIA: | INV- E-125 E-126 A-300 de 2013 | Fecha Formato: | 20-may-2014 |


FECHA INFORME: *1- -2021*
O B R A : *CORREDOR DEL PALETARA SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE*
SECTOR : *PR 0 000 AL PR 110 000*
CONSTRUCTOR: *CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064*
INTERVENTOR: *CONSORCIO ICAYECO 189*
S O L I C I T Ó : *CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064*
FECHA ENTRADA: *31- -2021* ODS Nº:
MATERIAL: *SUB BASE GRANULAR*
CANTERA : *CANTERA GOLONDRINA A UL*
DESCRIPCION: *MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE COLOR GRIS CON PRESENCIA DE GRAVAS CAF S*

## LIMITE LÍQUIDO

| LIMITE LIQUIDO | N° de Golpes | 35 | 25 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| | P1 (Húmedo) | 25,38 | 26,58 | 28,02 |
| | P2(Seco) | 21,92 | 22,94 | 23,93 |
| | P3 (Cap.) | 4,01 | 5,10 | 4,65 |
| | % de Humedad | 19,32 | 20,40 | 21,21 |

## LIMITE PLÁSTICO

| LIM. PLASTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | P1 (Húmedo) | 13,56 | 14,26 | | |
| | P2(Seco) | 12,45 | 12,87 | | |
| | P3 (Cap.) | 5,90 | 4,63 | | Promedio |
| | % de Hum | 16,95 | 16,87 | | 16,9 |

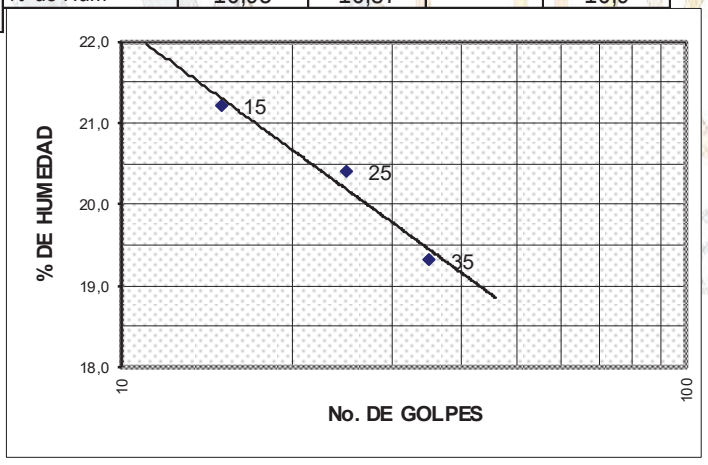


RESULTADOS

| | |
|---|---|
| Contenido de Humedad: | |
| Limite Liquido: | 20,0 |
| Límite Plástico: | 17,0 |
| Indice de Plasticidad: | 3,0 |
| Indice de Liquidez: | |
| Indice de grupo: | |
| U.S .C.: | |
| A.A.S.H.O.: | |
| CUMPLIMIENTO: | CUMPLE |

OBSERVACIONES:

MUESTRA INGRESADA AL LABORATORIO POR EL INTERESADO

LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO APLICAN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA INGRESADA Y PROCESADA EN LABORATORIO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| Geot. Luis Carlos Ponce | Ing. Hugo Daza Delgado | |

# ANEXO 7
# MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-12 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1006 DE 2021.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** AGOSTO 2021

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

## VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| Nombre | Cargo | Período laborado | No. Días mes (Base Liquidación) | C.C. | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPS | | ARL | Pensiones | | Caja de Compensación - ICBF Y SENA | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Planilla | No. días cotizados | | Planilla | No. días cotizados | Planilla | No. días cotizados | |
| Bladimir guacharna acosta | Director de obra | ago-21 | 31 | 79.891.685 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50748875 | 31 | Colmena | 50748875 | 31 | 50748875 | 31 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Claudia Zoraida Muñoz Chavez | Coordinadora de proyecto | ago-21 | 31 | 34.567.091 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50748875 | 31 | Colmena | 50748875 | 31 | 50748875 | 31 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Jorge Luis Zúñiga | Ingeniero residente | ago-21 | 31 | 10.543.850 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50748875 | 31 | Colmena | 50748875 | 31 | 50748875 | 31 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Daniela valencia | Administradora de obra | ago-21 | 31 | 1.061.786.939 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50748875 | 31 | Colmena | 50748875 | 31 | 50748875 | 31 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Mirtha Yolanda Burbano Apraez | Residente social | ago-21 | 31 | 68.028.551 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50748875 | 31 | Colmena | 50748875 | 31 | 50748875 | 31 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Hugo Javier Solís | Residente ambiental y sst | ago-21 | 31 | 10.297.791 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50748875 | 31 | Colmena | 50748875 | 31 | 50748875 | 31 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Jhon Alejandro Suarez | Auxiliar de ingeniería | ago-21 | 31 | 1.144.103.501 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50748875 | 31 | Colmena | 50748875 | 31 | 50748875 | 31 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Diana catalina Burbano | Inspectora sst | ago-21 | 31 | 1.061.699.354 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50748875 | 31 | Colmena | 50748875 | 31 | 50748875 | 31 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Benjamín castro Orozco | Conductor camioneta | ago-21 | 31 | 10.540.410 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50748875 | 31 | Colmena | 50748875 | 31 | 50748875 | 31 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Ricardo Londoño castillo | Conductor camioneta | ago-21 | 19 | 1.130.600.469 | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi. Sanitas | 19 | Colmena | Porvenir | 19 | Afiliacion | 19 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Vidal Oswaldo Hoyos Guzman | Conductor turbo | ago-21 | 7 | 4.753.591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | Afi. AIC | 7 | Colmena | Porvenir | 7 | Afiliacion | 7 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Jaime Andres Perdomo Pardo | Operado motoniveladora | ago-21 | 24 | 1.061.727.868 | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi. Nueva EPS | 24 | Colmena | Proteccion | 24 | Afiliacion | 24 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Aquilino Díaz | Operador vibrocompactado | ago-21 | 19 | 76.314.220 | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi. Nueva EPS | 19 | Colmena | Colpensiones | 19 | Afiliacion | 19 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Eduvan Montenegro | Ayudante de obra | ago-21 | 20 | 1.002.923.867 | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi. Sanitas | 20 | Colmena | Porvenir | 20 | Afiliacion | 21 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Hernán Darío Mapallo | Ayudante de obra | ago-21 | 12 | 1.060.239.796 | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi.Asmet Salud | 12 | Colmena | Porvenir | 12 | Afiliacion | 12 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Yeferson Alexis Muñoz Olave | Ayudante de obra | ago-21 | 12 | 1.061.791.997 | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi.Asmet Salud | 12 | Colmena | Porvenir | 12 | Afiliacion | 12 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Jhon Fredy Urrea Guaña | Ayudante de obra | ago-21 | 7 | 1.061.740.703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi. AIC | 7 | Colmena | Porvenir | 7 | Afiliacion | 7 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| José Elver muñoz | Ayudante de obra | ago-21 | 13 | 1.061.795.390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi. Asmet Salud | 13 | Colmena | Porvenir | 13 | Afiliacion | 13 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Marco Fidel Avirama | Conductor volqueta | ago-21 | 7 | 1.060.236.258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi.Asmet Salud | 7 | Colmena | Porvenir | 7 | Afiliacion | 7 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Danny Alexander bedoya | Conductor volqueta | ago-21 | 4 | 1.061.707.161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | Afi.Asmet Salud | 4 | Colmena | Porvenir | 4 | Afiliacion | 4 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| Hemerson Alberto Quintero Carmona | Conductor volqueta | ago-21 | 12 | 71.191.433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi. Nueva EPS | 12 | Colmena | Afi.Porvenir | 12 | Afi. Comfenalco | 12 | INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ SA | |
| Jhon Jairo Cardona Aguilar | Conductor volqueta | ago-21 | 31 | 70.325.013 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423310235 | 31 | Colmena | 9423310235 | 31 | 9423310235 | 31 | INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA | |
| Alejandrao Zapata Monsalve | Conductor volqueta | ago-21 | 31 | 1.023.801.455 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423310235 | 31 | Colmena | 9423310235 | 31 | 9423310235 | 31 | INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA | |
| Kevin Esmith parra | Conductor volqueta | ago-21 | 31 | 1.061.746.688 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423320726 | 31 | Positiva | 9423320726 | 31 | 9423320726 | 31 | VOLCOS DEL SUR SAS | |
| Luis Eduardo Urbano | Conductor volqueta | ago-21 | 31 | 1.002.791.943 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423320726 | 31 | Positiva | 9423320726 | 31 | 9423320726 | 31 | VOLCOS DEL SUR SAS | |
| José Hernán López | Conductor volqueta | ago-21 | 31 | 76.325.815 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423320726 | 31 | Positiva | 9423320726 | 31 | 9423320726 | 31 | VOLCOS DEL SUR SAS | |
| Edier muñoz | Conductor volqueta | ago-21 | 31 | 10.662.749 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423320726 | 31 | Positiva | 9423320726 | 31 | 9423320726 | 31 | VOLCOS DEL SUR SAS | |
| Galvis Quisoboni | Conductor volqueta | ago-21 | 31 | 76.334.732 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423320726 | 31 | Positiva | 9423320726 | 31 | 9423320726 | 31 | VOLCOS DEL SUR SAS | |
| Ancizar tenorio | Conductor volqueta | ago-21 | 31 | 10.537.896 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423320726 | 31 | Positiva | 9423320726 | 31 | 9423320726 | 31 | VOLCOS DEL SUR SAS | |
| José Manuel paz | Conductor volqueta | ago-21 | 11 | 10.690.784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Afi. Nueva EPS | 11 | Sura | Afi.Proteccion | 11 | Afiliacion | 11 | INNOVA MAX DC SAS | |
| Anuar Esmar prado | Conductor volqueta | ago-21 | 31 | 10.302.359 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1039625458 | 31 | Sura | 1039625458 | 31 | 1039625458 | 31 | TRANSPORTE Y MENSAJERIA 2475AS | |
| Néstor naun camayo | Conductor volqueta | ago-21 | 21 | 1.061.697.337 | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1039625458 | 21 | Sura | 1039625458 | 21 | 1039625458 | 21 | TRANSPORTE Y MENSAJERIA 2475AS | |
| Wilson Rengifo Perez | Conductor volqueta | ago-21 | 6 | 76.343.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | Afi. Nueva EPS | 6 | Sura | Porvenir | 6 | Afiliacion | 6 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS DEL VALLE | |
| Alveiro Antonio Sánchez Montilla | Conductor volqueta | ago-21 | 31 | 76.028.602 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423216757 | 31 | Positiva | 9423216757 | 31 | 9423216757 | 31 | JUAN CARLOS GIRALDO | |
| Edgar Quijano Ordoñez | Topografo | ago-21 | 31 | 76.307.100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8614012299 | 31 | Positiva | 8614012299 | 31 | 8614012299 | 31 | EDGAR QUIJANO | |
| Diana Ruth Quijano Quilindo | Topografo | ago-21 | 31 | 1.061.731.370 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8614490530 | 31 | Positiva | 8614490530 | 31 | 8614012299 | 31 | EDGAR QUIJANO | |
| Filemón Gómez | Cadenero 1 | ago-21 | 31 | 4.709.710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8614490530 | 31 | Positiva | 8614490530 | 31 | 8614012299 | 31 | EDGAR QUIJANO | |
| Gregory Sánchez | Cadenero 1 | ago-21 | 31 | 1.062.777.638 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423095494 | 31 | Sura | 9423095494 | 31 | 9423095494 | 31 | CAD TOPOGRAFIA E INGENIERÍA | |
| Enar Díaz | Topografo | ago-21 | 31 | 10.290.453 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9423095494 | 31 | Sura | 9423095494 | 31 | 9423095494 | 31 | CAD TOPOGRAFIA E INGENIERÍA | |

**NOTA:**

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : BLADIMIR GACHARNA ACOSTA
Director de Obra
Matricula No. 25202-094656

Firma
Nombre: ELSA CAMPO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula No. : .19202-01710 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**EDUVAN MONTENEGRO BENAVIDES,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.002.923.867**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 6 de Agosto del 2021.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

# CERTIFICA QUE:

**HEMERSON ALBERTO QUINTERO CARMONA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **71.191.433**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 9 de Agosto del 2021.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**HERNAN DARIO MAPALLO BASTO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.060.239.796**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Septiembre del 2021.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.198.281**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **PERDOMO PARDO JAIME ANDRES** identificado(a) con **CC** número **1.061.727.868** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 12 de mayo de 2009 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 02 de septiembre de 2021.

Cordialmente,




***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202109021459

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**JOSE ELVER MUÑOZ ZAMBRANO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.061.795.390**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Agosto del 2021.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**RICARDO LONDOÑO CASTILLO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.130.600.469**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 11 de Agosto del 2021.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**VIDAL OSWALDO HOYOS GUZMAN,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **4.753.591**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 9 de Agosto del 2021.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**YEFERSON ALEXIS MUÑOZ OLAVE,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.061.791.997**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 6 de Agosto del 2021.

Cordialmente,

_____

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

# CERTIFICA QUE:

**MARCO FIDEL AVIRAMA PIZO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.060.236.258**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Agosto del 2021.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 1192581 | |
| **RAZON SOCIAL** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 901476491 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 78497310 | 2021-8-11 | CC 1002923867 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| MONTENEGRO BENAVIDES | EDUVAN | 1991-9-25 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CRA 50 2N 70 | SUR | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| POPAYAN - Cauca | eduvan52@gmail.com | 7427374 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3224260115 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE | $908,526.00 | E.P.S. Sanitas S.A. |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | RIESGO 5 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2021-8-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

| SOPORTE DE NOVEDADES | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 1178959 | |
| **RAZON SOCIAL** | INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S INTRAMAQ | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 900102268 | |
| | | |

| CAMBIO FECHA INICIO | | |
|---|---|---|
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 78519139 | 2021-8-17 | CC 71191433 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| QUINTERO CARMONA | HEMERSON ALBERTO | 1979-9-28 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CLL PRINCIPAL 15-21 | CRISTALES | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| SAN ROQUE - Antioquia | afiliaciones@intramaq.co | 4483012 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3113713243 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| CONDUCTOR DE VOLQUETA | $1,417,453.00 | Nueva EPS |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | PROYECTOS VARIOS INTRAMAQ | |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Nueva fecha inicio de vigencia** | | **Tipo jornada** |
| 2021-8-16 | | JORNADA UNICA |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 1192581 | |
| **RAZON SOCIAL** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 901476491 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 78497359 | 2021-8-11 | CC 1060239796 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| MAPALLO BASTO | HERNAN DARIO | 1997-5-30 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| JOSEFINA PALETARA | SUR | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| PURACE - Cauca | dyana970530@gmail.com | 7427374 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3117843262 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE | $908,526.00 | Asociacion Mutual La Esperanza "ASMET SALUD" |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Colpensiones | RIESGO 5 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2021-8-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

## REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** | 1192581 | |
| **RAZON SOCIAL** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 901476491 | |

## INGRESO DE TRABAJADOR

| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
|---|---|---|
| 78471607 | 2021-8-6 | CC 1061727868 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| PERDOMO PARDO | JAIME ANDR S | 1989-12-19 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CRA 17 73N 30 | SUR | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| POPAYAN - Cauca | jperdomopardo@gmail.com | 7427374 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3185817977 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| OPERADOR DE MAQUINARIA | $1,800,000.00 | Nueva EPS |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Colpensiones | RIESGO 5 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2021-8-6 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 1192581 | |
| **RAZON SOCIAL** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 901476491 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 78531355 | 2021-8-17 | CC 1061740703 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| URREA GUAUÑA | JHON FREDY | 1991-8-21 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CALLE 73 BN 3 E 34 | CIUDADELA FUTURO LAS GUACAS | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| POPAYAN - Cauca | jhonfreddyu07@hotmail.com | 8337368 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3104393683 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE | $908,526.00 | ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA - A.I.C- |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | RIESGO 5 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2021-8-17 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

| REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **CONTRATO:** | 1192581 | |
| **RAZON SOCIAL** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 901476491 | |
| | | |
| **INGRESO DE TRABAJADOR** | | |
| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
| 78529748 | 2021-8-17 | CC 1061795390 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| MUÑOZ ZAMBRANO | JOSE ELVER | 1996-11-11 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| PALETARA | RIO CLARO | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| PURACE - Cauca | ymunozolave@gmail.com | 7427374 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3122797397 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE | $908,526.00 | Asociacion Mutual La Esperanza "ASMET SALUD" |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | RIESGO 5 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2021-8-17 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

## REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** | 1192581 | |
| **RAZON SOCIAL** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 901476491 | |

## INGRESO DE TRABAJADOR

| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
|---|---|---|
| 78497485 | 2021-8-11 | CC 4753591 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| HOYOS GUZMAN | VIDAL OSWALDO | 1981-4-12 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| EL ARADO TIMBIO | SUR | Rural |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| TIMBIO - Cauca | hoyosguzma@gmail.com | 7427374 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3215880995 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| CONDUCTOR | $1,250,000.00 | ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA - A.I.C- |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | RIESGO 5 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2021-8-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

## REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** | 1192581 | |
| **RAZON SOCIAL** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 901476491 | |

## INGRESO DE TRABAJADOR

| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
|---|---|---|
| 78497437 | 2021-8-11 | CC 1130600469 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| LONDOÑO CASTILLO | RICARDO | 1988-3-1 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CALLE 10 12 20 | SUR | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| POPAYAN - Cauca | londonocastillor@gmail.com | 7427374 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3116136741 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| londonocastillorgmailcom | $1,100,000.00 | E.P.S. Sanitas S.A. |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | RIESGO 5 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2021-8-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

## REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** | 1192581 | |
| **RAZON SOCIAL** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 901476491 | |

## INGRESO DE TRABAJADOR

| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
|---|---|---|
| 78497279 | 2021-8-11 | CC 1061791997 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| MUÑOZ OLAVE | YEFERSON ALEXIS | 1996-5-29 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| PALETARA | SUR | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| PURACE - Cauca | ymunozlave@gmail.com | 7427374 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3128904700 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| AYUDANTE | $908,526.00 | Asociacion Mutual La Esperanza "ASMET SALUD" |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | RIESGO 5 | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2021-8-11 | JORNADA UNICA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71191433

QUINTERO CARMONA
APELLIDOS

HEMERSON ALBERTO
NOMBRES

Hemerson Quintero C.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1979
PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

21-NOV-1997 PUERTO BERRIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0120500-14082112-M-0071191433-20000919 13716 00256A 02 081574732

## INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y / O PERSONAS A CARGO
## CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA

FORMULARIO: 32700525 FECHA INGRESO: 2021/08/12

### DATOS DE LA EMPRESA O EL EMPLEADOR

| Doc Empresa | Sucur | Razón Social |
|---|---|---|
| 900102268 | 0 | INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. |

### DATOS DE TRABAJADOR

| Tipo Id | Doc Identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | 71191433 | QUINTERO | CARMONA | HEMERSON | ALBERTO |

| Fecha Nac | Sexo | Estado Civil | Nivel Educativo | Centro de Costos | Fecha Ing Emp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979/09/28 | M | SOLTERO | BTO.COMPLETO | 0 | 2021/08/17 |

| Horas Trabajadas | Tipo Salario | Salario Mensual | Cargo | Profesión |
|---|---|---|---|---|
| 240 | FIJO | 1417453 | CONDUCTOR | CONSTRUCCION CIVIL |

| Correo electrónico | Autoriza envío de información |
|---|---|
| | |

| Tipo Contrato | Fecha Terminación | Celular | Empresa con quien trabaja simultáneamente | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nombre Empresa | Salario Mensual |
| OBRA REALIZADA | | 3113713243 | | 0 |

| Dirección de Residencia | Departamento | Municipio de Residencia | Barrio | Sector | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| CLL PRINCIPAL 15 21 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | SIN IDENTIFICAR | U | 4483012 |

| Dirección donde labora | Departamento | Municipio donde labora | Barrio | Sector | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| KR 48 48 75 BG 161 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | LAS CASITAS | U | 4483012 |

| Administradora de Fondo de Pensiones | Administradora de Riesgos laborales | E.P.S. | Vive en Casa Propia |
|---|---|---|---|
| PORVENIR | COLMENA | NUEVA EPS | NO |

Certifico que los datos suministrados son verídicos y podrán ser validados en otras fuentes de información. La información suministrada es para uso exclusivo de COMFENALCO Antioquia y sus entes reguladores.

PENDIENTE POR AUTORIZAR DOCUMENTOS

FOLIO 104

Medellín, 11 de Agosto de 2021

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CAD TOPOGRAFIA E INGENIERIA SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CAUCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante |
|---|---|---|---|---|---|
| C1063807425 | ASTAIZA ASTAIZA ELVIS OMAIRO | 12/08/2021 | | 22030161 | DEPENDIENTE |
| C1061717989 | AVIRAMA CARLOS | 12/08/2021 | | T1872471 | DEPENDIENTE |
| C25273033 | CHILITO DIAZ LIDIA ESPERANZA | 12/08/2021 | | 18939249 | DEPENDIENTE |
| C76317272 | CHILITO ORTEGA CESAR AUGUSTO | 12/08/2021 | | 20420816 | DEPENDIENTE |
| C76290672 | GURRUTE CALAMBAS ELVER DUQUEIRO | 12/08/2021 | | 22217018 | DEPENDIENTE |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C763172722122338008

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/08/2021 10:33:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.5.198.3, 198.143.41.30, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 76307100 | 0 | EDGAR QUIJANO ORDOÑEZ | I | 1 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7490 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | CRA 17 61N 66 CASA H10 | | 8367605 | | | top.edgarito@hotmail.com | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2021-08 | 2021-08 | 8614012299 | I | 2021-08-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 281.200 | 0 | AvVillas |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 8607621072 | 2021-09-02 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | |
| 1 | CC 76307100 | QUIJANO ORDOÑEZ EDGAR | 908.526 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | 908.526 | 145.400 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 908.526 | 113.600 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 908.526 | 22.200 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 281.200 | N |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 76307100 | 0 | EDGAR QUIJANO ORDOÑEZ | I | 1 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7490 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | CRA 17 61N 66 CASA H10 | | 8367605 | | | top.edgarito@hotmail.com | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2021-08 | 2021-08 | 8614012299 | I | 2021-08-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 281.200 | 0 | AvVillas |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 8607621072 | 2021-09-02 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 908.526 | 908.526 | 908.526 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 145.400 | 0 | 0 | 0 | 145.400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 145.400 | 0 | 0 | 0 | 145.400 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 113.600 | 0 | 0 | 0 | 113.600 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 113.600 | 0 | 0 | 0 | 113.600 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 22.200 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 22.200 |
| Gran Total | | | | | 281.200 | 0 | 0 | 0 | 281.200 |

ASOPAGOS
s.a.
PAGADO

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 76307100 | 0 | EDGAR QUIJANO ORDOÃEZ | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7490 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | CR 17N 61N 66 CASA H 10 | | 8367605 | | | top.edgarito@hotmail.com | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2021-07 | 2021-08 | 8614490530 | E | 2021-08-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 480.800 | 0 | AvVillas |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 2 | 8607796565 | 2021-08-03 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | |
| 1 | CC 4709710 | GOMEZ GILON FILIMON | 908.526 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | 908.526 | 145.400 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 908.526 | 36.400 | COMFACAUCA-CCF14 | 908.526 | 36.400 | 908.526 | 22.200 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 240.400 | S |
| 2 | CC 1061731370 | QUIJANO QUILINDO DIANA RUTH | 908.526 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | 908.526 | 145.400 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 908.526 | 36.400 | COMFACAUCA-CCF14 | 908.526 | 36.400 | 908.526 | 22.200 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 240.400 | S |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 76307100 | 0 | EDGAR QUIJANO ORDOÃEZ | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7490 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | CR 17N 61N 66 CASA H 10 | | 8367605 | | | top.edgarito@hotmail.com | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2021-07 | 2021-08 | 8614490530 | E | 2021-08-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 480.800 | 0 | AvVillas |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 2 | 8607796565 | 2021-08-03 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.817.052 | 1.817.052 | 1.817.052 | 1.817.052 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 2 | 290.800 | 0 | 0 | 0 | 290.800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 2 | 290.800 | 0 | 0 | 0 | 290.800 |
| EPS(Administradoras: 2) | | | | 2 | 72.800 | 0 | 0 | 0 | 72.800 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 36.400 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 36.400 |
| Gran Total | | | | | 363.600 | 0 | 0 | 0 | 363.600 |

FOLIO 108

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 2 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 44.400 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 2 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 44.400 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 2 | 72.800 | 0 | 0 | 0 | 72.800 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891500182 | 0 | 2 | 72.800 | 0 | 0 | 0 | 72.800 |
| Gran Total | | | | | 480.800 | 0 | 0 | 0 | 480.800 |

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA

EPSIC3

Formulario No. 10117921355418

Fecha de radicación 23/08/2021

**I. DATOS TRÁMITE**

| Tipo de Trámite | Tipo de afiliación: | Regimen |
|---|---|---|
| A.Afiliación [ ] B.Reporte de Novedades [X] | A.Individual -Cotizante o Cabeza de familia [X]; -Beneficiario o afiliado adicional [ ]; B.Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ] | A.Contributivo [X]; B.Subsidiado [ ] |

| Tipo de afiliado: | Tipo de Cotizante | Código |
|---|---|---|
| A.Cotizante [X] B.Cabeza de familia [ ] C.Beneficiario [ ] | A.Dependiente [X] B.Independiente [ ] C.Pensionado [ ] | registrar por la EPS: 1 |

**A. AFILIACIÓN**

**II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| URREA | GUAUÑA | JHON | FREDY |
| Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento |
| CC | 1061740703 | Femenino [ ] Masculino [X] | 21/08/1991 |

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)**

**Datos personales**

| Etnia | Discapacidad | Condición | Puntaje SISBÉN | Grupo de población especial |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Indigena | Ninguna | | | |

| Administradora de Riesgos Laborales | Administradora de Pensiones | Ingreso base de cotización IBC |
|---|---|---|
| 14-25: Colmena Riesgos Profesionales S.A | 230301: Fondo de Pensiones y Cesantias Porvenir | $ 908.526 |

| Dirección Residencia | Teléfono fijo | Celular | Correo electrónico cotizante |
|---|---|---|---|
| CL 73 3 E 34 | | 3104393683 | jhonfreddyu07@hotmail.com |

| Municipio/Distrito | Zona | Localidad/Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|
| POPAYÁN | Urbana [X] Rural [ ] | B128 - Centro | CAUCA |

**IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR**

NO HAY BENEFICIARIOS EN EL GRUPO FAMILIAR

**Selección de la IPS Primaria**

| No | Nombre de la IPS primaria | Código de la IPS |
|---|---|---|
| 0 | SERVI SALUD DEL CAUCA IPS SAS_CAUCA - CALLE 5 CARRERA 14 ESQUINA | 1900109041 Sede: 531 |

**V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

| Nombre o Razón social | Identificación | Tipo de aportante o pagador de pensiones |
|---|---|---|
| CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NI901476491 | |

| Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio/Distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| KR 16 97 46 OF 203 | 7427374 | admon@alcaing.com | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. |

**B. REPORTE DE NOVEDADES**

Tipo Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código:
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [X] 13. Movilidad: [X] A. Régimen Contributivo; [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen; [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

**VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | Identificación | Sexo | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|



FOLIO 110

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA

EPSIC3

Formulario No. 10117921355418

Fecha de radicación 23/08/2021

| Fecha | EPS anterior | Motivo del traslado | Caja de compensación familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | | | |

**VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**

- [X] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficianos o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte novedades en la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. de acuerdo con lo previsto ente Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

**VIII. FIRMAS**

El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

**IX. ANEXOS**

- [X] 56. Anexo copia de documento de identidad

| | CN | RC | TI | CC | PA | CE | CD | SC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad: | | | | 1 | | | | | 1 |

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio. sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación date unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o decreto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificacion de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliacion de oficio

**X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL**

| Municipio Entidad Territorial | Departamento Entidad Territorial | No ficha SISBÉN | Puntaje SISBÉN | Nivel SISBÉN | Fecha radicación | Fecha validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 17/08/2021 |

| Primer apellido Funcionario | Segundo apellido Funcionario | Primer nombre Funcionario | Segundo nombre Funcionario | Firma del Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Tipo de documento de identificación | Número de identificación |
|---|---|
| | |

| Observaciones |
|---|
| Empresa:, Asesor:MARCELA TATICUAN, Sucursal:, Teléfono:, Correo Electrónico:registrocauca8@aicsalud.org.co |
| Puede verificar la autenticidad de este formulario en la página web de ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA e ingresando el código: E0EE5C58-80A8-4846-A |
| Url: http://contributivo.aicsalud.org.co/Publico/BoxaludPublico/Publico/CQR.aspx |



FOLIO 111

| | CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO DE LA EPS | VERSIÓN 1 | EDICIÓN Mayo de 2016 |
|---|---|---|---|
| | | CODIGO FEPS-GCO-02 | Hoja 1 de 1 |

**A CONTINUACION SE PRESENTAN UNAS BREVES PREGUNTAS PARA CERTIFICAR LA INFORMACION PROPORCIONADA POR ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA EN EL MOMENTO DE SU AFILIACION, FAVOR MARCAR CON UNA "X" EN SI o NO, SEGÚN SEA EL CASO:**


| | SI | NO |
|---|---|---|
| ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliacion, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? | X | |
| ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliacion, la EPS le hizo entrega de La Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? | X | |
| ¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente? | X | |
| ¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS? | X | |
| ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? | X | |

**CC1061740703 JHON FREDY URREA GUAUÑA**

En constancia se firma a los 23 del mes de ago. de 2021

Nombre y documento de identidad del afiliado que certifica:

**CC1061740703 JHON FREDY URREA GUAUÑA**



FIRMA AFILIADO

Si el afiliado no sabe o no puede firmar, el diligenciamiento y suscripción de este formato se efectuará por la persona a quien el ruegue, lo cual deberá ser ratificado por el afiliado a través de su huella.

FIRMA A RUEGO

Nombres y apellidos:

Documento de identidad: Edad:

Domicilio (Dirección y ciudad):

HUELLA AFILIADO

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

No. de Radicación | Fecha de Radicación

148362385

*(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)*

## I. DATOS DEL TRÁMITE

| 1. Tipo de Trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen |
|---|---|---|
| A. Afiliación B. Reporte de Novedades X | A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia B. Colectiva D. De Oficio - Beneficiario o Afiliado adicional C. Institucional | A. Contributivo X B. Subsidiado |

| 4. Tipo de Afiliado | 5. Tipo de Cotizante | Código |
|---|---|---|
| A. Cotizante X B. Cabeza de Familia C. Beneficiario | A. Dependiente X B. Independiente C. Pensionado | (a registrar por la EPS) |

## A. AFILIACIÓN

### II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| Montenegro. | Benavides. | Eduvan | |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CN TI CE CD RC CC X PA SC | 1002.923867. | Femenino Masculino X | 25 09 1991 |

### III. DATOS COMPLEMENTARIOS

**Datos Personales**

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de población especial |
|---|---|---|---|
| | Tipo F N M Condición T P | | |

| 15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL | 16. Administradora de Pensiones | 17. Ingreso base de cotización - IBC |
|---|---|---|
| Colmena. | Porvenir | 908526. |

| 18. Residencia Dirección | Teléfono Fijo |
|---|---|
| Cra 50 2N-70 | |

| Teléfono Celular | Correo Electrónico | | |
|---|---|---|---|
| 3224260115 | edubon52@gmail.com | | |
| **Municipio / Distrito** | **Zona** | **Localidad / Comuna** | **Departamento** |
| Popayan | Urbana X Rural | | Cauca. |

### IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

**Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante**

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CN TI CE CD RC CC PA SC | | Femenino Masculino | |

**Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales**

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

**Datos Complementarios**

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo | 28. Fecha de nacimiento | 29. Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | Femenino Masculino | | |
| B2 | | | Femenino Masculino | | |
| B3 | | | Femenino Masculino | | |
| B4 | | | Femenino Masculino | | |
| B5 | | | Femenino Masculino | | |

| | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo | Condición | 32. Datos de Residencia Municipio/Distrito | Zona | Departamento | Teléfono Fijo y/o Celular | 33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B2 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B3 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B4 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B5 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |

**Selección de la IPS Primaria**

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | IPS popayan. | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

OPIA

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: 064 Consorcio San Sebastian

36. Tipo documento de identificación: NIT X | TI | CE | CC | PA | CD

37. Número del documento de identificación: 901476491-4

39. Ubicación
Dirección: Cra 16 97-46 of 203

Teléfono Fijo: 7427374

Correo Electrónico: khumano@alcaing.com

Municipio / Distrito: Bogota

Departamento: Cundinamarca

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código:
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad: CN RC TI CC CE PA CD SC

Número del documento de identidad

Sexo: Femenino Masculino

Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

42. Fecha: 1 6 0 3 2 0 2 1

43. EPS anterior: Sanitas

44. Motivo de traslado
Código:

45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

## VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario
X Edwar Montenegro

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio
X [illegible]

## IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad — CN RC TI CC PA CE CD SC — TOTAL
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la cesación de efectos civiles y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consta la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

EPS SANITAS
RECIBIDO PARA VERIFICACION POR LA EPS
Agosto 11/21
RECIBIDO POR:

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio | Código del Departamento

67. Datos del SISBEN: Número de ficha | Puntaje | Nivel

68. Fecha de Radicación: D D M M A A A A

69. Fecha de Validación: D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento | Número de documento de identidad

71. Firma del Funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Doc. Identificación y nombre del Ejecutivo Comercial: 4145946 Blanco

Sello de Radicación: Agosto 11/21

Sticker procesamiento

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

## FORMATO DE ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y CARTA DE DESEMPEÑO DE EPS SANITAS S.A.

Nombre del Afiliado Eduvan Montenegro Benavides

| | |
|---|---|
| Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? | SI X NO |
| Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? | SI X NO |
| ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente? | SI X NO |
| ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? | SI X NO |
| Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, ¿fue asesorado adecuadamente por la EPS? | SI X NO |
| ¿Autoriza a EPS Sanitas el envío de este documento e información relacionada con la afiliación y la prestación en servicios de salud a su correo electrónico o celular? | SI X NO |

Firma del Afiliado Eduvan Montenegro
Documento de identidad CC 1002923867

### FIRMA A RUEGO

A ruego del señor(a) _____, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el señor(a) _____, quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al señor(a) _____

El firmante a ruego

Huella índice

Nombres y Apellidos:
Documento de identidad:
Edad:
Dirección de domicilio:

Nombre de la persona que no sabe firmar

### FORMATO AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

Eduvan Montenegro Benavides, declaro que he sido informado sobre que la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. en adelante EPS Sanitas, actuará como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y ha puesto a mi disposición la línea de atención en Bogotá en el número de teléfono 3759000 o fuera de Bogotá en el 018000919100, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, observando la Política de Tratamiento de Información de EPS Sanitas disponible en www.epssanitas.com.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 5621 de 1994 del Ministerio de Salud, en el artículo 2.1.3.8 del Decreto 780 de 2016, y en los artículos 7 y 20 del Decreto 1377 de 2013, estos últimos, referidos a la estipulación a favor de otro o para otro, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a EPS Sanitas y/o a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis datos personales y los de mis beneficiarios, afiliados, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, con las siguientes finalidades, adicionales a las autorizadas por la Constitución y la ley de prestación de servicios de salud, actividades propias del Sistema de Seguridad Social en Salud y del cumplimiento de las normas que lo regulan, así como de las actividades derivadas del objeto social de EPS Sanitas, incluidas pero sin limitarse a las actividades corporativas, administrativas, de información, comercialización, petición, recaudo, cobranza entre otros; contacto y envío de información relacionada con la prestación de los servicios de salud y relacionados a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales; crear y gestionar bases de datos (incluyendo bases de datos respecto de datos sensibles) para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios; dar a conocer, transferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier empresa miembro de la Organización Sanitas Internacional, de la cual hace parte EPS Sanitas, así como a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube; acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública; consultar a cualquier médico, hospital, compañía de seguros, compañía de medicina prepagada o entidad promotora de salud (EPS) para que en cualquier momento, ya sea en vida mía o ya habiendo sucedido mi muerte, EPS Sanitas pueda acceder a la información sobre mi esto de salud; en consecuencia autorizo a dichas entidades para que entreguen a EPS Sanitas copia de toda la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en: www.epssanitas.com. Así mismo, autorizo a EPS Sanitas a modificar o actualizar el contenido de la política, con el fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de los servicios, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía y/o correo electrónico.

La presente autorización la he suministrado de forma voluntaria.

Firma: Eduvan Montenegro
Nombre: Eduvan Montenegro Benavides
Identificación: CC 1002923867
Fecha: Agosto 4/21

# ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

**Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud**

**Resultados de la consulta**

## Información Básica del Afiliado :

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 76314220 |
| NOMBRES | AQUILINO |
| APELLIDOS | DIAZ QUISTANCHALA |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | CAUCA |
| MUNICIPIO | POPAYAN |

## Datos de afiliación :

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | NUEVA EPS S.A. | CONTRIBUTIVO | 01/08/2008 | 31/12/2999 | COTIZANTE |

| Fecha de Impresión: | 09/02/2021 16:32:39 | Estación de origen: | 192.168.70.220 |
|---|---|---|---|

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.**

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

FOLIO 116

# ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

**Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud**

**Resultados de la consulta**

## Información Básica del Afiliado :

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 1061707161 |
| NOMBRES | DANNY ALEXANDER |
| APELLIDOS | BEDOYA ERAZO |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | CAUCA |
| MUNICIPIO | POPAYAN |

## Datos de afiliación :

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | ASMET SALUD EPS S.A.S. -CM | CONTRIBUTIVO | 27/06/2017 | 31/12/2999 | COTIZANTE |

| Fecha de Impresión: | 08/26/2021 10:55:57 | Estación de origen: | 192.168.70.220 |
|---|---|---|---|

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.**

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

FOLIO 117

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 12/08/2021, el empleador INTRAMAQ SA identificado con NIT número 900102268 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.


| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 3604739 | 12/08/2021 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA REINGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 71191433 | HEMERSON ALBERTO QUINTERO CARMONA | 1417453 | CONDUCTOR VOLQUETA | 2021-08-17 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de Agosto del año 2021.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva EPS

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

**Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS**

ESSC62

**Formulario No. 2833992355418**
**Fecha de radicación 18/08/2021**

**I. DATOS TRÁMITE**

| Tipo de Trámite | Tipo de afiliación: | | Regimen |
|---|---|---|---|
| A.Afiliación [ ] B.Reporte de Novedades [X] | A.Individual | -Cotizante o Cabeza de familia [X]<br>-Beneficiario o afiliado adicional [ ] | A.Contributivo [X]<br>B.Subsidiado [ ] |
| | B.Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ] | | |

| Tipo de afiliado: | Tipo de Cotizante | Código |
|---|---|---|
| A.Cotizante [X] B.Cabeza de familia [ ] C.Beneficiario [ ] | A.Dependiente [X] B.Independiente [ ] C.Pensionado [ ] | registrar por la EPS [1] |

**A. AFILIACIÓN**

**II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| MAPALLO | BASTO | HERNAN | DARIO |
| Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento |
| CC | 1060239796 | Femenino [ ] Masculino [X] | 30/05/1997 |

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)**

**Datos personales**

| Etnia | Discapacidad | Condición | Puntaje SISBÉN | Grupo de población especial |
|---|---|---|---|---|
| 06 - Otros | Ninguna | | | |

| Administradora de Riesgos Laborales | Administradora de Pensiones | Ingreso base de cotización IBC |
|---|---|---|
| 00-0: Sin ARL | 230301: Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir | $ 908.526 |

| Dirección Residencia | Teléfono fijo | Celular | Correo electrónico cotizante |
|---|---|---|---|
| PALETARA RIO CLARO | | 3117843262 | dyana970530@gmail.com |

| Municipio/Distrito | Zona | Localidad/Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|
| POPAYÁN | Urbana [ ] Rural [X] | | CAUCA |

**IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR**

NO HAY BENEFICIARIOS EN EL GRUPO FAMILIAR

**Selección de la IPS Primaria**

| No | Nombre de la IPS primaria | Código de la IPS |
|---|---|---|
| 0 | SIEMPREE IPS SAS - CALLE 11 N # 9-94 SANTA CLARA | 60201 |

**V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

| Nombre o Razón social | Identificación | Tipo de aportante o pagador de pensiones |
|---|---|---|
| CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NI901476491 | |

| Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio/Distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| KR 16 97 46 | 7427344 | admonobra.css064@gmail.com | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. |

**B. REPORTE DE NOVEDADES**

Tipo Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código:
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [X] 13. Movilidad:
  - [X] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado:
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

**VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | Identificación | Sexo | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|



FOLIO 119
SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

**Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS**

ESSC62

**Formulario No. 2833992355418**
**Fecha de radicación 18/08/2021**

| Fecha | EPS anterior | Motivo del traslado | Caja de compensación familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | | | |

**VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**

- [X] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficianos o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte novedades en la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. de acuerdo con lo previsto ente Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

**VIII. FIRMAS**

El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

**IX. ANEXOS**

- [X] 56. Anexo copia de documento de identidad

| | CN | RC | TI | CC | PA | CE | CD | SC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad: | | | | 1 | | | | | 1 |

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio. sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación date unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o decreto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificacion de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliacion de oficio

**X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL**

| Municipio Entidad Territorial | Departamento Entidad Territorial | No ficha SISBÉN | Puntaje SISBÉN | Nivel SISBÉN | Fecha radicación | Fecha validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11/08/2021 |

| Primer apellido Funcionario | Segundo apellido Funcionario | Primer nombre Funcionario | Segundo nombre Funcionario | Firma del Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Tipo de documento de identificación | Número de identificación |
|---|---|
| | |

Observaciones

Empresa:, Asesor:yakeline erazo, Sucursal:, Teléfono:, Correo Electrónico:yakeline.erazo@asmetsalud.org.co

Puede verificar la autenticidad de este formulario en la página web de Asmet Salud EPS SAS e ingresando el código:

Url: http://boxaludrc.asmetsalud.org.co/Publico/BoxaludPublico/Publico/CQR.aspx



FOLIO 120
SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

Código (Uso exclusivo para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado)

# FORMULARIO VÍA WEB

I. DATOS DEL TRÁMITE — Lea cuidadosamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [✔]
2. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [✔] B. Beneficiario a cargo de [ ] C. Cotizante a cargo [ ] D. Pensionado [ ] E. Concejal [ ] F. Independiente [ ] G. Otro [ ]
3. REGIMEN: A. Contributivo [✔] B. Subsidiado [ ]
4. TIPO DE AFILIADO: Cot. Cotizante [✔] CF. Cotizante de Familia [ ] BE. Beneficiario [ ]
5. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [✔] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
CIUDAD: N0062
FECHA DE LA SOLICITUD: 06 08 2021

II. AFILIACION

A. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| PERDOMO | PARDO | JAIME | ANDRES |

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [✔] — 8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1061727868 — 9. SEXO: [✔] — 10. FECHA NACIMIENTO: 19 12 1989

B. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ZONA: Rural [ ] Urbana [ ] — 12. ESCOLARIDAD: Ninguno [ ] Básica primaria [ ] Básica secundaria [ ] Media académica [ ] Media técnica [ ] Técnica profesional [ ] Tecnológica [ ] Universitaria [ ] Especialización [ ] Maestría [ ] Doctorado [ ] — 13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN — 14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL — 15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: COLMENA

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES: COLPENSIONES
17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC: 1800000
18. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: CRA 17 79 N 30 — CASA [✔] APTO [ ] — BARRIO / VEREDA / COMUNA / MUNICIPIO

| CIUDAD / MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | TELÉFONO FIJO | TELÉFONO MÓVIL | CORREO ELECTRÓNICO | CÓDIGO DIVIPOLA |
|---|---|---|---|---|---|
| POPAYAN | CAUCA | | 3185817977 | jperdomopardo@gmail.cpm | |

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (Diligencie un registro por cada uno de ellos)

11. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| | | | |

12. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [ ] — 13. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [ ] — 14. SEXO: [ ] — 15. FECHA NACIMIENTO: [ ] — 16. PARENTESCO: [ ] — CÓDIGO EPS: [ ]

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 17. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS | 18. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 19. NÚMERO DE IDENTIDAD | 20. SEXO (M/F) | 21. PARENTESCO | 22. EDAD | 23. ESTADO CIVIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. | | | | | | |
| b. | | | | | | |
| c. | | | | | | |
| d. | | | | | | |

24. DATOS DE RESIDENCIA

| a. PAÍS | b. DEPARTAMENTO | c. MUNICIPIO | d. CORREGIMIENTO | e. TIPO DE PAGO (Cuota moderadora / Copago) | f. VALOR PAGADO | g. NÚMERO DE RECIBO | h. FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. | | | | | | | |
| b. | | | | | | | |
| c. | | | | | | | |
| d. | | | | | | | |

C. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE GRUPO

25. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
26. Tipo de identificación: [✔]
27. Número de identificación: 901476491
28. Tipo de aportante o empleador de grupo familiar: 4

29. DIRECCIÓN O UBICACIÓN: CRA 16 97 46 OF 203
BOGOTA — CUNDINAMARCA — 7427374 — rhumanos@alcasing.com

FECHA INGRESO DE AFILIACIÓN LABORAL: 06 08 2021 — CARGO: Operador MOtoniveladora — SALARIO: 1800000

D. REPORTE DE NOVEDADES

TIPO DE NOVEDAD
1. INGRESO POR AFILIACIÓN A EMPLEADOR NUEVO [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS O APORTES DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. RETIRO DE LA ENTIDAD POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL [ ]
4. ACTUALIZACIÓN POR INTERRUPCIÓN DE PAGO (LICENCIAS, SUSPENSIÓN, VACACIONES) [ ]
5. TRASLADO A LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD [ ]
6. INGRESO POR NACIMIENTO [ ]
7. RETIRO POR MUERTE [ ]
8. INGRESO POR ADOPCIÓN [ ]
9. RETIRO POR ADOPCIÓN [ ]
10. INGRESO POR ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA [ ]
11. RETIRO POR ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA [ ]
12. INGRESO POR CAMBIO DE TIPO DE AFILIADO [ ]
13. RETIRO POR CAMBIO DE TIPO DE AFILIADO [ ]
14. INGRESO POR CAMBIO DE RÉGIMEN [ ]
15. RETIRO POR CAMBIO DE RÉGIMEN [ ]
16. TRASLADO DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL COTIZANTE [ ]
17. RETIRO DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD [ ]
18. REINTEGRO POR LICENCIAS, SUSPENSIÓN, VACACIONES [ ]
19. REINTEGRO DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| | | | |

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [ ] — NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [ ] — SEXO: [ ] — FECHA NACIMIENTO: [ ]

30. FECHA DE RETIRO (DD/MM/AAAA): [ ] — 31. CAUSAS DE RETIRO (Código): [ ] — 32. MOTIVO DE TRASLADO (Código): [ ] — 33. FECHA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O FACTURACIÓN DE PENSIONES: [ ]

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

VIII. FIRMAS

Jaime Perdomo

34. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario

35. Firma y sello de representante, apoderado o autorizado responsable de la afiliación colectiva, institucional o de grupo

IX. ANEXOS

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

36. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio [ ] Código del Departamento [ ]
37. Datos del Afiliado: Número de Folio [ ] Planilla [ ] Nivel [ ]
38. Fecha de Radicación [ ] — 39. Fecha de Afiliación [ ]
39a. Datos del funcionario que realiza la validación
Tipo Documento de Identidad [ ] — Número del Documento de Identidad [ ] — 41. Firma del funcionario

OBSERVACIONES: VITAL PLUS SAS N0062

FOLIO 121

Recuerde que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información suministrada y de los anexos relacionados en el capítulo VII del formulario.

- 2a. COPIA: AFILIADO -

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

# FORMULARIO VÍA WEB

nueva eps
gente cuidando gente

## Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 00016 mayo de 2012)

Yo, **JAIME ANDRES PERDOMO PARDO** identificado (a) con [ ] [ ] [✔] [ ] Otro: ____
número **1061727868** de **PAPAYAN-CAUCA** certifico que:

| | |
|---|---|
| 1. He recibido la carta de derechos y deberes | SI[☑] No[ ] |
| 2. He recibido la carta de desempeño con el ranking de NUEVA EPS | SI[☑] No[ ] |
| 3. Leí el contenido de la carta de derechos y deberes | SI[☑] No[ ] |
| 4. Leí el contenido de la carta de desempeño | SI[☑] No[ ] |
| 5. Me fueron resueltas las dudas sobre el contenido de las cartas de derechos y deberes y la carta de desempeño | SI[☑] No[ ] |
| 6. Entendí y comprendí lo enunciado en la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño | SI[☑] No[ ] |
| 7. NUEVA EPS cuenta con canales disponibles y eficaces para resolver las dudas sobre el contenido de las cartas | SI[☑] No[ ] |

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. **3185817977**
y/o correo electrónico ____
SI[☑] No[ ]

Cordialmente,
Firma: Jaime Perdomo
Tipo ID: **CC** No. ID: **1061727868**
Fecha (dd/mm/aaaa): **06/08/2021**
Dirección: **CRA 17 73 N 30**
Tel: **3185817977** Municipio **POPAYAN**
Departamento: **CAUCA**
Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:
Firma: ____
Tipo ID: ____ No. ID: ____
Fecha (dd/mm/aaaa): ____
Dirección: ____
Tel: ____ Municipio ____
Departamento: ____
Huella

Nota Legal: Con la firma de la autorización de la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño, el usuario manifiesta que ha sido informado de la finalidad de la recolección de sus datos personales por parte de NUEVA EPS S.A. con la cual podrá ejercer sus derechos.

Información de NUEVA EPS
Asesor: **VITAL PLUS SAS**
Codigo: **N0062** Oficina **SAN CAYETANO**

## Autorizaciones

En calidad de la(s) persona(s) relacionada(s), autorizo expresamente y conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1999, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como mas no «Short message service» -, correos electrónicos y redes sociales, relacionados con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derechos y deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, suprima o disponga mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

## Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Ser informado sobre los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento está expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al público de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita: 01 8000 954400
Línea de atención en Bogotá: 307 7444
Conmutador: (57 1) 5100900
Dirección Administrativa: Carrera 68A No. 49A – 86 Piso 2.

Si no ejercita los mismos, la información por usted suministrada en este formato, así como la contenida en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, será utilizada por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información, únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud del Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Habeas Data", dicho tratamiento podrá implicar la transferencia y transmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de el mismo, terceros encargados de tratamiento de información o de sus bases comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR (INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV)

ACTIVIDAD ECONÓMICA | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN $ | PAGO EXENTO APORTES PARAFISCALES SI [ ] NO [ ] | PAGO EXENTO APORTES SALUD SI [ ] NO [ ]

Nombre Establecimiento | Jornada: Mañana [ ] Tarde [ ] Nocturna [ ] Rotativa [ ] Discapacitado [ ] | Posición Ocupacional | Fecha Ingreso Empleador | Contratista [ ] Trabajador s/ Cuenta [ ]
Dirección Establecimiento | Barrio | Teléfono Establecimiento | Ciudad | Fecha Ingreso Cotizante | Fin Contrato

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL CONTRATANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO

SOLO DILIGENCIAR SI ES CONTRATANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO | Nombre del Tercero | Tipo de Identificación | No. | D.V. | C.P. | Departamento del Tercero que Realiza el Aporte | Ciudad

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del GESTOR o PROMOTOR | CÓDIGO GESTOR o PROMOTOR | Nombre DIRECTOR COMERCIAL | CÓDIGO DIRECTOR | Causal Inconsistencia y/o Observaciones | ESTADO | PAGO

# ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

**Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud**

**Resultados de la consulta**

## Información Básica del Afiliado :

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 1060236258 |
| NOMBRES | MARCO FIDEL |
| APELLIDOS | AVIRAMA PIZO |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | CAUCA |
| MUNICIPIO | PURACE |

## Datos de afiliación :

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | ASMET SALUD EPS S.A.S. -CM | CONTRIBUTIVO | 05/05/2015 | 31/12/2999 | COTIZANTE |

| Fecha de Impresión: | 08/19/2021 16:37:45 | Estación de origen: | 192.168.70.220 |
|---|---|---|---|

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

**Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.**

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

FOLIO 123

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA
Formulario No. 10117919355418
Fecha de radicación 23/08/2021

EPSIC3

**I. DATOS TRÁMITE**

| Tipo de Trámite | Tipo de afiliación: | Regimen |
|---|---|---|
| A.Afiliación [ ] B.Reporte de Novedades [X] | A.Individual -Cotizante o Cabeza de familia [X]; -Beneficiario o afiliado adicional [ ]; B.Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ] | A.Contributivo [X]; B.Subsidiado [ ] |

| Tipo de afiliado: | Tipo de Cotizante | Código |
|---|---|---|
| A.Cotizante [X] B.Cabeza de familia [ ] C.Beneficiario [ ] | A.Dependiente [X] B.Independiente [ ] C.Pensionado [ ] | registrar por la EPS [1] |

**A. AFILIACIÓN**

**II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| HOYOS | GUZMAN | VIDAL | OSWALDO |
| Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento |
| CC | 4753591 | Femenino [ ] Masculino [X] | 12/04/1981 |

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)**

**Datos personales**

| Etnia | Discapacidad | Condición | Puntaje SISBÉN | Grupo de población especial |
|---|---|---|---|---|
| 06 - Otros | Ninguna | | 0,00 | |

| Administradora de Riesgos Laborales | Administradora de Pensiones | Ingreso base de cotización IBC |
|---|---|---|
| 14-25: Colmena Riesgos Profesionales S.A | 230301: Fondo de Pensiones y Cesantias Porvenir | $ 1.250.000 |

| Dirección Residencia | Teléfono fijo | Celular | Correo electrónico cotizante |
|---|---|---|---|
| EL ARADO | | 3215880995 | hoyoguzma@gmail.com |

| Municipio/Distrito | Zona | Localidad/Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|
| TIMBÍO | Urbana [ ] Rural [X] | 1 - TIMBIO | CAUCA |

**IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR**

NO HAY BENEFICIARIOS EN EL GRUPO FAMILIAR

**Selección de la IPS Primaria**

| No | Nombre de la IPS primaria | Código de la IPS |
|---|---|---|
| 0 | Hospital TIMBIO E.S.E - KR 22 # 18-00 | 1980700017 Sede: 382 |

**V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

| Nombre o Razón social | Identificación | Tipo de aportante o pagador de pensiones |
|---|---|---|
| CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NI901476491 | |

| Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio/Distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| KR 16 97 46 OF 203 | 7427374 | admon@alcaing.com | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. |

**B. REPORTE DE NOVEDADES**

Tipo Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [X] 13. Movilidad: [X] A. Régimen Contributivo; [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen; [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

**VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | Identificación | Sexo | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|



FOLIO 124

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA
Formulario No. 10117919355418
Fecha de radicación 23/08/2021

EPSIC3

| Fecha | EPS anterior | Motivo del traslado | Caja de compensación familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | | | |

**VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**

- [X] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficianos o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte novedades en la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. de acuerdo con lo previsto ente Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

**VIII. FIRMAS**

El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

**IX. ANEXOS**

- [X] 56. Anexo copia de documento de identidad — CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [1] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] — Cantidad: Total [1]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio. sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación date unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o decreto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificacion de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliacion de oficio

**X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL**

| Municipio Entidad Territorial | Departamento Entidad Territorial | No ficha SISBÉN | Puntaje SISBÉN | Nivel SISBÉN | Fecha radicación | Fecha validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11/08/2021 |

| Primer apellido Funcionario | Segundo apellido Funcionario | Primer nombre Funcionario | Segundo nombre Funcionario | Firma del Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Tipo de documento de identificación | Número de identificación |
|---|---|
| | |

| Observaciones |
|---|
| Empresa:, Asesor:MARCELA TATICUAN, Sucursal:, Teléfono:, Correo Electrónico:registrocauca8@aicsalud.org.co |
| Puede verificar la autenticidad de este formulario en la página web de ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA e ingresando el código: 4D835BBE-31C0-4D08-B |
| Url: http://contributivo.aicsalud.org.co/Publico/BoxaludPublico/Publico/CQR.aspx |

| | CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO DE LA EPS | VERSIÓN 1 | EDICIÓN Mayo de 2016 |
|---|---|---|---|
| | | CODIGO FEPS-GCO-02 | Hoja 1 de 1 |

**A CONTINUACION SE PRESENTAN UNAS BREVES PREGUNTAS PARA CERTIFICAR LA INFORMACION PROPORCIONADA POR ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA EN EL MOMENTO DE SU AFILIACION, FAVOR MARCAR CON UNA "X" EN SI o NO, SEGÚN SEA EL CASO:**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliacion, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? | X | |
| ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliacion, la EPS le hizo entrega de La Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? | X | |
| ¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente? | X | |
| ¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS? | X | |
| ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? | X | |

**CC4753591 VIDAL OSWALDO HOYOS GUZMAN**

En constancia se firma a los 23 del mes de ago. de 2021

Nombre y documento de identidad del afiliado que certifica:

**CC4753591 VIDAL OSWALDO HOYOS GUZMAN**

Vidal Oswaldo Hoyos

FIRMA AFILIADO

Si el afiliado no sabe o no puede firmar, el diligenciamiento y suscripción de este formato se efectuará por la persona a quien el ruegue, lo cual deberá ser ratificado por el afiliado a través de su huella.

FIRMA A RUEGO

Nombres y apellidos:

Documento de identidad: Edad:

Domicilio (Dirección y ciudad):

HUELLA AFILIADO

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas
*Nuestro compromiso es contigo*
NIT. 800.251.440-6

No. de Radicación | Fecha de Radicación

148362385

*(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)*

## I. DATOS DEL TRÁMITE

| 1. Tipo de Trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen |
|---|---|---|
| A. Afiliación B. Reporte de Novedades X | A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia B. Colectiva D. De Oficio - Beneficiario o Afiliado adicional C. Institucional | A. Contributivo X B. Subsidiado |

| 4. Tipo de Afiliado | 5. Tipo de Cotizante | Código |
|---|---|---|
| A. Cotizante X B. Cabeza de Familia C. Beneficiario | A. Dependiente X B. Independiente C. Pensionado | (a registrar por la EPS) |

## A. AFILIACIÓN

### II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| Montenegro. | Benavides. | Eduvan | |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CN TI CE CD RC CC X PA SC | 1002.923867. | Femenino Masculino X | 25 09 1991 |

### III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de población especial |
|---|---|---|---|
| | Tipo F N M Condición T P | | |

| 15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL | 16. Administradora de Pensiones | 17. Ingreso base de cotización - IBC |
|---|---|---|
| Colmena. | Porvenir | 908526. |

| 18. Residencia Dirección | Teléfono Fijo |
|---|---|
| Cra 50 2N-70 | |

| Teléfono Celular | Correo Electrónico | | |
|---|---|---|---|
| 3224260115 | edubon52@gmail.com | | |
| **Municipio / Distrito** | **Zona** | **Localidad / Comuna** | **Departamento** |
| Popayan | Urbana X Rural | | Cauca. |

### IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CN TI CE CD RC CC PA SC | | Femenino Masculino | |

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

Datos Complementarios

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo | 28. Fecha de nacimiento | 29. Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | Femenino Masculino | | |
| B2 | | | Femenino Masculino | | |
| B3 | | | Femenino Masculino | | |
| B4 | | | Femenino Masculino | | |
| B5 | | | Femenino Masculino | | |

| | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo | Condición | 32. Datos de Residencia Municipio/Distrito | Zona | Departamento | Teléfono Fijo y/o Celular | 33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B2 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B3 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B4 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B5 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |

Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | IPS popayan. | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

Original

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: 064 Consorcio San Sebastian

36. Tipo documento de identificación: NIT X | TI | CE | CC | PA | CD

37. Número del documento de identificación: 901476491-4

39. Ubicación
Dirección: Cra 16 97-46 of 203

Teléfono Fijo: 7427374

Correo Electrónico: khumano@alcaing.com

Municipio / Distrito: Bogota

Departamento: Cundinamarca

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [X] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [X] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  - Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [X] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [X] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [X] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [X] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [X] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [X] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad: CN RC TI CC CE PA CD SC

Número del documento de identidad

Sexo: Femenino Masculino

Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

42. Fecha: 1 1 0 8 2 0 2 1

43. EPS anterior: Sanitas

44. Motivo de traslado
Código

45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

## VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario: X Edwan Montenegro

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio: X [illegible]

## IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad | CN RC TI CC PA CE CD SC | TOTAL
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [X] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la cesación de efectos civiles y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [X] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [X] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [X] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consta la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

EPS SANITAS
RECIBIDO PARA VERIFICACION POR LA EPS
Agosto 11/21
RECIBIDO POR:

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio | Código del Departamento

67. Datos del SISBEN: Número de ficha | Puntaje | Nivel

68. Fecha de Radicación: D D M M A A A A

69. Fecha de Validación: D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento | Número de documento de identidad

71. Firma del Funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Doc. Identificación y nombre del Ejecutivo Comercial: 4145946 Blanco

Sello de Radicación: Agosto 11/21

Sticker procesamiento

EPS Sanitas
*Nuestro compromiso es contigo*
NIT. 800.251.440-6

## FORMATO DE ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y CARTA DE DESEMPEÑO DE EPS SANITAS S.A.

**Nombre del Afiliado** Eduvan Montenegro Benavides

| | |
|---|---|
| Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? | SI NO |
| Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? | SI NO |
| ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente? | SI NO |
| ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? | SI NO |
| Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, ¿fue asesorado adecuadamente por la EPS? | SI NO |
| ¿Autoriza a EPS Sanitas el envío de este documento e información relacionada con la afiliación y la prestación en servicios de salud a su correo electrónico o celular? | SI NO |

Eduvan Montenegro

Firma del Afiliado
Documento de identidad CC 1002923867

**FIRMA A RUEGO**

A ruego del señor(a) _____, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el señor(a) _____, quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al señor(a) _____

El firmante a ruego

Huella índice

Nombres y Apellidos:
Documento de identidad:
Edad:
Dirección de domicilio:

Nombre de la persona que no sabe firmar

## FORMATO AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

Eduvan Montenegro Benavides, declaro que he sido informado sobre que la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. en adelante EPS Sanitas, actuará como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y ha puesto a mi disposición la línea de atención en Bogotá en el número de teléfono 3759000 o fuera de Bogotá en el 018000919100, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, observando la Política de Tratamiento de Información de EPS Sanitas disponible en www.epssanitas.com.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 5621 de 1994 del Ministerio de Salud, en el artículo 2.1.3.8 del Decreto 780 de 2016, y en los artículos 7 y 20 del Decreto 1377 de 2013, estos últimos, referidos a la estipulación a favor de otro o para otro, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a EPS Sanitas y/o a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis datos personales y los de mis beneficiarios, afiliados, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, con las siguientes finalidades, adicionales a las autorizadas por la Constitución y la ley de prestación de servicios de salud, actividades propias del Sistema de Seguridad Social en Salud y del cumplimiento de las normas que lo regulan, así como de las actividades derivadas del objeto social de EPS Sanitas, incluidas pero sin limitarse a las actividades corporativas, administrativas, de información, comercialización, petición, recaudo, cobranza entre otros; contacto y envío de información relacionada con la prestación de los servicios de salud y relacionados a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales; crear y gestionar bases de datos (incluyendo bases de datos respecto de datos sensibles) para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios; dar a conocer, transferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier empresa miembro de la Organización Sanitas Internacional, de la cual hace parte EPS Sanitas, así como a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube; acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública; consultar a cualquier médico, hospital, compañía de seguros, compañía de medicina prepagada o entidad promotora de salud (EPS) para que en cualquier momento, ya sea en vida mía o ya habiendo sucedido mi muerte, EPS Sanitas pueda acceder a la información sobre mi esto de salud; en consecuencia autorizo a dichas entidades para que entreguen a EPS Sanitas copia de toda la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en: www.epssanitas.com. Así mismo, autorizo a EPS Sanitas a modificar o actualizar el contenido de la política, con el fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de los servicios, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía y/o correo electrónico.

La presente autorización la he suministrado de forma voluntaria.

Firma: Eduvan Montenegro
Nombre: Eduvan Montenegro Benavides
Identificación: CC 1002923867
Fecha: Agosto 4/21

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

**Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS**

ESSC62

**Formulario No. 2833991355418**
**Fecha de radicación 18/08/2021**

**I. DATOS TRÁMITE**

| Tipo de Trámite | Tipo de afiliación: | Regimen |
|---|---|---|
| A.Afiliación [ ] B.Reporte de Novedades [X] | A.Individual -Cotizante o Cabeza de familia [X]; -Beneficiario o afiliado adicional [ ]; B.Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ] | A.Contributivo [X]; B.Subsidiado [ ] |

| Tipo de afiliado: | Tipo de Cotizante | Código |
|---|---|---|
| A.Cotizante [X] B.Cabeza de familia [ ] C.Beneficiario [ ] | A.Dependiente [X] B.Independiente [ ] C.Pensionado [ ] | registrar por la EPS: 1 |

**A. AFILIACIÓN**

**II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ | OLAVE | YEFERSON | ALEXIS |
| **Tipo de documento de identidad** | **Número de documento de identidad** | **Sexo** | **Fecha de nacimiento** |
| CC | 1061791997 | Femenino [ ] Masculino [X] | 29/05/1996 |

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)**

**Datos personales**

| Etnia | Discapacidad | Condición | Puntaje SISBÉN | Grupo de población especial |
|---|---|---|---|---|
| 06 - Otros | Ninguna | | | |

| Administradora de Riesgos Laborales | Administradora de Pensiones | Ingreso base de cotización IBC |
|---|---|---|
| 00-0: Sin ARL | 230301: Fondo de Pensiones y Cesantias Porvenir | $ 908.526 |

| Dirección Residencia | Teléfono fijo | Celular | Correo electrónico cotizante |
|---|---|---|---|
| POPAYAN | | 3128904700 | ymunozlave@gmail.com |

| Municipio/Distrito | Zona | Localidad/Comuna | Departamento |
|---|---|---|---|
| POPAYÁN | Urbana [ ] Rural [X] | | CAUCA |

**IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR**

NO HAY BENEFICIARIOS EN EL GRUPO FAMILIAR

**Selección de la IPS Primaria**

| No | Nombre de la IPS primaria | Código de la IPS |
|---|---|---|
| 0 | SIEMPREE IPS SAS - CALLE 11 N # 9-94 SANTA CLARA | 60201 |

**V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

| Nombre o Razón social | Identificación | Tipo de aportante o pagador de pensiones |
|---|---|---|
| CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NI901476491 | |

| Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Municipio/Distrito | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| KR 16 97 46 | 7427344 | admonobra.css064@gmail.com | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. |

**B. REPORTE DE NOVEDADES**

Tipo Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código:
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [X] 13. Movilidad: [X] A. Régimen Contributivo; [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen; [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

**VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD**

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | Identificación | Sexo | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |



FOLIO 130
SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

**Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS**

ESSC62

**Formulario No. 2833991355418**
**Fecha de radicación 18/08/2021**

| Fecha | EPS anterior | Motivo del traslado | Caja de compensación familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | | | |

**VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**

- [X] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficianos o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte novedades en la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. de acuerdo con lo previsto ente Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

**VIII. FIRMAS**

El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

**IX. ANEXOS**

| | CN | RC | TI | CC | PA | CE | CD | SC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad: | | | | 1 | | | | | Total 1 |

- [X] 56. Anexo copia de documento de identidad
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio. sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación date unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o decreto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificacion de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliacion de oficio

**X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL**

| Municipio Entidad Territorial | Departamento Entidad Territorial | No ficha SISBÉN | Puntaje SISBÉN | Nivel SISBÉN | Fecha radicación | Fecha validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11/08/2021 |

| Primer apellido Funcionario | Segundo apellido Funcionario | Primer nombre Funcionario | Segundo nombre Funcionario | Firma del Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Tipo de documento de identificación | Número de identificación |
|---|---|
| | |

Observaciones

Empresa:, Asesor:yakeline erazo, Sucursal:, Teléfono:, Correo Electrónico:yakeline.erazo@asmetsalud.org.co

Puede verificar la autenticidad de este formulario en la página web de Asmet Salud EPS SAS e ingresando el código:

Url: http://boxaludrc.asmetsalud.org.co/Publico/BoxaludPublico/Publico/CQR.aspx



FOLIO 131
SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 19/08/2021, el empleador INNOVA MAX DC SAS identificado con NIT número 901415678 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.


| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 3621041 | 19/08/2021 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA REINGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 10690784 | JOSE MANUEL PAZ | 908526 | CONDUCTOR DE REMOLQUE | 2021-08-19 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Agosto del año 2021.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva EPS

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.198.281**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **PAZ JOSE MANUEL** identificado(a) con **CC** número **10.690.784** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de agosto de 1994 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN CONSERVADOR
2. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 19 de agosto de 2021.

Cordialmente,



**Laura Patricia Merchan Metaute**
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2021081911300

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900866939 | 1 | VOLCOS DEL SUR SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | calle 78 norte 9 198 | POPAYAN-CAUCA | 8361434 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1091494695 | 9423320726 | E | 2021/08/10 | 2021/08/11 | BANCOLOMBIA | 1 | $2,674,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (11 Afiliados)** | | | | | | $9,447,793 | $1,512,000 | | | $10,356,319 | $414,900 | | | $10,356,319 | $414,900 | | | $10,356,319 | $333,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO ( 3 Afiliados)** | | | | | | $3,088,111 | $494,200 | | | $3,088,111 | $123,700 | | | $3,088,111 | $123,700 | | | $3,088,111 | $16,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA ( 3 Afiliados) | | | | | | $3,088,111 | $494,200 | | | $3,088,111 | $123,700 | | | $3,088,111 | $123,700 | | | $3,088,111 | $16,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 34574519 | MUÑOZ ANI | 230301 | 30 | $1,755,606 | $280,900 | EPS037 | 30 | $1,755,606 | $70,300 | CCF14 | 30 | $1,755,606 | $70,300 | 14-23 | 30 | $1,755,606 | $9,200 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 34558781 | RENGIFO OLGA | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS018 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $908,526 | $4,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1085255742 | YELA MARTHA | 230301 | 14 | $423,979 | $67,900 | ESSC18 | 14 | $423,979 | $17,000 | CCF14 | 14 | $423,979 | $17,000 | 14-23 | 14 | $423,979 | $2,300 | 14 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: CONDUCTORES ( 8 Afiliados)** | | | | | | $6,359,682 | $1,017,800 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $316,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA ( 8 Afiliados) | | | | | | $6,359,682 | $1,017,800 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $316,800 | | $0 | $0 |
| 4 | CC | 70047985 | JIMENEZ MANUEL | | 0 | $0 | $0 | ESSC18 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 76325815 | LOPEZ JOSE | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | ESSC62 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 10662749 | MUÑOZ EDIER | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1061746688 | PARRA KEVIN | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 76334732 | QUISOBONI GALVIS | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 76335007 | SAMBONI ALBARO | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPSIC3 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 10537896 | TENORIO ANCIZAR | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1002791943 | URBANO LUIS | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-23 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 11)** | | | $9,447,793 | $1,512,000 | | | $10,356,319 | $414,900 | | | $10,356,319 | $414,900 | | | $10,356,319 | $333,100 | | $0 | $0 |

FOLIO 134



2021/08/11 12:12 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900866939 | 1 | VOLCOS DEL SUR SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | calle 78 norte 9 198 | POPAYAN-CAUCA | 8361434 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-08 | 1091494695 | 9423320726 | E | 2021/08/10 | 2021/08/11 | BANCOLOMBIA | 1 | $2,674,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 10 | $1,512,000 | $0 | $0 | $1,512,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $436,200 | $0 | $0 | $436,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $1,075,800 | $0 | $0 | $1,075,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $333,100 | $0 | $0 | $333,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 11 | $333,100 | $0 | $0 | $333,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $414,900 | $0 | $0 | $414,900 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 11 | $414,900 | $0 | $0 | $414,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 11 | $414,900 | $0 | $0 | $414,900 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | $53,400 | $0 | $0 | $53,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 6 | $252,300 | $0 | $0 | $252,300 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| **TOTAL** | | | | **11** | **$2,674,900** | **$0** | **$0** | **$2,674,900** |

FOLIO 135



2021/08/11 12:12 PM

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2021-08-09, 11:33:39 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1039625458

**Periodo Cotización** 202107 **Periodo Servicio** 202108

**Cliente:**

## PAGADA 2021-08-09

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | TRANSPORTE Y MENSAJERIA 247 SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901383654 | **Dirección** | CR 2B #47 - 29 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3731946 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | LOPEZ FLOREZ HENRY | **Identificación** | CC 94074603 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 10302359 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | PRADO PORTILLA ANUAR ESMAR | 88001000 - 88 | 000001359 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 908.526 | 230301 | | 16 % | $ 908.526 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | EPS037 | | 4 % | $ 908.526 | $ 36.400 | $ 0 | 14-11 | 5 | 6.960 % | $ 908.526 | $ 63.300 | CCF64 | 4 % | $ 1 | $ 100 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | NUEVA EPS | ARL SURA | CAJASAI | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | $ 36.400 | $ 63.300 | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 245.200 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

FOLIO 136

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

## Certificados de Aportes

Se certifica que INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS identificado(a) con NI 900102268 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEJANDRO ZAPATA MONSALVE identificado(a) con CC 1023801455

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avl | | | | | | |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,039,261 | 4% | $81,600 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,039,261 | 16% | $326,300 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,039,261 | | $0 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,039,261 | | $0 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,039,261 | 6.96% | $142,000 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | CCF | CCF03 | COMFENALCO ANTIOQUIA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $2,039,261 | 4% | $81,600 |

Este certificado se expide el día 2021-08-17 a las 03:49.

aportes en línea

## Certificados de Aportes

Se certifica que INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS identificado(a) con NI 900102268 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON JAIRO CARDONA AGUILAR identificado(a) con CC 70325013

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avj | | | | | |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,387,902 | 4% | $135,600 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,387,902 | 16% | $542,100 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,387,902 | | $0 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,387,902 | | $0 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,387,902 | 6.96% | $235,800 |
| 9423310235 | 1097340695 | E | 2021-08-17 | CCF | CCF03 | COMFENALCO ANTIOQUIA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-07 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $3,387,902 | 4% | $135,600 |

Este certificado se expide el día 2021-08-17 a las 03:49.

Medellín, 19 de Agosto de 2021

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INNOVA MAX DC SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CAUCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante |
|---|---|---|---|---|---|
| C10690784 | PAZ JOSE MANUEL | 20/08/2021 | | 16519925 | DEPENDIENTE |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C345630362123141613

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/08/2021 11:33:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.156.86.92, 192.230.94.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901338709 | 3 | CAD TOPOGRAFIA E INGENERIA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Cl 36 b 3-14 barrio villamercedes | POPAYAN-CAUCA | 8318520 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-07 | 1082203139 | 9423095494 | E | 2021/07/06 | 2021/08/03 | BANCOLOMBIA | 28 | $784,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,725,578 | $436,200 | | | $2,725,578 | $109,200 | | | $2,694,855 | $108,000 | | | $2,725,578 | $131,400 | | $0 | $0 | | $784,800 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO CINCO 6960 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | $290,800 | | | $1,817,052 | $72,800 | | | $1,786,329 | $71,600 | | | $1,817,052 | $126,600 | | $0 | $0 | | $561,800 |
| Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | $290,800 | | | $1,817,052 | $72,800 | | | $1,786,329 | $71,600 | | | $1,817,052 | $126,600 | | $0 | $0 | | $561,800 |
| 1 | CC | 10290453 | DIAZ ENAR | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $281,500 |
| 2 | CC | 1062777638 | SANCHEZ GREGORY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPSIC3 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-11 | 30 | $908,526 | $63,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $280,300 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO1 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $36,400 | | | $908,526 | $36,400 | | | $908,526 | $4,800 | | $0 | $0 | | $223,000 |
| Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $36,400 | | | $908,526 | $36,400 | | | $908,526 | $4,800 | | $0 | $0 | | $223,000 |
| 3 | CC | 25272816 | CHILITO ANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS008 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF14 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $4,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $223,000 |
| **Total** | | | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,725,578 | $436,200 | | | $2,725,578 | $109,200 | | | $2,694,855 | $108,000 | | | $2,725,578 | $131,400 | | $0 | $0 | | $784,800 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901338709 | 3 | CAD TOPOGRAFIA E INGENERIA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Cl 36 b 3-14 barrio villamercedes | POPAYAN-CAUCA | 8318520 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-07 | 1082203139 | 9423095494 | E | 2021/07/06 | 2021/08/03 | BANCOLOMBIA | 28 | $784,800 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $436,200 | $0 | $0 | $436,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $290,800 | $0 | $0 | $290,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $131,400 | $0 | $0 | $131,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $131,400 | $0 | $0 | $131,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $108,000 | $0 | $0 | $108,000 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 3 | $108,000 | $0 | $0 | $108,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $109,200 | $0 | $0 | $109,200 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| TOTAL | | | | 3 | $784,800 | $0 | $0 | $784,800 |

FOLIO 140

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2021-08-09, 02:48:37 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 50748875

**Periodo Cotización:** julio de 2021 **Periodo Servicio:** agosto de 2021

## PAGADO 06/08/2021

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | **Nombre Sucursal** | SAN SEBASTIAN | **Código Sucursal** | 001 |
| **Documento** | NI901476491 | **Dirección** | CR 16 #97 - 46 OFICINA 203 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 7427374 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | MORALES RIGUEROS CARLOS ALFONSO | **Identificación** | CC 80410780 | | |
| **Total Afiliados** | 9 | **ARP** | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 10297791 | HUGO JAVIER SOLIS CHAVEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 4.500.000 | $ 765.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 4.500.000 | $ 180.000 | 6,960 | $ 4.500.000 | $ 313.200 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 4.500.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.438.200 |
| CC 10540410 | BENJAMIN CASTRO OROZCO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | (230301) PORVENIR | $ 1.228.331 | $ 196.600 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.228.331 | $ 49.200 | 6,960 | $ 1.228.331 | $ 85.500 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 1.228.331 | $ 49.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 380.500 |
| CC 10543850 | JORGE LUIS ZUÑIGA DAZA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | (230301) PORVENIR | $ 2.200.000 | $ 352.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 2.200.000 | $ 88.000 | 6,960 | $ 2.200.000 | $ 153.200 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 2.200.000 | $ 88.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 681.200 |
| CC 1061699354 | DIANA CATALINA BURBANO DELGADO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.916.667 | $ 306.700 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.916.667 | $ 76.700 | 6,960 | $ 1.916.667 | $ 133.500 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 1.916.667 | $ 76.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 593.600 |
| CC 1061786939 | DANIELA VALENCIA CANO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | (230301) PORVENIR | $ 1.266.667 | $ 202.700 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.266.667 | $ 50.700 | 6,960 | $ 1.266.667 | $ 88.200 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 1.266.667 | $ 50.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 392.300 |
| CC 1144103501 | JHON ALEJANDRO SUAREZ LUNA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | (230301) PORVENIR | $ 2.083.334 | $ 333.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.083.334 | $ 83.400 | 6,960 | $ 2.083.334 | $ 145.100 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 2.083.334 | $ 83.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 645.300 |
| CC 34567091 | CLAUDIA ZORAIDA MUÑOZ CHAVEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 6.000.000 | $ 1.020.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 6.000.000 | $ 240.000 | 6,960 | $ 6.000.000 | $ 417.600 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 6.000.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.917.600 |
| CC 69028551 | MIRTHA YOLANDA BURBANO APRAEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 4.500.000 | $ 765.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 4.500.000 | $ 180.000 | 6,960 | $ 4.500.000 | $ 313.200 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 4.500.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.438.200 |
| CC 79891685 | BLADIMIR GACHARNA ACOSTA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 8.000.000 | $ 1.360.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 8.000.000 | $ 320.000 | 6,960 | $ 8.000.000 | $ 556.800 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 8.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.556.800 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 31.694.999 | $ 31.694.999 | $ 31.694.999 | $ 31.694.999 | $ 5.301.400 | $ 1.268.000 | $ 2.206.300 | $ 1.268.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.043.700 | $ 0 | $ 10.043.700 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

# CERTIFICA QUE:

**DANNY ALEXANDER BEDOYA ERAZO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.061.707.161**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 26 de Agosto del 2021.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**JHON FREDY URREA GUAUÑA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.061.740.703**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Agosto del 2021.

Cordialmente,

_____

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **AQUILINO DIAZ QUISTANCHALA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **76314220,** se encuentra afiliado/a desde **04/03/1994** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 30 de agosto de 2021.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Rosa Mercedes Niño Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

# ANEXO 8
# MINFRA-MN-IN-15-FR-14 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

| | FECHA DE ELABORACIÓN | 5 (Día) | 9 (Mes) | 21 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 2 **PERIODO MES:** jul/2021 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 121.792.968,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No : | 1006-2018 | PLAZO INICIAL: | 114 MESES | PLAZO ACUMULADO: | 114 MESES |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | FECHA DE INICIACIÓN: | 28/07/2021 | FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A. |
| CONTRATISTA: | MODULO2: Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. | FECHA DE REANUDACIÓN: | | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 30/08/2021 |
| SECTOR: | | VALOR INICIAL (incluido IVA) : | $ 300.149.391.398,00 | VALOR ADICIONALES: | |
| RUTA | VÍA 2002 | VALOR ACUMULADO: | $ 300.149.391.398,00 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO: | $ - |
| TRAMO: | PR0+000 AL PR1 10+000 | ANTICIPO CONCEDIDO: | $ - | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | 990-2021 | INTERVENTOR: | CONSORCIO ICAYECO 189 | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON |

## I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

**CONTRATO DE OBRA**

| Contrato No. | Plazo Acumulado | Fecha Vencimiento | Valor | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1006-2021 | 114 MESES | 31/08/2021 | $ 300.149.391.398 | $ 300.149.391.398,00 |
| TOTAL | | | | $ 300.149.391.398,00 |

**VIGENCIAS PRESUPUESTALES**

| Año | Valor |
|---|---|
| 2021 | $ 6.125.861.986 |
| 2022 | $ 18.376.470.588 |
| 2023 | $ 27.564.705.882 |
| 2024 | $ 13.782.352.941 |
| 2025 | $ 27.564.705.882 |
| 2026 | $ 36.752.941.176 |
| 2027 | $ 27.564.705.882 |
| 2028 | $ 41.347.058.824 |
| 2029 | $ 45.941.176.471 |
| 2030 | $ 55.129.411.766 |
| **Total** | **$ 300.149.391.398** |

**ANTICIPOS**

| | |
|---|---|
| **Otorgado $** | $ - |
| **Amortizado $** | $ - |
| **Saldo $** | $ - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Contrato No. | Plazo Acumulado | Fecha Vencimiento | Valor | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1531-2014 | 114 MESES | 31/08/2021 | $ 46.719.707.260,00 | $ 46.719.707.260,00 |
| **TOTAL** | **CIENTO CATORCE (114)MESES** | | | **$ 46.719.707.260,00** |

3

| | Inversión Programada (P) | INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) | | | E/P | Costos de Intervent (I) | C/B | I/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obra (B) | Ajustes (A) | Total (C=A+B) | | | | |
| **En el mes:** | $ 273.633.314 | $ 122.682.994 | | $ 122.682.994 | 0,45 | $ 141.983.708 | 1,00 | 1,157 |
| **Acumulado:** | $ 301.729.528 | $ 150.984.526 | | $ 150.984.526 | 0,50 | $ 216.488.644 | 1,00 | 1,434 |

| | E/V | Meses Ejecutados | Plazo Ejecutado/Total | Meses Faltantes | Saldo Contrato | Plazo Adicional Estimado | Presupuesto disponible | Valor Programado para los meses faltantes del año. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | 1,00 | 1,0 | 114 | 113 | $ 299.998.406.872 | | $ 299.998.406.872,00 | $ 299.998.406.872,00 |
| **Interventor:** | 1,00 | 1 | 114 | 113 | $ 46.503.218.616 | | $ 46.503.218.616,00 | $ 46.503.218.616,00 |

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| Sección | Metros |
|---|---|
| Corona: | |
| Calzada: | |
| Bermas: | |
| Sub base: | |
| Base: | |
| Carpeta: | |

Observaciones: El contratista se encuentra en etapa de preconstruccion y ha realizado entregas de los estudios dada la necesidad de establecer criterios base para los diseños y asi adoptar los diseños para la etapa de construcción

| *OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | Valor sin IVA |
|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0,00 |
| GESTIÓN PREDIAL | 0,00 |
| GESTIÓN SOCIAL | 0,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL | 0,00 |
| OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN | 0,00 |
| **VALOR TOTAL** | 0,00 |

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


**CONVENCIONES:** Programado: Ejecutado:

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSION | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | 5 (Día) | 9 (Mes) | 21 (Año) |
| **UNIDAD EJECUTORA:** | **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** | **CAUCA** | **ACTA No:** | **2** | **PERIODO MES:** | **jul/2021** | **VALOR BÁSICO ACTA:** | **$** | **121.792.968,00** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No : | 1006-2018 | PLAZO INICIAL: | 114 MESES | PLAZO ACUMULADO: | 114 MESES |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | FECHA DE INICIACIÓN: | 28/07/2021 | FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A. |
| CONTRATISTA: | MODULO2: Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. | FECHA DE REANUDACIÓN: | | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 30/08/2021 |
| SECTOR: | | VALOR INICIAL (incluido IVA) : | $ 300.149.391.398,00 | VALOR ADICIONALES: | |
| RUTA | VÍA 2002 | VALOR ACUMULADO: | $ 300.149.391.398,00 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO: | $ - |
| TRAMO: | PR0+000 AL PR1 10+000 | ANTICIPO CONCEDIDO: | $ - | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | 990-2021 | INTERVENTOR: | CONSORCIO ICAYECO 189 | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON |

**A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A**

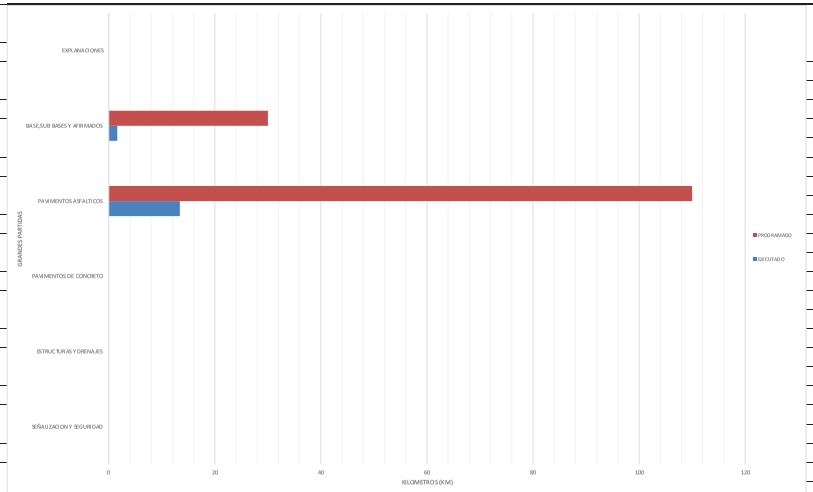


| ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP) | Programado (Km-mes) | Ejecutado (Km-mes) | Programado Acumulado (PA) | Ejecutado Acumulado (EA) (Km) | EA / PA | INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | En el mes | | Acumulado | |
| | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| EXPLANACIONES | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | $ - | $ - | $ 22.081.956,04 | $ 9,10 |
| BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS | 0 | 0,0000 | 30,0000 | 1,6000 | 5,33% | $ 273.633,31 | $ 121.792,97 | $ 301.729,53 | $ 150.984,53 |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS | 6 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 100,00% | $ 28.096,21 | $ 28.096,21 | $ 28.096,21 | $ 28.096,21 |
| PAVIMENTOS DE CONCRETO | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | $ - | $ - | $ 38.454.738,73 | $ - |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | $ - | $ - | $ 67.541.193,27 | $ - |
| SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | $ - | $ - | $ 2.600.888,38 | $ - |
| OBRAS VARIAS | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | $ - | $ - | $ 3.528.428,20 | $ - |
| TRANSPORTES | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | $ - | $ - | $ 24.377.548,70 | $ - |
| | | | | | | $ 301.729,53 | $ 149.889,18 | $ 239.068.605,41 | $ 179.089,84 |

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.

Firma
Nombre: BLADIMIR GACHARNÁ ACOSTA
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-094656

Firma
Nombre: ELSA CAIIA CAMPO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 1920 19202-01710 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias.: Interventor, Dirección Territorial.

# ANEXO 9
# MINFRA-MN-IN-15-FR-15
# SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.** 1006 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBATIAN 064

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ),DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

**FECHA DE INICIO:** 28/06/2021

**PLAZO INICIAL:** 114 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/08/2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 300.149.391.398,00

**VALOR ADICIONAL:**

**VALOR ACUMULADO:** $ 300.149.391.398,00 (Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 2.052.750.000,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 2.052.750.000,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** ONSORCIO ICAYECO 189

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | | | |
| Calidad de Estudios y Diseños | | | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | | |
| Otros | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:**

**Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:** Anexo N°0 11/06/2021

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:**

Firma

Nombre: Elsa Campo Lopez
Directora de Interventoria
Matrícula No. 1920201710CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.** 1006 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBATIAN 064

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ),DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

**FECHA DE INICIO:** 28/06/2021

**PLAZO INICIAL:** 114 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/08/2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 300.149.391.398,00

**VALOR ADICIONAL:**

**VALOR ACUMULADO:** $ 300.149.391.398,00 (Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 2.052.750.000,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 2.052.750.000,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** ONSORCIO ICAYECO 189

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | $ 9.341.409.728 | 9 6 2021 | 31 12 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | $ 3.800.000.000- | 9 6 2021 | 31 12 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | $ 18.682.819.456 | 9 6 2021 | 31 12 2028 |
| Calidad de Estudios y Diseños | | $ 615.825.000 | 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementac | 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementac |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | | $ 28.024.229.184 | Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría. | Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría. |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 400033869

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Nacional de seguros S.A.

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 4.670.704.864,00 | 9 6 2021 | 31 12 2025 |
| Otros | | | Día Mes Año | Día Mes Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 33867 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Nacional de seguros S.A.

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE** | CÓDIGO | | | |
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** | | | | |
| | **DIRECCION DE CONTRATACION** | VERSIÓN | | | |
| | **ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA** | PAGINA | 1 | DE | 1 |
| **UNIDAD EJECUTORA:** | DIRECCIÓN TÉCNICA. | | | | |

**CONTRATO 1006 DE 2021**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 NIT. 901.476.491-4 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 9/06/2021 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 31/08/2021 |
| **PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:** | N/A |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO**: | $ 300.149.391.398,00 |
| **VALOR ADICIONAL:** N/A | **No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** 467521 del 11/6/2021 por la suma de $ 6.125.861.986, vigencia 2021. |
| **DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:** | Contrato Principal 1006 de 2021 |

**VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Póliza Única de Cumplimiento No:** 400033869 | **Anexo o modificatorio N°:** 0 del 11/6/2021 | **Aseguradora:** | **Nacional de seguros S.A.** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.** | **Desde:** | 9/06/2021 | **Hasta:** | 31/12/2025 | **Valor:** | $ 9.341.409.728 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.** | **Desde:** | 9/06/2021 | **Hasta:** | 31/12/2025 | **Valor:** | $ 3.800.000.000 (De acuerdo a Memorando DO-GGP 44047 del 22/6/2021) |
| **PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.** | **Desde:** | 9/06/2021 | **Hasta:** | 31/12/2028 | **Valor:** | $ 18.682.819.456 |
| **ESTABILIDAD DE LA OBRA.** | Nota de Vigencia: Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría. | | | | **Valor:** | $ 28.024.229.184 |
| **CALIDAD AJUSTES Y DISEÑOS.** | Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños. | | | | **Valor:** | $ 615.825.000 |

# DO-GGP 33165

Bogotá D. C., 28 de junio de 2021

Doctor
**CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS**
Representante Legal
CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064
Carrera 16 # 97 – 46, Oficina 203
57-1) 7427374
admon@alcaing.com; licitaciones@alcaing.com; lizeth.eulegelo@alcaing.com; licitaciones@intramaq.com; licitaciones@
Bogotá

**Asunto:** Orden de Inicio Contrato de obra No.1006 del 2021 CORREDOR DEL PALETARÁ (Solución sostenible parque natural Puracé).

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del Contrato de Obra No.1006 del 2021, cuyo objeto es: *"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2."*, le informo lo siguiente:

1. A partir del 28 de junio del 2021 se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

2. El contrato cuenta con Registro Presupuestal No.467521 de fecha 11 de junio del 2021, y con Aprobación de las Garantías exigidas mediante memorando correo electrónico de fecha 23 de junio del 2021.

3. Para el control y vigilancia de las obras a ejecutar, el INVIAS contrató a la firma CONSORCIO ICAYECO 189, con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Dirección: Carrera 7A No. 124 – 93, Bogotá. Teléfono fijo/celular: + (571) 704 27 82. Y correo electrónico: ajdiaz@ayesa.com; idpina@ayesa.com ; licitacionescopeba@gmail.com

# DO-GGP 33165

4. El INVIAS designó mediante oficio DO 32799 del 25 de junio del 2021 al ingeniero VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA como Gestor Técnico de Proyecto, Teléfono fijo/celular: 3216402809 y correo electrónico: vgutierrez@invias.gov.co

Atentamente,

**DIANA KARINA ANGARITA CASTRO**
Coordinadora Gerencia Grandes Proyectos

C.C. INVIAS - SUBDIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL
INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

Proyecto: DAGOBERTO LINAN

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527 - 9

www.nacionaldeseguros.com.co

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.

**DIRECCIÓN GENERAL** CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

**TELÉFONO** 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOGOTÁ D.C. | 11 | BOGOTA | 30 | 400033869 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 6 / 8 / 2021 | 28 / 6 / 2021 | 00:00 | 31 / 12 / 2030 | 00:00 | MODIFICACIÓN | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NIT | 901.476.491 - 4 |
| DIRECCIÓN | CRA 16 N. 97 46, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7427374 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NIT | 901.476.491 - 4 |
| DIRECCIÓN | CRA 16 N. 97 46, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7427374 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 7056000 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 | TELÉFONO | 7056000 |

**OBJETO DEL SEGURO**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE INICIO DE 28 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA LA VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.
LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO N 1006 DE 2021 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ),

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/06/2021 | 31/12/2025 | 9.341.409.728.00 | 0,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/06/2021 | 31/12/2028 | 18.682.819.456.00 | 0,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 28/06/2021 | 31/12/2025 | 3.800.000.000.00 | 0,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 31/12/2025 | 31/12/2030 | 28.024.229.184.00 | 0,00 |
| CALIDAD DE LOS ESTUDIOS | 31/12/2025 | 31/12/2030 | 615.825.000.00 | 0,00 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Día - Mes - Año |
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 07/08/2021 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 60.464.283.368,00 | SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PES |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| ARKA BENEFICIOS LTDA | 40198 | 50,00 | | | |
| RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 2134 | 50,00 | | | |

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**

Nacional de seguros S.A.
20012012-1345-P-05-CumEstGU10000021
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400033869 | 1 | BOGOTÁ D.C. | 6 /8 /2021 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 28 /6 /2021 | 00:00 Horas del 31 /12 /2030 | MODIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN GENERAL** | CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
| **TELÉFONO** | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NIT | 901.476.491 - 4 |
| DIRECCIÓN | CRA 16 N. 97 46, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7427374 |
| ASEGURADO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN | CRA 59 N. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7056000 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | NIT | 800.215.807 - 2 |
| DIRECCIÓN | CRA 59 N. 26-60, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7056000 |

DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2,

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 CONFORMADO POR:
INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S NIT. 900.102.268-1 PARTICIPACION 20%
HORACIO VEGA CÁRDENAS NIT. 91.209.970-1 PARTICIPACION 20%
ALCA INGENIERÍA S.A.S NIT.: 830.089.381-5 PARTICIPACION 35%
ICM INGENIEROS S.A.S NIT. 800.231.021-8 PARTICIPACION 25%

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA

********** **FIN PÓLIZA** **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 07/08/2021 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 6 DE 2021



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**


**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400033869, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
NIT : 901.476.491 - 4
Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 06 días del mes de Agosto de 2021.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527 - 9

www.nacionaldeseguros.com.co

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.

**DIRECCIÓN GENERAL** CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

**TELÉFONO** 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOGOTÁ D.C. | 11 | BOGOTA | 15 | 400033867 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 6 / 8 / 2021 | 28 / 6 / 2021 | 00:00 | 31 / 12 / 2025 | 00:00 | MODIFICACIÓN | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NIT | 901.476.491 - 4 |
| DIRECCIÓN | CRA 16 N. 97 46, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7427374 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NIT | 901.476.491 - 4 | TELÉFONO | 7427374 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 4.670.704.864,00 | 4,670,704,864.00 | 4.670.704.864,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 4.670.704.864,00 | 4,670,704,864.00 | 4.670.704.864,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 4.670.704.864,00 | 4,670,704,864.00 | 4.670.704.864,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 4.670.704.864,00 | 4,670,704,864.00 | 4.670.704.864,00 | 0,00 |

**DEDUCIBLES**

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | Día - Mes - Año 03/07/2021 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 4.670.704.864,00 | CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| ARKA BENEFICIOS LTDA | 40198 | 50,00 | | | |
| RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 2134 | 50,00 | | | |

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

**CANALES DE ATENCIÓN:**
Calle 94 # 11-30 Piso 4.
(057 1) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

**Pague en línea en:**
www.nacionaldeseguros.com.co

**DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:**
Defensor principal: Liliana Otero
Defensor suplente: Sara Garcés
Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.
(057 1) 217 4707
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com



Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
20012012-1345-P-06-RCE20000010001

**DIRECCIÓN GENERAL** CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
**TELÉFONO** 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400033867 | 2 | BOGOTÁ D.C. | Día - Mes - Año 6 8 2021 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 28 6 2021 | 00:00 | 31 12 2025 | 00:00 | MODIFICACIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NIT | 901.476.491 - 4 |
| DIRECCIÓN | CRA 16 N. 97 46, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 7427374 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | NIT | 901.476.491 - 4 | TELÉFONO | 7427374 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE INICIO DE 28 DE JUNIO DE 2021 SE AJUSTA LA VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.
LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL DESARROLLO DELCONTRATO N 1006 DE 2021 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

TOMADOR Y O AFIANZADO: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 CONFORMADO POR:
INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S NIT. 900.102.268-1 PARTICIPACION 20%
HORACIO VEGA CÁRDENAS NIT. 91.209.970-1 PARTICIPACION 20%
ALCA INGENIERÍA S.A.S NIT.: 830.089.381-5 PARTICIPACION 35%
ICM INGENIEROS S.A.S NIT. 800.231.021-8 PARTICIPACION 25%

ASEGURADO: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

********** **FIN PÓLIZA** **********

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400033867 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 03/07/2021 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 6 DE 2.021

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

# ANEXO 10
# MINFRA-MN-IN-6-FR-1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-2-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 14 | 7 | 2021 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA** GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 1006 **DE** 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

**OBJETO DEL CONTRATO:** "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 **DE** 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**JUSTIFICACIÓN:**
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | VR. MES 1 JULIO 2021 | VR. MES 2 AGOSTO 2021 | VR. MES 3 SEPTIEMBRE 2021 | VR. MES 4 OCTUBRE 2021 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ETAPA PRECONTRACTUAL**<br>Estudios y Diseños- Mantenimiento-Construción | | | | | | % |
| 1.1 | Pago materiales , combustible y transporte. | $ 500,000,000.00 | $ 670,000,000.00 | $ 290,000,000.00 | $ 361,115,538.19 | $ 1,821,115,538.00 | 47.92% |
| 1.2 | Pago repuestos de maquinaria y compra de maquinaria-equipos adicionales al equipo minimo propuesto. | $ 310,000,000.00 | $ 140,000,000.00 | $ 75,000,000.00 | $ 45,000,000.00 | $ 570,000,000.00 | 15.00% |
| 1.3 | Pago de Salarios, jornales y gastos operacionales | $ 100,000,000.00 | $ 120,000,000.00 | $ 90,000,000.00 | $ 90,000,000.00 | $ 400,000,000.00 | 10.53% |
| 1.4 | Pago Estudios y Diseños e implementación del protocolo de bioseguridad | $ 600,000,000.00 | $ 200,000,000.00 | $ 100,000,000.00 | $ 100,000,000.00 | $ 1,000,000,000.00 | 26.32% |
| 1.5 | Gravamen y movimientos financieros (4*1000) | $ 2,400,000.00 | $ 3,160,000.00 | $ 1,520,000.00 | $ 1,804,462.15 | $ 8,884,462.00 | 0.23% |
| TOTAL | | $ 1,512,400,000.00 | $ 1,133,160,000.00 | $ 556,520,000.00 | $ 597,920,000.00 | $ 3,800,000,000.00 | 100.00% |

**NOTAS:**
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)
**CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
Matricula No.:25202-40138 CND

(Firma)
**FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CONSORCIO ICAYECO 189
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | |
| | **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | PÁGINA | 1 | DE 1 |

CONTRATO No: 1006 de 2021

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | X | 1.6% | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 467521 | RUBRO No.: | C-2401-0600-113-0-2401008-02 | RECURSO No. | 54 | VALOR AFECTADO | $ 3,800,000,000.00 |
| No. COMPROMISO: | | RUBRO No.: | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No.: | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | $ 3,800,000,000.00 |

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc...)

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
**VICTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA**
1720212-24682 CLD

FOLIO 163

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° 1006 DE 2021 Contratista: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

Objeto del Contrato : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ),DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

Acta N° _____ Valor basico $ 3.772.432.225,00 Período _____

Valor Incluido Iva _____ $ 3.800.000.000,00

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | POPAYAN-PATICO-PALETARA-SAN JOSE DE ISNOS | | | $ 3.800.000.000,00 | $ 3.800.000.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$ 3.800.000.000,00** | **$ 3.800.000.000,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | CAUCA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 817.005.0280 – 2 | MUNICIPIO 1 | POPAYAN | $ 1.400.000.000 | $ 1.389.843.451 |
| 891.500.721-0 | MUNICIPIO 2 | PURACE | $ 1.600.000.000 | $ 1.588.392.516 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 3.000.000.000** | **$ 2.978.235.967** |

| NIT | HUILA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800097098-1 | MUNICIPIO 1 | ISNOS | $ 800.000.000 | $ 794.196.258 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | **$ 800.000.000,00** | **$ 794.196.258,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS**
Representante Legal o su Apoderado
**Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064**
Matricula No.:25202-40138 CND

**FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ**
Representante Legal o su Apoderado
**Interventoria CONSORCIO ICAYECO 189**
C.E No :1175476

# ANEXO 11
# MINFRA-MN-IN-6-FR-1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MNPTA-MN-INVS-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 3 |

**UNIDAD EJECUTORA:** GRANDES PROYECTOS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO No:** 1006 de 2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 — **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** CORREDOR POPAYAN-PATICO-PALETARÁ-ISNOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA RUTA 2002
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 990 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / Valor programado / % Ejecutado / % Ejecutado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 |
| EXPLANACIONES | $22.091.956 | 9,237% | | % P | | | 0,0462% | 0,0300% | 0,0036% | 0,1000% | 0,1100% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0476 % | 0,0476% |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ 110.516,1 | $ 71.720,6 | $ 152.456,4 | $ 2.39.068,6 | $ 262.975,5 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 |
| | $0 | 0,000% | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE,SUBBASES Y ARRMADOS | $32.322.135 | 1,35% | | % P | | | 0,0920% | 0,0460% | 0,1600% | 0,2200% | 0,2200% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,1035% | 0,1035% | 0,1035% | 0,1035% | 0,1035% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,0797 % | 0,0797% |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ 523.951,1 | $ 95.627,4 | $ 430.323,5 | $ 0.25.950,9 | $ 525.950,9 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 247.543,6 | $ 247.543,6 | $ 247.543,6 | $ 247.543,6 | $ 247.543,6 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 |
| | $0 | 0,0% | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS | $48.161.717 | 2,0,1% | | % P | | 0,0116% | | | | 0,2382% | 0,2020% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,1110% | 0,1110% | 0,1110% | 0,1110% | 0,1110% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0876% | 0,1166% | 0,1166% | 0,1166% | 0,1166% | 0,1166% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,0637% | 0,0637% |
| | | | | $ P | $ - | $ 28.096,2 | $ - | $ - | $ - | $ 0.99.975,3 | $ 597.677,8 | $ 266.460,0 | $ 209.460,0 | $ 266.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 266.460,0 | $ 266.460,0 | $ 266.565,4 | $ 266.565,4 | $ 266.565,4 | $ 266.565,4 | $ 266.565,4 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 266.460,0 | $ 265.627,2 | $ 265.627,2 | $ 265.627,2 | $ 265.627,2 | $ 265.627,2 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 |
| | $0 | 0,0% | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTOS DE CONCRETO | $38.454.739 | 16,09% | | % P | | | | | | | | | | | | | | | 0,0396% | 0,1035% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1593% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2390% |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 95.209,1 | $ 247.543,6 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 577.693,3 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 |
| | $0 | 0,0% | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $67.541.193 | 28,25% | | % P | | | | 0,1769% | 0,1200% | 0,0131% | 0,1964% | 0,1196% | 0,1196% | 0,1196% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1196% | 0,1196% | 0,1196% | 0,1196% | 0,1196% | 0,1196% | 0,1196% | 0,1196% | 0,1196% | 0,1593% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,0717% | 0,0717% |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ - | $ 422.660,0 | $ 286.862,3 | $ 31.945,4 | $ 497.106,1 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 380.836,3 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 |
| | $0 | 0,0% | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | $2.603.889 | 1,1% | | % P | | | | | | | 0,0110% | | | | 0,0080% | | 0,0080% | | 0,0080% | 0,0080% | 0,0080% | 0,0080% | 0,0080% | | 0,0096% | | 0,0096% | | 0,0096% | | 0,0096% | 0,0096% | 0,0096% | 0,0096% | 0,0096% | 0,0064% | 0,0064% |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 23.906,9 | $ - | $ - | $ - | $ 19.041,8 | $ - | $ 19.041,8 | $ - | $ 19.041,8 | $ - | $ 19.041,8 | $ 19.041,8 | $ 19.041,8 | $ 19.041,8 | $ - | $ 22.850,2 | $ - | $ 22.850,2 | $ - | $ 22.850,2 | $ - | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ 15.233,5 | $ 15.233,5 |
| | $0 | 0,0% | | $ E | | | | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS VARIAS | $3.528.428 | 1,5% | | % P | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0398% | | | | | 0,0212% | | | | | | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | | |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 95.209,1 | $ - | $ - | $ - | $ 50.629,0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38.083,6 | $ 38.083,6 | $ 38.083,6 | $ - | $ - |
| | $0 | 0,0% | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTES | $24.377.549 | 10,2% | | % P | | | 0,0462% | 0,0300% | 0,1036% | 0,1100% | 0,1100% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0837% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0476 % | 0,0476% |
| | | | | $ P | $ - | $ - | $ 110.516,1 | $ 86.767,2 | $ 248.083,8 | $ 4.06.416,6 | $ 406.416,6 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 266.460,0 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 |
| | $0 | 0,0% | | $ E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BASICO DE OBRA ( A ) | $239.068.605 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | 0,00% | 0,01% | 0,11% | 0,27% | 0,47% | 0,74% | 0,98% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,49% | 0,50% | 0,61% | 0,65% | 0,65% | 0,87% | 0,61% | 0,62% | 0,63% | 0,86% | 0,69% | 0,79% | 0,76% | 0,85% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,38% | 0,38% |
| | VALOR (Miesde Pesos) | | $ - | $ 28.096,2 | $ 273.633,3 | $ 650.000,2 | $ 1.117.746,0 | $ 1.772.356,8 | $ 2.284.029,5 | $ 971.132,5 | $ 971.132,5 | $ 971.132,5 | $ 1.085.383,4 | $ 1.066.341,6 | $ 1.085.383,4 | $ 1.161.950,7 | $ 1.199.634,3 | $ 1.447.177,9 | $ 1.542.387,0 | $ 1.542.387,0 | $ 1.593.015,9 | $ 1.466.219,7 | $ 1.489.069,9 | $ 1.504.303,3 | $ 1.584.279,8 | $ 1.657.899,3 | $ 1.793.738,9 | $ 1.808.972,4 | $ 2.022.240,7 | $ 2.155.533,4 | $ 2.155.533,4 | $ 2.155.533,4 | $ 2.161.971,2 | $ 910.198,7 | $ 910.198,7 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | 0,00% | 0,01% | 0,13% | 0,40% | 0,87% | 1,61% | 2,58% | 2,97% | 3,37% | 3,78% | 4,24% | 4,68% | 5,14% | 5,62% | 6,12% | 6,73% | 7,37% | 8,02% | 8,88% | 9,50% | 9,92% | 10,55% | 11,21% | 11,91% | 12,68% | 13,41% | 14,26% | 15,16% | 16,06% | 16,96% | 17,87% | 18,25% | 18,63% |
| | VALOR (Miesde Pesos) | | $ - | $ 28.096 | $ 301.730 | $ 951.730 | $ 2.069.476 | $ 3.841.832 | $ 6.125.862 | $ 7.096.995 | $ 8.068.127 | $ 9.039.260 | $ 10.124.643 | $ 11.190.985 | $ 12.276.368 | $ 13.437.919 | $ 14.637.553 | $ 16.084.731 | $ 17.627.118 | $ 19.169.505 | $ 20.762.521 | $ 22.228.741 | $ 23.717.810 | $ 25.222.114 | $ 26.806.393 | $ 28.464.296 | $ 30.258.025 | $ 32.066.997 | $ 34.089.238 | $ 36.244.771 | $ 38.400.304 | $ 40.555.838 | $ 42.717.809 | $ 43.628.008 | $ 44.538.207 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miesde Pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miesde Pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

| PROVISIONES* | VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO |
|---|---|
| PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $ 35.010.277 |
| PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA | $ 1.100.000 |
| PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 | $ 2.014.576 |
| REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 1.725.000 |
| IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 327.750 |
| GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) | $ 20.079.183 |
| PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | $ 324.000 |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) | $ 61.080.786 |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (A+B) | $300.149.391.398 |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (A'+B' ) | $300.149.391.398 |

**NOTAS:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPPy el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA ).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez se cuente el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**OBSERVACIONES:**

Firma: _____
Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES BOLIVAR
Apoderado Representante legal CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
Matrícula No.: 23202-401310 CND

Revisó Firma: _____
Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-40638 CAU

Aprueba Firma: _____
Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
Representante legal CONSORCIO ICAYECO 189
CE No 5175476

Revisó Firma: _____
Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial Cauca
Matrícula No.: 19202-40638 CAU

Aprueba Firma: _____
Nombre: DIANA KARINA ANSARITA CASTRO
TP 142789CSJ
JEFE UNIDAD EJECUTORA
COORDINADORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

Revisó Firma: _____
Nombre: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
Gestor Tecnico de Proyectos
Matrícula No.: 17202-124882 CAU

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Director Territorial

| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 |
| 0,0476% | 0,0476 % | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0558% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0959% | 0,0958% |
| $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 | $ 133.292,7 |
| 0,0797% | 0,0797 % | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1792% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,1274% |
| $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 418.919,9 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 304.669,0 |
| 0,0637% | 0,0637 % | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0876% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1513% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1513% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0876% | 0,1195% | 0,1195% |
| $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 209.460,0 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 381.784,5 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 381.784,5 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 209.460,0 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 |
| 0,0637% | 0,0637 % | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,0637% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2416% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2655% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1593% | 0,1593% |
| $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 152.334,5 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 577.692,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 654.826,8 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 |
| 0,0717% | 0,0717 % | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1593% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,2101% | 0,2101% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2549% | 0,2549% | 0,3188% | 0,3505% | 0,3505% | 0,3505% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1593% | 0,1991% |
| $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 380.836,3 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 514.128,0 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 609.336,1 | $ 609.336,1 | $ 761.670,2 | $ 837.836,8 | $ 837.836,8 | $ 837.836,8 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 380.836,3 | $ 476.045,4 |
| 0,0064% | 0,0064 % | 0,0064% | 0,0064% | 0,0064% | 0,0064% | 0,0064% | 0,0064% | 0,0064% | 0,0064% | | 0,0096% | | 0,0096% | | 0,0096% | | 0,0096% | 0,0096% | 0,0096% | 0,0096% | 0,0096% | | | 0,0119% | | 0,0119% | | 0,0119% | | 0,0119% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | | 0,0096% | | 0,0096% | | 0,0096% |
| $ 15.233,5 | $ 15.233,5 | $ 15.233,5 | $ 15.233,5 | $ 15.233,5 | $ 15.233,5 | $ 15.233,5 | $ 15.233,5 | $ 15.233,5 | $ 15.233,5 | $ - | $ 22.850,2 | $ - | $ 22.850,2 | $ - | $ 22.850,2 | $ - | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ - | $ - | $ 28.562,7 | $ - | $ 28.562,7 | $ - | $ 28.562,7 | $ - | $ 28.562,7 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ - | $ 22.850,2 | $ - | $ 22.850,2 | $ - | $ 22.850,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,0080% | 0,0080% | 0,0072% | | | | | | | | | 0,0159% | 0,0159% | 0,0159% | 0,0159% | | 0,0159% | | | | | | | 0,0159% | 0,0159% | 0,0319% | 0,0319% | 0,0319% | 0,0319% | | | | | | |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 19.041,9 | $ 19.041,9 | $ 17.175,1 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38.083,8 | $ 38.083,8 | $ 38.083,8 | $ 38.083,8 | $ - | $ 38.083,8 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38.083,8 | $ 38.083,8 | $ 38.083,8 | $ 76.167,3 | $ 76.167,3 | $ 76.167,3 | $ 76.167,3 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,0476% | 0,0476 % | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0476% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0876% | 0,0797% | 0,1200% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0876% | 0,0797% | 0,1201% | 0,0797% |
| $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 114.250,9 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 209.460,0 | $ 190.416,1 | $ 286.882,3 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 193.416,1 | $ 190.416,1 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 190.416,1 | $ 190.416,1 | $ 209.460,0 | $ 190.416,1 | $ 286.882,3 | $ 190.416,1 |

| 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,61% | 0,62% | 0,63% | 0,66% | 0,69% | 0,70% | 0,70% | 0,85% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,80% | 0,83% | 0,86% | 0,87% | 0,94% | 0,99% | 1,00% | 1,01% | 1,17% | 1,23% | 1,29% | 1,27% | 0,61% | 0,62% | 0,63% | 0,68% | 0,69% | 0,75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 910.198,7 | $ 910.198,7 | $ 910.198,7 | $ 910.198,7 | $ 910.198,7 | $ 910.198,7 | $ 910.198,7 | $ 929.240,5 | $ 929.240,5 | $ 927.374,5 | $ 1.466.219,7 | $ 1.489.069,9 | $ 1.504.303,3 | $ 1.584.279,0 | $ 1.657.993,0 | $ 1.793.739,9 | $ 1.808.972,4 | $ 2.022.240,7 | $ 2.155.533,4 | $ 2.155.533,4 | $ 2.155.533,4 | $ 2.161.971,2 | $ 1.923.323,3 | $ 1.989.869,8 | $ 2.056.516,0 | $ 2.085.078,7 | $ 2.246.934,1 | $ 2.370.705,9 | $ 2.380.236,8 | $ 2.408.789,5 | $ 2.791.946,7 | $ 2.989.964,9 | $ 2.989.964,9 | $ 3.034.097,4 | $ 1.466.219,7 | $ 1.489.069,9 | $ 1.504.303,3 | $ 1.584.279,0 | $ 1.657.993,0 | $ 1.793.739,9 |
| 19,01% | 19,39% | 19,77% | 20,15% | 20,53% | 20,91% | 21,29% | 21,68% | 22,07% | 22,46% | 23,07% | 23,70% | 24,33% | 24,99% | 25,68% | 26,43% | 27,19% | 28,03% | 28,94% | 28,94% | 30,74% | 31,64% | 32,45% | 33,28% | 34,14% | 35,01% | 35,95% | 36,94% | 37,94% | 38,95% | 40,12% | 41,37% | 42,62% | 43,89% | 44,90% | 45,13% | 45,70% | 46,42% | 47,11% | 47,86% |
| $ 45.448,40 | $ 46.358,60 | $ 47.268,80 | $ 48.179,00 | $ 49.089,20 | $ 49.999,39 | $ 50.909,59 | $ 51.838,80 | $ 52.768,00 | $ 53.695,40 | $ 55.161,67 | $ 56.650,74 | $ 58.155,04 | $ 59.739,32 | $ 61.397,32 | $ 63.190,99 | $ 64.999,92 | $ 67.022,17 | $ 69.177,70 | $ 71.333,23 | $ 73.488,77 | $ 75.650,74 | $ 77.573,96 | $ 79.563,84 | $ 81.620,36 | $ 83.705,42 | $ 85.952,36 | $ 88.323,09 | $ 90.703,29 | $ 93.112,08 | $ 95.911,23 | $ 98.900,79 | $ 101.890,36 | $ 104.924,49 | $ 106.390,67 | $ 107.879,74 | $ 109.384,05 | $ 110.968,33 | $ 112.626,22 | $ 114.419,86 |

Firma:
Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES HIZCIROS
Apoderado Representante legal CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
Matricula No.: 25203-401310 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
Representante legal CONSORCIO ICAYECO 189
C.E No. 5 17 5476

Aprueba Firma:
Nombre: DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
TP 142706 CSJ
JEFE UNIDAD EJECUTORA
COORDINADORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

Revisó Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula No.: 19202-40838 CAU

Revisó Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial Cauca
Matricula No.: 19202-40838 CAU

Revisó Firma:
Nombre: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
Gestor Tecnico de Proyecto
Matricula No.: 17302-124882 CAU

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-6-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 3 DE 3 |
| FECHA | 28 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año) |

**PROGRAMA DE INVERSIONES** [X] (Indicar con una X)

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

PLAZO INICIAL: 110 MESES y 3 DIAS (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES y 3 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de Agosto de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 300.149.391.398 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 300.149.391.398

| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 |
| 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0717% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% |
| $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 171.376,3 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 |
| 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,1274% | 0,0956% | 0,0956% | 0,0956% | 0,0956% | 0,0956% | 0,0956% |
| $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 304.669,0 | $ 228.501,8 | $ 228.501,8 | $ 228.501,8 | $ 228.501,8 | $ 228.501,8 | $ 228.501,8 |
| 0,1195% | 0,1195% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1274% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% |
| $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 304.669,0 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 |
| 0,1593% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2416% | 0,1991% | 0,1991% | 0,2151% | 0,2390% | 0,2390% | 0,2390% |
| $ 380.836,3 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 577.692,3 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 514.129,0 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 | $ 571.254,4 |
| 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1752% | 0,1991% | 0,2788% | 0,3584% | 0,3584% | 0,3584% |
| $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 418.919,9 | $ 476.045,4 | $ 666.463,5 | $ 856.881,6 | $ 856.881,6 | $ 856.881,6 |
| | 0,0096% | 0,0096% | 0,0096% | 0,0096% | 0,0096% | 0,0159% | 0,0159% | 0,0159% | 0,0159% | 0,0159% | 0,0159% |
| $ - | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ 22.850,2 | $ 38.083,6 | $ 38.083,6 | $ 38.083,6 | $ 38.083,6 | $ 38.083,6 | $ 38.083,6 |
| | | 0,0159% | 0,0159% | 0,0159% | 0,0159% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% |
| $ - | $ - | $ 38.083,6 | $ 38.083,6 | $ 38.083,6 | $ 38.083,6 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 |
| 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% |
| $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 |
| 0,76% | 0,85% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,80% | 0,85% | 0,95% | 1,05% | 1,05% | 1,05% |
| $ 1.808.972,4 | $ 2.022.240,7 | $ 2.155.533,4 | $ 2.155.533,4 | $ 2.155.533,4 | $ 2.161.971,2 | $ 1.904.181,4 | $ 2.037.474,1 | $ 2.265.975,9 | $ 2.513.519,5 | $ 2.513.519,5 | $ 2.513.519,5 |
| 48,62% | 49,46% | 50,36% | 51,27% | 52,17% | 53,07% | 53,87% | 54,72% | 55,67% | 56,72% | 57,77% | 58,82% |
| $ 116.228.935 | $ 118.251.176 | $ 120.406.709 | $ 122.562.243 | $ 124.717.776 | $ 126.879.747 | $ 128.783.929 | $ 130.821.403 | $ 133.087.379 | $ 135.600.898 | $ 138.114.418 | $ 140.627.937 |

| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 |
| 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,0797% | 0,1035% | 0,1035% | 0,1035% | 0,1035% | 0,1035% | 0,1035% |
| $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 190.418,1 | $ 247.543,6 | $ 247.543,6 | $ 247.543,6 | $ 247.543,6 | $ 247.543,6 | $ 247.543,6 |
| 0,0956% | 0,1354% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1115% | 0,1115% | 0,1115% | 0,1115% | 0,1115% | 0,1115% |
| $ 228.501,8 | $ 323.710,8 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 266.585,4 | $ 266.585,4 | $ 266.585,4 | $ 266.585,4 | $ 266.585,4 | $ 266.585,4 |
| 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1434% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% |
| $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 342.752,7 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 |
| 0,2788% | 0,2788% | 0,2788% | 0,2788% | 0,2788% | 0,2987% | 0,1832% | 0,1832% | 0,1832% | 0,1832% | 0,1832% | 0,1832% |
| $ 666.463,5 | $ 666.463,5 | $ 666.463,5 | $ 666.463,5 | $ 666.463,5 | $ 714.182,4 | $ 437.961,7 | $ 437.961,7 | $ 437.961,7 | $ 437.961,7 | $ 437.961,7 | $ 437.961,7 |
| 0,4381% | 0,4381% | 0,4381% | 0,4381% | 0,4381% | 0,4381% | 0,4460% | 0,4460% | 0,4460% | 0,4460% | 0,4460% | 0,4460% |
| $ 1.047.299,8 | $ 1.047.299,8 | $ 1.047.299,8 | $ 1.047.299,8 | $ 1.047.299,8 | $ 1.047.299,8 | $ 1.066.341,6 | $ 1.066.341,6 | $ 1.066.341,6 | $ 1.066.341,6 | $ 1.066.341,6 | $ 1.066.341,6 |
| 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0319% | 0,0319% | 0,0319% | 0,0319% | 0,0239% | 0,0239% |
| $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 76.167,3 | $ 76.167,3 | $ 76.167,3 | $ 76.167,3 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 |
| 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0263% | 0,0263% | 0,0263% | 0,0263% | 0,0263% | 0,0263% |
| $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 62.838,0 | $ 62.838,0 | $ 62.838,0 | $ 62.838,0 | $ 62.838,0 | $ 62.838,0 |
| 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,0876% | 0,1035% |
| $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 209.460,0 | $ 247.543,6 |
| 1,26% | 1,30% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,38% | 1,13% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,14% | 1,16% |
| $ 3.008.606,7 | $ 3.103.815,8 | $ 3.256.150,3 | $ 3.256.150,3 | $ 3.256.150,3 | $ 3.303.869,1 | $ 2.709.650,2 | $ 2.747.733,8 | $ 2.747.733,8 | $ 2.747.733,8 | $ 2.728.692,0 | $ 2.766.775,6 |
| 60,08% | 61,38% | 62,74% | 64,10% | 65,47% | 66,85% | 67,98% | 69,13% | 70,28% | 71,43% | 72,57% | 73,73% |
| $ 143.636.544 | $ 146.740.360 | $ 149.996.510 | $ 153.252.660 | $ 156.508.811 | $ 159.812.680 | $ 162.522.330 | $ 165.270.064 | $ 168.017.797 | $ 170.765.531 | $ 173.494.223 | $ 176.260.999 |

| 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 |
| 0,1354% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1800% | 0,1800% | 0,1800% | 0,1800% | 0,1800% | 0,1800% | 0,4582% |
| $ 323.710,8 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 430.323,5 | $ 430.323,5 | $ 430.323,5 | $ 430.323,5 | $ 430.323,5 | $ 430.323,5 | $ 1.095.318,5 |
| 0,1115% | 0,1115% | 0,1115% | 0,1115% | 0,1115% | 0,1115% | 0,1200% | 0,1200% | 0,1500% | 0,1500% | 0,2000% | 0,2000% | 0,8099% |
| $ 266.585,4 | $ 266.585,4 | $ 266.585,4 | $ 266.585,4 | $ 266.585,4 | $ 266.585,4 | $ 286.882,3 | $ 286.882,3 | $ 358.602,9 | $ 358.602,9 | $ 478.137,2 | $ 478.137,2 | $ 1.936.144,7 |
| 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1593% | 0,1600% | 0,2200% | 0,2500% | 0,4000% | 0,4000% | 0,4000% | 5,6831% |
| $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 380.836,3 | $ 382.509,8 | $ 525.950,9 | $ 597.671,5 | $ 956.274,4 | $ 956.274,4 | $ 956.274,4 | $ 13.586.551,5 |
| 0,1832% | 0,1832% | 0,1991% | 0,1991% | 0,1991% | 0,2395% | 0,2100% | 0,2500% | 0,3000% | 0,4000% | 0,4000% | 0,4000% | -2,8574% |
| $ 437.961,7 | $ 437.961,7 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 476.045,4 | $ 572.650,9 | $ 502.044,1 | $ 597.671,5 | $ 717.205,8 | $ 956.274,4 | $ 956.274,4 | $ 956.274,4 | $ (6.831.048,4) |
| 0,5177% | 0,5974% | 0,5974% | 0,5974% | 0,6372% | 0,7169% | 0,4500% | 0,5000% | 0,7000% | 0,7000% | 0,7000% | 0,7000% | 0,8670% |
| $ 1.237.717,9 | $ 1.428.136,1 | $ 1.428.136,1 | $ 1.428.136,1 | $ 1.523.345,2 | $ 1.713.763,3 | $ 1.075.808,7 | $ 1.195.343,0 | $ 1.673.480,2 | $ 1.673.480,2 | $ 1.673.480,2 | $ 1.673.480,2 | $ 2.072.670,1 |
| 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | 0,0239% | | | | | 0,0050% | 0,0050% | 0,0054% |
| $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ 57.125,4 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11.953,4 | $ 11.953,4 | $ 12.896,6 |
| 0,0263% | 0,0263% | 0,0263% | 0,0263% | 0,0263% | 0,0263% | 0,0330% | 0,0330% | 0,0330% | 0,0330% | 0,0330% | 0,0330% | 0,1365% |
| $ 62.838,0 | $ 62.838,0 | $ 62.838,0 | $ 62.838,0 | $ 62.838,0 | $ 62.838,0 | $ 78.892,6 | $ 78.892,6 | $ 78.892,6 | $ 78.892,6 | $ 78.892,6 | $ 78.892,6 | $ 326.305,0 |
| 0,1035% | 0,1035% | 0,1035% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1195% | 0,1100% | 0,1100% | 0,1100% | 0,1100% | 0,1100% | 0,1100% | 0,3240% |
| $ 247.543,6 | $ 247.543,6 | $ 247.543,6 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 285.627,2 | $ 262.975,5 | $ 262.975,5 | $ 262.975,5 | $ 262.975,5 | $ 262.975,5 | $ 262.975,5 | $ 774.675,8 |
| 1,26% | 1,36% | 1,38% | 1,40% | 1,44% | 1,56% | 1,26% | 1,41% | 1,72% | 1,97% | 2,03% | 2,03% | 5,43% |
| $ 3.014.319,2 | $ 3.261.862,8 | $ 3.299.946,4 | $ 3.338.030,1 | $ 3.433.239,1 | $ 3.720.262,8 | $ 3.019.436,5 | $ 3.378.039,4 | $ 4.119.152,1 | $ 4.716.823,6 | $ 4.848.311,3 | $ 4.848.311,3 | $ 12.973.513,9 |
| 74,99% | 76,35% | 77,73% | 79,13% | 80,57% | 82,12% | 83,39% | 84,80% | 86,52% | 88,49% | 92,55% | 94,57% | 100,00% |
| $ 179.275.318 | $ 182.537.181 | $ 185.837.127 | $ 189.175.157 | $ 192.608.397 | $ 196.328.659 | $ 199.348.096 | $ 202.726.135 | $ 206.845.287 | $ 211.562.111 | $ 221.246.780 | $ 226.095.091 | $ 239.068.605 |

100% 83,4% 66,7% 50,0% 33,4% 16,7% 0,0%

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | - - - - | —— |

Firma:
**Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES FIGUEROS**
**Apoderado Representante legal CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064**
**Matricula No.: 25202-40138 CND**

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó Firma:
**Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**
**Supervisor de Contrato de Interventoria**
**Matricula No.: 19202-40638 CAU**

Aprueba Firma:
**Nombre: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ**
**Representante legal CONSORCIO ICAYECO 189**
**C.E No :1175476**

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó Firma:
**Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**
**Director Territorial Cauca**
**Matricula No.: 19202-40638 CAU**

Aprueba Firma
**Nombre: DIANA KARINA ANGARITA CASTRO**
**TP 142786 CSJ**
**JEFE UNIDAD EJECUTORA**
**COORDINADORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS**

Revisó Firma:
**Nombre: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA**
**Gestor Técnico de Proyecto**
**Matricula No.: 17202-124682 CAU**

FOLIO 168

# ANEXO 12
# MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTAS DE COMITE DE OBRA

FECHA: 05 (Día) 08 (Mes) 2021 (Año)

**(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 03
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.** 1006 **DE** 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÈ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 **DE** 2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

| PARTICIPANTES | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | INVIAS |
| JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN | SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA | INVIAS |
| BLAS URIEL PÁEZ | PROFESIONAL | INVIAS |
| JUAN CARLOS OCHOA OSORIO | SUBDIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE | INVIAS |
| MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ | SUBDIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE | INVIAS |
| GUSTAVO EDUARDO REYES LÓPEZ | SUBDIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE | INVIAS |
| CRISTIAN CAMILO JIMÉNEZ | SUBDIRECCIÓN PREDIAL | INVIAS |
| ANGIE JULIET MILA DÍAZ | SUBDIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE | INVIAS |
| ELSA CAMPO LÓPEZ | DIRECTORA DE INTERVENTORÍA | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| IVÁN DARÍO PIÑA HERNÁNDEZ | DIRECTOR COMERCIAL | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| BLADIMIR GACHARNA | DIRECTOR DE OBRA | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 |
| CLAUDIA MUÑOZ | COORDINADORA | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

*** REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO**

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| | | |
|---|---|---|
| **Compromisos:** | **1 Inicio de obras** | Continúan con actividades de bacheo con asfalto- Jornadas "tapahuecos" |
| | **2 Instalación de vallas informativas** | Se cumplio, la instalación se realizo el 28 de julio de 2021 |
| | **3 Revisión parcial Diseños - Observaciones** | Se cumplio,se llevo a cabo reunión observaciones y requerimientos a Estudios y Diseños el 26 de julio de 2021 |
| | **4 Entrega de concepto mantenimiento PNN Purace** | Se cumple, con la entrega del concepto técnico intervención PNN el 26 de julio de 2021 |
| | **5 Equipo Mínimo Requerido** | No se cumple, a la fecha el contratista se encuentra en proceso de contratación de operarios |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

**A) ENTREGABLES REFERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONTRATO 1001 DE 2021**

**B) ESTUDIOS Y DISEÑOS**

**C) PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN**

**D) GESTIÓN PREDIAL**

**E) AMBIENTAL**

**F) OTROS**

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

**A) ENTREGABLES REFERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONTRATO 1006 DE 2021**

En el avance de los cumplimientos contractuales y de intervención la interventoría informa:

Hojas de vida del personal están Aprobadas, hojas de vida programa de reincorporación Aprobado, relación del equipo mínimo Cumple, Análisis de precio unitarios Cumple, Programa de obra Cumple, programa de inversiones Cumple, flujo de caja Cumple, Programa de generación de empleo Cumple, Instalaciones provisionales, falta adjuntar documentación para poder ser enviada al INVIAS, laboratorio y control de calidad se solicitaron ajustes con relación a los equipos de calibración, plan de calidad Cumple, plan de manejo de transito Cumple, instalación de vayas Cumple.

Se da la palabra al personal del contratista para que informe el estado el inicio de obra, respecto al mantenimiento y equipo en obra e inicio de las actividades de construcción

El contratista informa que el consorcio se encuentra en la fase de terminación de alistamiento de los equipos, esperan el día 7 de agosto, trasladar hasta la zona del parque Natural Puracé; Un Vibro compactador y Un Carrotanque y la Motoniveladora se espera trasladar a la zona para completar el equipo el día 8 de agosto de 2021, apara iniciar la conformación y cuneteo

Actualmente se esta dando continuidad a las actividades de parcheo (tapahuecos) entre el PR 0+000 al PR 8+000, y se tiene confirmado el suministro de la mezcla asfáltica para continuar con la actividad

Pregunta el supervisor que si reactivaron la actividad en el sector, a lo que el contratista informa que desde el día 6 de agosto se reiniciaría y va a continuara el día 7 de agosto.

La Interventoría solicita que los compromisos de las fechas queden en el acta para que haya una responsabilidad y se cumplan los compromisos.

**B) estudios y diseños**

El contratista entrego el diseño geométrico de los primeros 6 kilómetros donde informa la interventoría que se tienen observaciones de fondo por lo que se hará una reunión con los especialistas tanto del la interventoría como del contratista, la interventoría ha chequeado el diseño con loe quipos con que el contratista realizo el levantamiento donde se pudo observar que hay deficiencia en la precisión del levantamiento del corredor, por eso se programo la visita para verificar y sacar las conclusiones y tomar las medidas para solucionar el tema

La interventoría aclara que las decisiones que esta toma obedecen a única y exclusivamente a decisiones que estén sustentadas en aspectos técnicos que permitan demostrar que lo que se esta realizando se esta realizando correctamente.

El supervisor pregunta a la interventoría sobre los inconveniente en los estudios de diseño geométrico obedecen a un tema de calidad de información o que no se ha llegado a algún acuerdo en algún procedimiento constructivo y demás

La interventoría informa falencia en la calidad respecto a la topografía que se debe ajustar y con la visita del día de mañana de corroboraran en campo con las partes

El contratista pide la palabra y comenta que esta confirmada para el día de mañana la visita con los especialistas geométricos y de las topografías de las partes y solicita socializar en campo realizando las actividades en conjunto en cuanto a la topografía y la verificación del diseño geométrico y con base a lo chequeado se definirá si hay errores, el contratista informa que internamente ha realizado seguimientos internos y al parecer las actividades se ejecutaron correctamente, por eso solicita que las se realice el chequeo en campo y si se presenta algún error poder conjuntamente plantear una solución que es el objetivo de a visita para poder liberar los 3 primeros kilómetros

La interventoría manifiesta que el modelo de trabajo es realizando chequeos independientes y por eso se solicito la visita en campo para hacer lo que corresponda y se aclara que no se han aprobado los tres primero kilómetros debido a la revisión de los especialistas y los trabajos de campo no permiten aprobar es por eso dejar claro que la interventoría tiene sus tiempo y no se pueden aprobar, si no están de acuerdo a los requerimientos exigidos y es un proceso que se dirime en el campo estando las dos partes, asumiendo las responsabilidades si la interventoría esta mal ratificará y si el contratista esta mal tendrán que ajustar en los tiempos estipulados por ellos para entregar las correcciones.

La interventoría informa que esta haciendo las cosas con diligencia y ya depende de los tiempos que se tomen los contratistas son demasiado largos pero la interventoría realizara la revisión en el menor tiempo posible

**E) PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN**

Con relación a este punto, se realizo la reunión de socialización donde la interventoría participo, esta acorde a los tiempos

**F) GESTIÓN PREDIAL**

Interventoría hasta el momento en el corredor a intervenir en el no se contempla afectación predial ni en ella zona del parque y en los primeros 5 kilómetros de la zona de rehabilitación no se ha definido a la fecha, se esta a la espera que se haga entrega de los estudios y diseños por parte del contratista de mirara si hay requerimientos se adelantara el correspondiente procedimiento predial.

Por parte de la entidad contratante tiene una duda respectos a la gestión predial adelantada en otros contratos del mismo corredor, que si existen pasivos prediales o predios que estén en expropiación o predios que tengan algún tipo de conflicto sobre el corredor vial para para esta modalidad de legalidad .

Interventoría indica que el tema de Popayán a Coconuco es una rehabilitación del corredor existente , a la fecha solo se tiene establecida la topografía de los primeros 5 kilómetros y no se ha definido cual va a ser el alcance para la aprobación de los estudios y diseños y si se requiere alguna aplicación o sobreancho, para mejorar, aparentemente a la fecha se pueden observar unos dos o tres sitios específicos se tendrá una afectación predial, pero no se ha podido definir , y en el sector del parque que es donde se tienen los otros 30 kilómetros, como es un parque no hay una gestión predial.

En la parte del Huila en el tramo que esta incluido en el contrato si se considera que puede haber una afectación predial.

Contratista en el corredor no hay pasivos prediales del 27+890 al 93+373, pero 93+373 al 98+400 si se debe hacer trabajo predial en el sector .

La entidad contratante pregunta que si se ha visualizado una afectación predial en la zona del Huila

Contratista , hasta el momento no debido que hasta la fecha se vienen adelantando los estudios y diseños entre el PR0+000 al PR27 y el sector del Parque Natural.

La entidad contratante, entonces teniendo en cuenta lo expresado no sabe hasta que punto la interventoría tenga que solicitar hojas de vida de Longa y Hojas de vida de peritos, puesto que la interventoría debe contratar un gestos voluntario, debe gestionar la lonja y la consecución de los peritos que va a hacer lo avalúos .

Interventoría, informa que no se ha hecho solicitudes al respecto, porque se esta a la espera que de acuerdo a los pliegos en el tercer mes debe el contratista entregar los estudios y diseños y ya cuando tengamos la información completa de la topografía y la definición de los chaflanes ya se podrá definir cual es el alcance de la afectación predial que pueda existir.

**G) AMBIENTAL**

El profesional ambiental comenta que de acuerdo a los mencionado desde acta anterior se viene planteando llevar en dos pares la parte ambiental, uno el tramo correspondiente a la zona de mantenimiento y rehabilitación el cual tiene por instrumento de gestión ambiental el documento PAGA, y la otra parte corresponde a la zona del Parque Puracé que tiene por instrumento de gestión ambiental el Licenciamiento.

Respecto al área de Parques el día 28 de julio se realizo una primera reunión con los funcionarios de parques, el Director de la territorial y el área de grupo de tramites ambientales de Parque Nacionales, en términos generales fue una reunión para que las partes se conocieran, adicionalmente Parques informa la reunión de carácter informativo y que los pronunciamientos se realizan a través de la agencia de licencias ambientales quien es la entidad encargada del tramite o del proceso de licenciamiento y dentro de las conclusiones de la reunión quedo que el contratista debe realizar un cronograma especifico para el tramite de permisos ambientales para el proceso del licenciamiento y de finir los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental y contar con los permisos para realizar estudios de índole ambiental al interior del área protegida como colecta de especies que van a definir la línea base del estudio de impacto ambiental

Respecto al tema de mantenimiento y rehabilitación el contratista ha definido 3 lugares para zodmes, se encuentran radicado ante planeación dos de ellos en el municipio de Popayán esperando concepto favorable para el so del suelo, también se tiene definido hacer captación de aguas en el Rio Negro pare el sector de Paletará, en este caso se ha hecho la solicitud al Gobernador de del Cabildo de Paletará.

Respecto al PAGA, se tenia como plazo el día de hoy para ya entrega del documento, por lo tanto se espera la radicación del documento en día de hoy

La entidad contratante pregunta cual es la información sobre el estado de los tramites en cuanto a los permisos de las fuentes de materiales, vertimientos

La interventoría responde que se hace la claridad que con respecto al tema de los zodmes no están aprobados solo se tiene el tramite , respecto a las fuentes de materiales el contratista ya ha entregado los permiso a minero ambientales o los documentos que respaldan el permiso minero ambiental de la cantera " LA GOLONDRINA AZUL" que se ubica sobre el corredor del Paletará, que cuenta con los dos permisos, de igual manera ha suministrado fuentes de materiales que cuentan con loa permisos como "CONEXPE", "CASTRILLÓN" que son como el plan B en caso de requerir mas materiales.

Respecto al tema de sitios temporales y plantas se tienen pendiente por definir y se espera que el tema este incluido en el documento PAGA.

El contratista referente a los sitio para las plantas de trituración y/o planta de concreto, se tiene un sitio en estudio donde se esta realizando la negociación con el propietario el PR 25 margen Izquierda sector de Coconuco donde antiguamente funciono una de las zonas de deposito de materiales, ya se tiene un acuerdo con el propietario y se esta tramitando el permiso de uso de suelos ante el municipio de Puracé, para posteriormente solicitar los permisos de emisiones atmosféricas, concesión de aguas y los permisos de vertimientos para el funcionamiento de las plantas.

En referencia a los sitios de los zodmes del PR 9+200 MI y de PR 13+ 767 margen derecha, esta radicado el uso de suelos ante Planeación desde el día martes, ya desde planeación se realizo la visita a los sitios, donde dice el funcionario que tiene unos tiempos entre dos y tres semanas para emitir el concepto, debido a que en la alcaldía de Popayán entra a un comité técnico, para luego hacer el tramite ante la Corporación CRC, con respecto al tema de la viabilidad ambiental .

FECHA: 05 (Día) 08 (Mes) 2021 (Año)

Por parte de la entidad contrátate se solicita que se completen los tramites pendientes para anexar los respectivos radicados al documento PAGA y adicionalmente tener en cuanta el Plan de Inversión Ambiental ,una vez con todos los elementos poder hacer la aprobación del componente ambiental.

El contratista responde que están en tramite de la documentación faltante

**H) OTROS**

La entidad contratante pregunta a como va el tema con respecto a las consultas previas, lo del ICANH debido a que en el tramite de sustracción de reserva se encuentra un formato donde se solicita los territorios y las comunidades étnicas

El contratista informa que dentro del cronograma que se va a entregar van a estar incluidas estas actividades, cronograma que será radicado el día de hoy a la interventoría, entonces allí estará la programación de acuerdo a las recomendaciones del consultor

La entidad contratante solicita que se pueda suministrar una copia de manera informativa para tener conocimiento

El contratista informa que hará llegar una copia entidad contratante al correo suministrado.


| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| 1- Actividades de bacheo con asfalto | 7/08/2021 | Contratista |
| 2-Equipo Mínimo Requerido | 8/08/2021 | Contratista |
| 3- Visita de los especialistas en Diseño Geométrico | 6/08/2021 | Contratista e Interventoría |
| 4- Entrega de Documento PAGA | 5/08/2021 | Contratista |
| 5- Entrega de Cronograma Tramite de Permisos Ambientales | 5/08/2021 | Contratista |

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 19 (Día) 08 (Mes) 2021 (Año)

**NOTAS**
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA | |
| JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN | |
| JUAN CARLOS OCHOA OSORIO | |
| CRISTIAN CAMILO JIMÉNEZ | |
| ELSA CAMPO LÓPEZ |  |
| BLADIMIR GACHARNA | |
| CLAUDIA MUÑOZ | |

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |

FECHA: 19 (Día) 08 (Mes) 2021 (Año)

**(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 04
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.** 1006 **DE** 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÈ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 **DE** 2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

| PARTICIPANTES | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA | GESTOR TECNICO | INVIAS |
| JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON | SUPERVISOR CONTRATO | INVIAS |
| JUAN CARLO OCHOA OSORIO | SUBDIRECCION MEDIO AMBIENTE | INVIAS |
| SANTIGO ORTEGA PALENCIA | SUBDIRECCION MEDIO AMBIENTE | INVIAS |
| MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE | GESTOR SOCIAL | INVIAS |
| ELSA CAMPO LOPEZ | DIRECTORA DE INTERVENTORIA | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| LUIS MIGUEL NARVAEZ | PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| MARCELA ROSAS | PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA | CONSORCIO SAN SEBASTIAN |
| BLADIMIR GACHARNA | DIRECTOR DE OBRA | CONSORCIO SAN SEBASTIAN |
| CLAUDIA MUÑOZ | COORDINADORA | CONSORCIO SAN SEBASTIAN |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

*** REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO**

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| | | |
|---|---|---|
| **Compromisos:** | **1- Actividades de bacheo con asfalto** | Continúan con actividades de bacheo con asfalto- Jornadas "tapahuecos" |
| | **2-Equipo Mínimo Requerido** | Se cumplio, equipo minimo el 19 de agosto de 2021 |
| | **3- Visita de los especialistas en Diseño Geométrico** | Se cumplio,se llevo a cabo reunión 6 de agosto de 2021 |
| | **4- Entrega de Documento PAGA** | Se cumplio, entra del PAGA 6 de agosto de 2021, para revision |
| | **5- Entrega de Cronograma Tramite de Permisos Ambientales** | Se cumple, 5 de agosto de 2021, pendiente de ajustes por parte de interventoria |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

**A) ENTREGABLES REFERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONTRATO 1001 DE 2021**

**B) SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**

**C) GESTION SOCIAL**

**D) GESTIÓN AMBIENTAL**

**F) OTROS**

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

**A) ENTREGABLES REFERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONTRATO 1006 DE 2021**

Con relacion a los documentos entregables para el informacio para el control de la ejecucion de la obra la interventoría informa que estan pendientes las firmas correspondientes a los formatos una vez se tengan completos se tramitan y se envían a la Supervisión y Gerencia de Grandes Proyectos

**B) SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**

Se le informa al consorcio San Sebastian 064, que la demarcacion horizontal la hara por el programa concluir

**C) GESTION SOCIAL**

**Reuniones De Inicio:**

A la fecha se han realizado tres (3) reuniones de inicio, la primera, en san José de Isnos, el 17 de julio de 2021, para el tramo del PR0+000 al PR18+000, municipio de Popayán (mantenimiento y rehabilitación), el 04 de agosto de 2021 y con el Resguardo indígena de Paletará (PNNP), el día 18 de agosto de 2021.

**Oficinas SAU:**

Instalada una oficina en la ciudad de Popayán, Barrio Campamento, cuenta con aviso visible y horario de atención. la interventoría solicitó la ubicación de las oficinas SAU, en lugares de fácil acceso para la comunidad. el contratista informó, al respecto que, ubicará dos (2) oficinas más, una, en la Vereda, el Sendero, que corresponde al tramo del PR0+000 al PR 18+000, municipio de Popayán y en la otra en la oficina del Cabildo de Paletará.

**Actas De Vecindad:**

A la fecha se han efectuado 13 actas de vecindad, en el tramo del PR0+000 al PR18+000, que corresponde al municipio de Popayán (mantenimiento y rehabilitación).

**Tramite ARN:**
El contratista realizó la consulta ante la Territorial Cauca y en el oficio OFI21-016295 / IDM 112000, del 15 de julio de 2021, la agencia informó que no existen personas, objetivo de atención de la ARN interesadas en la oferta.

**Tramite Ministerio Del Interior:**
El contratista informó que en el sector del PR0+000 al PR27+890, se contemplan obras de mantenimiento y rehabilitación, actividades cuya intervención se realizará sobre la estructura existente por lo cual no se contempla cambio en el trazado actual y tampoco se incluyen en este tramo construcción de nuevas calzadas. según lo manifestado por el contratista, se sugiere que no se debería consultar ante el Ministerio del Interior.

En el sector del PR54+100 al PR83+000 (PNNP), en el cual se contemplan actividades de mejoramiento y pavimentación y que adicionalmente debe ser objeto de un licenciamiento previo, el contratista manifestó que una vez se cuente con estudios y diseños, elevará la consulta al Ministerio del Interior para que determine, la procedencia o no de adelantar la consulta previa.

La interventoría informa que, en la reunión de inicio, sostenida el día de ayer, con el Resguardo Indígena de Paletará, la comunidad en cabeza de la Gobernadora, manifestó la intención de solicitar el proceso de consulta previa a lo que la interventoría requiere al contratista que adelante con el trámite pertinente con la entidad competente, que es el Ministerio del Interior

A lo que el contratista manifiesta que en este momento en su programación tiene consultar al Ministerio del Interior, una vez se tenga el polígono definido de intervención en el sector del PNNP y esto solo se dará hasta que se tengan los estudios y diseños prácticamente ejecutados en dicho sector, el contratista manifiesta que está haciendo las consultas respectivas con su consultor ambiental y con el área jurídica para tomar las decisiones pertinentes de aquí en adelante, el contratista informa que el próximo viernes se tendrá una reunión en Popayán para tratar estos temas.

**D) GESTIÓN AMBIENTAL**

**Plan de Adaptación de la Guía Ambiental del INVIAS - PAGA.**
El contratista de Obra Consorcio San Sebastián 064 presentó el 06 de agosto de 2021 mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-29-21 la primera versión del documento PAGA el cual a la fecha se encuentra en revisión. La interventoría informa que entregará las observaciones a este documento el día 20 de agosto de 2021.

**Cronograma de permisos y autorizaciones (Hoja de Ruta).**
El contratista de Obra Consorcio San Sebastián 064 presentó el 05 de agosto de 2021, el cual ha sido devuelto con observaciones. Al respecto se ha gestionado reuniones con el Contratista, INVIAS e Interventoría, el día 13 de agosto de 2021 se puntualizó sobre la gestión ambiental de las obras a ejecutar en el PNN Puracé. De igual manera se tiene programado para el día 20 de agosto de 2021 una nueva reunión con el fin de conocer el concepto de parte del Contratista respecto a las actividades constructivas al interior del PNN Puracé.

**Permisos ambientales para el inicio de obras de mantenimiento y rehabilitación.**
A la fecha se ha identificado que para el inicio de obras de mantenimiento y rehabilitación solo se requieren los permisos de fuentes de materiales, zonas RCD y suministro de agua para uso industrial. A la fecha tiene identificadas dos zonas RCD ubicadas en el PR 9+200 LI y 13+777 LD los cuales tienen en trámite el concepto de Planeación Municipal referente al uso de suelos y la viabilidad ante la CRC.

Para satisfacer la demanda hídrica del proyecto, el Contratista radicó ante la CRC mediante oficio CSS064-OBRA-VR-11-21 del 23 de julio de 2021 (radicado vía correo OBRA-VR-15-21 del 27 de julio de 2021 (radicado vía correo electrónico a resguardoindigenadepaletara@gmail.com).

Teniendo en cuenta los tiempos administrativos de los permisos de la CRC y demás Entidades el Contratista tiene seleccionado proveedor para el suministro de agua cruda en bloque con destino industrial y la zona RCD "La Lajita" en Popayán.

La SMAGS de INVIAS solicita diligenciar una matriz de permisos ambientales que contenga por columna: Permiso, radicado, estado, observaciones, dentro del estado deberá tenerse en cuenta si está radicado, con auto de inicio, visita o resoluciones.

**Fuentes de materiales.**
Para las obras de mantenimiento el Contratista reporta que material granulares directamente a proveedores que cuenten con los permisos ambientales correspondientes (permiso de emisiones y si aplica, de captación y vertimiento) para la producción de este material.

El contratista tiene programado instalar una planta de concreto inicialmente, pero estamos por definir el sitio estratégico, está por definir la instalación una planta de mezcla asfáltica.

**H) OTROS**

El Director Territorial Cauca manifiesta que el estudio impacto ambiental que hizo el anterior Contratista de Obra sirve como punto de partida para evitar reprocesos en el proceso de Licenciamiento Ambiental, de igual manera se sugiere hacer reunión preliminar con el Ministerio del interior Area de Consultas Previas para poder definir si es obligación hacer la Consulta Previa para evitar desgastes posteriores. En en la reunión de socialización en Paletará se informó a la comunidad que el proyecto tiene unos proyectos sociales independientes a la Consulta Previa que se ejecutarán.

El Gestor Técnico del Proyecto Informa que mañana 20 de agosto de 2021 hay una reunión que planteó la interventoría a las 8:00 de la mañana para hablar de esos temas porque involucra en la parte ambiental, al respecto la interventoría expresa que se realizó una reunión el 13 de agosto de 2021 con miras a establecer todo en la gestión ambiental para la intervención del sector del PNN Puracé y como compromiso de la reunión el Contratista presentará el concepto sobre las actividades constructivas que se pueden adelantar al interior del PNN Puracé

Se tiene programado una reunión los días 25 26 y 27 de agosto de 2021 en Popayán con el equipo Socio-ambiental del contratista interventoría, con los especialistas y profesionales de la Subdirección de Medio Ambiente, para definir el inicio de todas las labores del Estudio Impacto Ambiental que se va a desarrollar y en ese sentido pues se definirá todo el actuar en ese tema

Se invita a la Supervisión del Proyecto a que participe en la reunión se llevara a cabo con los especialistas el 26 de agosto de 2021 y poder tener Claridad sobre los temas que se están tratando es para lo cual se han planteado un plan de trabajo así:

•El 25 de agosto de 2021 reunión contratista e interventoría
•El 26 de agosto de 2021 nos confirmaba la participación del ingeniero Juan Carlos Ochoa y Santiago de la subdirección de Medio Ambiente.
•El 27 de agosto de 2021, recorrido por el corredor

La Gerencia de Grande Proyectos expresa que la intervención en el PNN Puracé hace parte de los trámites de mayor complejidad que hay en toda la legislación ambiental y social y hay que ser Muy cuidadosos con los conceptos y con la información q que se allega al instituto para tomar las decisiones pertinentes, ya que no se puede caer en malas interpretaciones o equivocaciones erróneas de la normatividad y esto con el fin de adelantar los procesos de manera correcta y bajo un cronograma que nos permite adelantar la mayor cantidad de obras que podamos hacer dentro del marco jurídico ambiental y social

**Componente De Sostenibilidad**

Presentación de profesionales de la subdirección de medio ambiente profesionales para el Componente de Sostenibilidad que se vinculan al comité N°3 del Módulo 2 Paletera
Paola Marcela Sánchez (Componente social), Laura Alejandra Rodríguez (Componente ambiental)

Las profesionales de componente de sostenibilidad dejan como información que se deben enviar unos informes semestrales al Ministerio de Transporte con respecto a la implementación de los lineamientos de Infraestructura Verde Vial para tener en cuenta los dos requerimientos que quedaron establecidos en el anexo técnico del contrato relacionados con el cálculo de la huella de carbono y el de consumo de energía. respecto al producto el documento de sostenibilidad todavía se cuenta con aproximadamente 3 meses para su entrega.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| **1-Remisiones entregables de control aprobados por la interventoría INVIAS** | **25/08/2021** | **Contratista** |



**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 2 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

**NOTAS**
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA | |
| JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON | |
| JUAN CARLO OCHOA OSORIO | |
| SANTIGO ORTEGA PALENCIA | |
| MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE |  |
| ELSA CAMPO LOPEZ | |
| LUIS MIGUEL NARVAEZ | |
| MARCELA ROSAS |  |
| BLADIMIR GACHARNA | |
| CLAUDIA MUÑOZ | |

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

# ANEXO 13
# MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTAS DE REUNION

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| FECHA | 26 | 8 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

**ACTA DE REUNIÓN No.** 5
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA DE GRANDES PROYECTO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.** 1006 **DE** 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE)**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 **DE** 2021

**INTERVENTOR:** **CONSORCIO ICAYECO 189**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| SANTIAGO ORTEGA PALENCIA | GESTOR AMBIENTAL | SMAGS - INVIAS |
| MARTIN EMILIO RODRIGUEZ | GESTOR SOCIAL | SMAGS - INVIAS |
| JOSE ADRIAN VALENCIA | SUPERVISOR | TERRITORIAL CAUCA INVIAS |
| ELSA CAMPO LOPEZ | DIRECTORA DE INTERVENTORIA | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| MAURICIO JOYA | ESPECIALISTA AMBIENTAL | CONSORCIO ICAYECO 190 |
| DIEGO RUIZ | ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD | CONSORCIO ICAYECO 191 |
| DIEGO MAMBUSCAY | INGENIERO RESIDENTE | CONSORCIO ICAYECO 192 |
| RUBEN CAICEDO | PROFESIONAL PREDIAL | CONSORCIO ICAYECO 190 |
| LUIS MIGUEL NARVAEZ | PROFESIONAL AMBIENTAL | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| MARCELA ROSAS VERNAZA | PROFESIONAL SOCIAL | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| BLADIMIR GACHARNA | DIRECTOR DE PROYECTO | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 |
| CLAUDIA MUÑOZ | COORDINADORA DE PROYECTO | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 |
| JUAN CARLOS UCROS | CONSULTOR DE PROYECTO | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 |
| HUGO SOLÍS | PROFESIONAL AMBIENTAL | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

MANEJO DE GESTION AMBIENTAL AL INTERIOR DEL PNN PURACÉ - Conocer y definir, la propuesta metodologíca presentada por el Consorcio San Sebastian 064, en relación al Estudio d

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

Presentación de las Partes
Necesidad de Licencia Ambiental PNNP
Presentación de Cronograma de actividades propuestas por el Consorcio San Sebastian 064
Concepto sostenibilidad

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Presentacion de las partes.

En la reunión participan funcionarios del INVIAS, especialmente la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social SMAGS y el Director Terrirotial INVIAS, por parte de Interventoría esta presente la Directora de Interventoria y el equipo socio ambiental incluyendo los especialistas ambiental y sostenibilidad, por parte del Contratista, esta presente el Director de Proyecto, Coordinadora, equipo ambiental y el consultor seleccionado para la elaboracion del EIA.

2. Necesidad de Licencia Ambiental

De acuerdo con lo establecido en el decreto 1076 de 2015 que establece: *ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. "Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades":*

*12. Los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales:*

*a) Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por realizarse al interior de estas, en el marco de las actividades allí permitidas;*

*b) Los proyectos, obras o actividades señalados en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, localizados en las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales previamente determinadas, siempre y cuando sean compatibles con el plan de manejo ambiental de dichas zonas.*

Y lo establecido en el *ARTÍCULO 2.2.2.5.4.4. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Cuando las actividades de mejoramiento que se relacionan en el presente decreto se pretendan realizar al interior de las áreas protegidas públicas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP o las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales debidamente delimitadas, se deberá tramitar y obtener la correspondiente licencia ambiental, en el marco de las actividades permitidas.*

3. Presentacion de Cronograma

El Contratista de Obra mediante Comunicación CSS064-OBRA-CL-056-21 en respuesta a los oficios de interventoría ICA-PAL-0019 y ICA-PAL-0021, radicó el 25 de agosto de 2021 el cronograma de permisos ambientales incluido las actividades del tramite del Estudio de Impacto Ambiental y proceso de Licenciamiento Ambiental, sin embargo conforme a su presentación la Interventoría solicita el ajuste, en el sentido de adaptar los tiempos y definir la fecha de entrega de los estudios y diseños definitivos a ejecutar en el PNN Puracé, de igual manera se solicita presentar las sub actividades para las tareas de sustraccion de reserva, consulta previa e ICAHN.

Se estima que el proceso de licenciamiento ambiental incluidos todos los tramites que implica su obtencion es de aproximadamente 18 meses, los cuales contempla los tiempos definidos por la normatividad vigente y en muchos casos estan sujetos a los tiempos de la Autoridad Ambiental.

De igual manera es defnitivo que para el inicio del estudio de impacto ambiental la entrega y aprobacion de los estudios y diseños que permitan definir el poligono o poligos que determinen el área de influencia directa AID y el área de intervención. Para la definición del AID es necesario tener toda la información de las instalaciones provisionales como Zona RCD, Plantas de Procesamiento de Materiales y campamentos.

Los estudios y diseños, deberan atender lo dispuesto en Auto 141 de 2015 de la ANLA, mediante el cual se hacian observaciones al Estudio de Impacto Ambiental presentado por el contrato 0679 de 2009.

4. Concepto de Sostenibilidad

En el marco del cumplimiento con lo consignado dentro del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO MODULO 1 Adenda 2, en donde se especifica dentro del núméral 3.2 Actividades generales a desarrollar dentro del contrato lo siguiente;

*"...El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS"..."*

Se considera necesario que los criterios de sostenibilidad considerados en la política, sean incorporados dentro de la planeación y realización del Estudio de Impacto Ambiental, si bien, dentro del contrato se requiere que, en un capítulo se especifique el alcance de estos criterios dentro del EIA, no se especifica esto dentro de los términos de referencia, de tal forma que, la interventoría manifiesta la necesidad de desarrollar un volumen donde se explica el desarrollo de la política de sostenibilidad del INVIAS dentro de los capitulos a los que halla lugar dentro del estudio de impacto ambiental; sin necesidad que esta información sea remitida a ANLA dentro del trámite.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Visita de especialista en Diseño Geometrico al corredor | 01/09/2021 | CONTRATISTA |
| | | |
| | | |

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

La reunión fue desarrollada de forma presencial en el auditorio del la Asociacion Caucana de Ingenieros en la ciudad de Popayán.

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** 3 (Día) septiembre (Mes) 2021 (Año)

**NOTAS**
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| SANTIAGO ORTEGA PALENCIA | |
| MARTIN EMILIO RODRIGUEZ | |
| JOSE ADRIAN VALENCIA | |
| ELSA CAMPO LOPEZ | |
| MAURICIO JOYA | |
| DIEGO RUIZ | |
| DIEGO MAMBUSCAY | |
| RUBEN CAICEDO | |
| LUIS MIGUEL NARVAEZ | |
| MARCELA ROSAS VERNAZA | |
| BLADIMIR GACHARNA | |
| CLAUDIA MUÑOZ | |
| JUAN CARLOS UCROS | |
| HUGO SOLÍS | |

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

FECHA: 20 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

**ACTA DE REUNIÓN No.** 4
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA DE GRANDES PROYECTO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.** 1006 **DE** 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE)**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 **DE** 2021

**INTERVENTOR:** **CONSORCIO ICAYECO 189**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| JUAN CARLOS OCHOA | GRANDES PROYECTOS | GERENCIA GRANDES PROYECTOS - INVIAS |
| SANTIAGO ORTEGA PALENCIA | GESTOR SOCIAL | SMAGS - INVIAS |
| MARTIN EMILIO RODRIGUEZ | GESTOR AMBIENTAL | SMAGS - INVIAS |
| CARMEN STIBLE DUARTE | GESTOR PREDIAL | SMAGS - INVIAS |
| VICTOR ANDRES RODRIGUEZ | GESTOR TECNICO | INVIAS |
| BLAS URIEL PAEZ | SUPERVISOR | TERRITORIAL CAUCA INVIAS |
| ELSA CAMPO LOPEZ | DIRECTORA DE INTERVENTORIA | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| RUBEN CAICEDO | PROFESIONAL PREDIAL | CONSORCIO ICAYECO 190 |
| LUIS MIGUEL NARVAEZ | PROFESIONAL AMBIENTAL | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| MARCELA ROSAS VERNAZA | PROFESIONAL SOCIAL | CONSORCIO ICAYECO 189 |
| BLADIMIR GACHARNA | DIRECTOR DE PROYECTO | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 |
| CLAUDIA MUÑOZ | COORDINADORA DE PROYECTO | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 065 |
| JUAN CARLO UCROS | CONSULTOR DEL EIA | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 066 |
| YOLANDA BURBANO | PROFESIONAL SOCIAL | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 067 |
| HUGO SOLÍS | PROFESIONAL AMBIENTAL | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

MANEJO DE GESTION AMBIENTAL AL INTERIOR DEL PNN PURACÉ

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

Presentación de las Partes
Concepto sobre actividades constructivas al interior del PNN Puracé
Concepto sobre consulta previa
Concepto sobre tramites ante el ICAHN

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Concepto sobre actividades constructivas al interior del PNN Puracé

El Contratista a traves de su Consultor presenta e informa que, para las actividades de mantenimiento no existe en la normatividad ambiental vigente un permiso especifico para esta actividad, de igual manera informa que por su bajo impacto no es objeto de permiso o autorizacion por parte de alguna autoridad ambiental. Informa que Parques Nacionales ha estado informado de las actividades de mantenimiento a traves del Jefe del Parque Nacional Natural Puracé Isaac Bedoya, quien ha mostrado estar de acuerdo con la ejecucion de estas actividades.

Respecto a la pavimentacion al interior del Parque informa que conforme a la normatividad ambiental los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por realizarse al interior de estas requieren licienciamiento ambiental.

Concepto sobre consulta previa

Teniendo en cuenta lo planteado en comites de obra y reuniones anteriores, se pregunta al Consultor, sobre la pertinencia de adelantar la consulta ante el Ministerio del Interior , respecto al tramite de determinación de procedencia y oportunidad de la Consulta Previa, teniendo en cuenta que el proyecto requiere de dos intervenciones principales, la Rehabilitacion y el mantenimiento, entre el PR0 y el PR18 y la pavimentacion al interior del PNN Puracé, entre el PR54 y el PR83. Al respecto el Consultor manifiesta que en primera instancia, solo los proyectos objeto de licenciamiento ambiental requieren adelantar el proceso de Consulta Previa y para el tramite del lincenciamiento ambiental, se efetuará el proceso consultivo con el Resguardo Indígena de Paletará, quienes en reunión de inicio, solicitaron la necesidad de adelantar dicho proceso en su territorio; que aunque esta por fuera del área del PNN Puracé, se asume por los Indigenas como un espacio de vida. Para el tramo de la rehabilitación y mantenimiento, no se considera adelantar el tramite de consulta ante el Ministerio del Interior, siendo que se plantean actividades cuya intervención se realizará sobre la estructura existente por lo cual no se contempla cambio del trazado actual y tampoco se incluye la construcción de nuevas calzzadas, segun lo manifestado por el Consorcio San Sebastián 064.

Concepto sobre tramites ICAHN

Teniendo en cuenta que en el proyecto ejectuado por la Union Temporal Corredores Arteriales, bajo el Contrato, número 0679 de 2009, contó con un Programa de Arqueologia Preventiva aprobado por el ICAHN, que se presentó a la ANLA; el Consorcio San Sebastian 064, considera oportuno el aprovechamiento de este insumo dentro del actual proyecto. La SMAGS del INVIAS, solicita que esta información sea avalada o refrendada por el ICAHN. Al respecto el Contratista informa que ha realizado el tramite, en distintas comunicaciones y que el ICAHN ha solicitado informacion adicional, que el contratista ha suministrado y se encuentra a la espera de la respuesta definitiva de dicho instituto.

Se ratifica por todas las partes asistentes el compromiso y agenda de la reunion y recorrido a ejecutar los dias 25, 26 y 27 de agosto de 2021, donde el Contratista presentará el cronograma

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Presentación cronograma de EIA | 25/08/2021 | CONTRATISTA |
| Reunión 25,26 y 27 de agosto de 2021 en Popayán | 25/08/2021 | CONTRATISTA/INTERVENTORÍA |

**OBSERVACIONES**

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

La reunión fue desarrolla de forma virtual a través del enlace: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html url 2F 23 2Fl 2Fmeetup-join 2F19 3Ameeting Zj zMzMxOD tZmVmNC00O N LT 5ZTctN ExNzNhNjA0NGE3 40thread.v2 2F0 3Fcontext 3D 257b 2522Tid 2522 253a 2522b245367b-55a3-4d61-92d0-992b771e1d1f 2522 252c 2522Oid 2522 253a 25229246c78a-8a03-424e-9d27-85fc0e1d3428 2522 257d 26anon 3Dtrue type meetup-join deeplin ld dad8bb2b-3180-4a45-ab06-d9a02669edd7 directDl true msLaunch true enableMobilePage true suppressPrompt true

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** 26 (Día) agosto (Mes) 2021 (Año)

**NOTAS**

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| JUAN CARLOS OCHOA | |
| SANTIAGO ORTEGA PALENCIA | |
| MARTIN EMILIO RODRIGUEZ | |
| CARMEN STIBLE DUARTE | |
| VICTOR ANDRES RODRIGUEZ | |
| BLAS URIEL PAEZ | |
| ELSA CAMPO LOPEZ | |
| RUBEN CAICEDO | |
| LUIS MIGUEL NARVAEZ | |
| MARCELA ROSAS VERNAZA | |
| BLADIMIR GACHARNA | |
| CLAUDIA MUÑOZ | |
| JUAN CARLO UCROS | |
| YOLANDA BURBANO | |
| HUGO SOLÍS | |

Original: Informe mensual de Interventoría.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

# ANEXO 14
# MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-PALETARA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | | DE | |

FECHA: 8 (Día) / 8 (Mes) / 2021 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 — TRAMO Y/O SECTOR(S): CORREDOR DEL PALETARA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 2/08/2021 al 8/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" — FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 30 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "Popayan – Isnos - Sombrerillos". Longitud = 110.0 Km

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | | | INTERVENTOR: | CONSORCIO ICAYECO 189 | | |
| INTEGRANTES: | ALCA INGENIERIA S.A.S. - ICM INGENIEROS S.A.S. - INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. - HORACIO VEGA CARDENAS | | | INTEGRANTES: | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA | | |
| CONTRATO No. | 1006 DE 2021 | VALOR INICIAL: | $ 300.149.391.398,00 | CONTRATO No. | 990 DE 2021 | VALOR INICIAL: | $ 46.719.707.260,00 |
| PLAZO INICIAL: | 31/08/2030 | ADICIONES: | $ - | PLAZO INICIAL: | 114 MESES | ADICIONES: | $ - |
| PLAZO ACUMULADO: | 31/08/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 300.149.391.398,00 | PLAZO ACUMULADO: | 114 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 46.719.707.260,00 |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ 6.125.861.986 | $ 18.376.470.588 | $ 27.564.705.882 | $ 13.782.352.941 | $ 27.564.705.882 |
| EJECUTADO | $ - | $ 1 | $ - | $ - | $ - |

| VIGENCIA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ 36.752.941.176 | $ 27.564.705.882 | $ 41.347.058.824 | $ 45.941.176.471 | $ 55.129.411.766 |
| EJECUTADO | $ - | $ 1 | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 275.678.882.377,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 82.822.876,88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 55.459.545,44
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,020%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 49.852.500,00
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 105.312.045,44

| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | X | |

MES FACTURADO: — VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
El Acta de obra N°1, esta para revision del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 91.326.868,80


| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | | X |

MES FACTURADO: Julio — VALOR FACTURA: $ - — FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -
El Acta de Costos N°1 esta para revision del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FISICO

ACUMULADO PROYECTO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): | 2,89 | | 2,89 |
| KM CON OBRAS DE ARTE (Km): | | | |
| KM MANTENIDOS (Km): | 8 | | 8 |
| KM BASE/SUBBASE (Km) | | | |
| KM PAVIMENTADOS (Km) | | | |
| PUENTES (Un) | | | |
| OTROS | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Planta de concreto asfáltico | | | |
| Planta de trituración: | | | |
| Motoniveladoras: | | | |
| Retrocargadores: | | | |
| Vibrocompactadores: | | | |
| Volquetas: | 1 | | 1 |
| Otros: | | | |

TRAMO Y/O SECTOR 1: • Corredor Popayán - Paletara PR0+000 al PR27+890 — TRAMO Y/O SECTOR 2:

## IV. GESTION AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN: La Golodrina Azul Km 18 - Coconuco — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Ubicada en el PR17+800 de via Popayán – Coconuco en el Municipio de Popayán Departamento del Cauca, con aprobación de la Corporacion Autónoma Regional del Cauca – CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION bajo el código N° 20173.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | | NO | X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista ha identificado dos zonas RCD en los PR9 y PR13 del corredor vial, los cuales ha presentado a Planeacion Municipal para obtener el concepto de uso de suelo favorable. Al respecto esta interventoría ha solicitado a través del oficio ICA-PAL-0008 del 03 de agosto de 2021 la entrega de todos los permisos ambientales que permitan ejecutar las obras priorizadas de rehabilitación ubicadas entre el PR0+000 y el PR18+300

Para satisfacer la demanda hídrica del proyecto, el Contratista radicó ante la CRC mediante oficio CSS064-OBRA-VR-11-21 del 23 de julio de 2021 (radicado vía correo electrónico a crc@crc.gov.co). De igual manera el Contratista realizó el mismo ejercicio con el cabildo indígena de Paletará, como máxima autoridad ambiental en su territorio mediante comunicación CSS064-OBRA-VR-15-21 del 27 de julio de 2021.

Respecto al EIA del tramo del PNN Puracé el Contratista reporta la seleccion del consultor encargado de su elaboracion.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: EN REVISION

OBSERVACIONES:
El contratista de Obra Consorcio San Sebastián 064 presentó el 06 de agosto de 2021 mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-29-21 la primera versión del documento PAGA el cual a la fecha se encuentra en revisión

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en su etapa de preconstruccion a la fecha no se cuenta con los estudios y diseños que permitan identificar las posibles afectaciones en materia predial.

La interventoria se encuentra realizando el balance para establecer un eventual afectacion por lo cual se estan elaborando de actas de vecindad

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 24
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 17
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 7
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SAU ubicación carrera 17 N°18AN-94

OBSERVACIONES:
Continua elaboracion de actas de vecindad pr0+000 al PR6+000

En el mes de julio del presente, la ARN dio respuesta al contratista de obra, mediante comunicación OFI21-016295 / IDM 112000, acerca de la NO existencia de personas, objetivo de atención de la Agencia para la Reincorporación y Normalización interesadas en la oferta. Debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN.

En el periodo reportado, el día 4 de agosto de 2021, se realizó la reunión de inicio, en la Vereda el Sendero, para el tramo comprendido entre el PR 0+000 al PR 18+000, municipio de Popayan. En dicha reunión participaron los lideres comunitarios, presidentes de las JAC, representantes del contratista, la interventoria y comunidad en general, permitiendo así el acercamiento con las comunidades del AID

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | | CÓDIGO | MINFRA-MN-N-15-FR-2 | |
| | | | VERSIÓN | 1 | |
| | | | PÁGINA | | DE |

FECHA: 8 (Día) | 8 (Mes) | 2021 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 — TRAMO Y/O SECTOR(S): CORREDOR DEL PALETARA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 2/08/2021 al 8/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" — FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 30 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "Popayan – Isnos - Sombrerillos". Longitud = 110,0 Km

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realiza reunion de socializacion proyecto entre el PR0+000 al PR18+000, en el Centro Educativo el Sendero- Sede Liceo Nacional Alejandro Humbold
* Continua levantamiento topográfico del corredor en el tramo B (PR54+000 al PR 83+000)
* Continua el Inventario de alcantarillas. Hasta la fecha se han inventariado 20 alcantarillas en el tramo B (PR54+000 al PR 83+000)
* Continua la exploración geotecnica de la estructura de rodadura existente del tramo (PR8+000 al PR 14+000) con un total de 55 sondeos con realiaados durante la presente semana
* Continua jornadas de mantenimiento "tapahuecos" sobre el PR8+000 al PR10+000
* Se realiza chequeos por parte de la inteventoiria a las coordenadas de los puntos medidos en tiempo real con GPS de alta precisión


## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Continua levantamiento topográfico del corredor en el tramo B (PR54+000 al PR 83+000)
* Continua el Inventario de alcantarillas. Hasta la fecha se han inventariado 20 alcantarillas en el tramo B (PR54+000 al PR 83+000)
* Iniciar actividades de intervención de mejoramiento en la zona del Parque Nacional Natural de Puracé entre el PR54+000 y el PR83+000.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 2002

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

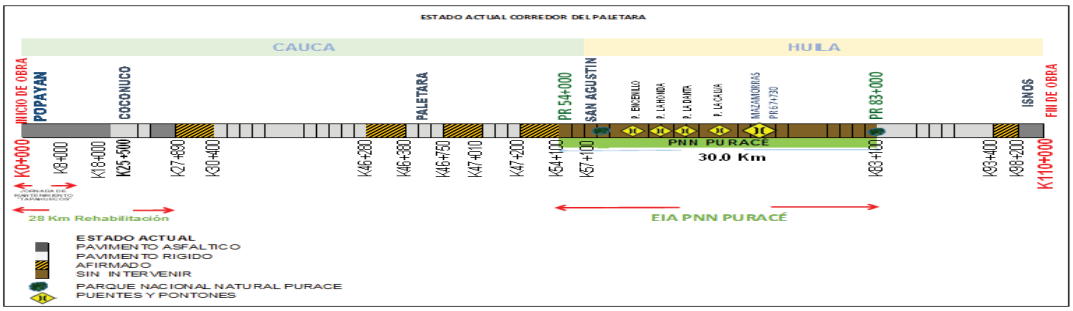


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunion de Socializacion del Proyecto entre PR0+000 AL PR18+000



Lugar de Socializacion :Centro Educativo el Sendero- Sede Liceo Nacional Alejandro Humbold



PR2+000 Chequeo de topografia estacion RTK




PR9+400 sondeos manuales con recuperación de muestra.



PR7+800 Jornada de reparcheo y acondicionamiento de la via



PR0+000 AL PR27+700 Reoorrido del tramo con especialistas en Diseño Geometrico

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| * Se realizan reuniones semanales de seguimiento con el contratista para tomar los correctivos necesarios y cumplir con el programa establecido | |
| *Se realizan jornadas de mantenimiento "tapahuecos" con la utilizacion de una (1) volqueta, previo al concepto de geotecnia para iniciar el mantenimiento del PNN Purace | FIRMA: |
| | NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ |
| | No. MAT: 192020-1710 |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | | DE | |

FECHA: 15 (Día) / 8 (Mes) / 2021 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 — TRAMO Y/O SECTOR(S): CORREDOR DEL PALETARA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 7 (Numeración consecutiva) del 9/08/2021 al 15/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" — FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 30 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "Popayan – Isnos - Sombrerillos". Longitud = 110.0 Km

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | | | INTERVENTOR: | CONSORCIO ICAYECO 189 | | |
| INTEGRANTES: | ALCA INGENIERIA S.A.S. - ICM INGENIEROS S.A.S. - INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. - HORACIO VEGA CARDENAS | | | INTEGRANTES: | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA | | |
| CONTRATO No. | 1006 DE 2021 | VALOR INICIAL: | $ 300.149.391.398,00 | CONTRATO No. | 990 DE 2021 | VALOR INICIAL: | $ 46.719.707.260,00 |
| PLAZO INICIAL: | 31/08/2030 | ADICIONES: | $ - | PLAZO INICIAL: | 114 MESES | ADICIONES: | $ - |
| PLAZO ACUMULADO: | 31/08/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 300.149.391.398,00 | PLAZO ACUMULADO: | 114 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 46.719.707.260,00 |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ 6.125.861.986 | $ 18.376.470.588 | $ 27.564.705.882 | $ 13.782.352.941 | $ 27.564.705.882 |
| EJECUTADO | $ - | $ 1 | $ - | $ - | $ - |

| VIGENCIA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ 36.752.941.176 | $ 27.564.705.882 | $ 41.347.058.824 | $ 45.941.176.471 | $ 55.129.411.766 |
| EJECUTADO | $ - | $ 1 | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | |
|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 275.678.882.377,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 137.549.539,76 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 82.822.876,88 |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 0,030% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 59.857.500,00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 142.680.376,88 |

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: Julio — VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

El Acta de obra esta para revision del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 106.548.013,60

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: Julio — VALOR FACTURA: $ - — FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

El Acta de Costos esta para revision del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): | 3,47 | | 3,47 |
| KM CON OBRAS DE ARTE (Km): | | | |
| KM MANTENIDOS (Km): | 12,5 | | 12,5 |
| KM BASE/SUBBASE (Km) | | | |
| KM PAVIMENTADOS (Km) | | | |
| PUENTES (Un) | | | |
| OTROS | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Planta de concreto asfáltico | | | |
| Planta de trituración: | | | |
| Motoniveladoras: | | 1 | 1 |
| Retrocargadores: | | | |
| Vibrocompactadores: | | 1 | 1 |
| Volquetas: | 1 | | 1 |
| Otros: | | 1 | 1 |

TRAMO Y/O SECTOR 1: • Corredor Popayán - Paletara PR0+000 al PR27+890 — TRAMO Y/O SECTOR 2: • Corredor Puracé- Isnos PR54+100 al PR83+000

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN: La Golodrina Azul Km 18 - Coconuco — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Ubicada en el PR17+800 de via Popayán – Coconuco en el Municipio de Popayán Departamento del Cauca, con aprobación de la Corporacion Autónoma Regional del Cauca – CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION bajo el código N° 20173.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | |

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista ha identificado dos zonas RCD en los PR9 y PR13 del corredor vial, los cuales ha presentado a Planeacion Municipal para obtener el concepto de uso de suelo favorable. Al respecto esta interventoría ha solicitado a través del oficio ICA-PAL-0008 del 03 de agosto de 2021 la entrega de todos los permisos ambientales que permitan ejecutar las obras priorizadas de rehabilitación ubicadas entre el PR0+000 y el PR18+300

Para satisfacer la demanda hídrica del proyecto, el Contratista radicó ante la CRC mediante oficio CSS064-OBRA-VR-11-21 del 23 de julio de 2021 (radicado vía correo electrónico a crc@crc.gov.co). De igual manera el Contratista realizó el mismo ejercicio con el cabildo indígena de Paletará, como máxima autoridad ambiental en su territorio mediante comunicación CSS064-OBRA-VR-15-21 del 27 de julio de 2021.

Respecto al EIA del tramo del PNN Puracé el Contratista reporta la seleccion del consultor encargado de su elaboracion. El dia 13 de agosto de 2021 se desarrolló reunion con funcionarios de INVIAS (GGP y SMAGS) con el fin de coordinar las intervenciones al interior del PNN Puracé. Se programaron reuniones de seguimiento para el 20 de agosto de 2021 y 26 de agosto de 2021 con acompañamiento de INVIAS.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: EN REVISION

OBSERVACIONES:
El contratista de Obra Consorcio San Sebastián 064 presentó el 06 de agosto de 2021 mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-29-21 la primera versión del documento PAGA el cual a la fecha se encuentra en revisión

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en su etapa de preconstruccion a la fecha no se cuenta con los estudios y diseños que permitan identificar las posibles afectaciones en materia predial.

La interventoria se encuentra realizando el balance para establecer un eventual afectacion por lo cual se estan elaborando de actas de vecindad

## VI. GESTIÓN SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 26 | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 2 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 19 | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 7 | DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | SAU ubicación carrera 17 N°18AN-94 |
| OTROS: | | | |

OBSERVACIONES:
Continua elaboracion de actas de vecindad pr0+000 al PR6+000

En el mes de julio del presente, la ARN dio respuesta al contratista de obra, mediante comunicación OFI21-016295 / IDM 112000, acerca de la NO existencia de personas, objetivo de atención de la Agencia para la Reincorporación y Normalización interesadas en la oferta. Debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN.

En el periodo reportado, el día 4 de agosto de 2021, se realizó la reunión de inicio, en la Vereda el Sendero, para el tramo comprendido entre el PR 0+000 al PR 18+000, municipio de Popayan. En dicha reunión participaron los líderes comunitarios, presidentes de las JAC, representantes del contratista, la interventoria y comunidad en general, permitiendo así el acercamiento con las comunidades del AID

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | |
| | | | VERSIÓN | 1 | |
| | | | PÁGINA | | DE |

FECHA: 15 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 — TRAMO Y/O SECTOR(S): CORREDOR DEL PALETARA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 7 (Numeración consecutiva) del 9/08/2021 al 15/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" — FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 30 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "Popayan – Isnos - Sombrerillos". Longitud = 110,0 Km

**VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

* Continua levantamiento topográfico del corredor en el tramo (PR0+000 al PR 27+890)
* Continua las jornadas de mantenimiento "tapahuecos" bacheo con mezcla asfáltica entre el PR25+000 al PR27+500
* Inicia actividades de conformación de cunetas en tierra entre PR 54+100 AL PR 54+500
*Continua ala elaboración de actas de vecindad entre PR0+000 a PR2+000


**VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

* Continuar levantamiento topográfico del corredor en el tramo A (PR0+000 al PR 27+890)
* Contuar con actividades de intervención de mejoramiento en la zona del Parque Nacional Natural de Puracé entre el PR54+100 y el PR83+000.

**IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO**

RUTA No. 2002

**VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030**

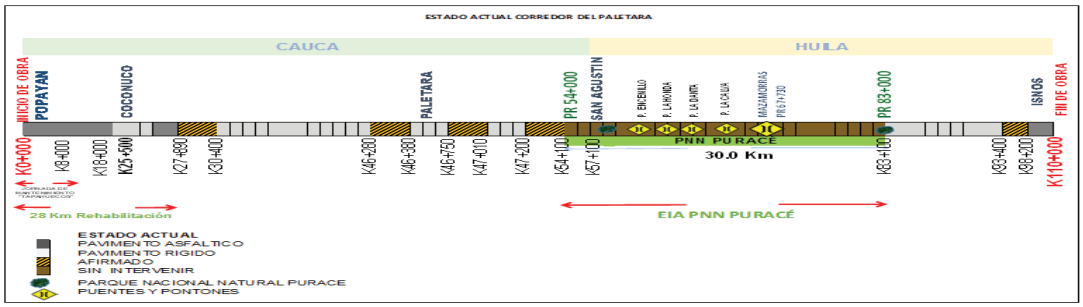


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**X. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Continúa la realización de las actas de vecindad entre el Pr0+000 al Pr 2+000**



**Jornadas de mantenimiento "tapahuecos"**



**PR 27+000 AL PR 25+500 Bacheo con asfalto**



**Continúa el levantamiento topográfico de la silueta del corredor por parte del contratista con tres comisiones de topografia entre el PR 0+000AL PR 2+000**



**Recorrido por el corredor con el gestor técnico del proyecto seguimiento del contrato de obra**



**Inicia la adecuacion de cunetas en tierra con motoniveladora en el PR 54+100 AL PR 54+500**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

* Se realizan reuniones semanales de seguimiento con el contratista para tomar los correctivos necesarios y cumplir con el programa establecido

*Se realizan jornadas de mantenimiento "tapahuecos" con la utilizacion de una (1) volqueta, previo al concepto de geotecnia para iniciat el mantenimiento del PNN Purace

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ

No. MAT: 192020-1710

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | DE |

FECHA: 23 (Día) / 8 (Mes) / 2021 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 — TRAMO Y/O SECTOR(S): CORREDOR DEL PALETARA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 9 (Numeración consecutiva) del 23/08/2021 al 29/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" — FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 30 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "Popayán – Isnos - Sombrerillos". Longitud = 110,0 Km

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
INTEGRANTES: ALCA INGENIERIA S.A.S. - ICM INGENIEROS S.A.S. - INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. - HORACIO VEGA CARDENAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1006 DE 2021 | VALOR INICIAL: | $ 300.149.391.398,00 |
| PLAZO INICIAL: | 31/08/2030 | ADICIONES: | $ - |
| PLAZO ACUMULADO: | 31/08/2030 | VALOR ACUMULADO: | $ 300.149.391.398,00 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
INTEGRANTES: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 990 DE 2021 | VALOR INICIAL: | $ 46.719.707.260,00 |
| PLAZO INICIAL: | 114 MESES | ADICIONES: | $ - |
| PLAZO ACUMULADO: | 114 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 46.719.707.260,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ 6.125.861.986 | $ 18.376.470.588 | $ 27.564.705.882 | $ 13.782.352.941 | $ 27.564.705.882 |
| EJECUTADO | $ - | $ 1 | $ - | $ - | $ - |

| VIGENCIA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ 36.752.941.176 | $ 27.564.705.882 | $ 41.347.058.824 | $ 45.941.176.471 | $ 55.129.411.766 |
| EJECUTADO | $ - | $ 1 | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | |
|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 275.678.882.377,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 192.276.202,64 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 149.889.182,00 |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | 0,054% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 81.765.000,00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 231.654.182,00 |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | | X |

MES FACTURADO: Julio
VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORIA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 200.078.246,00

| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | | X |

MES FACTURADO: Julio
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -


El Acta de Costos esta para revisión del supervisor INVIAS del contrato

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): | 4,74 | | 4,74 |
| KM CON OBRAS DE ARTE (Km): | | | |
| KM MANTENIDOS (Km): | 10,5 | 3,2 | 13,7 |
| KM BASE/SUBBASE (Km) | | | |
| KM PAVIMENTADOS (Km) | | | |
| PUENTES (Un) | | | |
| OTROS | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Planta de concreto asfáltico | | | |
| Planta de trituración: | | | |
| Motoniveladoras: | | 1 | 1 |
| Retrocargadores: | | 1 | 1 |
| Vibrocompactadores: | | 1 | 1 |
| Volquetas: | | 6 | 6 |
| Otros: | | 1 | 1 |

TRAMO Y/O SECTOR 1: • Corredor Popayán - Paletara PR0+000 al PR27+890

TRAMO Y/O SECTOR 2: • Corredor Puracé- Isnos PR54+100 al PR83+000

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN: La Golondrina Azul Km 18 - Coconuco — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Ubicada en el PR17+800 de vía Popayán – Coconuco en el Municipio de Popayán Departamento del Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION bajo el código N° 20173.

Respecto a La mezcla asfáltica que está siendo instalada sobre la ruta 2002 entre los PR0+000 al PR18+000 se hace con el suministro del proveedor Perea y CIA, con planta ubicada en Yumbo – Valle, la cual trabaja con materiales provenientes del título minero con expediente 15862 vigente hasta el año 2027, Plan de Manejo Ambiental establecido por la CVC mediante resolución 00345 de 2006 y permiso de emisiones atmosféricas mediante resolución 0710 de 2020.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | | NO | X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista ha identificado dos zonas RCD en los PR9 y PR13 del corredor vial, los cuales ha presentado a Planeación Municipal para obtener el concepto de uso de suelo favorable. Al respecto esta interventoría ha solicitado a través del oficio ICA-PAL-0008 del 03 de agosto de 2021 la entrega de todos los permisos ambientales que permitan ejecutar las obras priorizadas de rehabilitación ubicadas entre el PR0+000 y el PR18+300

Para satisfacer la demanda hídrica del proyecto, el Contratista radicó ante la CRC mediante oficio CSS064-OBRA-VR-11-21 del 23 de julio de 2021 (radicado vía correo electrónico a crc@crc.gov.co). De igual manera el Contratista realizó el mismo ejercicio con el cabildo indígena de Paletará, como máxima autoridad ambiental en su territorio mediante comunicación CSS064-OBRA-VR-15-21 del 27 de julio de 2021.

Respecto al EIA del tramo del PNN Puracé se desarrolló reunión el dia 26 dfe agosto de 2021 con funcionarios de INVIAS (DT Cauca y SMAGS) con el fin de conocer el cronograma de trabajo del Contratista para las intervenciones al interior del PNN Puracé y proceso de licenciamiento ambiental. De igual manera se desarrollo recorrido al Corredor Vial especialmente los sectores donde el ancho de calzada es inferior a 7 metros.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: DEVUELTO CON OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:
El contratista de Obra Consorcio San Sebastián 064 presentó el 06 de agosto de 2021 mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-29-21 la primera versión del documento PAGA el cual a la fecha se encuentra devuelto con observaciones mediante oficio ICA-PAL-0022

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en su etapa de preconstruccion a la fecha no se cuenta con los estudios y diseños que permitan identificar las posibles afectaciones en materia predial.

La interventoría se encuentra realizando el balance para establecer un eventual afectación por lo cual se están elaborando de actas de vecindad

## VI. GESTIÓN SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 45 | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 44 | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | N.A |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 1 | DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 1. SAU ubicación carrera 17 |
| OTROS: | | | |

OBSERVACIONES:
Continua elaboración de actas de vecindad PR0+000 al PR6+000

En el mes de agosto del presente, el contratista atendiendo la solicitud de la interventoría, respecto de ubicar oficinas de atención a la comunidad de facil acceso; instaló dos (2) SAU, en la Vereda El Sendero, en le PR 2+400, tramo de Rehabilitación y Mejoramiento y en las oficinas del Resguardo Indígena de Paletará, para el sector del PR54+000 al PR83+000 (PNNP). En cuanto a los trámites requeridos ante el ICANH, el contratista continua a la espera de la respuesta del instituto y frente al tramite ante el Ministerio del Interior, lo manifestado por el contratista, es que adelantará la consulta ante dicho Ministerio para que este determine la procedencia y oportunidad de la consulta previa en el sector del PNNP y para el tramo de Rehabilitación y Mejoramiento, el contratista sugirio no consultar. En el mes de agosto, se efectuaron reuniones con la SMA, consultor del EIA, Contratista e Interventoría con el fin de unificar criterios referentes al tramite de licenciamiento ambiental.

FECHA: 23 (Día) / 8 (Mes) / 2021 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 — TRAMO Y/O SECTOR(S): CORREDOR DEL PALETARA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 9 (Numeración consecutiva) del 23/08/2021 al 29/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" — FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 30 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "Popayán – Isnos - Sombrerillos". Longitud = 110,0 Km

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Termina levantamiento topográfico del corredor en el tramo A (PR0+000 al PR 12+000)
* Continua actividades de conformación subrasante entre PR 54+680 AL PR 57+300
* Continua mantenimiento con adición de material entre PR54+780 al PR55+750
* Continua la elaboración de actas de vecindad entre PR0+000 a PR2+000


## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Iniciar el levantamiento topográfico del corredor en el tramo B (PR54+100 al PR 837+000)
* Continuar con actividades de mantenimiento con adición de material en la zona del Parque Nacional Natural de Puracé entre el PR54+100 y el PR83+000.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 2002

**VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030**

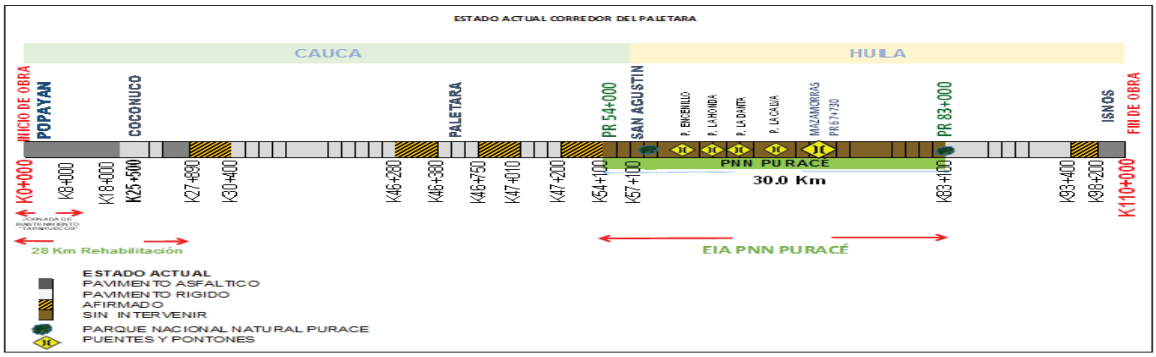


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Conformación y compactación con adición de material entre el PR 54+680 AL PR 54+780.**



**Conformación y compactación con adición de material entre el PR 55+050 al PR 55+080**



**SAU Paletará , Casa del Cabildo**



**Vista por parte de la Gestor Social y Gestor Ambiental de contrato**



**Levantamiento topográfico PR 8+700**



**Levantamiento topográfico PR 10+500**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 |
| | | | VERSIÓN | 1 |
| | | | PÁGINA | DE |

FECHA: 23 (Día) / 8 (Mes) / 2021 (Año)

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 — TRAMO Y/O SECTOR(S): CORREDOR DEL PALETARA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 9 (Numeración consecutiva) del 23/08/2021 al 29/08/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" — FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 30 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "Popayán – Isnos - Sombrerillos". Longitud = 110,0 Km



**Recorrido via con participacion de la SMAGS del INVIAS**



**Sector con ancho de 6.60 m PR62+200**



**Sector con ancho de 6.60 m PR62+200**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

* Se realizan reuniones semanales de seguimiento con el contratista para tomar los correctivos necesarios y cumplir con el programa establecido

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ

No. MAT: 152020-1710

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

FECHA: 5 (Día) / 8 (Mes) / 2021 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 — TRAMO Y/O SECTOR(S): CORREDOR DEL PALETARÁ

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 10 (Numeración consecutiva) del 30/08/21 al 5/09/21

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PAR UE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" — FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

M A MEJORAR: 30 — M A REHABILITAR: — M A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "Popayán – Isnos - Sombrerillos". Longitud = 110.0 Km

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | | | INTERVENTOR: | CONSORCIO ICAYECO 189 | | |
| INTEGRANTES: | ALCA INGENIERIA S.A.S. - ICM INGENIEROS S.A.S. - INGENIERIA TRANSPORTE Y MA UINARIA S.A.S. - HORACIO VEGA CARDENAS | | | INTEGRANTES: | AYESA INGENIERIA Y AR UITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA | | |
| CONTRATO No. | 1006 DE 2021 | VALOR INICIAL: | 300.149.391.398,00 | CONTRATO No. | 990 DE 2021 | VALOR INICIAL: | 46.719.707.260,00 |
| PLAZO INICIAL: | 31/08/30 | ADICIONES: | - | PLAZO INICIAL: | 114 MESES | ADICIONES: | - |
| PLAZO ACUMULADO: | 31/08/30 | VALOR ACUMULADO: | 300.149.391.398,00 | PLAZO ACUMULADO: | 114 MESES | VALOR ACUMULADO: | 46.719.707.260,00 |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | 6.125.861.986 | 18.376.470.588 | 27.564.705.882 | 13.782.352.941 | 27.564.705.882 |
| EJECUTADO | - | 1 | - | - | - |

| VIGENCIA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | 36.752.941.176 | 27.564.705.882 | 41.347.058.824 | 45.941.176.471 | 55.129.411.766 |
| EJECUTADO | - | 1 | - | - | - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): 275.678.882.377,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: 431.729.563,43
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 258.338.299,00
AVANCE DE OBRA EN (B/A): 0,094
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 81.765.000,00
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 340.103.299,00

| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | | X |

MES FACTURADO: Agosto
VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: -
El Acta de Costos esta para revisión del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: 198.947.472,00


| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | | X |

MES FACTURADO: Agosto
VALOR FACTURA: - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: -
El Acta de Costos esta para revisión del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS ( ): | 4,74 | | 4,74 |
| M CON OBRAS DE ARTE ( m): | | | |
| M MANTENIDOS ( m): | 10,5 | 3,2 | 13,7 |
| M BASE/SUBBASE ( m) | | | |
| M PAVIMENTADOS ( m) | | | |
| PUENTES (Un) | | | |
| OTROS | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Planta de concreto asfáltico | | | |
| Planta de trituración: | | | |
| Motoniveladoras: | | 1 | 1 |
| Retrocargadores: | | 1 | 1 |
| Vibrocompactadores: | | 1 | 1 |
| Volquetas: | | 11 | 11 |
| Otros: | | 1 | 1 |

TRAMO Y/O SECTOR 1: • Corredor Popayán - Paletara PR0+000 al PR27+890
TRAMO Y/O SECTOR 2: • Corredor Puracé- Isnos PR54+100 al PR83+100

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN: La Golondrina Azul m 18 - Coconuco — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Ubicada en el PR17+800 de vía Popayán – Coconuco en el Municipio de Popayán Departamento del Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC del plan de manejo ambiental para la explotación según resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION bajo el código N 20173.

Respecto a La mezcla asfáltica que está siendo instalada sobre la ruta 2002 entre los PR0 000 al PR18 000 se hace con el suministro del proveedor Perea y CIA, con planta ubicada en Yumbo – Valle, la cual trabaja con materiales provenientes del título minero con expediente 15862 vigente hasta el año 2027, Plan de Manejo Ambiental establecido por la CVC mediante resolución 00345 de 2006 y permiso de emisiones atmosféricas mediante resolución 0710 de 2020.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | |

OBSERVACIONES: A la fecha el contratista ha identificado dos zonas RCD en los PR9 y PR13 del corredor vial, los cuales ha presentado a Planeación Municipal para obtener el concepto de uso de suelo favorable. Al respecto esta interventoría ha solicitado a través del oficio ICA-PAL-0008 del 03 de agosto de 2021 la entrega de todos los permisos ambientales que permitan ejecutar las obras priorizadas de rehabilitación ubicadas entre el PR0 000 y el PR18 300

Para satisfacer la demanda hídrica del proyecto, el Contratista radicó ante la CRC mediante oficio CSS064-OBRA-VR-11-21 del 23 de julio de 2021 (radicado vía correo electrónico a crc crc.gov.co). De igual manera el Contratista realizó el mismo ejercicio con el cabildo indígena de Paletará, como máxima autoridad ambiental en su territorio mediante comunicación CSS064-OBRA-VR-15-21 del 27 de julio de 2021.

Respecto al EIA del tramo del PNN Puracé se desarrolló reunión el dia 26 dfe agosto de 2021 con funcionarios de INVIAS (DT Cauca y SMAGS) con el fin de conocer el cronograma de trabajo del Contratista para las intervenciones al interior del PNN Puracé y proceso de licenciamiento ambiental. De igual manera se desarrollo recorrido al Corredor Vial especialmente los sectores donde el ancho de calzada es inferior a 7 metros

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: DEVUELTO CON OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:
El contratista de Obra Consorcio San Sebastián 064 presentó el 06 de agosto de 2021 mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-29-21 la primera versión del documento PAGA el cual a la fecha se encuentra devuelto con observaciones mediante oficio ICA-PAL-0022

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A AD UIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVAL OS APROBADOS:
PREDIOS AD UIRIDOS:

OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en su etapa de preconstruccion a la fecha no se cuenta con los estudios y diseños que permitan identificar las posibles afectaciones en materia predial.

La interventoría se encuentra realizando el balance para establecer un eventual afectación por lo cual se están elaborando de actas de vecindad

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 45
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 44
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1. SAU ubicación carrera 17 N 18AN-94. 2. Vereda El Sendero 3.Casa del Cabildo de Paletará.

OBSERVACIONES:
Continua elaboración de actas de vecindad PR0 000 al PR6 000

En el mes de agosto del presente, el contratista atendiendo la solicitud de la interventoría, respecto de ubicar oficinas de atención a la comunidad de facil acceso; instaló dos (2) SAU, en la Vereda El Sendero, en le PR 2 400, tramo de Rehabilitación y Mejoramiento y en las oficinas del Resguardo Indígena de Paletará, para el sector del PR54 000 al PR83 000 (PNNP). En cuanto a los trámites requeridos ante el ICANH, el contratista continua a la espera de la respuesta del instituto y frente al tramite ante el Ministerio del Interior, lo manifestado por el contratista, es que adelantará la consulta ante dicho Ministerio para que este determine la procedencia y oportunidad de la consulta previa en el sector del PNNP y para el tramo de Rehabilitación y Mejoramiento, el contratista sugirio no consultar. En el mes de agosto, se efectuaron reuniones con la SMA, consultor del EIA, Contratista e Interventoría con el fin de unificar criterios referentes al tramite de licenciamiento ambiental.

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Inicia la georreferenciación de los mojones e inicia la materialización de los deltas para la poligonal de amarre sector parque macional Natural Puracé Tramo B (PR51 100 al PR 83 100)
Continua mantenimiento con adición de material entre PR 55 800 al PR 56 610
Se realiza visista de identificación de los sitios críticos por ancho de calzada de zona del Parque Nacional Natural Puracé entre el PR 51 100 al PR 83 100

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar el levantamiento topográfico del corredor en el tramo B (PR54 100 al PR 83 100)
Continuar con actividades de mantenimiento con adición de material en la zona del Parque Nacional Natural de Puracé entre el PR54 100 al PR83 100.
Continuar la elaboración de actas de vecindad entre PR0 000 a PR6 000

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | DE | |

FECHA: 5 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 TRAMO Y/O SECTOR(S): CORREDOR DEL PALETARA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 (Numeración consecutiva) del 30/08/21 al 5/09/21

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA


OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PAR UE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

M A MEJORAR: 30 M A REHABILITAR: M A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "Popayán – Isnos - Sombrerillos". Longitud = 110.0 Km

**IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO**

RUTA No. 2002

**VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030**

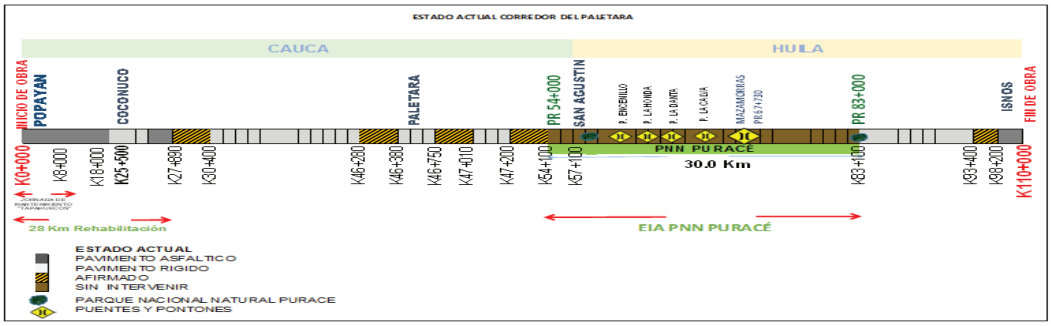


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**X. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Dispoción de Material PR 55+600**



**Conformación de Material PR 55+600**




**Compactación de Material PR 55+600**



**Instalación de mojones para la georreferenciación PR55+500**



**Georreferenciación de mojones PR54+500**

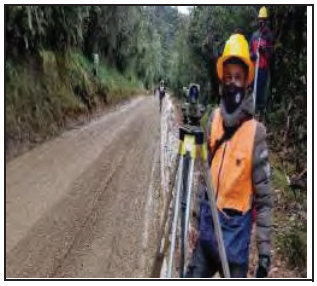

**Nivelación de la poligonal de Amarre PR55+000**



**Identificación de los sitios críticos por ancho de zona del Parque Nacional Natural Puracé entre el PR 51+100 al PR 83+100**



**Identificación de los sitios críticos por anchos de zona del Parque Nacional Natural Puracé entre el PR 51+100 al PR 83+100**



**Planta de trituración , cargue de material de sub-base PR 17+500.**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| **XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| Se realizan reuniones semanales de seguimiento con el contratista para tomar los correctivos necesarios y cumplir con el programa establecido | FIRMA<br>NOMBRE: E/SA CAMPO LOPEZ<br>No. MAT: 192020-1710 |

# ANEXO 15
# INFORME ESPECIALISTA

# INFORME E ECUTIVO MENSUAL
# E A
# A

Proyecto: INTERVENTOR A PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O ME ORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA P BLICA "V AS PARA LA LEGALIDAD LA REACTIVACIÓN VISIÓN " LOCALI ADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA HUILA

C INVIAS N

## CORREDOR DEL PALETAR

RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DE INTERVENTOR A

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcci n, período de tiempo en el cual el Contratista de O ra se encuentra en re isi n de los Estudios y Dise os entregados por el INVIAS y ela orados con anterioridad a o el Contrato 0679 de 2009.

El período de pre construcci n para el área am iental se concentra en un a ance documental y desarrollo de instrumentos de planeaci n de la Gesti n Am iental, que permita dar inicio al desarrollo de las o ras cumpliendo con toda la normati idad y políticas del INVIAS - igentes.

A tra s de reuniones y o icios, el área am iental de Inter entoría se a centrado en el requerimiento al Contratista de la presentaci n de los documentos e igidos y detallados por el Ap ndice D del Pliego de Condiciones que dio origen al Contrato No. 1006, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento y re isi n del Plan de Adaptaci n a la Guía Am iental del INVIAS - PAGA.
- Requerimiento y re isi n del cronograma de permisos y autorizaciones (Ho a de Ruta).
- Requerimiento y re isi n del Plan de Tra a o Am iental.
- Requerimiento y re isi n am ientales para inicio de o ras de mantenimiento y re a ilitaci n.

Se a procedido a re isar la documentaci n presentada por el Contratista de O ra, especialmente la de requisitos iniciales como es el Plan de Tra a o Am iental, PAGA y Ho a de Ruta, documentos que una ez re isados ueron de ueltos al Contratista con o ser aciones mediante correspondencia y de manera o icial.

De igual manera, en el mes de agosto de 2021 se a participado en los di erentes comit s programados por INVIAS e Inter entoría, con el o eti o de de inir los parámetros iniciales de las inter enciones programadas

en el sector comprendido entre el PR54 100 asta el PR83 000 correspondiente al paso por el Parque Nacional Natural Purac . Dentro de las reuniones programadas, se resalta las mesas de tra a o de los días 25 y 26 de agosto de 2021 y recorrido del 27 de agosto de 2021 por el corredor ial a inter enir, especialmente el sector del PNN Purac .

REUNIONES E ECUTADAS EN EL PER ODO

- El día 13 de agosto de 2021, se desarroll reuni n irtual con uncionarios de INVIAS: o icina de Gerencia de Grandes Proyectos, Gestor Am iental de la SMAGS INTERVENTORÍA: Especialista Am iental, Pro esional Am iental, Pro esional Social CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Pro esional Am iental, donde se trataron los siguientes temas:

  Se in orma so re el o eto del contrato me oramiento y pa imentaci n de los 30 m del PNN Purac in orman so re la selecci n y contrataci n del consultor para el EIA del PNN Purac : Ucros A ogados Asociados. Una ez se cuente con dise o geom trico apro ado a ustado a las o ser aciones del Auto 141 de 2015, se procederá con el Estudio de Impacto Am iental, sin em argo en las siguientes semanas se adelantarán los monitoreos a ustados a la normati idad actual.

  En los 30 m al interior del PNN Purac , se está aciendo con ormaci n de anca e istente con adici n de material en algunos sectores, una ez se cuente con el licenciamiento am iental, se podrá acer la inter enci n con pa imentaci n.

  Inter entoría solicita al Contratista que se reporte las isitas en materia am iental para acer el correspondiente acompa amiento. De igual manera, Inter entoría a irma los cam ios en normati idad am iental para el a uste y desarrollo del EIA.

  Inter entoría solicita in ormar si ya an radicado al ANLA y PNN la in ormaci n requerida en el marco del Permiso de In estigaci n Cientí ica para acer la colecta de lora y auna, que de acuerdo con la normati idad igente se de e in ormar de las colectas de lora y auna al ANLA con mínimo 15 días de anticipaci n. El Contratista responde que se cumplirá con lo dispuesto en la normati idad igente y que el Consultor cuenta con el Permiso de In estigaci n Cientí ica - PIC, para todo el territorio nacional.

  Inter entoría in orma que los días 25 y 26 de agosto de 2021 se tiene programada la reuni n de inicio para todas las la ores del EIA.

  SMAGS de INVIAS mani iesta que es adecuado proceder con el estudio de impacto am iental y licenciamiento am iental para la inter enci n del corredor en el PNN Purac , sin em argo solicita presentar concepto al respecto.

  Gerencia de Grandes Proyectos GGP de INVIAS solicita la siguiente in ormaci n:

  1. Por qu se neg la licencia RTA (Contratista) A partir del Auto 141 de 2015 se conocen las razones por las cuales se neg la licencia, este Auto presenta la posici n de PNN respecto al proyecto, en

resumen, la restricci n más importante es el anc o de calzada, el cual tenía inter enciones laterales en el PNN. De igual manera, Incoder in orm que en el polígono no a ía presencia de comunidades tnicas, sin em argo por el ec o de tener instalaciones temporales en el po lado de Paletará, se de e conceptuar nue amente con el Ministerio del Interior. La orma de la secci n de la cuneta de e ser ree aluada para el paso de auna especialmente las ranas.

2. Cuál es el Concepto PNN respecto al proyecto RTA (Contratista) A partir del Auto 141 de 2015 se conoce el concepto de PNN, donde se in orma que el anc o de e ser a ustado al e istente, de igual manera PNN in orma que no es permitido el apro ec amiento orestal al interior del Parque como las grandes razones de negar la Licencia Am iental.

3. Hay sustracci n en el marco de la Ley 2da de 1959 RTA (Contratista) Si aplica sustracci n de reser a orestal.

Inter entoría solicita ele ar las consultas ante las di erentes Entidades con el nue o sistema de coordenadas CTM12 esta lecido por el IGAC, de igual manera solicita al Contratista que el 20 de agosto de 2021 presente un análisis de las acti idades que se puedan desarrollar al interior del PNN Purac , especialmente teniendo en cuenta las acti idades de me oramiento, mantenimiento y re a ilitaci n. Inter entoría presentará al INVIAS el 23 de agosto de 2021 el resumen de acti idades permitidas al interior del Parque. De igual manera se solicita el cronograma del EIA - a ustado a los t rminos de Ley.

SMAGS de INVIAS requiere que todas las acti idades permitidas al interior del Parque sean coordinadas con lo contenido en el documento PAGA.

Finalmente las partes participantes acuerdan los t rminos de las reuniones y recorridos planteados para los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2021, en el marco de la presentaci n o icial de los lineamientos que permitirán la inter enci n del sector comprendido entre el PR54 100 y el PR83 000 al interior del PNN Purac .

- El día 20 de agosto de 2021 se desarroll reuni n con uncionarios de INVIAS: Gestor Am iental y Social de la SMAGS INTERVENTORÍA: Especialista Am iental, Pro esional Am iental, Pro esional Social CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Pro esional Am iental, donde se trataron los siguientes temas:

*C* *PNN P*

El Contratista a tra s de su Consultor presenta e in orma que para las acti idades de mantenimiento, no e iste en la normati idad am iental igente un permiso especí ico para esta acti idad, de igual manera in orma que por su a o impacto no es o eto de permiso o autorizaci n por parte de alguna autoridad am iental. In orma que Parques Nacionales a estado in ormado de las acti idades de mantenimiento a tra s del e e del Parque Nacional Natural Purac Isaac Bedoya, quien a mostrado estar de acuerdo con la e ecuci n de estas acti idades.

Respecto a la pa imentaci n al interior del Parque in orma que con orme a la normati idad am iental, los proyectos, o ras o acti idades que a ecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por realizarse al interior de stas, requieren licenciamiento am iental.

*C*

Teniendo en cuenta lo planteado en comit s de o ra y reuniones anteriores, se pregunta al Consultor, so re la pertinencia de adelantar la consulta ante el Ministerio del Interior, respecto al trámite de determinaci n de procedencia y oportunidad de la Consulta Pre ia, teniendo en cuenta que el proyecto requiere de dos inter enciones principales, la Re a ilitaci n y el Mantenimiento, entre el PR0 y el PR18 y la pa imentaci n al interior del PNN Purac , entre el PR54 y el PR83. Al respecto el Consultor mani iesta que en primera instancia, solo los proyectos o eto de licenciamiento am iental requieren adelantar el proceso de Consulta Pre ia y para el trámite del licenciamiento am iental, se e ectuará el proceso consulti o con el Resguardo Indígena de Paletará, quienes en reuni n de inicio, solicitaron la necesidad de adelantar dic o proceso en su territorio que aunque está por uera del área del PNN Purac , se asume por esta comunidad indígena como un espacio de ida. Para el tramo de la re a ilitaci n y mantenimiento, no se considera adelantar el trámite de consulta ante el Ministerio del Interior, siendo que se plantean acti idades cuya inter enci n se realizará so re la estructura e istente por lo cual no se contempla cam io del trazado actual y tampoco se incluye la construcci n de nue as calzadas, según lo mani estado por el Consorcio San Se astián 064.

*C ICA N*

Teniendo en cuenta que en el proyecto e ecutado por la Uni n Temporal Corredores Arteriales, a o el Contrato No. 0679 de 2009, cont con un Programa de Arqueología Pre enti a apro ado por el ICAHN, que se present a la ANLA el Consorcio San Se astián 064, considera oportuno el apro ec amiento de este insumo dentro del actual proyecto. La SMAGS del INVIAS, solicita que esta in ormaci n sea a alada o re rendada por el ICAHN. Al respecto, el Contratista in orma que a realizado el trámite en distintas comunicaciones y que el ICAHN a solicitado in ormaci n adicional, que el Contratista a suministrado y se encuentra a la espera de la respuesta de initi a de dic o Instituto.

Se rati ica por todas las partes asistentes, el compromiso y agenda de la reuni n y recorrido a e ecutar los días 25, 26 y 27 de agosto de 2021, donde el Contratista presentará el cronograma para el desarrollo del EIA.

- El día 26 de agosto de 2021 se desarroll de orma presencial reuni n con uncionarios de INVIAS: Gestores Am iental y Social de la SMAGS INTERVENTORÍA: Especialista Am iental, Pro esional Am iental, Pro esional Social CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Pro esional Am iental y Consultor del EIA, donde se trataron los siguientes temas:

*P*

En la reuni n participan uncionarios del INVIAS, especialmente de la Su direcci n de Medio Am iente y Gesti n Social SMAGS y el Director Territorial por parte de Inter entoría, la Directora de Inter entoría y el equipo socio am iental incluyendo los Especialistas Am iental y de Sosteni ilidad por parte del Contratista, el Director de Proyecto, la Coordinadora, el equipo am iental y el Consultor seleccionado para la ela oraci n del EIA.

*N L A*

De acuerdo con lo esta lecido en el Decreto 1076 de 2015, que esta lece:

*"… ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. "C A N L A*
*ANLA . L A N L A -ANLA-*
*"*

*12. L S P N N*

*L S P N*
*N*

*L 2.2.2.3.2.2 2.2.2.3.2.3*
*D S P N*
*N*
*. …"*

lo esta lecido en el ARTÍCULO 2.2.2.5.4.4. Sistema Nacional de Áreas Protegidas:

*"… C D*
*S N*
*P -SINAP- S P N N*

*. …"*

*P C*

El Contratista de O ra mediante Comunicaci n CSS064-OBRA-CL-056-21 en respuesta a los o icios de Inter entoría ICA-PAL-0019 y ICA-PAL-0021, radic el 25 de agosto de 2021 el cronograma de permisos am ientales incluidas las acti idades del trámite del Estudio de Impacto Am iental y proceso de Licenciamiento Am iental sin em argo, con orme a su presentaci n, la Inter entoría solicita el a uste,

en el sentido de adaptar los tiempos y de inir la ec a de entrega de los estudios y dise os de initi os a e ecutar en el PNN Purac , de igual manera se solicita presentar las su acti idades para las tareas de sustracci n de reser a, consulta pre ia y concepto del ICAHN.

Se estima que el proceso de licenciamiento am iental incluidos todos los trámites que implica su o tenci n, es de apro imadamente de 18 meses, los cuales contemplan los tiempos de inidos por la normati idad igente y en muc os casos están su etos a los tiempos de la Autoridad Am iental.

De igual manera, es de initi o para el inicio del estudio de impacto am iental la entrega y apro aci n de los estudios y dise os que permitan de inir el polígono o polígonos que determinen el área de in luencia directa -AID- y el área de inter enci n. Para la de inici n del AID, es necesario tener toda la in ormaci n de las instalaciones pro isionales como onas RCD, Plantas de Procesamiento de Materiales y Campamentos, entre otros.

Los estudios y dise os, de erán atender lo dispuesto en Auto 141 de 2015 de la ANLA, mediante el cual se acían o ser aciones al Estudio de Impacto Am iental presentado por el Contrato No. 0679 de 2009.

*C S*

En el marco del cumplimiento con lo consignado dentro del ANE O 1 - ANE O T CNICO M DULO 1 Adenda 2, en donde se especí ica dentro del numeral 3.2 las acti idades generales a desarrollar dentro del Contrato, lo siguiente

*"...E C R N . 000405 13 2020*
*"P P S*
*C S I N V - INVIAS"..."*

Se considera necesario que los criterios de sosteni ilidad considerados en la política, sean incorporados dentro de la planeaci n y realizaci n del Estudio de Impacto Am iental, si ien, dentro del Contrato se requiere que, en un Capítulo se especi ique el alcance de estos criterios dentro del EIA, no se especi ica esto dentro de los t rminos de re erencia, de tal orma que, la Inter entoría mani iesta la necesidad de desarrollar un olumen donde se e plica el desarrollo de la Política de Sosteni ilidad del INVIAS dentro de los capítulos a los que aya lugar dentro del estudio de impacto am iental sin necesidad que esta in ormaci n sea remitida a ANLA dentro del trámite.

RE UERIMIENTOS AL CONTRATISTA

De acuerdo con las o ligaciones contractuales del Contratista e Inter entoría, se a solicitado al Contratista el cumplimiento de sus o ligaciones, principalmente en los siguientes temas:

| F R | C | A | PLA O DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 3/08/2021 | ICA-PAL-0008 | Solicitud documento PAGA | 4/08/2021 |
| 3/08/2021 | ICA-PAL-0009 | Permisos para EIA - PNN Purac | 8/08/2021 |
| 6/08/2021 | ICA-PAL-0015 | Re isi n Plan de Tra a o Sosteni ilidad V1 | Sin plazo |
| 12/08/2021 | ICA-PAL-0019 | Respuesta CSS064-OBRA-CL-27-21 re isi n cronograma EIA | 15/08/2021 |
| 19/08/2021 | ICA-PAL-0020 | Solicitud se alizaci n pre enti a sector Parque Nacional Purac | 25/08/2021 |
| 19/08/2021 | ICA-PAL-0021 | Respuesta comunicaci n CSS064-OBRA-CL-28-21<br>Cronograma de permisos am ientales (Ho a de Ruta) | 25/08/2021 |
| 23/08/2021 | ICA-PAL-0022 | Respuesta CSS064-OBRA-CL-29-21 re isi n PAGA V1 | 27/08/2021 |
| 31/08/2021 | ICA-PAL-0025 | Respuesta CSSS064-OBRA-CL-056-21 Re isi n cronograma EIA | Sin plazo |

## ANILLO DEL MACI O COLOMBIANO

RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DE INTERVENTOR A

Para el mes de agosto de 2021, el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcci n, período de tiempo en el cual el Contratista de O ra se encuentra en re isi n de los Estudios y Dise os entregados por el INVIAS.

El período de pre construcci n para el área am iental se concentra en un a ance documental y desarrollo de instrumentos de planeaci n de la Gesti n Am iental, que permita dar inicio al desarrollo de las o ras cumpliendo con toda la normati idad y políticas del INVIAS - igentes.

A tra s de reuniones y o icios, el área am iental de Inter entoría se a centrado en el requerimiento al Contratista de la presentaci n de los documentos e igidos y detallados por el Ap ndice D del Pliego de Condiciones que dio origen al Contrato No. 1001, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento y re isi n del Plan de Adaptaci n a la Guía Am iental del INVIAS - PAGA.
- Requerimiento y re isi n del cronograma de permisos y autorizaciones (Ho a de Ruta).
- Requerimiento y re isi n del Plan de Tra a o Am iental.

Se a procedido a re isar la documentaci n presentada por el Contratista de O ra, especialmente la de requisitos iniciales como es el Plan de Adaptaci n a la Guía Am iental - PAGA, el cual ue de uelto con o ser aciones mediante comunicaciones o iciales ICA-MACI O-0007 e ICA-MACI O-0012, del 02 y 06 de agosto de 2021, respecti amente.

De igual manera en el mes de agosto de 2021, se a participado en una reuni n solicitada por el Contratista de O ra con el in de re isar las o ser aciones presentadas por la Inter entoría al documento PAGA, reuni n que se realiz en la ciudad de Popayán, el día 25 de agosto de 2021.

REUNIONES E ECUTADAS EN EL PER ODO

- El día 25 de agosto de 2021 se desarroll de orma presencial en Popayán una reuni n con asistencia del Especialista Am iental del Contratista, el Especialista Am iental y el Pro esional Am iental de la Inter entoría, donde se trataron los siguientes temas:

  Cartogra ía temática: Se requiere la cartogra ía del AID, la cual de e incluir las instalaciones pro isionales que corresponden a las áreas de instalaci n temporal, campamentos, plantas de trituraci n, as alto o de concreto, sitios de disposici n inal de materiales so rantes de e ca aci n, uentes de materiales, entre otros.

  Calidad del agua: Todos los monitoreos que requiera la CAR acen parte de las responsa ilidades del Contratista de O ra, en el proceso de o tenci n de los permisos am ientales y se arán con cargo a la Administraci n del Proyecto, de acuerdo con lo esta lecido en el Ap ndice D. En caso de que la CAR requiera monitoreos de seguimiento para el permiso de ocupaci n de cauce, estos serán su etos de inclusi n en el Plan de In ersi n Am iental.

  Respecto a las zonas RCD, se solicita la inclusi n de todas las medidas mínimas de mane o am iental dentro del documento PAGA, con orme lo e igido en la Resoluci n 472 de 2017.

  Se solicita tener en cuenta los lineamientos de la Guía Am iental, especialmente lo contenido en la Ta la 7.1, páginas 148 y 149 (especialmente mapas temáticos y cartogra ía). De igual manera, se ane a la matriz de re isi n del documento PAGA preparada por la Inter entoría.

  Respecto a los monitoreos de calidad de aire, estos de erán acerse cuando las o ras se encuentren en cercanía de centros po lados o caseríos. La e ecuci n de estos monitoreos de e estar acorde a los cronogramas de inter enci n de las o ras, puesto que se de en acer pre io a la e ecuci n de las acti idades constructi as, las cuales pueden estar programadas asta por los siguientes 10 a os.

  El Contratista mani iesta estar entregando el documento PAGA el 10 de septiem re de 2021 - a ustado con las o ser aciones.

RE UERIMIENTOS AL CONTRATISTA

De acuerdo con las o ligaciones contractuales entre el Contratista e Inter entoría, se a solicitado al Contratista el cumplimiento de sus o ligaciones, principalmente en los siguientes temas:

| F R | C | D | A |
|---|---|---|---|
| 2/08/2021 | ICA-MACI O-0007 | CONSORCIO VÍAS EQUIPOS MACI O 2030 | O ser aciones y recomendaciones Programa de Gesti n Social documento PAGA V0. Respuesta a su comunicaci n MACI O 2030-P-0038 |
| 6/08/2021 | ICA-MACI O-0012 | CONSORCIO VÍAS EQUIPOS MACI O 2031 | O ser aciones y recomendaciones al documento PAGA V0. Respuesta a su comunicaci n Macizo 2030-P-0030 |
| 23/08/2021 | ICA-MACI O-0019 | CONSORCIO VÍAS EQUIPOS MACI O 2032 | Pendientes am ientales. |
| 31/08/2021 | ICA-MACI O-0022 | CONSORCIO VÍAS EQUIPOS MACI O 2033 | Solicitud Plan de Tra a o Sosteni ilidad. |

## CONCLUSIONES

El proyecto ial se encuentra en etapa de pre construcci n, etapa de initi a para la o tenci n de los permisos am ientales y la planeaci n de la e ecuci n de la gesti n am iental, para lo cual se a requerido al Contratista el cumplimiento y gesti n oportuna de los mismos.

La gesti n am iental se soporta en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y la Normati idad Vigente en materia am iental por ende, la entrega de los documentos ela orados cumpliendo los requerimientos mínimos permite e idenciar el cumplimiento de las o ligaciones contractuales, de esta manera se espera que a partir de la presentaci n del documento PAGA, se logre direccionar las acti idades en manera am iental.

Hasta la ec a, las inter enciones propuestas al interior del PNN Purac requerirán de licencia am iental de acuerdo con lo esta lecido en el Decreto 1076 de 2015 y demás legislaci n am iental igente sin em argo, se encuentra en estudio la re isi n de alternati as que permitan la inter enci n de este sector dando cumplimiento a la normati idad e istente.



MAURICIO O A VELO A
Especialista Am iental Inter entoría

# INFORME EJECUTIVO MENSUAL
# Especialista de Pavimentos
# Agosto de 2021

Proyecto: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

**Contrato de interventoría - INVIAS N° 990 - 2021**

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre-construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el Contrato 0679 de 2009.

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra y que corresponde básicamente a.

- MEJORAMIENTO DE LA RUTA 25CC15 ROSAS SANTIAGO. SECTOR SAN MIGUEL – LA VEGA DEL PR41 000 AL PR75 00. Revisión 02 de agosto de 2021.

- MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA BOLÍVAR – SANTIAGO EN LA RUTA 1203, DEL PR50 000 AL PR75 000.Revisión 02 de agosto de 2021

## REUNIONES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

El día 27 de agosto de 2021, se desarrolló reunión en la ciudad de Popayán con el Contratista, interventoría y el director de la Territorial Invias del Cauca a fin de tener una presentación general del proyecto y de las limitaciones ambientales del mismo en la zona del Páramo de Puracé.

## VISITA DE CAMPO

Se realizó visita de campo al tramo Popayán – Paletará el pasado 26 de agosto, en la misma se pudo establecer el estado del pavimento de acuerdo con su condición superficial, el cual entre el m 0 000 y el m 6 000 (Sector Coconucó) presenta un elevado estado de deterioro con presencia de daños tipo piel de cocodrilo de severidad y extensión alta, así como sectores con alta densidad de parches.

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

SANDRA BENAVIDES B.

**Sandra Johana Benavides Bermúdez**
Especialista de Pavimentos.

# INFORME EJECUTIVO MENSUAL
## Especialista en Hidráulica
## Agosto 2021

Proyecto: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

**Contrato de interventoría - INVIAS N° 990 - 2021**

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DE HIDRÁULICA DE INTERVENTORÍA

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el Contrato 0679 de 2009.

El período de pre construcción para el área de hidrología, hidráulica y socavación se concentra en un avance documental, que permita dar inicio al desarrollo de las obras cumpliendo con toda la normatividad y Políticas del INVIAS vigentes.

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra, en los estudios de hidrología, hidráulica y socavación.

### Corredor vial San Miguel - La Vega:

Se hace la revisión del informe, en el cual se identifican las cuencas aferentes utilizando la cartografía 1:25.000 y 1:10.000 del IGAC.

Entre las cuencas principales se destaca la cuenca del río Pancitara (67.7 m ) con sus afluentes la uebrada Juan Ruiz, la uebrada Cuchuguaico o la uebrada Pascariguaica. Otras cuencas serían las uebradas La Ascensión y El Pantanal o la uebrada El Bujío, afluente del río Pancitara (9.7 m ).

Según el inventario de obras, existen 176 obras que se distribuyen de la siguiente forma: 77 obras de paso y 2 puentes y 97 obras de paso que desaguan la escorrentía de las laderas aferentes entre hoyas de cauces y de la calzada.

Las estaciones que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dispone en la zona, son las estaciones pluviométricas de La Sierra, La Vega, uebradillas y Guachicono y para determinar el área de influencia de cada estación pluviométrica se usa el método de los polígonos de Thiessen, en donde se observa que solo tienen influencia sobre el proyecto vial, las estaciones de La Sierra y La Vega:

Se calculan las curvas IDF de las estaciones con influencia en el proyecto, usando el método simplificado definido en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVÍAS con base en el método de Vargas y Díaz Granados, ubicándose el proyecto en la región Andina (R1),

Para el cálculo de los caudales, se aplica el Método Racional en cuencas con superficie inferior a 0.5 m y el Método SCS de escorrentía superficial en el resto de casos.

Según el INGEOMINAS, se define el tipo de suelo como rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias y superficialmente estas unidades de roca se encuentran afectadas por procesos de meteorización.

Se maneja la sumergencia a la entrada de las alcantarillas, con la relación H /D (altura de agua a la entrada / diámetro o altura de la obra con valores no mayores al rango 1.2 - 1.5). Además, la velocidad en el interior de la obra debe ser menor a 10 m/s, debido a la resistencia del concreto.

Cuando el área de la cuenca no supera los 2.5 m2, se aplica el Método Racional para obtener el caudal. Además, se calcula la escorrentía generada en las laderas, y la generada en la calzada con ancho de 6.6 m.

Se sustituirán 77 obras menores que dan continuidad a cauces por nuevas obras, entre las que habrá 1 nuevo pontón. El resto de las obras menores existentes, se tratan de alcantarillas de 600 mm de diámetro y por tanto no cumplen la condición de dimensión mínima de 900 mm y deberán ser sustituidas.

En el estudio, se proponen tres tipos de cunetas, para nuestro caso, se continuará con las dimensiones de las cunetas existentes en los tramos de vías pavimentados.

Las longitudes máximas de las cunetas, están mal calculadas, según la capacidad hidráulica de la cuneta, con esas longitudes, se presentará el hidroplaneo.

# INFORME EJECUTIVO MENSUAL
# Especialista en Diseño Geométrico

Proyecto: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

**Contrato de interventoría - INVIAS N° 990 - 2021**

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre-construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el Contrato 0679 de 2009.

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra y que corresponde básicamente a.

- CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030. SECTOR SAN MIGUEL – LA VEGA – Primeros 3 km a intervenir
- CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 SECTOR PALETERÁ – Rehabilitación de los 6 primeros Kilómetros.

## REVISIONES REALIZADAS A ENTREGABLES

Se han realizado una serie de revisiones parciales a diseños preliminares enviados por cada uno de los contratistas para los dos tramos denominados como Macizo (Zona de Bolívar) y Paletera (Primeros 6 km), de los cuales se han emitido observaciones tanto de forma como de variables técnicas con el fin de tener el diseño más adecuado, conforme a los alcances del contrato, teniendo en cuenta todas las variables que se enmarcan en la zona.

## REUNIONES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

El día 02 de agosto de 2021, se desarrolló reunión de manera virtual por medio de la plataforma Google Meet, con el contratista Consorcio San Sebastián 064, donde se tocaron temas para el desarrollo de los estudios de geometría para los seis (6) primeros kilómetros del tramo de San Miguel en el sector denominado Coconucó; es decir entre los PR0+0000 al PR6+0000, con el fin de resolver algunas dudas al diseño preliminar enviado, teniendo en cuenta que el alcance para este sector es la rehabilitación de la vía. Se llegaron a algunos acuerdos en temas técnicos sobre el cumplimento de los parámetros de diseño geométrico y quedaron pendientes algunos temas por revisar y ajustar por parte del contratista, dadas nuestras observaciones. Es menester tener en cuenta y según lo conversado con cada una de las partes

del contrato (INVIAS, Constructor e Interventor) que cumplir el Manual de Diseño Geométrico al 100% para estas vías no es posible, toda vez que se tienen las condicionantes como tipo de terreno por la topografía de la zona, geometría existente del corredor actual y alcance del contrato. Condiciones restrictivas de cumplimiento, que deberán ser consignadas y justificadas dentro del Volumen de Diseño Geométrico que se entregará al interventor para dar pleno aval de este. Temas como la adopción de velocidad de diseño de 30 Km/h, siendo que se trata de una vía de primer orden, ancho de sección típica para el corredor, entre otros temas hablados, deberán ser detallados y justificados dentro del documento, con el fin de dar a conocer de una forma clara a todos los lectores, todos los análisis realizados dentro del Diseño geométrico.

## VISITA DE CAMPO

En la reunión realizada virtualmente, quedaron algunas dudas respecto al tratamiento de algunos puntos en especifico para el Tramo Popayán – Paleterá en sus primeros 6 kilómetros, con lo que se acordó realizar visita en campo. Esta visita a campo se realizó el pasado 6 de agosto de 2021, en donde se recorrieron los 6 km en su totalidad, parando en cada uno de los puntos específicos del sector. Se retomaron conversaciones en cuanto a que este tramo su alcance trata de rehabilitación de la vía existente y las posibles intervenciones a realizar.

**Imagen 1. Inicio de Tramo PR0+000**



**Imagen 2. Vista General Estado Vía Existente**

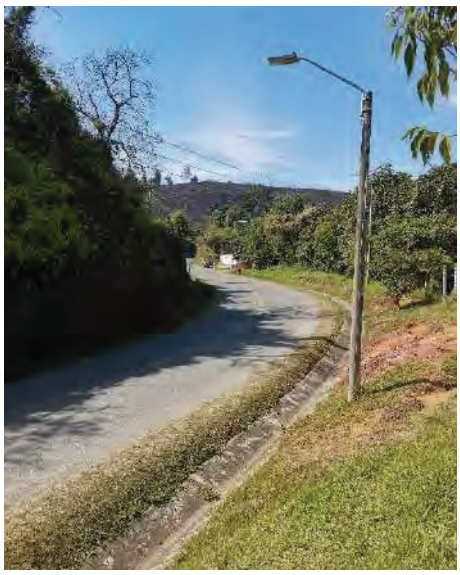


**Imagen 3. Vista de algunas curvas de la geometría existente del tramo**



**Imagen 4. Comprobaciones topográficas mediante replanteos realizados a los diseños preliminares**



**Imagen 5. Curva Crítica en el sector del restaurante vista 1**

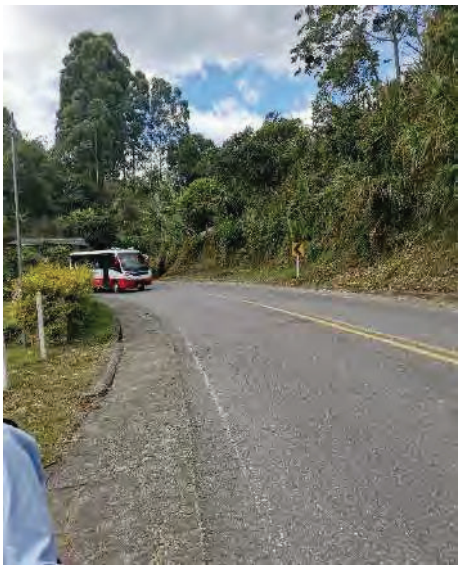


**Imagen 6. Curva Crítica en el sector del restaurante vista 2**



**Imagen 7. Curva Crítica #2 vista 1**



**Imagen 8. Curva Crítica #2 vista 2**



Posterior a la visita de campo, se realizó una m reunión de carácter técnico en compañía de los respectivos Directores, especialistas, coordinadores, residentes, entre otros, con el fin de recopilar la información y conversaciones sostenidas durante el recorrido. Llegando a algunos acuerdos en cuanto a los parámetros geométricos y a los ajustes que se debían realizar al diseño preliminar presentado, empezando con la corrección de la topografía realizada, dadas las variaciones encontradas en replanteo de campo, definición de ancho de sección típico, obtenido de las mediciones, adopción de velocidad de diseño de 30 km/h debido las restricciones que se tienen en la zona (Se solicita que debe ser debidamente justificado dentro del informe a presentar para el aval sin condiciones), se estableció que dado a que dentro del alcance del contrato este tramo es de rehabilitación, se diseñarán los sobreanchos con un camión tipo C3, toda vez que en la zona actualmente y conforme a lo informado en el documento de tránsito, para está zona transita hasta máximo este tipo de vehículo, salvo algunas ocasiones algún vehículo mayor, con lo que se deberá disponer de señalización restrictiva a lo largo del corredor para alertar sobre este tema. Para las curvas y sectores críticos se deberá realizar el calculo para un camión tipo C3S2 con el fin de dar mayor seguridad a los usuarios en estos puntos. Dado a que solo se trato de una revisión preliminar al diseño geométrico, se está a la espera del informe y diseño definitivo para dar aprobación de este. Se le informo al contratista que se debe tener especial cuidado en estas zonas críticas que el diseño de trazado sea armónico y lleve concordancia con un correcto diseño de señalización y seguridad vial, verificando sitios de puntos negros y registros de accidentalidad en la vía.

**Diego Andrés Beltrán H.**
Especialista en Diseño Geométrico.

En cuanto a pontones, existen dos pontones, uno en el P.R 41 246 y otro en el P.R. 58 995. En el P.R 41 246, el nuevo pontón se ubicará aguas abajo del existente debido al cambio del trazado en el diseño geométrico y se mantienen las dimensiones del pontón existente (6 m de altura y 7 m de luz).

El otro pontón, se encuentra en el P.R. 58 995, será un pontón en lugar de varios marcos. Las dimensiones libres de la estructura serán de 8.5 m de luz y 4 m de altura.

En el P.R. 62 490 existe en la actualidad un puente de 16.4 m de luz y 9 m de altura. Puesto que el nuevo trazado de la vía se ajusta al existente en ese punto no será necesario ejecutar un nuevo pontón sino que es suficiente con ampliar el tablero.

El caudal de diseño para este último puente en un período de retorno de 50 años es demasiado grande (859.5 m3/s).

Para el cálculo de la socavación general, consideran estables los perfiles de los cauces por lo que inicialmente se estima que este tipo de socavación tiene un valor de 0 m, tienen una socavación total muy grande.

Falta el estudio hidrológico e hidráulico de los Zodmes

**Corredor vial La Vega - San Sebastián - Santiago - Bolivar:**

Se realiza la revisión de los Estudios y Diseños hidrológicos e hidráulicos y propuesta de obras de drenaje para el sector Bolívar - Santiago desde el 51 a 56

No se encontró información de los resultados modelación hidráulica HEC-RAS, ni los diseños hidrológicos e hidráulicos para la zona urbana.

No se anexó la información hidrológica del IDEAM corresponde a los registros de precipitación máxima en 24 horas de las cuatro estaciones pluviométricas (Santiago, Los Milagros, El Rodeo y Bolívar).

No se anexó el material cartográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y hace falta la granulometría del cauce para el diseño de la socavación.

Hace falta el estudio hidrológico e hidráulico de los Zodmes.

## REUNIONES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Se realizó la reunión los días 6 y 7 de agosto en las oficinas de interventoría.

## REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA

Aún no se ha hecho requerimiento al contratista por estar en revisión los informes en mención

## CONCLUSIONES

En la revisión del informe, se encontró que faltan varios ítems para poder realizar una buena revisión del diseño, a continuación, se enumerar los ítems faltantes:

1. Para el sector de Bolivar - Santiago, no se encontró información de los resultados modelación hidráulica HEC-RAS: (Anexo E).

2. Para ambos estudios, no se encontraron los diseños hidrológicos e hidráulicos para la zona urbana.

3. Para el sector de Bolivar - Santiago, no se anexó la información hidrológica del IDEAM corresponde a los registros de precipitación máxima en 24 horas de las cuatro estaciones pluviométricas (Santiago, Los Milagros, El Rodeo y Bolívar).

4. Para ambos estudios, no se anexó el material cartográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual no incluye el número de planchas y la escala utilizada.


5. En el sector de San Miguel - La Vega, se recalculan las curvas IDF, por lo tanto, se recalculan los caudales para las obras proyectadas. Una vez recalculados los caudales, se realizó el chequeo hidráulico, se recomienda modificar la pendiente al 0.01m/m (1 ) para reducir velocidad a todas las obras. De las 76 obras de drenaje del diseño original, únicamente se mantienen 4 obras, los 72 restantes se modifican.

6. Se observa que, en ambos informes, el contratista propone aumentar la sección transversal de la cuneta. Se sugiere que las dimensiones de la cuneta se continúen con las dimensiones de la vía existente.

7. En cuanto al diseño del filtro longitudinal el contratista requiere el uso de Fortex para los filtros y aumentar la sección transversal mientras que en el diseño original se tiene la construcción con geodrenes. Se sugiere que se continue con el uso de geodrenes o con filtro francés usando geotextil no tejido NT2500 y tubería de drenaje perforada de 4".

8. Falta el estudio hidrológico e hidráulico de los Zodmes, en ambos estudios.

9. En el estudio de La Vega, hace falta la granulometría del cauce para el diseño de la socavación.



**ALBERTO JOSE CALDAS CONSTAIN**
Especialista Hidráulico

# INFORME E ECUTIVO MENSUAL
# E S
# A

Proyecto: INTERVENTOR A PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O ME ORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA V AS PARA LA LEGALIDAD LA **REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA"**

C – INVIAS N

## CORREDOR DEL PALETAR

RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DE INTERVENTOR A

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcci n, periodo de tiempo en el cual el Contratista de O ra se encuentra en re isi n de los Estudios y Dise os entregados por el INVIAS y ela orados con anterioridad a o el contrato 0679 de 2009.

El periodo de pre construcci n para el área am iental se concentra en un a ance documental y desarrollo de instrumentos de planeaci n de la Gesti n Am iental, que permita dar inicio al desarrollo de las o ras cumpliendo con toda la normati idad y Políticas del INVIAS igentes.

A tra s de reuniones y o icios el área de sosteni ilidad de Inter entoría se a centrado en el requerimiento al Contratista de la presentaci n de los documentos e igidos y detallados por el Ap ndice G del Pliego de Condiciones que dio origen al contrato N° 1006, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento y re isi n de Plan de Tra a o de Sosteni ilidad
- Requerimiento TOMO ANE O - SOSTENIBILIDAD DEL PRO ECTO

Se a procedido a re isar la documentaci n presentada por el Contratista de O ra, especialmente la de requisitos iniciales como es el Plan de Tra a o en Sosteni ilidad, documento que una ez re isado ue de uelto al Contratista con o ser aciones mediante correspondencia y o icial.

De igual manera en el mes de agosto de 2021 se a participado en los di erentes comit s programados por INVIAS e Inter entoría con el o eti o de de inir los parámetros iniciales de las inter enciones programadas en el sector comprendido entre el PR54 100 asta el PR83 000 correspondiente al paso por el Parque Nacional Natural Purac . Dentro de las reuniones programadas se resalta las mesas de tra a o de los días

25 y 26 de agosto de 2021 y recorrido del 27 de agosto de 2021 por el corredor ial a inter enir especialmente el sector del PNN Purac .

REUNIONES E ECUTADAS EN EL PERIODO

- El día 26 de agosto de 2021 se desarroll de orma presencial reuni n con uncionarios de INVIAS: Gestor Am iental y Social de la SMAGS INTERVENTORÍA: Especialista Am iental, Pro esional Am iental, Pro esional Social CONTRATISTA: Director de Proyecto, Coordinadora de Proyecto, Pro esional Am iental y Consultor de EIA donde se trataron los siguientes temas:

  *P .*

  En la reuni n participan uncionarios del INVIAS, especialmente la Su direcci n de Medio Am iente y Gesti n Social SMAGS y el Director Territorial INVIAS, por parte de Inter entoría está presente la Directora de Inter entoría y el equipo socio am iental incluyendo los especialistas am iental y sosteni ilidad, por parte del Contratista, está presente el Director de Proyecto, Coordinadora, equipo am iental y el consultor seleccionado para la ela oraci n del EIA.

  *N L A*

  De acuerdo con lo esta lecido en el decreto 1076 de 2015 que esta lece:

  *"… ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. C A N L A ANLA . L A N L A -ANLA-*

  *12. L S P N N*

  *L S P N N*

  *L 2.2.2.3.2.2 2.2.2.3.2.3 S P N N*

  *. …"*

  lo esta lecido en el ARTÍCULO 2.2.2.5.4.4. Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

  *"… C S N P -SINAP S P N N*

*. …”*

*P C*

El Contratista de O ra mediante Comunicaci n CSS064-OBRA-CL-056-21 en respuesta a los o icios de inter entoría ICA-PAL-0019 y ICA-PAL-0021, radic el 25 de agosto de 2021 el cronograma de permisos am ientales incluido las acti idades del trámite del Estudio de Impacto Am iental y proceso de Licenciamiento Am iental, sin em argo con orme a su presentaci n la Inter entoría solicita el a uste, en el sentido de adaptar los tiempos y de inir la ec a de entrega de los estudios y dise os de initi os a e ecutar en el PNN Purac , de igual manera se solicita presentar las su acti idades para las tareas de sustracci n de reser a, consulta pre ia e ICAHN.

Se estima que el proceso de licenciamiento am iental incluidos todos los tramites que implica su o tenci n es de apro imadamente 18 meses, los cuales contempla los tiempos de inidos por la normati idad igente y en muc os casos están su etos a los tiempos de la Autoridad Am iental.

De igual manera es de initi o que para el inicio del estudio de impacto am iental la entrega y apro aci n de los estudios y dise os que permitan de inir el polígono o polígonos que determinen el área de in luencia directa AID y el área de inter enci n. Para la de inici n del AID es necesario tener toda la in ormaci n de las instalaciones pro isionales como ona RCD, Plantas de Procesamiento de Materiales y campamentos.

Los estudios y dise os, de erán atender lo dispuesto en Auto 141 de 2015 de la ANLA, mediante el cual se acían o ser aciones al Estudio de Impacto Am iental presentado por el contrato 0679 de 2009.

*C S*

En el marco del cumplimiento con lo consignado dentro del ANE O 1— ANE O T CNICO MODULO 1 Adenda 2, en donde se especí ica dentro del numeral 3.2 Acti idades generales a desarrollar dentro del contrato lo siguiente

*...E C R N 000405 13 2020 P P S C S I N V - INVIAS ...*

Se considera necesario que los criterios de sosteni ilidad considerados en la política, sean incorporados dentro de la planeaci n y realizaci n del Estudio de Impacto Am iental, si ien, dentro del contrato se requiere que, en un capítulo se especi ique el alcance de estos criterios dentro del EIA, no se especi ica esto dentro de los t rminos de re erencia, de tal orma que, la inter entoría mani iesta la necesidad de

desarrollar un olumen donde se e plica el desarrollo de la política de sosteni ilidad del INVIAS dentro de los capítulos a los que aya lugar dentro del estudio de impacto am iental sin necesidad que esta in ormaci n sea remitida a ANLA dentro del trámite.

RE UERIMIENTOS A CONTRATISTA

De acuerdo con las o ligaciones contractuales de Contratista e Inter entoría, se a solicitado al contratista el cumplimiento de sus o ligaciones principalmente en los siguientes temas:

| F R | C | A | PLA O DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 6/08/2021 | ICA-PAL-0015 | Re isi n Plan de Tra a o Sosteni ilidad V1 | SIN PLA O |
| 31/08/2021 | ICA-PAL-0025 | Respuesta CSSS064-OBRA-CL-056-21 Re isi n cronograma EIA | SIN PLA O |

## ANILLO DEL MACI O COLOMBIANO

RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DE INTERVENTOR A

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcci n, periodo de tiempo en el cual el Contratista de O ra se encuentra en re isi n de los Estudios y Dise os entregados por el INVIAS.

El periodo de pre construcci n para el área de sosteni ilidad se concentra en un a ance documental y desarrollo de instrumentos de planeaci n de la Gesti n Am iental, que permita dar inicio al desarrollo de las o ras cumpliendo con toda la normati idad y Políticas del INVIAS igentes.

A tra s de reuniones y o icios el área am iental de Inter entoría se a centrado en el requerimiento al Contratista de la presentaci n de los documentos e igidos y detallados por el Ap ndice D del Pliego de Condiciones que dio origen al contrato N° 1001, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento y re isi n de Plan de Tra a o de Sosteni ilidad

De igual manera en el mes de agosto de 2021 se a participado en una reuni n solicitada por el Contratista de O ra con el in de re isar las o ser aciones presentadas por Inter entoría al documento PAGA, reuni n que el día 25 de agosto de 2021, reuni n en la que se reiter la solicitud de entrega la documentaci n que e idencia la adaptaci n de la Política de Sosteni ilidad del INVIAS. Esta solicitud se o icializ el pasado 31 de agosto con la radicaci n del o icio con consecuti o No. ICA-MACI O-0022.

REUNIONES E ECUTADAS EN EL PERIODO

- El día 25 de agosto de 2021 se desarroll de orma presencial en Popayán una reuni n con asistencia del Especialista Am iental del Contratista, Especialista Am iental de Inter entoría y pro esional Am iental de Inter entoría, donde se requiri la adaptaci n de la Política de Sosteni ilidad del INVIAS.

RE UERIMIENTOS A CONTRATISTA

De acuerdo con las o ligaciones contractuales de Contratista e Inter entoría, se a solicitado al contratista el cumplimiento de sus o ligaciones principalmente en los siguientes temas:

| F R | C | D | A |
|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | ICA-MACI O-0022 | CONSORCIO VÍAS EQUIPOS MACI O 2033 | Solicitud Plan de Tra a o Sosteni ilidad |

CONCLUSIONES

El proyecto ial se encuentra en etapa de pre construcci n, etapa de initi a para la o tenci n de permisos am ientales y la planeaci n de la e ecuci n de la gesti n am iental, para lo cual se a requerido al Contratista el cumplimiento y gesti n oportuna de los mismos.

La gesti n am iental se soporta en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y la Normati idad Vigente en materia am iental, por ende la entrega de los documentos ela orados cumpliendo los requerimientos mínimos permite e idenciar el cumplimiento de las o ligaciones contractuales, de esta manera se espera que a partir de la presentaci n del documento PAGA se logre direccionar las acti idades en manera am iental.

Es necesario que los criterios de sosteni ilidad considerados en la política del INVIAS, sean incorporados dentro de la planeaci n y realizaci n del Estudio de Impacto Am iental del Corredor del Paletará, así como del PAGA para el corredor de MACI O, de tal orma que se desarrolle un olumen donde se e plica el desarrollo de la política de sosteni ilidad del INVIAS dentro de los capítulos a los que aya lugar dentro del estudio de impacto am iental sin necesidad que esta in ormaci n sea remitida a ANLA dentro del trámite.

DIEGO RUI VEGA
Especialista en Sosteni ilidad

# ANEXO 16
# MINFRA-MN-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO INT

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-5 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

**MES DE INFORME MENSUAL:** ago-21 **CONTRATO No.** 990 DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ICAYECO 189 **SECTOR:** CORREDOR DEL PALETERA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS-SOMBRERILLOS.

| EQUIPO | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/08/2021 | 2/08/2021 | 3/08/2021 | 4/08/2021 | 5/08/2021 | 6/08/2021 | 7/08/2021 | 8/08/2021 | 9/08/2021 | 10/08/2021 | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 14/08/2021 | 15/08/2021 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021 | 21/08/2021 | 22/08/2021 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 28/08/2021 | 29/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | |
| CORREDOR DEL PALETERA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS-SOMBRERILLOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHEVROLET VITARA | SUSUKI VITARA 2WD AT PLACA IHO550 más de 2000 c.c. | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | |
| VAN DE PASAJEROS (ENTRE 8 Y 10 PERSONAS) | VAN RENAULT TRAFIC PLACA TJT605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | |
| OFICINA | POPAYAN- Calle 4 N°7-32 | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | |
| ESTACION TOPOGRAFIA | ESTACION TOTAL TOPCON MODELO CTS-3007 SERIAL 4U1216 | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | |
| NIVEL TOPOGRAFIA | NIVEL AUTOMATICO MODELO AT-G6 SERIAL 825040 | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | |
| EQUIPO COMPUTO | VARIOS | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | |
| | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:**
Nivel Automatico-Certificado de Calibración No.1730; Fecha Vencimiento:12/10/2021
Estacion Total - Certificado de Calibración No.2077; Fecha Vencimiento:22/08/2021

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: **ELSA CAMPO LOPEZ**
Director de Interventoría
Matrícula No.:19202-01710CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma
Nombre: **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Consultoria . Construcciones

No.2077

# VERIFICACIÓN DE EQUIPO

**Instrumento:** ESTACION TOTAL
**Marca:** TOPCON
**Modelo:** CTS-3007
**Número de Serie:** 4U1216
**Cliente:** ALEXANDER LEITON RIVERA
**Fecha de expedición:** 22 de febrero de 2021
**Recomendamos ajustar:** 22 de agosto de 2021

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de CCV&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

**Equipo Utilizado:**

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 07/11/2019

**Patrones Utilizados:**

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-11-2019
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-11-2019

Elaboró:

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

*Gabriel Martinez*

**Técnico de Laboratorio**
**CCV&O S.A.S.**
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali.



**Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.**

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D N° 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

No. 1730

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desviación Estándar (doble km de nivelación) | 2mm | Mínima distancia focal | 0,5m |
| Tipo de imagen | Directa | Relación de estadía | 100 |
| Magnificación | 24X | Rango del compensador | ± 15' |
| Apertura del objetivo | 30mm | Exactitud del compensador | 0,5" |

## AJUSTES EFECTUADOS

**CÓDIGOS** **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza exterior | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | Ajuste del nivel circular | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantenimiento interno | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Ajuste del sistema de enfoque | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantenimiento base nivelante | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | Ajuste del retículo | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Tornillo de movimiento fino H | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Ajuste de colimación | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |
| Chequeo del teclado | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | Ajuste de las mirillas de puntería | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |
| Ajuste del compensador | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | |

## AJUSTE CON COLIMADORES

| DESCRIPCIÓN | TOLERANCIA | ERROR | DESCRIPCIÓN | TOLERANCIA | ERROR |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de visión | <5" | <5" | Rango de compensación | + 15' | <10" |
| Nivel circular | <5' | <5' | Verticalidad de la retícula | <10" | <10" |

Fin de este documento.

2/2

Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0255
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

Consultoria . Construcciones

No. 1730

# VERIFICACIÓN DE EQUIPO

**Instrumento:** NIVEL AUTOMATICO **Marca:** TOPCON

**Modelo:** AT-G6 **Número de Serie:** B25040

**Cliente:** ALEXANDER LEITON RIVERA

**Fecha de expedición:** 12 de abril de 2021

**Recomendamos ajustar:** 12 de octubre de 2021

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de C.C.V&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

**Equipo utilizado:**

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 19/12/2018

**Patrones Utilizados:**

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 13-03-2018
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 13-03-2018

Elaboro:

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

*Gabriel Martinez*

**Técnico de Laboratorio**
**CCV&O S.A.S.**
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali

**Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.**

1/2

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D N° 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

consultoria . construcciones

No.2077

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aumentos del telescopio | 30X | Alcance sin reflector | 200M |
| Precisión angular (DIN 18723) | 5" | Alcance con dianas reflectivas | 250M |
| Precisión en distancia | ± 3mm+2ppmxd | Alcance con un prisma | 3000m |

## AJUSTES EFECTUADOS

**CÓDIGOS** **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza exterior | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | Ajuste del nivel circular | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Mantenimiento interno | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Ajuste del sistema de enfoque | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantenimiento base nivelante | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | Ajuste del retículo | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Prensa horizontal y vertical | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Ajuste de la verticalidad | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tornillo de movimiento fino H y/o V | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Ajuste de colimación | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Chequeo del teclado | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Ajuste de plomada óptica o láser | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Ajuste del compensador | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Ajuste de las mirillas de puntería | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ajuste del nivel tubular | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Ajuste del distanciómetro | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |

## AJUSTE CON COLIMADORES

| DESCRIPCIÓN | TOLERANCIA | ERROR | DESCRIPCIÓN | TOLERANCIA | ERROR |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto 0 compensador | <10" | <10" | Colimación vertical | <5" | <2" |
| Nivel tubular | <15" | <15" | Verticalidad | <20" | <10" |
| Nivel circular | <5' | <5' | Plomada óptica o láser | <1mm | .5mm |
| Colimación horizontal | <5" | <2" | | | |

## AJUSTE CON LÍNEA BASE

Constante de Prisma: -30mm PPM: 14

| DISTANCIA (mm) | PROMEDIO (10 Medidas) | DESVIACIÓN ESTÁNDAR | INCERTIDUMBRE (mm) | TOLERANCIA (mm) | Error (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49805.66 | 49805.1 | 0,32 | 0.10 | ± 2 | -0.56 |

Fin de este documento.



consultoria . construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
Email.: ccvyo.sas@gmail.com

**Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.**

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

Consultoria . Construcciones

No. 2469

# VERIFICACIÓN DE EQUIPO

**Instrumento:** NIVEL AUTOMATICO
**Marca:** T
**Modelo:** AT-G6
**Número de Serie:** B25040
**Cliente:** ALEXI LEITON RIVERA
**Fecha de expedición:** 4 de agosto de 2021
**Recomendamos ajustar:** 4 de febrero de 2022

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de C.C.V&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

**Equipo utilizado:**

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 08/03/2021

**Patrones Utilizados:**

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-03-2021
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-03-2021

Elaboro:

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail.: ccvyo.sas@gmail.com

*Gabriel Martinez*
**Técnico de Laboratorio**
**CCV&O S.A.S.**
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali



**Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.**
TOPCON PENTAX SPECTRA PRECISION SOUTH Leica Nikon SOKKIA
CALLE 3D N° 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

Consultoria . Construcciones

No. 2469

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desviación Estándar (doble km de nivelación) | 2mm | Mínima distancia focal | 0,4m |
| Tipo de imagen | Directa | Relación de estadía | 100 |
| Magnificación | 24X | Rango del compensador | ± 15' |
| Apertura del objetivo | 32mm | Exactitud del compensador | 0.5" |

## AJUSTES EFECTUADOS

**CÓDIGOS** **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza exterior | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | Ajuste del nivel circular | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantenimiento interno | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Ajuste del sistema de enfoque | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantenimiento base nivelante | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | Ajuste del retículo | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Tornillo de movimiento fino H | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Ajuste de colimación | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |
| Chequeo del teclado | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | Ajuste de las mirillas de puntería | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |
| Ajuste del compensador | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | |

## AJUSTE CON COLIMADORES

| DESCRIPCIÓN | TOLERANCIA | ERROR | DESCRIPCIÓN | TOLERANCIA | ERROR |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de visión | <5" | <5" | Rango de compensación | + 15' | <30" |
| Nivel circular | <5' | <5' | Verticalidad de la retícula | <10" | <10" |

Fin de este documento.

2/2

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 5056
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

Consultoria . Construcciones

No.2797

# VERIFICACIÓN DE EQUIPO

**Instrumento:** ESTACION TOTAL **Marca:** TOPCON

**Modelo:** CTS-3007 **Número de Serie:** 4U1216

**Cliente:** ALEXANDER LEITON RIVERA

**Fecha de expedición:** 22 de agosto de 2021

**Recomendamos ajustar:** 22 de febrero de 2022

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de CCV&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

**Equipo Utilizado:**

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 07/11/2019

**Patrones Utilizados:**

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-11-2019
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-11-2019

Elaboró:

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

*Gabriel Martinez*

**Técnico de Laboratorio**
**CCV&O S.A.S.**
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali.



**Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.**

TOPCON PENTAX EPICTIA SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

FOLIO 225

Consultoria . Construcciones

No.2797

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aumentos del telescopio | 30X | Alcance sin reflector | 200M |
| Precisión angular (DIN 18723) | 5" | Alcance con dianas reflectivas | 250M |
| Precisión en distancia | ± 3mm+2ppmxd | Alcance con un prisma | 3000m |

## AJUSTES EFECTUADOS

**CÓDIGOS** **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza exterior | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Mantenimiento interno | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantenimiento base nivelante | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Prensa horizontal y vertical | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tornillo de movimiento fino H y/o V | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Chequeo del teclado | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ajuste del compensador | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ajuste del nivel tubular | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste del nivel circular | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Ajuste del sistema de enfoque | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ajuste del retículo | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Ajuste de la verticalidad | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ajuste de colimación | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Ajuste de plomada óptica o láser | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Ajuste de las mirillas de puntería | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ajuste del distanciómetro | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |

## AJUSTE CON COLIMADORES

| DESCRIPCIÓN | TOLERANCIA | ERROR | DESCRIPCIÓN | TOLERANCIA | ERROR |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto 0 compensador | <10" | <10" | Colimación vertical | <5" | <2" |
| Nivel tubular | <15" | <15" | Verticalidad | <20" | <10" |
| Nivel circular | <5' | <5' | Plomada óptica o láser | <1mm | .5mm |
| Colimación horizontal | <5" | <2" | | | |

## AJUSTE CON LÍNEA BASE

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
Email.: ccvyo.sas@gmail.com

Constante de Prisma: -30mm PPM: 14

| DISTANCIA (mm) | PROMEDIO (10 Medidas) | DESVIACIÓN ESTÁNDAR | INCERTIDUMBRE (mm) | TOLERANCIA (mm) | Error (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49805.66 | 49805.1 | 0,32 | 0.10 | ± 2 | -0.56 |



Fin de este documento.

**Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.**

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

FOLIO 226

# ANEXO 17
# MINFRA-MN-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTRATO INT

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-7 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 03 (Día) 09 (Mes) 2021

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

**MES DEL INFORME:** AGOSTO DE 2021 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 DE 2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189 **SECTOR:** * RUTA 2002 · POPAYAN - PALETARA - ISNOS - SOMBRERILLOS

| NOMBRE | CARGO | 1/08/2021 | 2/08/2021 | 3/08/2021 | 4/08/2021 | 5/08/2021 | 6/08/2021 | 7/08/2021 | 8/08/2021 | 9/08/2021 | 10/08/2021 | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 14/08/2021 | 15/08/2021 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021 | 21/08/2021 | 22/08/2021 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 28/08/2021 | 29/08/2021 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TODOS LOS FRENTES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elsa Campo López | Director de interventoría | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Cesar Yamid Hoyos | Ingeniero Residente de Interventoría | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Diego Fernando Mambuscay Pantoja | Ingeniero Residente de Interventoría | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Carolina Andrea Martínez Salazar | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Rafael Belalcazar Orozco | Especialista Ambiental | - | - | - | - | - | - | | | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Modesto Mauricio Joya Veloza | Especialista Ambiental | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Sandra Johana Benavidez Bermudez | Especialista en Pavimentos y/o Vías | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Alberto Jose Caldas Cosntain | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | | | | | | | | | | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Beltran Hurtado Diego Andres | Especialista en Diseño Geométrico | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Diego Alejandro Ruiz Vega | Especialista en Sostenibilidad | | | | | | | | | | | | | | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Nory Fabiola Garcia de Velez | Profesional Social | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Ingrit Marcela Rosas Vernanza | Profesional Social | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Luis Miguel Narváez Vanegas | Profesional en Gestión Ambiental | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Ruben Caicedo Celis | Profesional Técnico Predial | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Diana Soley Quiroga Moreno | Auditor de calidad | | | | | | | | | | | | | | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Nestor Wilson Arias Escobar | Inspector | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Manuel Antonio Perez | Inspector | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| Alexi Omir Leiton Rivera | Topógrafo Inspector | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| Alexander Leiton Rivera | Topógrafo Inspector | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| Sandra Murcia | Laboratorista Inspector | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| Andrés Felipe Sánchez Grijalba | Inspector SST | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| Angie Liseth Anacona Majin | Secretaria | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| Andrea Cantor Henao | Secretaria | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| James Leonardo Collazos Pino | Conductor | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| Segundo Ricaude Rodriguez diaz | Conductor | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL PERSONAL DE INTERVENTORIA REGISTRADO LABORO DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE CON LA DEDICACIÓN PAGADA EN EL ACTA DE OBRA N°3

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-01710CAU

Firma
Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: Jose Adrian Valencia Castrillon
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# ANEXO 18
# MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORIA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| | | FECHA | 3 (Día) | 9 (Mes) | 2021 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

**MES INFORME MENSUAL:** 1 a 31 de Agosto de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** **MODULO1:** Anillo del Macizo **MODULO2:** Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. **SECTOR:** VARIOS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 423821 | C-2401-0600-90-0-2401008-02 | 54 | Nación | Contrato Principal | $ 538.921.940,00 |
| | 423821 | C-2401-0600-90-0-2401023-02 | 54 | Nación | Contrato Principal | $ 7.370.706,00 |
| | 423821 | C-2401-0600-113-0-2401008-02 | 54 | Nación | Contrato Principal | $ 1.623.229.650,00 |
| 2022 | | | | | | $ 2.169.815.216,00 |
| 2023 | | | | | | $ 3.254.722.689,00 |
| 2024 | | | | | | $ 2.856.504.202,00 |
| 2025 | | | | | | $ 4.074.151.261,00 |
| 2026 | | | | | | $ 5.705.344.538,00 |
| 2027 | | | | | | $ 5.166.722.689,00 |
| 2028 | | | | | | $ 6.384.369.747,00 |
| 2029 | | | | | | $ 7.063.394.958,00 |
| 2030 | | | | | | $ 7.875.159.664,00 |
| | | | TOTAL | | | **$ 46.719.707.260,00** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** XDR **46.719.707.260,0**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No.423821 De 24/05/2021 | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2.169.522.296,00 | | 46.719.707.260,00 | | Valor iniciales sin a ectaci n de pagos |
| 1 | 1 a 30 de unio de 2021 | - | - | - | - | - | 2.169.522.296,00 | - | 46.719.707.260,00 | | Amortizaci n 0% |
| 2 | 1 a 31 de ulio de 2021 | 124.284.020,00 | 23.613.964,00 | 147.897.984,00 | - | - | 2.021.624.312,00 | 147.897.984,00 | 46.571.809.276,00 | | Amortizaci n 0% |
| 3 | 1 a 31 de Agosto de 2021 | 197.445.180,00 | 37.514.584,00 | 234.959.764,00 | - | - | 1.786.664.548,00 | 382.857.748,00 | 46.336.849.512,00 | | Amortizaci n 0% |
| | TOTALES | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.**

**NOTAS:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **Elsa Campo Lopez**
Director de Interventoria
Matrícula No.: **19202-917 10 CAU**

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma
Nombre: **Jose Adrian Valencia Castrillon**
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula No.: **19202 40638 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjmendiet | JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-05-24-5:29 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 67121 de fecha 2021-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 423821 | **Fecha Registro:** | 2021-05-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 2.169.522.296,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 2.169.522.296,00 | **Saldo x Obligar:** | 2.169.522.296,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901480839 | **Razon Social:** | CONSORCIO ICAYECO 189 | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 833030083 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Registro Previo |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 35195494 | **Nombre:** | CATALINA TELLEZ POSADA | **Cargo:** | DIRECTOR DE CONTRATACION |

| CAJA MENOR | | | | VIATICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de comisión:** | | **Numero:** | 990/2021 | **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Fecha:** | 2021-05-13 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | C-2401-0600-90-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA. CAUCA, PUTUMAYO | Nación | 54 | CSF | | 538.921.940,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 538.921.940,00 | 0,00 | 538.921.940,00 | 538.921.940,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | C-2401-0600-90-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA. CAUCA, PUTUMAYO | Nación | 54 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 7.370.706,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 7.370.706,00 | 0,00 | 7.370.706,00 | 7.370.706,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | C-2401-0600-113-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA | Nación | 54 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 1.623.229.650,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 1.623.229.650,00 | 0,00 | 1.623.229.650,00 | 1.623.229.650,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CON 990/2021 PLAZO 144 MESES MEMO DO 35792 DE 24-05-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ...CAUCA Y HUILA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-06-30 | 309.522.296,00 | 309.522.296,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-07-31 | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-08-31 | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-09-30 | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-10-31 | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-11-30 | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-31 | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# ANEXO 19
# MINFRA-MN-IN-15-FR-13- CONTROL DE APORTES INTERVENTORIA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| | | FECHA | 3 (Día) | 9 (Mes) | 2021 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** Agosto de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** **MODULO1:** Anillo del Macizo **MODULO2:** Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos.

**SECTOR:** VARIOS

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO / HONORARIOS | Índice Base Cotización (I.B.C.) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARL | EPS | PENSIÓN | CAJA | SENA | ICBF |
| 1 | Elsa Campo López | 34.524.375 | Director de interventoría | $ 8.000.000,00 | $ 7.500.000,00 | $ 522.000,00 | $ 320.000,00 | | $ 320.000,00 | | |
| 2 | Cesar Yamid Hoyos | 1.061.710.447 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 5.700.000,00 | $ 5.200.000,00 | $ 361.920,00 | $ 228.000,00 | $ 832.000,00 | $ 228.000,00 | | |
| 3 | Diego Fernando Mambuscay Pantoja | 10.299.575 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 5.700.000,00 | $ 5.200.000,00 | $ 361.920,00 | $ 228.000,00 | $ 832.000,00 | $ 228.000,00 | | |
| 4 | Carolina Andrea Martínez Salazar | 25.285.032 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.900.000,00 | $ 3.500.000,00 | $ 243.600,00 | $ 156.000,00 | $ 560.000,00 | $ 156.000,00 | | |
| 5 | Rafael Belalcazar Orozco | 76.322.682 | Especialista Ambiental | $ 2.457.000,00 | $ 3.500.000,00 | $ 243.600,00 | $ 98.280,00 | $ 560.000,00 | $ 98.280,00 | | |
| 6 | Modesto Mauricio Joya Veloza | 79.513.988 | Especialista Ambiental | $ 2.040.000,00 | $ 6.800.000,00 | $ 473.280,00 | $ 81.600,00 | $ 1.088.000,00 | $ 81.600,00 | | |
| 7 | Sandra Johana Benavidez Bermudez | 63.437.371 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 884.000,00 | $ 6.800.000,00 | $ 473.280,00 | $ 35.360,00 | $ 1.088.000,00 | $ 35.360,00 | | |
| 8 | Alberto Jose Caldas Cosntain | 10.548.030 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 4.080.000,00 | $ 6.800.000,00 | $ 473.280,00 | $ 163.200,00 | $ 1.088.000,00 | $ 163.200,00 | | |
| 9 | Diego Andres Beltran Hurtado | 2.997.407 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 5.440.000,00 | $ 6.800.000,00 | $ 473.280,00 | $ 217.600,00 | $ 1.088.000,00 | $ 217.600,00 | | |
| 10 | Diego Alejandro Ruiz Vega | 10.546.661 | Especialista en Sostenibilidad | $ 3.600.000,00 | $ 6.000.000,00 | $ 417.600,00 | $ 144.000,00 | $ 960.000,00 | $ 144.000,00 | | |
| 11 | Nory Fabiola Garcia de Velez | 34.527.562 | Profesional Social | $ 4.200.000,00 | $ 4.200.000,00 | $ 292.320,00 | $ 168.000,00 | $ 672.000,00 | $ 168.000,00 | | |
| 12 | Ingrit Marcela Rosas Vernanza | 25.282.150 | Profesional Social | $ 4.200.000,00 | $ 4.200.000,00 | $ 292.320,00 | $ 168.000,00 | $ 672.000,00 | $ 168.000,00 | | |
| 13 | Luis Miguel Narváez Vanegas | 1.061.691.327 | Profesional en Gestión Ambiental | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | $ 313.200,00 | $ 180.000,00 | $ 720.000,00 | $ 180.000,00 | | |
| 14 | Ruben Caicedo Celis | 79.569.923 | Profesional Técnico Predial | $ 4.800.000,00 | $ 4.500.000,00 | $ 313.200,00 | $ 192.000,00 | $ 720.000,00 | $ 192.000,00 | | |
| 16 | Diana Soley Quiroga Moreno | 53.076.173 | Auditor de calidad | $ 450.000,00 | $ 4.500.000,00 | $ 313.200,00 | $ 18.000,00 | $ 720.000,00 | $ 18.000,00 | | |
| 17 | Nestor Wilson Arias Escobar | 76.321.236 | Inspector | $ 1.914.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 139.200,00 | $ 76.560,00 | $ 320.000,00 | $ 76.560,00 | | |
| 18 | Manuel Antonio Perez | 10.546.661 | Inspector | $ 1.914.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 139.200,00 | $ 76.560,00 | $ 320.000,00 | $ 76.560,00 | | |
| 19 | Alexi Omir Leiton Rivera | 10.298.111 | Topógrafo Inspector | $ 2.200.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 139.200,00 | $ 88.000,00 | $ 320.000,00 | $ 88.000,00 | | |
| 20 | Alexander Leiton Rivera | 91.495.146 | Topógrafo Inspector | $ 2.200.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 139.200,00 | $ 88.000,00 | $ 320.000,00 | $ 88.000,00 | | |
| 21 | Sandra Murcia | 25.274.451 | Laboratorista Inspector | $ 814.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 139.200,00 | $ 32.560,00 | $ 320.000,00 | $ 32.560,00 | | |
| 22 | Andrés Felipe Sánchez Grijalba | 10.302.439 | Inspector SST | $ 2.200.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 139.200,00 | $ 88.000,00 | $ 320.000,00 | $ 88.000,00 | | |
| 23 | Angie Liseth Anacona Majin | 1.061.767.776 | Secretaria | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 69.600,00 | $ 40.000,00 | $ 160.000,00 | $ 40.000,00 | | |
| 24 | Andrea Cantor Henao | 1.032.430.268 | Secretaria | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 69.600,00 | $ 40.000,00 | $ 160.000,00 | $ 40.000,00 | | |
| 25 | James Leonardo Collazos Pino | 10.540.950 | Conductor | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 83.520,00 | $ 48.000,00 | $ 192.000,00 | $ 48.000,00 | | |
| 26 | Segundo Ricaude Rodriguez diaz | 98.290.187 | Conductor | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 83.520,00 | $ 48.000,00 | $ 192.000,00 | $ 48.000,00 | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | **$ 75.593.000,00** | | | $ 3.023.720,00 | | $ 3.023.720,00 | | |

**NOTAS:**
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma
Nombre: **Elsa Campo López**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **19202-01710 CAU**

Firma
Nombre: **José Adrián Valencia Castrillón**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **19202 40638 CAU**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.483.121
MONROY MARIÑO

APELLIDOS
JOSE HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

20-OCT-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00169943-M-0019483121-20090815 0014998444A 1 1440105592

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO




38453-T

JOSE HERNANDO
MONROY MARINO
C.C. 19.493.121
RESOLUCION INSCRIPCION 011
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 14-JU-94

Presidente

0004696

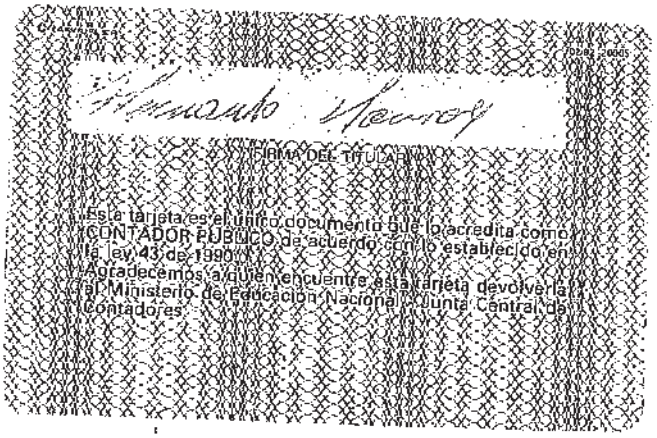

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3EB0313A190E4F76

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE HERNANDO MONROY MARI O** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19483121 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38453-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# Certificado de Aportes

Se certifica que ELSA  CAMPO LOPEZ identificado(a) con CC 34524375 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA NI 900494141**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2021-08 | 2021-09 | 1121967563 | 9424420700 | E | 2021-09-07 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| ARL | COLMENA | 30 | 6.96% | $7,500,000 | $522,000 |
| CCF | COMFACAUCA | 30 | 4% | $7,500,000 | $300,000 |
| EPS | SANITAS | 30 | 4% | $7,500,000 | $300,000 |

Este certificado se expide el día 2021-09-07 a las 12:31.

# Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR YAMID HOYOS COLLAZOS identificado(a) con CC 1061710447 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA NI 900494141**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2021-08 | 2021-09 | 1121967563 | 9424420700 | E | 2021-09-07 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $5,200,000 | $832,000 |
| AFP | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 30 | | $5,200,000 | $26,000 |
| AFP | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 30 | | $5,200,000 | $26,000 |
| ARL | COLMENA | 30 | 6.96% | $5,200,000 | $362,000 |
| CCF | COMFACAUCA | 30 | 4% | $5,200,000 | $208,000 |
| EPS | SANITAS | 30 | 4% | $5,200,000 | $208,000 |

Este certificado se expide el día 2021-09-07 a las 12:34.

# Certificado de Aportes

Se certifica que YURI ANDREA CANTOR HENAO identificado(a) con CC 1032430268 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA NI 900494141**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2021-08 | 2021-09 | 1121967563 | 9424420700 | E | 2021-09-07 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | COLMENA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 30 | 4% | $2,000,000 | $80,000 |
| EPS | FAMISANAR | 30 | 4% | $2,000,000 | $80,000 |

Este certificado se expide el día 2021-09-07 a las 12:33.

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901480839 | 9 | CONSORCIO ICAYECO 189 | A - 200 O MAS COTIZANTES | ICAYECO | CR 7 A 124 93 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7042782 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-09 | 1121783042 | 9424412976 | E | 2021/09/09 | 2021/09/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $10,083,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: ICAYECO (14 Afiliados)** | | | | | | $35,666,669 | $5,880,900 | | | $35,666,669 | $1,426,900 | | | $8,916,666 | $356,900 | | | $35,666,669 | $2,418,600 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 1 Afiliados)** | | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $250,000 | $10,000 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $250,000 | $10,000 | | | $1,000,000 | $5,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1061767776 | ANACONA ANGIE | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF14 | 30 | $250,000 | $10,000 | 14-25 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 13 Afiliados)** | | | | | | $34,666,669 | $5,720,900 | | | $34,666,669 | $1,386,900 | | | $8,666,666 | $346,900 | | | $34,666,669 | $2,413,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA ( 13 Afiliados) | | | | | | $34,666,669 | $5,720,900 | | | $34,666,669 | $1,386,900 | | | $8,666,666 | $346,900 | | | $34,666,669 | $2,413,300 | | $0 | $0 |
| 2 | CC | 76321236 | ARIAS NESTOR | 25-14 | 29 | $1,933,334 | $309,400 | EPS005 | 29 | $1,933,334 | $77,400 | CCF14 | 29 | $483,333 | $19,400 | 14-25 | 29 | $1,933,334 | $134,600 | 29 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 76322682 | BELALCAZAR RAFAEL | 230301 | 22 | $2,566,667 | $410,700 | EPS018 | 22 | $2,566,667 | $102,700 | CCF14 | 22 | $641,667 | $25,700 | 14-25 | 22 | $2,566,667 | $178,700 | 22 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 79569923 | CAICEDO RUBEN | 25-14 | 30 | $4,500,000 | $765,000 | EPS005 | 30 | $4,500,000 | $180,000 | CCF14 | 30 | $1,125,000 | $45,000 | 14-25 | 30 | $4,500,000 | $313,200 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 10540950 | COLLAZOS JAMES | 230301 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS037 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | CCF14 | 30 | $300,000 | $12,000 | 14-25 | 30 | $1,200,000 | $83,600 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 34527562 | GARCIA NORY | 25-14 | 30 | $4,200,000 | $714,000 | EPS037 | 30 | $4,200,000 | $168,000 | CCF14 | 30 | $1,050,000 | $42,000 | 14-25 | 30 | $4,200,000 | $292,400 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 10298111 | LEITON ALEXI | 25-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS037 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF14 | 30 | $500,000 | $20,000 | 14-25 | 30 | $2,000,000 | $139,200 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 91495146 | LEITON ERLIN | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS037 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF14 | 30 | $500,000 | $20,000 | 14-25 | 30 | $2,000,000 | $139,200 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 25285032 | MARTINEZ CAROLINA | 230201 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS005 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | CCF14 | 30 | $875,000 | $35,000 | 14-25 | 30 | $3,500,000 | $243,600 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 25274451 | MURCIA SANDRA | 230301 | 14 | $933,334 | $149,400 | EPS005 | 14 | $933,334 | $37,400 | CCF14 | 14 | $233,333 | $9,400 | 14-25 | 14 | $933,334 | $65,000 | 14 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1061691327 | NARVAEZ LUIS | 25-14 | 30 | $4,500,000 | $765,000 | EPS037 | 30 | $4,500,000 | $180,000 | CCF14 | 30 | $1,125,000 | $45,000 | 14-25 | 30 | $4,500,000 | $313,200 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 10546661 | PEREZ MANUEL | 231001 | 29 | $1,933,334 | $309,400 | EPS005 | 29 | $1,933,334 | $77,400 | CCF14 | 29 | $483,333 | $19,400 | 14-25 | 29 | $1,933,334 | $134,600 | 29 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 98290187 | RODRIGUEZ SEGUNDO | 25-14 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS005 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | CCF14 | 30 | $300,000 | $12,000 | 14-25 | 30 | $1,200,000 | $83,600 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 25282150 | ROSAS INGRID | 230201 | 30 | $4,200,000 | $714,000 | EPS005 | 30 | $4,200,000 | $168,000 | CCF14 | 30 | $1,050,000 | $42,000 | 14-25 | 30 | $4,200,000 | $292,400 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 14)** | | | $35,666,669 | $5,880,900 | | | $35,666,669 | $1,426,900 | | | $8,916,666 | $356,900 | | | $35,666,669 | $2,418,600 | | $0 | $0 |

FOLIO 241

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901480839 | 9 | CONSORCIO ICAYECO 189 | A - 200 O MAS COTIZANTES | ICAYECO | CR 7 A 124 93 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7042782 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-09 | 1121783042 | 9424412976 | E | 2021/09/09 | 2021/09/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $10,083,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 14 | $5,880,900 | $0 | $0 | $5,880,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $309,400 | $0 | $0 | $309,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 6 | $3,065,400 | $0 | $0 | $3,065,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $1,232,100 | $0 | $0 | $1,232,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $1,274,000 | $0 | $0 | $1,274,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $2,418,600 | $0 | $0 | $2,418,600 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 14 | $2,418,600 | $0 | $0 | $2,418,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $356,900 | $0 | $0 | $356,900 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 14 | $356,900 | $0 | $0 | $356,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 14 | $1,426,900 | $0 | $0 | $1,426,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | $556,000 | $0 | $0 | $556,000 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $102,700 | $0 | $0 | $102,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 8 | $768,200 | $0 | $0 | $768,200 |
| **TOTAL** | | | | **14** | **$10,083,300** | **$0** | **$0** | **$10,083,300** |

FOLIO 242



2021/09/07 11:39 AM

# CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la ley 828 de 2003 y demás normatividad que rige la materia, bajo la gravedad de juramento.

Yo, Angie Caterine Cantor Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 53.117.693 de Bogotá y tarjeta profesional No 137910-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en calidad de Revisora Fiscal de COPEBA S.A.S

## CERTIFICO

Que en el periodo del **01 de Agosto al 31 de Agosto de 2021**, COPEBA S.A.S. identificada con el NIT 830.011.122-9 ha dado cumplimiento para todo el personal de trabajo e integrantes de la misma, de forma oportuna y completa a las afiliaciones y pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el ámbito de la ejecución del contrato **No**. **921 de 2021**, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se suscribe en Bogotá, a los seis (06) días del mes de septiembre de 2021.

**ANGIE CATERINE CANTOR ORTIZ**
T.P. No. 137910-T
REVISOR FISCAL COPEBA S.A.S..

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA identificado(a) con CC 10299575

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,700,000 | 4% | $228,000 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,700,000 | 16% | $912,000 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,700,000 | | $28,500 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,700,000 | | $28,500 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | ARL | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,700,000 | 6.96% | $396,800 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | CCF | CCF14 | COMFACAUCA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,700,000 | 4% | $228,000 |

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 03:49.



FOLIO 244

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE SANCHEZ GRIJALBA identificado(a) con CC 10302439

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,200,000 | 4% | $88,000 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,200,000 | 16% | $352,000 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,200,000 | | $0 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,200,000 | | $0 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | ARL | 14-7 | SEGUROS BOLIVAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,200,000 | 6.96% | $153,200 |
| 9424279120 | 1115755833 | E | 2021-09-02 | CCF | CCF14 | COMFACAUCA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,200,000 | 4% | $88,000 |

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 03:50.



FOLIO 245

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901480839 | 9 | CONSORCIO ICAYECO 189 | A - 200 O MAS COTIZANTES | ICAYECO | CR 7 A 124 93 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7042782 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-08 | 1121816248 | 9424413364 | Y | 2021/09/09 | 2021/09/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $314,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: ICAYECO (2 Afiliados)** | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $4,520,000 | $314,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 2 Afiliados)** | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $4,520,000 | $314,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 2 Afiliados) | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $4,520,000 | $314,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 10548030 | CALDAS ALBERTO | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $2,720,000 | $189,400 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 52210619 | RODRIGUEZ ELIANA | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 2)** | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $4,520,000 | $314,700 | | $0 | $0 |

FOLIO 246



2021/09/07 11:40 AM

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901480839 | 9 | CONSORCIO ICAYECO 189 | A - 200 O MAS COTIZANTES | ICAYECO | CR 7 A 124 93 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7042782 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-08 | 1121816248 | 9424413364 | Y | 2021/09/09 | 2021/09/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $314,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $314,700 | $0 | $0 | $314,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 2 | $314,700 | $0 | $0 | $314,700 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$314,700** | **$0** | **$0** | **$314,700** |

FOLIO 247



2021/09/07 11:40 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901480839 | 9 | CONSORCIO ICAYECO 189 | A - 200 O MAS COTIZANTES | ICAYECO | CR 7 A 124 93 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7042782 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-08 | 1122363715 | 9424434262 | N | 2021/09/09 | 2021/09/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $94,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: ICAYECO (1 Afiliados)** | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,360,000 | $94,600 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 1 Afiliados)** | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,360,000 | $94,600 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,360,000 | $94,600 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 10548030 | CALDAS ALBERTO | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | ($2,720,000) | ($189,400) | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 10548030 | CALDAS ALBERTO | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $4,080,000 | $284,000 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 1)** | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,360,000 | $94,600 | | $0 | $0 |

FOLIO 248

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901480839 | 9 | CONSORCIO ICAYECO 189 | A - 200 O MAS COTIZANTES | ICAYECO | CR 7 A 124 93 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7042782 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-08 | 1122363715 | 9424434262 | N | 2021/09/09 | 2021/09/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $94,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $94,600 | $0 | $0 | $94,600 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $94,600 | $0 | $0 | $94,600 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$94,600** | **$0** | **$0** | **$94,600** |

FOLIO 249



2021/09/07 04:26 PM

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MODESTO MAURICIO JOYA VELOZA identificado(a) con CC 79513988

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,267,587 | 12.5% | $1,033,500 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,267,587 | 16% | $1,322,900 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,267,587 | | $41,400 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,267,587 | | $41,400 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,267,587 | 0.522% | $43,200 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,267,587 | 4% | $330,800 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,267,587 | 2% | $165,400 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,267,587 | 3% | $248,100 |

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 02:54.



FOLIO 250

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA JOHANA BENAVIDES BERMUDEZ identificado(a) con CC 63437371

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | EPS | EPS001 | ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,250,000 | 4% | $170,000 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,250,000 | 16% | $680,000 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,250,000 | | $21,300 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,250,000 | | $21,300 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,250,000 | 0.522% | $22,200 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,250,000 | 4% | $170,000 |

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 02:55.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ANDRES BELTRAN HURTADO identificado(a) con CC 2997407

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | EPS | EPS001 | ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,690,000 | 4% | $227,600 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,690,000 | 16% | $910,400 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,690,000 | | $28,500 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,690,000 | | $28,500 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,690,000 | 6.96% | $396,100 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,690,000 | 4% | $227,600 |

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 02:53.

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEJANDRO RUIZ VEGA identificado(a) con CC 1012323002

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | EPS | EPS017 | FAMISANAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,300,000 | 4% | $212,000 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,300,000 | 16% | $848,000 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,300,000 | | $26,500 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,300,000 | | $26,500 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,300,000 | 0.522% | $27,700 |
| 9424301754 | 1116412022 | E | 2021-09-02 | CCF | CCF22 | COLSUBSIDIO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2021-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,300,000 | 4% | $212,000 |

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 02:52.

# ANEXO 20
# MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS INTERVENTORIA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-16 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | |

FECHA: 05 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 , LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

**FECHA DE INICIO:** 28/06/21

**PLAZO INICIAL:** 114 MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/08/30 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** 46.719.707.260,00

**VALOR ACUMULADO:** 46.719.707.260,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | 1.452.471.566,40 | 13 | 5 | 2021 | 16 | 7 | 2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | 2.904.943.132,80 | 13 | 5 | 2021 | 16 | 1 | 2029 |
| Calidad del servicio | | 4.357.414.699,20 | El amparo de Calidad del servicio tendra una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra objeto | | | El amparo de Calidad del servicio tendra una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra objeto | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | 2.178.707.349,60 | 13 | 5 | 2021 | 16 | 7 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** M-100141561

**Certificado de modificación o anexo No.:** ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS**

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | 1.452.471.566,40 | 13 | 5 | 2021 | 16 | 7 | 2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | 2.904.943.132,80 | 13 | 5 | 2021 | 16 | 1 | 2029 |
| Calidad del servicio | | 4.357.414.699,20 | 16 | 1 | 2026 | 16 | 1 | 2031 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | 2.178.707.349,60 | 13 | 5 | 2021 | 16 | 7 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** M-100141561

**Certificado de modificación o anexo No.:** ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:**

**Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:** Anexo No. 3 Certificado 14650283 2 de septiembre de 2021

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:** MODIFICACION A LOS AMPAROS DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 DE 2021

Firma

Nombre: Elsa Campo Lopez
Director de Interventoría
Matricula No.: 19202-01710 CAU

Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Nombre: José Adrián Valencia Castrillón
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN** | CÓDIGO | | | |
| | **ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | VERSIÓN | | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| **UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TÉCNICA - GERENCIA GRANDES PROYECTOS | | | | | |

**CONTRATO No.:** 990 DE 2021

**CONTRATISTA:** CONSORCIO ICAYECO 189 identificado con NIT. 901.480.839-9

**OBJETO DEL CONTRATO:** Interventoría para las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los corredores viales para la reactivación sur occidente del programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", localizados en los Departamentos de Cauca y Huila

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 13 de mayo de 2021

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** Ciento Catorce (114) MESES

**PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:** N/A

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 46.719.707.260

**VALOR ADICIONAL:** N/A **No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** 423821 de fecha 24 de mayo de 2021 por valor de $2.169.522.296 para la vigencia 2021.

**DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:** Contrato Principal

**VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS**

| **1. Póliza Única de Cumplimiento No: M-100141561** | | **Anexo No. 0 Certificado 14624518 de fecha 19 de mayo de 2021<br>Anexo No. 2 Certificado 14625592 de fecha 24 de mayo de 2021** | | | **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.** Cumplimiento del Contrato | **DESDE:** | 13-may.-21 | **HASTA:** | 16-jul.-26 | **VALOR:** | $ 1.452.471.566,40 |
| **1.2.** El buen manejo y correcta inversión del anticipo | **DESDE:** | 13-may.-21 | **HASTA:** | 16-jul.-26 | **VALOR:** | $ 2.178.707.350 |
| **1.3.** Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | **DESDE:** | 13-may.-21 | **HASTA:** | 16-ene.-29 | **VALOR:** | $ 2.904.943.132,80 |
| **1.4.** Calidad del servicio | **Nota:** El amparo de Calidad del servicio tendrá una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra objeto de interventoría | | | | **VALOR:** | $ 4.357.414.699,20 |

**OBSERVACIONES:**

**1.** En todo caso se entenderá que el amparo de Cumplimiento tendrá una vigencia hasta la liquidación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015 y el contrato.

**2.** En todo caso se entenderá que el amparo de El buen manejo y correcta inversión del anticipo tendrá una vigencia hasta la liquidación o hasta la amortización total del anticipo, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015 y el contrato.

**3.** La fecha de inicio es la fecha de suscripcion del contrato y por lo tanto esta es la que se entiende como inicio de las cobertura de los amparos

**4.** Es Responsabilidad del supervisor y/o Unidad Ejecutora en el caso de que el contratista solicite una mayor suma de anticipo y/o se entregue en las próximas vigencias, el solicitar a el contratista la actualización de amparo.

**5.** Se aprueba parcialmente la garantía única de cumplimiento del contrato 990 de 2021, condicionada a que la Unidad Ejecutora tramite la modificación o aclaración contractual que corresponda, en la cual se esclarezca el valor asegurado del amparo de Calidad del servicio. Lo anterior, en razón a que el contrato señala un valor asegurado diferente al valor asegurado en el contrato de seguro.

Elaboro: Natalia González Porras
Reviso: Yavira Esperanza Florian Castañeda

# DO-GGP 33159

Bogotá D. C., 28 de junio de 2021

Doctor
**DANIEL PRADOS OLLATA**
Representante Legal
CONSORCIO ICAYECO 189
Carrera 7A No. 124 – 93
+ (571) 704 27 82
ajdiaz@ayesa.com; idpina@ayesa.com; licitacionescopeba@gmail.com
Bogotá

**Asunto:** Orden de Inicio Contrato de Interventoría No.990 del 2021. ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (La lupa – Bolívar – La Vega – Rosas) y CORREDOR DEL PALETARÁ (Solución sostenible parque natural Puracé).

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del Contrato No.1005 del 2021 cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA"*, le informo lo siguiente:

1. A partir del 28 de junio del 2021 se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

2. El contrato cuenta con el Registro Presupuéstale No.423821 de fecha 24 de mayo del 2021 y aprobación de las garantías exigidas mediante correo electrónico de fecha 22 de junio del 2021.

3. Aprobación de hojas de vidas de los *"profesionales y expertos integrantes del equipo de trabajo del interventor"*, mediante Oficio DO-GGP 32545 del 24 de junio del 2021.

4. Para el control y vigilancia el INVIAS designó como Supervisor del Contrato al JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON mediante resolución No.1486 de fecha 09 de junio del 2021, con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Dirección: Carrera 9 No. 25N-06,

# DO-GGP 33159

Popayan. Teléfono fijo/celular: 8239629 - 8200933 - 8239692 - 8239613 - 8239051
Fax:8239075; y correo electrónico: jvalencia@invias.gov.co

5. El INVIAS designó mediante oficio DO 32799 del 25 de junio del 2021 al ingeniero VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA como Gestor Técnico de Proyecto, Teléfono fijo/celular: 3216402809 y correo electrónico: vgutierrez@invias.gov.co

Atentamente,

**DIANA KARINA ANGARITA CASTRO**
Coordinadora Gerencia Grandes Proyectos

C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
INVIAS - SUBDIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL

Proyecto: DAGOBERTO LINAN

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

# ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

**VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. PÓLIZA** | M-100141561 | **No. ANEXO** | 3 | **No. CERTIFICADO** | 14650283 | **No. RIESGO** | |
| **TIPO DE DOCUMENTO** | | | | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 02/09/2021 | **SUC. EXPEDIDORA** | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas del | 13/05/2021 | 24:00 Horas del | 16/01/2031 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | CONSORCIO ICAYECO 189 | **No. DOC. IDENTIDAD** | 901.480.839-9 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 7A NO. 124 93 | **TELÉFONO** | 7042782 |
| **ASEGURADO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 NO. 0-0 BARRIO TORRES DEL RIO | **TELÉFONO** | 3770600 |
| **BENEFICIARIO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 NO. 0-0 BARRIO TORRES DEL RIO | **TELÉFONO** | 3770600 |

## CLÁUSULA DE COASEGURO

LOS AMPAROS CONTENIDOS EN LA PRESENTE POLIZA LO OTORGAN Y SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS ABAJO INDICADAS, EN EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE PARA CADA UNA, SEGUN EL CUADRO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION.

LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS Y SE LIMITAN AL PORCENTAJE RESPECTIVO.

| COMPAÑIA | % PART. | VLR. ASEGURADO | PRIMA | ( $ Pesos ) |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 50.00 | 5,446,768,374.00 | 0.00 | |
| SEGUROS DEL ESTADO S. A. | 50.00 | 5,446,768,374.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 100.00 | 10,893,536,748.00 | 0.00 | |

LA ADMINISTRACIÒN Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., LA CUAL RECIBIRA DEL TOMADOR LA PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.

EN LOS SINIESTROS, LA COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., PAGARA UNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y ADEMÀS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARA AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGUN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACION.

SE FIRMA LA PRESENTE CLAUSULA EN MEDELLIN A LOS 2 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.
CLAUSULA QUE FORMA PARTE INTEGRATE DE LA POLIZA M-100141561 CERTIFICADO 14650283.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

Diomer Moncada Montoya
SEGUROS DEL ESTADO S. A.
FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

# ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

**VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. PÓLIZA** | M-100141561 | **No. ANEXO** | 3 | **No. CERTIFICADO** | 14650283 | **No. RIESGO** | |
| **TIPO DE DOCUMENTO** | | | | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 02/09/2021 | **SUC. EXPEDIDORA** | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas del | 13/05/2021 | 24:00 Horas del | 16/01/2031 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | CONSORCIO ICAYECO 189 | **No. DOC. IDENTIDAD** | 901.480.839-9 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 7A NO. 124 93 | **TELÉFONO** | 7042782 |
| **ASEGURADO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 NO. 0-0 BARRIO TORRES DEL RIO | **TELÉFONO** | 3770600 |
| **BENEFICIARIO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 NO. 0-0 BARRIO TORRES DEL RIO | **TELÉFONO** | 3770600 |

## CLÁUSULA DE COASEGURO

LOS AMPAROS CONTENIDOS EN LA PRESENTE POLIZA LO OTORGAN Y SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS ABAJO INDICADAS, EN EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE PARA CADA UNA, SEGUN EL CUADRO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION.

LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS Y SE LIMITAN AL PORCENTAJE RESPECTIVO.

| COMPAÑIA | % PART. | VLR. ASEGURADO | PRIMA | ( $ Pesos ) |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 50.00 | 5,446,768,374.00 | 0.00 | |
| SEGUROS DEL ESTADO S. A. | 50.00 | 5,446,768,374.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 100.00 | 10,893,536,748.00 | 0.00 | |

LA ADMINISTRACIÒN Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., LA CUAL RECIBIRA DEL TOMADOR LA PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.

EN LOS SINIESTROS, LA COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., PAGARA UNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y ADEMÀS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARA AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGUN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACION.

SE FIRMA LA PRESENTE CLAUSULA EN MEDELLIN A LOS 2 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.
CLAUSULA QUE FORMA PARTE INTEGRATE DE LA POLIZA M-100141561 CERTIFICADO 14650283.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

Diomer Moncada Montoya
SEGUROS DEL ESTADO S. A.
FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

# ANEXO 21
# MINFRA-MN-IN-3-FR-1 PLAN INVERSION ANTICIPO MENSUAL INTERVENTORIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-3-FR-1 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 27 (Día) | 7 (Mes) | 2021 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 **DE** 2021 **INTERVENTOR:** **CONSORCIO ICAYECO 189**

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 , DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**JUSTIFICACIÓN:**
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO DE SALARIOS | 100.000.000,00 | 37.500.000,00 | 25.214.172,00 | 162.714.172,00 | 50 |
| 2 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL | 30.000.000,00 | 11.250.000,00 | 7.564.252,00 | 48.814.252,00 | 15 |
| 3 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION | 40.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.085.669,00 | 65.085.669,00 | 20 |
| 4 | COMPRA DE E UIPOS DE OFICINA | 30.000.000,00 | 11.250.000,00 | 7.564.252,00 | 48.814.252,00 | 15 |
| **TOTAL** | | **$ 200.000.000,00** | **$ 75.000.000,00** | **$ 50.428.344,40** | **$ 325.428.345,00** | **100** |

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100 del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15 ) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

(Firma)
**FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ**
Representante Legal o su Apoderado
**Interventor CONSORCIO ICAYECO 189**
C.E No :1175476

(Firma)
**JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**
Supervisor del contrato de Interventoría
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
Matricula No.: 19202 40638 DEL CAUCA

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# ANEXO 22
# CONTROL CORRESPONDENCIA- AGOSTO

| Nº DE REGISTRO (E) | | | | | | | ORGANISMO EMISOR | TIPO DE DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | ÁREA | OBSERVACIONES | DOCUMENTOS ASOCIADOS | ARCHIVADO EN DIGITAL | ARCHIVO FISICO (OPCIONAL) | REQUIERE RESPUESTA | OFICIO RESPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0019 | 2 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | Respuesta a OficioICA-INV-0009 de 29/07/202.<br>Comunicado DO-GGP 36923 de 16/07/2021.<br>Aprobacion de Especialista en Diseño Geometrico, Lider de Integracion, Profesional de Aseguramiento o Gestion de la Calidad. | | Se envio documento a Andrea Cantor. | SIN ANEXOS | SI | NO | NO | |
| 4 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0007 | 4 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | Acta parcial N°01 Firma digital | | | Hoja Ruta y orden de pago contrato de obra de pago MINFRA-MIN-IN-4-FR-2<br>Acta de recibo obra MINFRA-MIN-IN4-FR-1<br>Formato afectacion presupuestal AFINCO-FR-12<br>Formato de identificacion de la distribucion de la ejecucion contractual por departamento AFINCO-FR-13<br>Copia de Rut.<br>Informe financiero y presupuestal de contrato de obra.MINFRA-MN-IN-15-FR-8<br>Certificado parafiscales -Consorcio San Sebastian 064<br>Seguimiento al programa de inversiones. Formato MINFRA-MIN-IN-6-FR-2(FR-1)<br>Pre acta 01Julio 2021 V3 31072021<br>MSOAMB-MN-IN1-FR-3-PREACTA AMBIENTAL 1-firmado<br>MSOAMB-MN-IN-1-FR-7 PREACTA SOCIAL N°1 firmado<br>MSOAMB-MN-IN-4-FR-7 PREACTA PERDIAL N°1 firmado<br>Lista de chequeo revision Acta Obra (1) | SI | NO | | |
| 4 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0020 | 4 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | Usuarios Aplicativos CIFRA e Instructivo MINFRA-FR-1 Sistema de Información Gerencial (CIFRA). Macizo Colombiano y Corredor Del Paletará. Programa Legalidad. | | | Instructivo Aplic CIFRA.<br>Instructivo CIFRA | SI | NO | | |
| 05 | 08 | 2021 | E-ICA-INV-0021 | 5 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | Tramite de Actas de Obra e Interventoria. | | | SIN ANEXOS | SI | NO | NO | |
| 5 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0008 | 5 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | Diseño preliminar ajustado al vehiculo de diseño C3 | | | | | | | |
| 5 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0009 | 5 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-027-21<br>Respuesta comunicación ICA-PAL-0009 Permisos EIA - PNN Puracé | Ambiental | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 5 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0010 | 5 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-28-21<br>Respuesta comunicación ICA-PAL-0003. Cronograma de permisos ambientales | Ambiental | Respuesta de ICA-PAL-00 | Hoja de ruta 1 | SI | NO | | |
| 5 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0010A | 5 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-29-21<br>Entrega documento PAGA V1 - Proyecto 1006 del 2021 | | Respuesta de ICA-PAL-00 | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 6 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0022 | 6 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | Formatos Sostenibilidad Calculo de emisiones y apropiación energías bajas en consumo energético | | | Hoja de calculo consumo energia.<br>Hola calculo emisiones contrato. | SI | NO | | |
| 6 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0023 | 6 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | Recorrido de obra Proyectos Corredor del Paletara y Macizo Colombiano (Programa de Legalidad). Agosto 10 y 11 de Agosto de 2021 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | NO | |
| 6 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0024 | 6 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | **DO-GGP-408-61**<br>Solicitud de informe detallado del avance de las actividades durante la Etapa de Preconstruccion, que, para los Contratos de obra N° 1001 y 1006 de 2021, en los que coo minimo se mencione, entre otras importantes que considere la interventoria. | | | SIN ANEXOS | SI | NO | SI | |
| 9 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0011 | 9 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-32-21<br>Respuesta comunicación ICA-PAL-0004- Ajuste a las Garantías del Contrato de Obra | | | 1.POLIZA_400033869 CUMPLIMIENTO<br>2. POLIZA_400033867_2 RCE | SI | NO | | |
| 9 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0012 | 9 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | 164- PALETARA - San Sebastian - Cuadro de obras | | | Excel cuadro de obras | SI | NO | | |
| 9 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0013 | 9 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-34-21<br>RADICACIÓN INFORME MES DE JULIO<br>Entrega de informe SST N°1. desde 28 de junio hasta 31 de julio de 2021 | SST | | Archivo comprimido | SI | NO | | |
| 9 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0014 | 9 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-30-21<br>Respuesta comunicación ICA-PAL-0014 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 27 | 7 | 2021 | E-ICA-INV-0025 | 10 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | DO-53270<br>Restricción de anticipos para ICM Ingenieros | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 11 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0015 | 11 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | Concepto técnico OBRA DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | | CONCEPTO TECNICO UTILIZACION SUB BASE GRANULAR MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL PARQUE NATURAL PURACE ENTRE EL PR 54 + 000 AL PR 83 +300. RUTA 2002 POPAYAN-PALETARA-USNOS | SI | NO | | |
| 10 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0026 | 11 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | SMA 42155<br>Seguimiento social proyecto vial Corredor del Paletara y Macizo Colombino Programa, Departamento del Cauca. | | | SIN ANEXOS | SI | NO | SI | RESPUESTA : ICA-INV-0012 |
| 9 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0027 | 11 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | DO-GGP-42032<br>la Gerencia de Grandes Proyectos, como Unidad Ejecutora del INVIAS, recuerda a la<br>Interventoría el respectivo seguimiento y control frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales<br>de la referencia, en el marco de los términos establecidos. K106 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 12 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0016 | 12 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-42-21<br>Invitacion a Socializacion del proyecto INVIAS 1006 de 2021 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 11 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0017 | 12 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-33-21<br>Respuesta comunicación ICA-PAL-0016- Solicitud del estado de la gestión, adelantada ante el Ministerio del Interior y el ICANH. | Social | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |

| Nº DE REGISTRO (E) | | | | | | | ORGANISMO EMISOR | TIPO DE DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | ÁREA | OBSERVACIONES | DOCUMENTOS ASOCIADOS | ARCHIVADO EN DIGITAL | ARCHIVO FISICO (OPCIONAL) | REQUIERE RESPUESTA | OFICIO RESPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0028 | 13 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | DO-GGP 43326<br>Respuesta Comunicado ICA-INV-0011 de 10/08/2021<br>Aprobacion PROFESIONAL AMBIENTAL (2) | AMBIENTAL | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 17 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0018 | 17 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-38-21<br>Respuesta Comunicación ICA-PAL-0012 Solicitud de Instalacion de adecuacion de la oficina SAU | Social | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 17 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0019 | 17 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-39-21<br>Respuesta comunicación ICA-PAL-0013 Solicitud de programacion Actas de Vecindad de Inicio. | social | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 17 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0020 | 17 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-044-21<br>Propuesta para implementacion de actividades de seguridad vial en el corredor | | | Propuesta tecnica para el cumplimiento de seguriad vial en el corredor entre el PR 27+890 al 93+373 | SI | NO | | |
| 13 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0028A | 17 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | MEMORANDO CIRCULAR N° DO 58826<br>MEMORANDO CIRCULAR N° DO 58524<br>MEMORANDO CIRCULAR N° DO 58824 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 19 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0021 | 19 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-047-21<br>Entrega informe ambienta 1 | ambiental | | Oficio CSS064-OBRA-CL-047-21<br>Informe ambiental - Julio<br>MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 INF TRIM ESTADO AMBIENTAL_1<br>MSOAMB-MN-IN-2-FR-3 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA<br>Anexos ambientales | SI | NO | SI | |
| 18 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0022 | 19 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-045-21<br>Alcance al comunicado CSS064-OBRA-CL-05-21 del 15/07/2021 | | | Anexo1-Doc. Laboratorio<br>CERTI. BALANZAS.pdf<br>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064.pdf<br>CERTIFICADO SIMIM F-894 Prensa para ensayos de concretos 2021.pdf<br>CERTIFICADO SIMIM F-895 Equipo para ensayos de suelos y pavimentos 2021.pdf<br>Anexo 2-Doc. Prog. Gen. de Empleo<br>GENERACION DE EMPLEO 18-AGOSTO-rev CMC.xlsx<br>Programa de Generación de empleo MOC-MONC-rev CMC.docx | SI | NO | SI | |
| 10 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0029 | 19 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | MEMORANDO CIRCULAR N° DO 57691<br>Encuesta llamada "Encuesta caraterizacion de uruarios 2021" publicada en pagina web www.invias en el Banner numero 6. | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 18 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0030 | 19 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | DO-GGP 34709<br>DO-GGP 40861<br>DO-GGP 44478 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | Respuesta de ICA-INV-0018 a DO-GGP 44478 y DO-40861<br>Respuesta a comunicado DO-GGP-40861 - MACIZO 2030-P-0057(E- |
| 18 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0031 | 18 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | MEMORANDO CIRCULAR N° DO 59404<br>MEMORANDO N° OAJ 593349 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 20 | 8 | 202 | E-ICA-PAL-0023 | 20 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-049-21<br>Respuesta Comunicacion ICA-PAL-0011 Solicitud Certificacion ARN, Territorial Huila. | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 19 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0024 | 20 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-VR-048-21<br>Respuesta al comunicado OFI21-017733/IDM 112000 del 30/07/2021 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 19 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0032 | 20 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | MEMORANDO CIRCULAR OAJ 60115 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 20 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0025 | 20 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-050-21<br>Respuesta solicitud de cesion en el marco del Contrato de Obra en 1006 del 2021- Radicado INVIAS DO-GGP-44594 | | | ANEXA CARPETA:<br>1. Carta de presentacion CSS_064.pdf<br>2. Documento Consorcial CSS_064.pdf<br>3. Existencia y Representacion Legal CSS_064.pdf<br>4. Registro Unico de Proponentes CSS_064.pdf<br>5. Certificación aportes parafiscales CSS_064.pdf<br>6. Documentos Identificación R.L CSS_064.pdf<br>7. Antecedentes Judiciales CSS_064.pdf<br>8. Antecedentes Disciplinarios CSS_064.pdf<br>9. Antecedentes Fiscales CSS_064.pdf<br>10. Capacidad Financiera CSS_064.pdf<br>11. Mayor Ingreso Operacional CSS_064.pdf<br>12. Formato 5 KR Experiencia CSS_064.pdf<br>13. Formato 5 KR SCE CSS_064.pdf<br>14. Formato 5 KR CT CSS_064.pdf<br>15. Documentos Revisor y Contador CSS_064.pdf<br>16. Experiencia Habilitante CSS_064.pdf<br>17. Apoyo a la Industria Nacional CSS_064.pdf<br>18. Acreditacion Personal con Discapacidad (Puntaje) CSS_064.pdf<br>19. Factor de Calidad CSS_064.pdf<br>20. Aval Ingeniero Civil CSS_064.pdf | SI | NO | | |
| 20 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-00033 | 20 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | DO-GGP 44772<br>Solicitud mediante oficio dirigido a las interventorias les requieran que dentro de cada de sus sectores y frentes de obran difundas la encuesta y entrevista - MEMORANDO DO-57691 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 20 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0034 | 21 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | DO-GGP 44754<br>Informe del estado actual del contrato de Obra N° 1006 DEL 2021. | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 20 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0035 | 20 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | DO 58826 17-08-21<br>DO 59404 18-08-21<br>ICA-INV-0018_Rta DO-GPP_40861_44478<br>OAJ 59349 17-08-21<br>OAJ 60115 19-08-21<br>Resolucion 1747 190721<br>Resolucion 02013 130821 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 20 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0036 | 23 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | DO-GGP 44594<br>Solicitud de cesion en el marco del Contrato de Obra N° 1006 del 2021 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |

| Nº DE REGISTRO (E) | | | | | | | ORGANISMO EMISOR | TIPO DE DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | ÁREA | OBSERVACIONES | DOCUMENTOS ASOCIADOS | ARCHIVADO EN DIGITAL | ARCHIVO FISICO (OPCIONAL) | REQUIERE RESPUESTA | OFICIO RESPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0026 | 23 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-53-21<br>Respuesta comunicacion ICA-PAL-0018 - Mantenimiento PNN Purace. | | | SIN ANEXOS | SI | NO | SI | Respuesta de ICA-PAL-0023 |
| 24 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0027 | 24 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | Recibo de pago Poliza cumplimiento | | | Recibos:<br>Recibo 2675<br>Recibo de caja N° 20014150<br>Recibo de caja N 20014092<br>Recibo de caja N 20014096<br>Recibo de caja N 20014094<br>POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL | SI | NO | NO | |
| 24 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0028 | 24 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OP-CL-55-21<br>Cesion Contrato<br>Anulacion y reemplaza oficio CSS064-OP-CL-50-21 / Cesionario | | | 1. Carta de presentacion CSS_064.<br>2. Documento Consorcial CSS 064 mod 2.<br>3. Existencia y Representacion Legal CSS 064.<br>4. Registro unico de proponentes CSS 064.<br>5. Formato Parafiscales y aportes CSS 064.<br>6. Documentos Identificación R.L CSS_064.<br>7. Antecedentes Judiciales CSS 064.<br>8. Antecedentes Diswciplinarios CSS 064.<br>9. Antecedentes Fiscales CSS 064.<br>10. Capacidad Financiera CSS 064.<br>11. Mayor Ingreso Operacional CSS 064.<br>12. Formato 5 KR CSS 064 EXP.<br>13. Formato 5 KR SCE CSS 064.<br>14. Formato 5 KR CT CSS 064.<br>15. Documentos Revisor y Contador CSS 064.<br>16. Experiencia Habilitante CSS_064.<br>17. Apoyo a la industria Nacional CSS 064.<br>18. Acreditacion Personal con Discapacidad (Puntaje) CSS_064.<br>19. Factor de Calidad CSS_064<br>20. Aval Ingeniero Civil CSS_064 | SI | NO | | |
| 25 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0028A | 25 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OP-CL-56-21<br><br>Respuesta comunicaciones ICA-PAL-0019 Respuesta CSS064-OBRA-CL-27-21 Revision comograma EIA<br>ICA-PAL-0021 Cronograma de permisos ambientales (Hoja de Ruta) | | | Hoja de Ruta .rev ucros | SI | NO | SI | Respuesta de ICA-PAL-0025 |
| 25 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0029 | 26 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OP-CL-061-21<br>Estado Porceso de Cesion | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 23 | 7 | 20251 | E-ICA-INV-0037 | 26 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | DO-GGP 38495<br>Solicita debida atencion a lo citado en el presente documento, en atencion a las responsabilidades estipuladas en los contartos, remplaza comunicacion do-ggp 33179,DO-GGP 33165 Y DO-GGP 33159 del 28 de junio | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 26 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0030 | 26 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-063-21<br>Respuesta comunicacion ICA-PAL-0020 Solicitud señalizacion preventiva sector Parque Nacional Purace. | ambiental | | SIN ANEXOS | SI | NO | | Respuesta: ICA-PAL-0026 |
| 26 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0031 | 26 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OP-CL-065-21<br>Informacion proceso de cesion /Bitacora de actuaciones. | | | Anexa<br>CSS064-OP-CL-060-21<br>CSS064-OP-CL-062-21<br>CSS064-OP-CL-064-21 | SI | NO | NO | |
| 25 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0038 | 27 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | VALIDACIÓN TIPO DE CONTRIBUYENTE EN FACTURACION ELECTRÓNICA | | | Circular Externa N°047 | SI | NO | | |
| 30 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0039 | 30 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | PROGRAMAS DE INVERSION INCIALES DE MODULO1: ANILLO DEL MACIZO Y MODULO2: PALETARA PARA TRAMITE DE ACTAS DE OBRA | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 30 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0032 | 30 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-67-21<br>Respuesta comunicacion ICA-PAL-0023 - Intervencion Parque Nacional Natural Purace. | AMBIENTAL | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 30 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0033 | 30 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064-OBRA-CL-68-21<br>Respuesta comunicacion ICA-PAL-0024 Intervencion Zona del Parque Nacional Natural Purace. | | | SIN ANEXOS | SI | NO | | |
| 24 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0040 | 30 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | SMA 45198<br>Comite de seguimiento al componente de sostenibilidad del proyecto Contrato de obra N° 1006 DE 2021 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | SI | |
| 30 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0041 | 31 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | MEMORANDO CIRCULAR N° DO 63102 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | NO | |
| 30 | 8 | 2021 | E-ICA-INV-0042 | 31 | 8 | 2021 | INVIAS | CORREO | MEMORANDO CIRCULAR N° DO 63103 | | | SIN ANEXOS | SI | NO | NO | |
| 31 | 8 | 2021 | E-ICA-PAL-0034 | 31 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064 OBRA-CL-70-21<br>Respuesta comunicacion ICA-PAL-0010 - Ajuste de protocolo de Bioseguridad | SST | | PS34 PROTOCOLO BIOSEGURIDAD CSS064 vs 2.colmena seguimiento protocolo de bioseguridad | SI | NO | SI | |
| 29 | 7 | 2021 | E-ICA-PAL-0035 | 31 | 8 | 2021 | CONSORCIO SAN SEBASTIAN | CORREO | CSS064 OBRA-CL-20-21<br>Entrega documentos SST | | | Certificados Laborales<br>Certificados academicos<br>4.7 MINFRA-MN-IN-15-FR12 CONTROL SAN SEBASTIAN.<br>210601 Manual SG-SST-CSS064-2021-V0.docx<br>PRESUPUESTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONSROCIO SAN SEBASTIAN 064 | | | | |

| CONSORCIO ICAYECO-189 | CODIGO: DC-AICA-ADM-002<br>Fecha de Elaboración: 16-Julio-2016<br>Revisión: 0<br>CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA | INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA |
|---|---|---|

| Nº DE REGISTRO S | | | | | | | ORGANISMO EMISOR | RADICADO | TIPO DE DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DESTINATARIO PERSONA | OBSERVACIONES | DOCUMENTOS ASOCIADOS | ARCHIVADO EN DIGITAL | ARCHIVO FISICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 2021 | ICA-INV-00001 | 30 | 4 | 2021 | AYESA INGENIERÍA - IVÁN PIÑA | 36579 | CORREO | Documentos indicados en el Numeral 8.1 del Pliego de Condiciones y Perfeccionamiento del Contrato | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | 1RUT del consorcio<br>2Certificación Bancaria CONSORCIO ICAYECO 189.<br>3AFINCO - FR-03-Informacion de Consorcios.<br>4Certificación de encontrarse a paz y salvo en el pago de las obligaciones de Seguridad Social y Parafiscales<br>5Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio<br>6Acuerdo de CONSORCIO ICAYECO 189<br>7Resolución de Adjudicación número 1115 del 27 de abril de 2021<br>8Paz y salvo en el Registro Nacional de Medidas | SI | |
| 3 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0008 | 3 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Solicitud documento PAGA | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Confirman recibido | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 3 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0009 | 3 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Permisos para EIA - PNN Puracé | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Confirman recibido-Respuesta: Comunicacion CC064-OBRA-CL-27-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 3 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0010 | 3 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Respuesta su comunicación CSS064 –OBRA-CL-0921. Protocolo de Bioseguridad | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuesta de CSS064 OBRA-CL-70-21 | | SI | NO |
| 4 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0011 | 4 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Solicitud de certificación ARN, territorial Huila. | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuesta: CSS064-OBRA-CL-49-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 4 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0012 | 4 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Solicitud de instalación y adecuación, de la oficina SAU. | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuesta: CSS064-OBRA-CL-38-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 4 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0013 | 4 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Solicitud de programación Actas de Vecindad de inicio | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuesta: CSS064-OBRA-CL-39-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 4 | 8 | 2021 | ICA-INV-0010 | 4 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | certificación Bancaria BBVA de la cuenta para Giro del Anticipo del Consorcio Icayeco 189. | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | Cuenta Bancaria de la Interventoria - Consorcio Ayesa 189 | SI | |
| 5 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0014 | 5 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Respuesta concepto tecnico intervencion zona de Parque Nacional Natural de Purece | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuesta: CSS64-OBRA-CL-30-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 6 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0015 | 6 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Revision plan de trabajo sostenibilidad V1 | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 6 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0016 | 6 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Solicitud del estado de la gestión, adelantada ante el Ministerio del Interior y el ICANH. | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuesta: CSS064-OBRA-CL-33-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 6 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0017 | 6 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Observaciones a la comunicación CSS064-OBRA-CL-05-21. Programa de Generación de Empleo. | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 10 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0018 | 10 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Mantenimiento sector Parque Nacional Natural Puracé | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuesta de CSS064-OBRA-CL-53-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 10 | 8 | 2021 | ICA-INV-0011 | 10 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | 70903 de 10/08/2021 | CORREO | Solicitud cambio de Profesional Ambiental (2) | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | Respuesta: DO-GGP 43326 | HV Richard Ojeda (Prof Ambiental)<br>Renuncia Julian Orozco | SI | NO |
| 12 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0019 | 12 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Respuesta CSS064-OBRA-CL-27-21 revisión cronograma EIA | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuest CSS064-OP-CL-56-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 18 | 8 | 2021 | ICA-INV-0012 | 18 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | 73860 de 18/08/2021 | CORREO | Respuesta a la comunicación SMA 42155 de fecha 10 agosto de 2021, seguimiento social proyecto vial Corredor del Paletará y Macizo Colombiano programa Legalidad, departamento del Cauca. | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | Anexo comunicacion CSS064-OBRA-CL-033-21 | SI | NO |
| 19 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0020 | 19 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Solicitud señalización preventiva sector Parque Nacional Puracé | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuesta: CSS064-OBRA-CL-63-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 19 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0021 | 19 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Respuesta comunicación CSS064-OBRA-CL-28-21<br>Cronograma de permisos ambientales (Hoja de Ruta) | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuest CSS064-OP-CL-56-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |

| CONSORCIO ICAYECO-189 | CODIGO: DC-AICA-ADM-002<br>Fecha de Elaboración: 16-Julio-2016<br>Revisión: 0<br>CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA | INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA |
|---|---|---|

| Nº DE REGISTRO S | | | | | | | ORGANISMO EMISOR | RADICADO | TIPO DE DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DESTINATARIO PERSONA | OBSERVACIONES | DOCUMENTOS ASOCIADOS | ARCHIVADO EN DIGITAL | ARCHIVO FISICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 2021 | ICA-INV-0018 | 20 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Respuesta a la comunicación DO-GGP 40861 y DO-GGP 44478 – Modulo 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 23 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0022 | 23 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Respuesta CSS064-OBRA-CL-29-21 revisión PAGA V1 | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | | LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN PAGA PALETARÁ V1 20ago2021<br>PAGA CSS064 vr. 1 rdo LMN MJoya 20ago2021 VF<br>PAGA CSS064 vr. 1-rdo-Social.pdf | SI | NO |
| 24 | 8 | 2021 | ICA-INV-0013 | 24 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | 76118 de 24/08/2021 | CORREO | Respuesta a la comunicación DO-GGP 40861 y DO-GGP 44478 – Modulo 2 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 24 | 8 | 2021 | ICA-INV-0014 | 24 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | 76007 de 24/08/2021 | CORREO | Remisión Programa Guardavías | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | Plan programa Guardavías final | SI | NO |
| 24 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0023 | 24 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Respuesta concepto técnico intervención zona de parque Nacional Natural de Puracé comunicación CSS064-0BRA-CL-53-21 | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuesta: CSS064-OBRA-CL-67-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 25 | 8 | 2021 | ICA-INV-0019 | 25 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | 76808 de 26/08/2021 | CORREO | Cesión en el Marco del Contrato de Obra 1006 de 2021. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIOS PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA. | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 25 | 8 | 2021 | ICA-INV-0020 | 25 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | 76818 de 26/08/2021 | CORREO | Cesión en el Marco del Contrato de Obra 1006 de 2021. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIOS PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA. ANULACION Y REEMPLAZO OFICIO CSS064-OP-CL-50-21. | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 27 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0024 | 27 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Intervencion Zona de paruqe Nacional Natural de Purace Comunicacion CSS064-OBRA-CL-53-21 | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | Respuesta: CSS064-OBRA-CL-68-21 | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 30 | 8 | 2021 | ICA-INV-0015 | 30 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | 78256 de 30/08/2021 | CORREO | Solicitud cambio de integracion y aprobacion de Profesional Predial de Interventoria | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | HV Jhonatan Morera<br>HV Ruben Caicedo | SI | NO |
| 31 | 8 | 2021 | ICA-INV-0016 | 31 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | 78466 de 31/08/2021 | CORREO | Solicitud cambio de Especialista en Geotecnia del Contrato 1001 de 2021 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | Renuncia | SI | NO |
| 31 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0025 | 31 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Respuesta CSSS064-OBRA-CL-056-21 Revision cronograma EIA | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 01 | 08 | 2021 | ICA-PAL-0026 | 1 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Respuesta comunicación CSS064-OBRA-CL-63-21 Solicitud señalización preventiva sector PNN Puracé | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 1 | 8 | 2021 | ICA-PAL-0027 | 1 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | | CORREO | Solicitud Permisos Ambientales Obras de Rehabilitación y Mantenimiento. | CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 | | SIN ANEXOS | SI | NO |
| 1 | 8 | 2021 | ICA-INV-0017 | 1 | 8 | 2021 | CONSORCIO ICAYECO-ELSA CAMPO | 79137 de 01/09/2021 | CORREO | Aclaración oficio ICA-INV-0016. Contrato 1001 de 2021 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | | SIN ANEXOS | SI | NO |

# ANEXO 23
# REGISTRO FOTOGRAFICO-AVANCE DE OBRA-AGOSTO 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO** | CÓDIGO | MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | 1 | DE | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | **05** (Día) | **09** (Mes) | **2021** (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | **CONTRATO N°** | 1006 DE 2021 | **INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021**<br>**OBRA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS** |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO ICAYECO -189 | **CONTRATO N°** | 990 DE 2021 | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"** | | | |




**Fotografía 1**. CPR112+000Instalacion de Valla Informativa de contrato




**Fotografía 2**. PR8+000 chequeo de topografía personal Interventoría




**Fotografía 3.** Limpieza manual de descole de cunetas Tramo B - PR 57+000 - Parque Nacional Natural Purecé




**Fotografía 4.** 27+000 AL PR 25+500 Bacheo con asfalto

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN | 05 (Día) | 09 (Mes) | 2021 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | **CONTRATO N°** | 1006 DE 2021 | **INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021**<br>**OBRA**<br>**REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS** |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO ICAYECO -189 | **CONTRATO N°** | 990 DE 2021 | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"** | | | |




**Fotografía 5.** PR 54+100 AL PR 54+500 -Adecuación de subrasante




**Fotografía 6.** PR54+100 al PR54+250 Instalación de material de adición




**Fotografía 7.** R54+100 AL PR54+400 Extendido y compactado de material de adición




**Fotografía 8.** Levantamiento topográfico PR 8+700

# ANEXO 24
# REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIO-AMBIENTAL Y PREDIAL-AGOSTO 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN | 05 (Día) | 09 (Mes) | 2021 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | **CONTRATO N°** | 1006 DE 2021 | **INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021**<br>**OBRA** |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO ICAYECO -189 | **CONTRATO N°** | 990 DE 2021 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"** | | | |




**Fotografía 9.** Recorrido vía con participación de la SMAGS del INVIAS




**Fotografía 10.** Socialización Colegio Liceo, 4 de Agosto de 2021 – Presentación del equipo de trabajo




**Fotografía 11**. Socialización Vereda El Sendero – Intervención Interventoría




**Fotografía 12**. Socialización 18 de agosto de 2021 se efectuó, con el Resguardo Indígena de Paletará

| | FECHA ELABORACIÓN | 05 (Día) | 09 (Mes) | 2021 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | **CONTRATO N°** | 1006 DE 2021 | **INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021**<br>**OBRA** |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO ICAYECO -189 | **CONTRATO N°** | 990 DE 2021 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"** | | | |




**Fotografía 13.** Socialización 18 de agosto de 2021 se efectuó, con el Resguardo Indígena de Paletará




**Fotografía 14.** SAU y Buzón, Vereda El Sendero PR2+400




**Fotografía 15.** SAU y Buzón, Vereda El Sendero PR2+400






**Fotografía 16.** Georreferenciación de mojones Tramo B - PR 55+500 Parque Nacional Natural Purecé

| | FECHA ELABORACIÓN | 05 (Día) | 09 (Mes) | 2021 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | **CONTRATO N°** | 1006 DE 2021 | **INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021**<br>**OBRA** |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO ICAYECO -189 | **CONTRATO N°** | 990 DE 2021 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"** | | | |




**Fotografía 17.** SAU y Buzón, Vereda El Sendero PR2+400




**Fotografía 18.** Identificación SAU El Sendero y Resguardo Indígena de Paletará




**Fotografía 19.** Identificación SAU El Sendero y Resguardo Indígena de Paletará




**Fotografía 20.** PR0+272 -Elaboración de Acta de Vecindad

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>REGISTRO FOTOGRÁFICO | CÓDIGO | | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | 1 | DE | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN | 05 (Día) | 09 (Mes) | 2021 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | **CONTRATO N°** | 1006 DE 2021 | **INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021**<br>**OBRA** |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO ICAYECO -189 | **CONTRATO N°** | 990 DE 2021 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"** | | | |





**Fotografía 21.** PR0+480 -Elaboración de Acta de Vecindad




**Fotografía 22.** Reunión, 27 de Agosto de 2021 – INVIAS, Contratista, Interventoría




**Fotografía 23.** Participación Gestores Gerencia Grandes de Proyectos

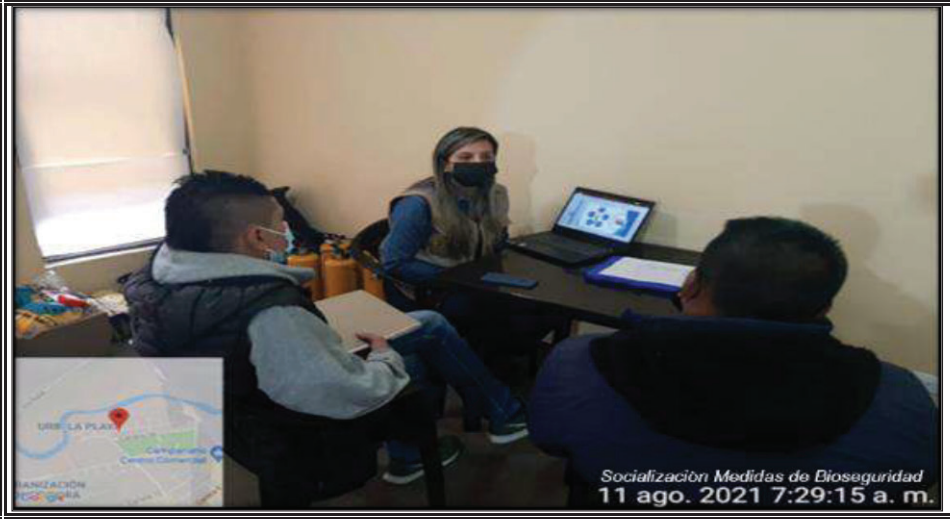


**Fotografía 24.** Socialización Medidas de Bioseguridad

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>REGISTRO FOTOGRÁFICO | CÓDIGO | | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | 1 | DE | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN | 05 (Día) | 09 (Mes) | 2021 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | **CONTRATO N°** | 1006 DE 2021 | **INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021**<br>**OBRA** |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO ICAYECO -189 | **CONTRATO N°** | 990 DE 2021 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"** | | | |




**Fotografía 25.** Popayán: Puntos de desinfección




**Fotografía 26.** Popayán: Puntos de desinfección




**Fotografía 27.** Registro de personas y toma de temperatura




**Fotografía 28.** Registro de personas y toma de temperatura

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>REGISTRO FOTOGRÁFICO | CÓDIGO | | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | 1 | DE | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN | 05 (Día) | 09 (Mes) | 2021 (Año) |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 | **CONTRATO N°** | 1006 DE 2021 | **INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021**<br>**OBRA** |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO ICAYECO -189 | **CONTRATO N°** | 990 DE 2021 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"** | | | |




**Fotografía 29.** Socialización 18 de agosto de 2021 se efectuó, con el Resguardo Indígena de Paletará




**Fotografía 30.** Levantamiento topografico Tramo A- PR 11+300

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

## Victor Andres Gutierrez Pineda

**De:** consorcioicayeco189 <consorcioicayeco189@ayesa.com>
**Enviado el:** martes, 28 de septiembre de 2021 4:36 p. m.
**Para:** Victor Andres Gutierrez Pineda
**CC:** José Adrián Valencia Castrillon
**Asunto:** ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°3 CTO 990-21 MODULO 2: CORREDOR DE PALETARA
**Datos adjuntos:** INFORME MENSUALDE INTERVENTORIA _ 03-Paletara_compressed .pdf

Cordial saludo:

Remitimos informe mensual de interventoría contrato 990 de 2021 -CONSORCIO ICAYECO 189, con la respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor de INVIAS territorial Cauca del siguiente módulo:

1. INFORME MENSUAL N°3-Modulo 2: Paletera

**Cordialmente,**

**Consorcio Icayeco 189**
Dirección de Interventoria
Contrato 990 de 2021
Ayesa / Iceacsa / Copeba
Tel.: +(571) 704 27 82
Calle 126 No. 7-26, Bogotá
www.ayesa.com

Este correo electronico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft, para el Instituto Nacional de Vias
