CONSORCIO VIAS NACIONALES

NIT 901474028 - 8

Responsable de Iva

Actividad Económica 4210

CR 2 11 41 EDIFICIO GRUPO AREA PISO 22 BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR Colombia

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C. - Colombia

ncamargo@invias.gov.co

3770600

FACTURA PROFORMA

NÚMERO:

VENCIMIENTO: 2022-06-07

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2022-04-08 15:54:08

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO-978-2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA 10- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELEN-SOACHA-SACAMA-LA CABUYA-PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RE	1	$ 1,243,906,648.00	0	0	$ 1,243,906,648.00	$ 1,243,906,648.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	$ 248,781,330.00	0	0	$ 248,781,330.00	$ 248,781,330.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	$ 62,195,332.00	0	0	$ 62,195,332.00	$ 62,195,332.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	$ 62,195,332.00	19	0	$ 62,195,332.00	$ 74,012,445.00

Cantidad de lineas: 4

SUBTOTAL:	$ 1,617,078,642.00
IVA:	$ 11,817,113.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 98,873,972.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

PERIODO: MARZO DE 2022
AMORTIZACION ANTICIPO 6,07% $98.873.972
OBSERVACIONES:
#$24-02-00; 978 DE 2021; dangarita@invias.gov.co #$
FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES
NIT: 901.474.028-8
BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE Nº: 055-9699-98461
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION: 90%: 830.094.920-5
CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR **$ 1,530,021,783.00**

SON: UN MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 11,817,113.00

Cuida el medio ambiente

PROFORMA

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3
FECHA	2/04/2022 (Dia/Mes/Año)		

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA Nª** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,617,078,642.00 **MES** mar-22

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 978 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES RUTA: 6404: BELEN-SACAMA /6405: SACAMA-LA CABUYA /6514: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1038 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 102 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **98 MESES Y 1 SEMANA** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **322,790,128,920.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **20,059,840,972.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **342,849,969,892.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 01 fecha 31/12/2021 de		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	4.00	$ 1,816,892.00	$ 7,267,568.00	4.00	$ 7,267,568.00				
2	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	13.00	$ 1,187,326.00	$ 15,435,238.00	13.00	$ 15,435,238.00				
3	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	8,042.00	$ 113,989.00	$ 916,699,538.00	8,042.00	$ 916,699,538.00				
4	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1,254.00	$ 69,636.00	$ 87,323,544.00	1,254.00	$ 87,323,544.00				
5	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	8,000.00	$ 4,475.00	$ 35,800,000.00	8,000.00	$ 35,800,000.00				
6	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	90,504.00	$ 12,579.00	$ 1,138,449,816.00	90,504.00	$ 1,138,449,816.00				
7	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y	m3	21,312.00	$ 62,892.00	$ 1,340,354,304.00	21,312.00	$ 1,340,354,304.00				
8	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1,051,379.00	$ 10,387.00	$ 10,920,673,673.00	1,051,379.00	$ 10,920,673,673.00	37.00	$ 384,319.00	37.00	$ 384,319.00
9	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	15,000.00	$ 9,747.00	$ 146,205,000.00	15,000.00	$ 146,205,000.00		$ -	2,064.00	$ 20,117,808.00
10	1	220.1		Terraplenes	m3	301,680.00	$ 12,804.00	$ 3,862,710,720.00	301,680.00	$ 3,862,710,720.00				
11	1	221-13		Pedraplen compacto	m3	1,376.00	$ 18,609.00	$ 25,605,984.00	1,376.00	$ 25,605,984.00				
12	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	48,500.00	$ 7,521.00	$ 364,768,500.00	48,500.00	$ 364,768,500.00				
Subtotal								**$ 18,861,293,885.00**		**$ 18,861,293,885.00**		**$ 384,319.00**		**$ 20,502,127.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
13	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	309,750.00	$ 927.00	$ 287,138,250.00	459,750.00	$ 426,188,250.00		$ -	312,081.00	$ 289,299,087.00
14	2	311-13		Afirmado	m3	32,928.00	$ 129,940.00	$ 4,278,664,320.00	48,928.00	$ 6,357,704,320.00	788.00	$ 102,392,720.00	2,043.00	$ 265,467,420.00
15	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	53,487.00	$ 150,000.00	$ 8,023,050,000.00	66,487.00	$ 9,973,050,000.00				
16	2	330-13		Base granular clase A	m3	130,475.00	$ 170,000.00	$ 22,180,750,000.00	146,475.00	$ 24,900,750,000.00		$ -		$ -
17	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6,300.00	$ 216,357.00	$ 1,363,049,100.00	6,300.00	$ 1,363,049,100.00				
18	2	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3	13,071.00	$ 217,561.00	$ 2,843,739,831.00	13,071.00	$ 2,843,739,831.00				
Subtotal								**$ 38,976,391,501.00**		**$ 45,864,481,501.00**		**$ 102,392,720.00**		**$ 554,766,507.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
19	3	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt	392,145.00	$ 2,406.00	$ 943,500,870.00	392,145.00	$ 943,500,870.00				
20	3	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	740,556.00	$ 2,848.00	$ 2,109,103,488.00	920,556.00	$ 2,621,743,488.00		$ -		$ -
21	3	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	118,832.00	$ 1,849.00	$ 219,720,368.00	178,918.00	$ 330,819,382.00	13,720.00	$ 25,368,280.00	71,091.00	$ 131,447,259.00
22	3		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	67,863.00	$ 800,000.00	$ 54,290,400,000.00	72,863.00	$ 58,290,400,000.00	1,492.10	$ 1,193,680,000.00	7,149.30	$ 5,719,440,000.00
23	3		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	2,835.00	$ 844,484.00	$ 2,394,112,140.00	4,235.00	$ 3,576,389,740.00				
24	3		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1,575.00	$ 72,822.00	$ 114,694,650.00	4,575.00	$ 333,160,650.00	1,407.90	$ 102,526,093.80	6,386.60	$ 465,084,985.20
25	1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	3,150.00	$ 78,894.00	$ 248,516,100.00	3,150.00	$ 248,516,100.00				
26	3	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	1,142.00	$ 4,342.00	$ 4,958,564.00	1,142.00	$ 4,958,564.00				
Subtotal								**$ 60,325,006,180.00**		**$ 66,349,488,794.00**		**$ 1,321,574,374.00**		**$ 6,315,972,245.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
27	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	105,596.00	$ 31,883.00	$ 3,366,717,268.00	131,596.00	$ 4,195,675,268.00		$ -	420.70	$ 13,413,178.00
28	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21,312.00	$ 79,917.00	$ 1,703,191,104.00	26,312.00	$ 2,102,776,104.00				
29	2	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31,679.00	$ 44,832.00	$ 1,420,232,928.00	31,679.00	$ 1,420,232,928.00				
30	2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	59,447.00	$ 111,264.00	$ 6,614,311,008.00	68,447.00	$ 7,615,687,008.00				
31	3		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons	m	434.00	$ 3,064,921.00	$ 1,330,175,714.00	834.00	$ 2,556,144,114.00				
32	3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,441.00	$ 850,001.00	$ 6,324,857,441.00	8,441.00	$ 7,174,858,441.00				
33	3	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	21,805.00	$ 703,582.00	$ 15,341,605,510.00	21,805.00	$ 15,341,605,510.00				
34	3	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	6,331.00	$ 533,062.00	$ 3,374,815,522.00	7,331.00	$ 3,907,877,522.00				
35	3	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	698.00	$ 491,194.00	$ 342,853,412.00	698.00	$ 342,853,412.00				
36	3		630P	Suministro e instalacion de bolsacretos	m3	5,000.00	$ 676,111.00	$ 3,380,555,000.00	5,000.00	$ 3,380,555,000.00				
37	6	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,572,492.00	$ 5,378.00	$ 13,834,861,976.00	2,744,492.00	$ 14,759,877,976.00				
38	4	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de	m	2,731.00	$ 609,158.00	$ 1,663,610,498.00	2,731.00	$ 1,663,610,498.00				
39	4		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100	m	119,860.00	$ 37,198.00	$ 4,458,552,280.00	119,860.00	$ 4,458,552,280.00		$ -	632.40	$ 23,524,016.00
40	4	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la	m3	7,131.00	$ 652,790.00	$ 4,655,045,490.00	7,131.00	$ 4,655,045,490.00				

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA Nº** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,617,078,642.00 **MES** mar-22

ACTA FINAL ☐

41	4		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la	m3	49,089.00	$ 651,419.00	$ 31,977,507,291.00	49,089.00	$	31,977,507,291.00				
42	4	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	474,366.00	$ 7,535.00	$ 3,574,347,810.00	474,366.00	$	3,574,347,810.00		$ -	2,023.60	$ 15,247,826.00
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	90,895.00	$ 158,463.00	$ 14,403,494,385.00	90,895.00	$	14,403,494,385.00		$ -	379.40	$ 60,120,863.00
44	2	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	18,179.00	$ 201,065.00	$ 3,655,160,635.00	18,179.00	$	3,655,160,635.00				
45	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero	m3	682.00	$ 266,301.00	$ 181,617,282.00	682.00	$	181,617,282.00				
Subtotal								**$ 121,603,512,554.00**			**$ 127,367,478,954.00**		**$ -**		**$ 112,305,883.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
46	7	Manual de Señalización Vial 2		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	349,035.00	$ 1,794.00	$ 626,168,790.00	349,035.00	$	626,168,790.00	107,031.90	$ 192,015,228.60	145,943.10	$ 261,821,921.40
47	7	Manual de Señalización Vial 2		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	585.00	$ 22,076.00	$ 12,914,460.00	585.00	$	12,914,460.00				
48	7	Manual de Señalización Vial 2		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29,027.00	$ 8,346.00	$ 242,259,342.00	29,027.00	$	242,259,342.00				
49	7	Manual de Señalización Vial 2		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	1,157.00	$ 399,892.00	$ 462,675,044.00	1,157.00	$	462,675,044.00				
50	7	Manual de Señalización Vial 2		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	785.00	$ 327,917.00	$ 257,414,845.00	785.00	$	257,414,845.00				
51	7	730-13		Poste de referencia	u	94.00	$ 257,885.00	$ 24,241,190.00	94.00	$	24,241,190.00				
52	7	730-13		Defensa metalica	m	7,969.00	$ 224,999.00	$ 1,793,017,031.00	7,969.00	$	1,793,017,031.00				
53	7	730-13		Sección final	u	1,113.00	$ 103,189.00	$ 114,849,357.00	1,113.00	$	114,849,357.00				
54	7	740-13		Captafaros	u	7,284.00	$ 22,031.00	$ 160,473,804.00	7,284.00	$	160,473,804.00				
Subtotal								**$ 3,694,013,863.00**			**$ 3,694,013,863.00**		**$ 192,015,229.00**		**$ 261,821,922.00**
OBRAS VARIAS															
55	5	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	8,000.00	$ 17,838.00	$ 142,704,000.00	8,000.00	$	142,704,000.00				
56	4		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	39.00	$ 29,898.00	$ 1,166,022.00	39.00	$	1,166,022.00				
57	6	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	116,226.00	$ 37,879.00	$ 4,402,524,654.00	116,226.00	$	4,402,524,654.00				
Subtotal								**$ 4,546,394,676.00**			**$ 4,546,394,676.00**				
TRANSPORTES															
58	8	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,052,001.00	$ 1,057.00	$ 1,111,965,057.00	1,052,001.00	$	1,111,965,057.00				
59	8	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11,631,950.00	$ 1,000.00	$ 11,631,950,000.00	11,631,950.00	$	11,631,950,000.00	712.00	$ 712,000.00	712.00	$ 712,000.00
60	8	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	195,000.00	$ 1,175.00	$ 229,125,000.00	195,000.00	$	229,125,000.00			1,960.00	$ 2,303,000.00
Subtotal								**$ 12,973,040,057.00**			**$ 12,973,040,057.00**		**$ 712,000.00**		**$ 3,015,000.00**
				ITEM NO PREVISTOS											

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA Nº** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,617,078,642.00 **MES** mar-22

ACTA FINAL ☐

Subtotal														
	SUBTOTAL OBRAS (A)							**$ 260,979,652,716.00**		**$ 279,656,191,730.00**		**$ 1,617,078,642.00**		**$ 7,268,383,684.00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 31,071,278,494.00		$ 32,309,052,778.00				$ 113,799,414.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 990,000,000.00		$ 990,000,000.00				
*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**							**$ 293,040,931,210.00**		**$ 312,955,244,508.00**		**$ 1,617,078,642.00**		**$ 7,382,183,098.00**
*	VALOR DEL IVA (OBRA) (E) (19% SOBRE UTILIDAD)							$ 2,141,452,959.00		$ 2,286,980,633.00		$ 11,817,113.00		$ 53,946,725.00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							**$ 295,182,384,169.00**		**$ 315,242,225,141.00**		**$ 1,628,895,755.00**		**$ 7,436,129,823.00**
*	VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)							$ 1,038,890,000.00		$ 1,038,890,000.00				$ -
*	VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)							$ 197,389,100.00		$ 197,389,100.00				$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							**$ 1,236,279,100.00**		**$ 1,236,279,100.00**				**$ -**
*	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%) (J)**							**$ 25,739,616,633.00**		$ 25,739,616,633.00				$ -
*	**VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%)**							**$ 631,849,018.00**		$ 631,849,018.00				$ -
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**							**$ 322,790,128,920.00**		**$ 342,849,969,892.00**		**$ 1,628,895,755.00**	**$ -**	**$ 7,436,129,823.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 20,059,840,972.00	5.97%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 98,873,972.00	6.07%
Valor Amortizado Acumulado	$ 157,033,927.00	0.05%
Valor Saldo por Amortizar	$ 19,902,807,045.00	5.92%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1,617,078,642.00	$ 11,817,113.00	$ 1,628,895,755.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTION PREDIAL (PREACTA)			
GESTION SOCIAL (PREACTA)			
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1,617,078,642.00	$ 11,817,113.00	$ 1,628,895,755.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 384,319.00	$ 20,502,127.00
SB	$ 102,392,720.00	$ 554,766,507.00
B	$ -	$ -
P	$ 1,321,574,374.00	$ 6,315,972,245.00
OA	$ -	$ 112,305,883.00
SCT	$ 192,015,229.00	$ 261,821,922.00
OV	$ -	$ -
T	$ 712,000.00	$ 3,015,000.00
TOTAL	$ 1,617,078,642.00	$ 7,268,383,684.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Preliminares y Explanación	$ 384,319.00	$ 33,915,305.00
2 Afirmados, Sub bases y Bases	$ 102,392,720.00	$ 614,887,370.00
3 Pavimentos Asfálticos / Concretos	$ 1,321,574,374.00	$ 6,315,972,245.00
4 Estructuras Hidráulicas y Drenajes	$ -	$ 38,771,842.00
5 Obras de Urbanismo	$ -	$ -
6 Obras Geotécnicas y Mitigación	$ -	$ -
7 Señalización y Control de Transito	$ 192,015,229.00	$ 261,821,922.00
8 Transporte y Sobre Acarreos	$ 712,000.00	$ 3,015,000.00
TOTAL	$ 1,617,078,642.00	$ 7,268,383,684.00

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1,617,078,642
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1,518,204,670

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,530,021,783
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327

Firma
Nombre: GERMAN GOMEZ TURRIAGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No: 10000 COPNIA

GT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 978 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		0%	ACTA DE OBRA	X	10	mar-22
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 954,010,819.00
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 128,815,368.00
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 447,195,596.00
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RP 420921	RUBRO No.	C-2401-0600-108-0-2401041-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	1,530,021,783.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____ (BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula No. 1521917469 BYC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 978 DE 2021 Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

Acta No. **10** Valor basico **$ 1,617,078,642.00** Período: mar-22

Valor incluido el Iva: **$ 1,628,895,755.00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6404	*BELEN-SOCHA-SACAMA*	$ 104,245,305.00		$ 1,331,232,033.00	**$ 1,435,477,338.00**
2	6405	*SACAMA - LA CABUYA*				**$** -
3	6514	*PAZ DE ARIPORO - HATO COROZAL - LA CABUYA*	$ -		$ 193,418,417.00	**$ 193,418,417.00**
TOTALES			**$ 104,245,305.00**	**$** -	**$ 1,524,650,450.00**	**$ 1,628,895,755.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800099199-4	MUNICIPIO 1	BELEN	$ 1,331,232,033.00	$ 1,321,574,374.00
891855015-2	MUNICIPIO 2	PAZ DEL RIO	$ -	
800099210-8	MUNICIPIO 3	SOCHA	$ -	$ -
800026911-1	MUNICIPIO 4	SOCOTA	$ 104,245,305.00	$ 103,489,039.00
891801962-0	MUNICIPIO 5	CHITA		
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - BOYACA (RUTA 6404)			**$ 1,435,477,338.00**	**$ 1,425,063,413.00**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800103657-3	MUNICIPIO 6	LA SALINA	$ -	$ -
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6404)			**$ -**	**$ -**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800103663-8	MUNICIPIO 7	SACAMA	$ -	$ -
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405)			**$ -**	**$ -**
DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405 Y 6514)			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800012638-2	MUNICIPIO 8	HATO COROZAL	$ 193,418,417.00	$ 192,015,229.00
800103659-8	MUNICIPIO 9	PAZ DE ARIPORO		
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CASANARE (RUTA 6405 Y 6514)			**$ 193,418,417.00**	**$ 192,015,229.00**
TOTAL			**$ 1,628,895,755.00**	**$ 1,617,078,642.00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matrícula No: 25202-57327

GERMAN GOMEZ TURRIAGO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matrícula No: 10000 COPNIA

GT

CONSORCIO
INTERVENTORIAS COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Representante Suplente, del **CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA**, interventor del Contrato de Obra 978 de 2021, cuyo objetivo es el mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Ruta de Los Libertadores (Belén – Socha – Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) en los departamentos de Boyacá y Casanare, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" – Módulo 4; certifica de acuerdo con el certificado expedido por el representante del **CONSORCIO VÍAS NACIONALES**, identificado con Nit. 901.474.028-8, que entre el 1° y el 31 de marzo de 2022 ha efectuado en forma correcta y oportuna los pagos de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombino de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje); de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, de sus empleados vinculados al desarrollo del citado contrato.

Para constancia se firma, a los ocho (8) días del mes de abril de 2022.

CONSORCIO INTERVENTORÍAS COLOMBIA

GERMÁN GÓMEZ TURRIAGO
Representante Suplente

GT

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **978 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES con NIT 901.474.028-8, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Marzo de 2022.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de Marzo de 2022, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
KMA CONTRUCCIONES S.A.S CON
NIT. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde al cierre del mes de marzo de 2022.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los seis (6) días de abril de 2022, en el marco del contrato No. **CTO-978 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO
Revisor Fiscal
C.C 1.050.961.832
T.P. No. 248049-T

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS

Cartagena, D.T y C, 04 de Abril de 2022

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

Contrato: 978 de 2021
Objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."

El Revisor Fiscal, **BELSY MEJIA CARO** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT 890.403.235-3 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de Marzo del 2022.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



BELSY MEJIA CARO
REVISOR FISCAL
C.C.NO. 1.128.053.618
T.P.NO. 164951-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 978 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 978 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Marzo de 2022. Para constancia se firma a los 01 días del mes de Abril de 2022, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL DAMIAN ARIAS HERNANDEZ
C.C. No. 73.138.202 de Cartagena
T.P. No. 73746-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1401736699	9433380195	E	2022/04/06	2022/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$929,151,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (112 Afiliados)						$208,662,012	$33,631,900			$218,262,012	$9,469,900			$213,009,430	$8,524,900			$218,262,012	$14,468,000		$9,600,000	$480,000
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (1 Afiliados)						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$12,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$12,100		$0	$0
1	CC	1143330024	MIRANDA ROMERO LILIAN LETICIA	231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (25 Afiliados)						$8,326,607	$1,262,300			$8,326,607	$252,300			$2,745,309	$110,200			$8,326,607	$0		$0	$0
Ciudad: BELEN Depto: BOYACA (8 Afiliados)						$2,506,015	$383,200			$2,506,015	$82,100			$490,000	$19,600			$2,506,015	$0		$0	$0
2	CC	1048850035	BERMEJO AREVALO WILLIAM ALONSO	230301	14	$1,142,517	$182,900	EPS017	14	$1,142,517	$45,800	CCF10	14	$0	$0	14-7	14	$1,142,517	$0	14	$0	$0
3	CC	1055312911	CASTIBLANCO SALAMANCA OSCAR LEONARDO	230301	7	$536,667	$85,900	EPS005	7	$536,667	$21,500	CCF10	7	$490,000	$19,600	14-7	7	$536,667	$0	7	$0	$0
4	CC	1055312911	CASTIBLANCO SALAMANCA OSCAR LEONARDO	230301	1	$76,667	$9,300	EPS005	1	$76,667	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$76,667	$0	1	$0	$0
5	CC	1055312911	CASTIBLANCO SALAMANCA OSCAR LEONARDO	230301	1	$76,667	$9,300	EPS005	1	$76,667	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$76,667	$0	1	$0	$0
6	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	3	$100,000	$16,000	EPS041	3	$100,000	$4,000	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$100,000	$0	3	$0	$0
7	CC	1056554283	NOCOBE USCATEGUI JOSE MIGUEL	230301	1	$44,011	$5,300	EPS042	1	$44,011	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$44,011	$0	1	$0	$0
8	CC	74381824	OLIVEROS CASTAÑEDA GUILLERMO ARTURO	231001	5	$166,667	$26,700	EPS017	5	$166,667	$6,700	CCF10	5	$0	$0	14-7	5	$166,667	$0	5	$0	$0
9	CC	1007391217	PALACIOS ALBA JESELL TATIANA	230301	1	$33,681	$4,100	EPS037	1	$33,681	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$33,681	$0	1	$0	$0
10	CC	79909708	SANCHEZ LOPEZ RAFAEL	230301	1	$150,000	$18,000	EPS005	1	$150,000	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$150,000	$0	1	$0	$0
11	CC	79913807	VEGA CARLOS AUGUSTO	230301	1	$76,771	$9,300	EPS037	1	$76,771	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$76,771	$0	1	$0	$0
12	CC	79913807	VEGA CARLOS AUGUSTO	230301	2	$102,367	$16,400	EPS037	2	$102,367	$4,100	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$102,367	$0	2	$0	$0
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (5 Afiliados)						$1,363,295	$218,800			$1,363,295	$45,200			$862,564	$34,600			$1,363,295	$0		$0	$0
13	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	1	$99,299	$12,000	ESSC24	1	$99,299	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$99,299	$0	1	$0	$0
14	CC	1116992429	BOHORQUEZ VACA YONEL FERNANDO	230301	4	$149,282	$23,900	EPSC25	4	$149,282	$6,000	CCF10	4	$0	$0	14-7	4	$149,282	$0	4	$0	$0
15	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	1	$38,716	$4,700	CCFC24	1	$38,716	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$38,716	$0	1	$0	$0
16	CC	1049795391	MARTIN ROA FREDY ALDEMAR	230301	1	$97,538	$11,800	EPS017	1	$97,538	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$97,538	$0	1	$0	$0
17	CC	23795468	OLIVOS MORALES BELQUIS AGNES	231001	7	$978,460	$166,400	EPS008	7	$978,460	$39,200	CCF10	7	$862,564	$34,600	14-7	7	$978,460	$0	7	$0	$0
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (4 Afiliados)						$1,540,482	$242,700			$1,540,482	$57,900			$833,894	$33,500			$1,540,482	$0		$0	$0
18	CC	7333224	MONDRAGON FERNANDEZ JOSE MISAEL	25-14	7	$242,980	$38,900	EPS037	7	$242,980	$9,800	CCF10	7	$0	$0	14-7	7	$242,980	$0	7	$0	$0
19	CC	4134549	MUÑOZ BARRERA ISIDORO	230301	4	$151,667	$24,300	EPS037	4	$151,667	$6,100	CCF10	4	$133,481	$5,400	14-7	4	$151,667	$0	4	$0	$0
20	CC	4047475	RUIZ ROA EDWIN NORBEY	230301	4	$145,834	$23,400	EPS017	4	$145,834	$5,900	CCF10	4	$133,746	$5,400	14-7	4	$145,834	$0	4	$0	$0
21	CC	74282000	SANCHEZ NIÑO FERNANDO	230301	3	$100,000	$12,000	EPS037	3	$100,000	$0	CCF10	3	$0	$0	14-7	3	$100,000	$0	3	$0	$0
22	CC	74282000	SANCHEZ NIÑO FERNANDO	230301	10	$333,334	$53,400	EPS037	10	$333,334	$13,400	CCF10	10	$0	$0	14-7	10	$333,334	$0	10	$0	$0
23	CC	74282000	SANCHEZ NIÑO FERNANDO	230301	17	$566,667	$90,700	EPS037	17	$566,667	$22,700	CCF10	17	$566,667	$22,700	14-7	17	$566,667	$0	17	$0	$0
Ciudad: SANTA MARIA Depto: BOYACA (5 Afiliados)						$1,743,622	$234,600			$1,743,622	$25,000			$558,851	$22,500			$1,743,622	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
24	CC	74324535	ARDILA DAZA PABLO ALFONSO	230301	29	$966,667	$116,100	CCFC55	29	$966,667	$0	CCF10	29	$0	$0	14-7	29	$966,667	$0	29	$0	$0
25	CC	7334813	CASTAÑEDA AREVALO OSCAR JAVIER	230301	2	$87,500	$14,000	EPS037	2	$87,500	$3,500	CCF10	2	$66,906	$2,700	14-7	2	$87,500	$0	2	$0	$0
26	CC	4055332	LEMUS MONTAÑA DELIO GILBERTO	230301	1	$76,756	$9,300	EPS037	1	$76,756	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$76,756	$0	1	$0	$0
27	CC	4055332	LEMUS MONTAÑA DELIO GILBERTO	230301	1	$76,756	$9,300	EPS037	1	$76,756	$0	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$76,756	$0	1	$0	$0
28	CC	74324703	MONROY SANCHEZ NEIL ALFONSO	230301	5	$252,453	$40,400	CCFC24	5	$252,453	$10,100	CCF10	5	$237,500	$9,500	14-7	5	$252,453	$0	5	$0	$0
29	CC	74324703	MONROY SANCHEZ NEIL ALFONSO	230301	4	$201,962	$32,400	CCFC24	4	$201,962	$8,100	CCF10	4	$187,778	$7,600	14-7	4	$201,962	$0	4	$0	$0
30	CC	74325762	SALGADO SALGADO IBAN	230301	2	$81,528	$13,100	EPS037	2	$81,528	$3,300	CCF10	2	$66,667	$2,700	14-7	2	$81,528	$0	2	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						**$1,173,193**	**$183,000**			**$1,173,193**	**$42,100**			**$0**	**$0**			**$1,173,193**	**$0**		**$0**	**$0**
31	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	230301	2	$123,782	$14,900	EPS017	2	$123,782	$0	CCF10	2	$0	$0	14-7	2	$123,782	$0	2	$0	$0
32	CC	74084850	PLAZAS ROMERO PEDRO MAURICIO	230301	1	$49,410	$8,000	EPS005	1	$49,410	$2,000	CCF10	1	$0	$0	14-7	1	$49,410	$0	1	$0	$0
33	CC	1090538980	SOLANO CASTELLANOS EDUARD NICASIO	230301	8	$266,667	$42,700	EPS037	8	$266,667	$10,700	CCF10	8	$0	$0	14-7	8	$266,667	$0	8	$0	$0
34	CC	1090538980	SOLANO CASTELLANOS EDUARD NICASIO	230301	22	$733,334	$117,400	EPS037	22	$733,334	$29,400	CCF10	22	$0	$0	14-7	22	$733,334	$0	22	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (109 Afiliados)						**$198,035,405**	**$32,001,600**			**$207,635,405**	**$9,125,600**			**$207,964,121**	**$8,322,700**			**$207,635,405**	**$14,455,900**		**$9,600,000**	**$480,000**
Ciudad: BELEN Depto: BOYACA (64 Afiliados)						**$121,159,139**	**$19,615,900**			**$121,159,139**	**$4,848,500**			**$121,212,264**	**$4,850,600**			**$121,159,139**	**$8,435,100**		**$0**	**$0**
35	CC	1049646966	AGUILAR AMAYA DIANA CAROLINA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
36	CC	1052312397	BALAGUERA BALAGUERA VICTOR MANUEL	230201	14	$466,667	$74,700	EPS041	14	$466,667	$18,700	CCF10	14	$466,667	$18,700	14-7	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
37	CC	79564690	BARRETO CARDENAS JOSE LEONARDO	25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF10	30	$2,900,000	$116,000	14-7	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
38	CC	1057600096	BELLO MOJICA JHON STEVEN	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS017	30	$2,300,000	$92,000	CCF10	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
39	CC	1050200966	BELTRAN ALVAREZ JULIAN ALBEIRO	230301	30	$2,406,001	$385,000	EPS037	30	$2,406,001	$96,300	CCF10	30	$2,406,001	$96,300	14-7	30	$2,406,001	$167,500	30	$0	$0
40	CC	1048850035	BERMEJO AREVALO WILLIAM ALONSO	230301	16	$1,126,875	$180,300	EPS017	16	$1,126,875	$45,100	CCF10	16	$1,126,875	$45,100	14-7	16	$1,126,875	$78,500	16	$0	$0
41	CC	1010094305	BLANCO SUA ERIKA JULIETH	230301	15	$500,000	$80,000	ESSC24	15	$500,000	$20,000	CCF10	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
42	CC	1006559819	BUITRAGO GONZALEZ DANNA ISAMAR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
43	CC	1116874244	CAMUAN SUA BERNABE	230301	30	$2,430,000	$388,800	EPS037	30	$2,430,000	$97,200	CCF10	30	$2,430,000	$97,200	14-7	30	$2,430,000	$169,200	30	$0	$0
44	CC	1055312911	CASTIBLANCO SALAMANCA OSCAR LEONARDO	230301	21	$1,656,667	$265,100	EPS005	21	$1,656,667	$66,300	CCF10	21	$1,656,667	$66,300	14-7	21	$1,656,667	$115,400	21	$0	$0
45	CC	1052395602	CASTRO BENITEZ EDWIN FABIAN	230301	30	$2,077,213	$332,400	EPS037	30	$2,077,213	$83,100	CCF10	30	$2,077,213	$83,100	14-7	30	$2,077,213	$144,600	30	$0	$0
46	CC	1002461031	CASTRO DIAZ ESTEBAN	230301	15	$500,000	$80,000	CCFC24	15	$500,000	$20,000	CCF10	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
47	CC	1057608391	CHAPARRO SANABRIA MAICOL ANDERSON	230201	23	$1,303,333	$208,600	EPS017	23	$1,303,333	$52,200	CCF10	23	$1,303,333	$52,200	14-7	23	$1,303,333	$90,800	23	$0	$0
48	CC	36066433	CHAVES BERNAL ANA MERCEDES	25-14	7	$1,050,000	$168,000	EPS005	7	$1,050,000	$42,000	CCF10	7	$1,050,000	$42,000	14-7	7	$1,050,000	$73,100	7	$0	$0
49	CC	4208019	DURAN HIGUERA GLADIMIRO	230301	30	$2,206,333	$353,100	EPS005	30	$2,206,333	$88,300	CCF10	30	$2,206,333	$88,300	14-7	30	$2,206,333	$153,600	30	$0	$0
50	CC	1002556873	DURAN VELANDIA GREISY FABIANA	230301	8	$266,667	$42,700	EPS041	8	$266,667	$10,700	CCF10	8	$266,667	$10,700	14-7	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
51	CC	40044477	GALINDO GOMEZ CATHERINE	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF10	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
52	CC	74380185	GALVIS CASTELLANOS WALTER OSWALDO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
53	CC	73551257	GAMARRA DEAVILA AMAURY JOSE	230301	30	$1,447,917	$231,700	EPS048	30	$1,447,917	$58,000	CCF10	30	$1,447,917	$58,000	14-7	30	$1,447,917	$100,800	30	$0	$0
54	CC	1049647649	GARCIA ARIAS ANGIE LORENA	230201	30	$1,350,700	$216,200	EPS005	30	$1,350,700	$54,100	CCF10	30	$1,350,700	$54,100	14-7	30	$1,350,700	$94,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
55	CC	12020282	GARCIA PALACIOS FULTON JOSE	25-14	30	$3,019,271	$483,100	EPS002	30	$3,019,271	$120,800	CCF10	30	$3,019,271	$120,800	14-7	30	$3,019,271	$210,200	30	$0	$0
56	CC	1052409165	GOMEZ BARRERA JUAN DARIO	230301	30	$1,970,688	$315,400	EPS005	30	$1,970,688	$78,900	CCF10	30	$1,970,688	$78,900	14-7	30	$1,970,688	$137,200	30	$0	$0
57	CC	78108584	GONZALEZ ALEMAN DAIRO LUIS	231001	1	$86,667	$13,900	EPS002	1	$86,667	$3,500	CCF10	1	$86,667	$3,500	14-7	1	$86,667	$6,100	1	$0	$0
58	CC	79687057	GONZALEZ CONTRERAS OMAR RICARDO	230301	30	$4,500,000	$765,000	MIN001	30	$4,500,000	$180,000	CCF10	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
59	CC	1116040623	GUALDRON TUMAY ARLEY	230301	30	$1,550,000	$248,000	EPSC25	30	$1,550,000	$62,000	CCF10	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
60	CC	74326892	GUERRERO HERNANDEZ YOANY	230301	14	$490,000	$78,400	EPS037	14	$490,000	$19,600	CCF10	14	$490,000	$19,600	14-7	14	$490,000	$34,200	14	$0	$0
61	CC	1052313019	GUTIERREZ DAZA MARLON EDUARDO	230301	27	$946,875	$151,500	EPS041	27	$946,875	$37,900	CCF10	27	$1,000,000	$40,000	14-7	27	$946,875	$66,000	27	$0	$0
62	CC	19585897	HERNANDEZ CORONADO ONORIO ALBERTO	230301	30	$3,243,042	$518,900	EPS037	30	$3,243,042	$129,800	CCF10	30	$3,243,042	$129,800	14-7	30	$3,243,042	$225,800	30	$0	$0
63	CC	1053606816	HURTADO MOLANO JOHN JAIRO	230301	30	$1,902,625	$304,500	EPS005	30	$1,902,625	$76,200	CCF10	30	$1,902,625	$76,200	14-7	30	$1,902,625	$132,500	30	$0	$0
64	CC	74380737	LARA SANDOVAL NELSON REINALDO	230301	30	$2,164,064	$346,300	EPS037	30	$2,164,064	$86,600	CCF10	30	$2,164,064	$86,600	14-7	30	$2,164,064	$150,700	30	$0	$0
65	CC	1118650765	LOPEZ VARGAS JOSE WILSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
66	CC	1070944475	MENDIVELSO MENDIVELSO MARCO ANTONIO	25-14	14	$466,667	$74,700	EPS037	14	$466,667	$18,700	CCF10	14	$466,667	$18,700	14-7	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
67	CC	1049630363	MORALES MORENO JAVIER ANDRES	230301	30	$1,565,578	$250,500	EPS005	30	$1,565,578	$62,700	CCF10	30	$1,565,578	$62,700	14-7	30	$1,565,578	$109,000	30	$0	$0
68	CC	52352795	MORENO MONROY MAIRA ESPERANZA	231001	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF10	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
69	CC	1054681191	MUÑOZ ROJAS LUIS CARLOS	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF10	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
70	CC	1056554283	NOCOBE USCATEGUI JOSE MIGUEL	230301	29	$1,310,834	$209,800	EPS042	29	$1,310,834	$52,500	CCF10	29	$1,310,834	$52,500	14-7	29	$1,310,834	$91,300	29	$0	$0
71	CC	74381824	OLIVEROS CASTAÑEDA GUILLERMO ARTURO	231001	25	$1,290,079	$206,500	EPS017	25	$1,290,079	$51,700	CCF10	25	$1,290,079	$51,700	14-7	25	$1,290,079	$89,800	25	$0	$0
72	CC	1007391217	PALACIOS ALBA JESELL TATIANA	230301	29	$1,008,334	$161,400	EPS037	29	$1,008,334	$40,400	CCF10	29	$1,008,334	$40,400	14-7	29	$1,008,334	$70,200	29	$0	$0
73	CC	74181633	PEÑA MESA NESTOR JAVIER	25-14	8	$613,333	$98,200	EPS008	8	$613,333	$24,600	CCF10	8	$613,333	$24,600	14-7	8	$613,333	$42,700	8	$0	$0
74	CC	1057571835	PEREZ MORENO OSCAR LEONARDO	230901	30	$4,500,000	$765,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF10	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
75	CC	1049795766	PERILLA SALAS JHON ALEXANDER	230301	30	$2,762,625	$442,100	EPS037	30	$2,762,625	$110,600	CCF10	30	$2,762,625	$110,600	14-7	30	$2,762,625	$192,300	30	$0	$0
76	CC	1110593285	PETANO ORTIZ BRAYAN CAMILO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF10	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
77	CC	7179892	RIAÑO SANCHEZ HOLLMAN RICARDO	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
78	CC	1058275336	RINCON PARRA JUAN CAMILO	230301	30	$1,629,167	$260,700	EPS017	30	$1,629,167	$65,200	CCF10	30	$1,629,167	$65,200	14-7	30	$1,629,167	$113,400	30	$0	$0
79	CC	74375614	RODRIGUEZ CEPEDA ANGEL RAFAEL	230301	30	$2,565,521	$410,500	EPS017	30	$2,565,521	$102,700	CCF10	30	$2,565,521	$102,700	14-7	30	$2,565,521	$178,600	30	$0	$0
80	CC	9533414	RODRIGUEZ CUBAQUE CARLOS JULIO	230301	30	$2,309,063	$369,500	EPS017	30	$2,309,063	$92,400	CCF10	30	$2,309,063	$92,400	14-7	30	$2,309,063	$160,800	30	$0	$0
81	CC	4277980	ROJAS ESPINEL JAVIER ANTONIO	230201	30	$2,424,375	$387,900	EPS037	30	$2,424,375	$97,000	CCF10	30	$2,424,375	$97,000	14-7	30	$2,424,375	$168,800	30	$0	$0
82	CC	88189055	ROJAS GOMEZ WILMAR ANTONIO	25-14	30	$2,505,751	$401,000	EPS037	30	$2,505,751	$100,300	CCF10	30	$2,505,751	$100,300	14-7	30	$2,505,751	$174,500	30	$0	$0
83	CC	1105304903	RUENES SANCHEZ OSCAR DAVID	230301	30	$4,500,000	$765,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF10	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
84	CC	1048822742	SALAMANCA BLANCO LEONIDAS	230301	2	$103,334	$16,600	EPSC25	2	$103,334	$4,200	CCF10	2	$103,334	$4,200	14-7	2	$103,334	$7,200	2	$0	$0
85	CC	1116992767	SALGADO SANCHEZ JHON FREDY	230301	30	$2,254,688	$360,800	EPS017	30	$2,254,688	$90,200	CCF10	30	$2,254,688	$90,200	14-7	30	$2,254,688	$157,000	30	$0	$0
86	CC	9153901	SALINAS VASQUEZ JULIO	230301	30	$1,570,142	$251,300	ESSC24	30	$1,570,142	$62,900	CCF10	30	$1,570,142	$62,900	14-7	30	$1,570,142	$109,300	30	$0	$0
87	CC	79909708	SANCHEZ LOPEZ RAFAEL	230301	29	$4,350,000	$739,600	EPS005	29	$4,350,000	$174,000	CCF10	29	$4,350,000	$174,000	14-7	29	$4,350,000	$302,800	29	$0	$0
88	CC	74337466	TANGUA NEITA YOLMAN FERNANDO	230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS037	30	$1,550,000	$62,000	CCF10	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
89	CC	1052378191	TELLEZ GOMEZ ROBINSON	230301	30	$2,451,375	$392,300	EPS008	30	$2,451,375	$98,100	CCF10	30	$2,451,375	$98,100	14-7	30	$2,451,375	$170,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
90	CC	1007400687	TIBOCHA CORREA KELY BIVIANA	230301	8	$266,667	$42,700	EPS037	8	$266,667	$10,700	CCF10	8	$266,667	$10,700	14-7	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
91	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	8	$440,000	$70,400	EPS037	8	$440,000	$17,600	CCF10	8	$440,000	$17,600	14-7	8	$440,000	$30,700	8	$0	$0
92	CC	3121271	TORRES GUERRERO DULTEBIR	231001	14	$466,667	$74,700	EPS037	14	$466,667	$18,700	CCF10	14	$466,667	$18,700	14-7	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
93	CC	23449678	TORRES TORRES ERIKA VIVIANA	230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS041	30	$3,300,000	$132,000	CCF10	30	$3,300,000	$132,000	14-7	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0
94	CC	1018504926	TRIANA PELAYO ANDREA HASBLEIDY	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
95	CC	79913807	VEGA CARLOS AUGUSTO	230301	27	$2,184,375	$349,500	EPS037	27	$2,184,375	$87,400	CCF10	27	$2,184,375	$87,400	14-7	27	$2,184,375	$152,100	27	$0	$0
96	CC	86087116	VELANDIA LARA CHRISTIAN BERNARDO	230301	30	$1,782,813	$285,300	EPS017	30	$1,782,813	$71,400	CCF10	30	$1,782,813	$71,400	14-7	30	$1,782,813	$124,100	30	$0	$0
97	CC	17594284	YEPEZ ORTEGA ALDEMAR	25-14	28	$2,613,333	$418,200	EPS037	28	$2,613,333	$104,600	CCF10	28	$2,613,333	$104,600	14-7	28	$2,613,333	$181,900	28	$0	$0
98	CC	1057604014	ZORRO ZEA SERGIO YESID	230301	30	$1,812,813	$290,100	EPS041	30	$1,812,813	$72,600	CCF10	30	$1,812,813	$72,600	14-7	30	$1,812,813	$126,200	30	$0	$0
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (15 Afiliados)						**$29,382,171**	**$4,733,200**			**$29,382,171**	**$1,176,000**			**$29,382,171**	**$1,176,000**			**$29,382,171**	**$2,045,700**		**$0**	**$0**
99	CC	7186441	AGUILAR MARTINEZ JOSE YESID	230301	29	$2,755,000	$440,800	ESSC24	29	$2,755,000	$110,200	CCF10	29	$2,755,000	$110,200	14-7	29	$2,755,000	$191,800	29	$0	$0
100	CC	8637418	BANDA CABARCAS JOSE FRANCISCO	230301	30	$1,406,251	$225,100	EPS002	30	$1,406,251	$56,300	CCF10	30	$1,406,251	$56,300	14-7	30	$1,406,251	$97,900	30	$0	$0
101	CC	8635207	BLANCO CABRERA JAIME ENRIQUE	230301	30	$3,309,167	$529,500	EPS002	30	$3,309,167	$132,400	CCF10	30	$3,309,167	$132,400	14-7	30	$3,309,167	$230,400	30	$0	$0
102	CC	1116992429	BOHORQUEZ VACA YONEL FERNANDO	230301	26	$1,406,153	$225,000	EPSC25	26	$1,406,153	$56,300	CCF10	26	$1,406,153	$56,300	14-7	26	$1,406,153	$97,900	26	$0	$0
103	CC	1052314148	CEPEDA CEPEDA MARIA ELENA	230301	30	$1,277,084	$204,400	CCFC24	30	$1,277,084	$51,100	CCF10	30	$1,277,084	$51,100	14-7	30	$1,277,084	$88,900	30	$0	$0
104	CC	1052313663	CEPEDA CEPEDA MARTHA CECILIA	230201	30	$1,213,541	$194,200	EPS008	30	$1,213,541	$48,600	CCF10	30	$1,213,541	$48,600	14-7	30	$1,213,541	$84,500	30	$0	$0
105	CC	2757541	DIAZ ARROYO VICENTE FRANCISCO	230301	30	$2,478,449	$396,600	EPS037	30	$2,478,449	$99,200	CCF10	30	$2,478,449	$99,200	14-7	30	$2,478,449	$172,600	30	$0	$0
106	CC	53176700	ESLAVA GUERRERO SONIA YIRLENY	230301	29	$1,228,334	$196,600	CCFC24	29	$1,228,334	$49,200	CCF10	29	$1,228,334	$49,200	14-7	29	$1,228,334	$85,500	29	$0	$0
107	CC	1049795391	MARTIN ROA FREDY ALDEMAR	230301	29	$2,577,875	$412,500	EPS017	29	$2,577,875	$103,200	CCF10	29	$2,577,875	$103,200	14-7	29	$2,577,875	$179,500	29	$0	$0
108	CC	80472538	MARTIN AVILA FREDY MAURICIO	230201	30	$2,546,625	$407,500	EPS037	30	$2,546,625	$101,900	CCF10	30	$2,546,625	$101,900	14-7	30	$2,546,625	$177,300	30	$0	$0
109	CC	1024599890	MONROY HOLGUIN DALY YANIRA	230301	30	$1,145,833	$183,400	EPS005	30	$1,145,833	$45,900	CCF10	30	$1,145,833	$45,900	14-7	30	$1,145,833	$79,800	30	$0	$0
110	CC	8635461	OLIVO MUÑOZ JUAN BAUTISTA	230301	30	$1,453,480	$232,600	EPS002	30	$1,453,480	$58,200	CCF10	30	$1,453,480	$58,200	14-7	30	$1,453,480	$101,200	30	$0	$0
111	CC	23795468	OLIVOS MORALES BELQUIS AGNES	231001	23	$3,134,137	$532,900	EPS008	23	$3,134,137	$125,400	CCF10	23	$3,134,137	$125,400	14-7	23	$3,134,137	$218,200	23	$0	$0
112	CC	9395164	PALACIOS PEREZ JAIME	230301	30	$2,140,313	$342,500	EPS037	30	$2,140,313	$85,700	CCF10	30	$2,140,313	$85,700	14-7	30	$2,140,313	$149,000	30	$0	$0
113	CC	1001866125	URUETA ESCORCIA JORGE LUIS	231001	30	$1,309,929	$209,600	EPS002	30	$1,309,929	$52,400	CCF10	30	$1,309,929	$52,400	14-7	30	$1,309,929	$91,200	30	$0	$0
Ciudad: GUATEQUE Depto: BOYACA (9 Afiliados)						**$15,602,243**	**$2,549,100**			**$15,602,243**	**$624,500**			**$15,738,076**	**$629,900**			**$15,602,243**	**$1,086,300**		**$0**	**$0**
114	CC	7335459	BOHORQUEZ DAZA JOHN FREDY	230301	30	$1,288,542	$206,200	EPS037	30	$1,288,542	$51,600	CCF10	30	$1,288,542	$51,600	14-7	30	$1,288,542	$89,700	30	$0	$0
115	CC	1056412731	BRICEÑO ESCARRAGA FABIAN DARIO	230301	30	$1,170,833	$187,400	EPS037	30	$1,170,833	$46,900	CCF10	30	$1,170,833	$46,900	14-7	30	$1,170,833	$81,500	30	$0	$0
116	CC	4053360	CARDENAS LUIS ORLANDO	230201	30	$1,794,004	$287,100	CCFC24	30	$1,794,004	$71,800	CCF10	30	$1,794,004	$71,800	14-7	30	$1,794,004	$124,900	30	$0	$0
117	CC	1049797429	GUATAQUIRA RAMIREZ CRISTIAN ORLEY	230301	30	$2,282,813	$365,300	EPS005	30	$2,282,813	$91,400	CCF10	30	$2,282,813	$91,400	14-7	30	$2,282,813	$158,900	30	$0	$0
118	CC	7333224	MONDRAGON FERNANDEZ JOSE MISAEL	25-14	23	$864,167	$138,300	EPS037	23	$864,167	$34,600	CCF10	23	$1,000,000	$40,000	14-7	23	$864,167	$60,200	23	$0	$0
119	CC	4134549	MUÑOZ BARRERA ISIDORO	230301	26	$923,959	$147,900	EPS037	26	$923,959	$37,000	CCF10	26	$923,959	$37,000	14-7	26	$923,959	$64,400	26	$0	$0
120	CC	1055313060	NOY GUTIERREZ PABLO ANDRES	230301	30	$5,224,800	$888,400	EPS005	30	$5,224,800	$209,000	CCF10	30	$5,224,800	$209,000	14-7	30	$5,224,800	$363,700	30	$0	$0
121	CC	72326310	RINCON MENDOZA JOSE DE JESUS	230201	30	$1,150,000	$184,000	EPS037	30	$1,150,000	$46,000	CCF10	30	$1,150,000	$46,000	14-7	30	$1,150,000	$80,100	30	$0	$0
122	CC	4047475	RUIZ ROA EDWIN NORBEY	230301	26	$903,125	$144,500	EPS017	26	$903,125	$36,200	CCF10	26	$903,125	$36,200	14-7	26	$903,125	$62,900	26	$0	$0
Ciudad: SAN LUIS DE GACENO Depto: BOYACA (2 Afiliados)						**$2,632,292**	**$421,200**			**$2,632,292**	**$105,300**			**$2,632,292**	**$105,300**			**$2,632,292**	**$183,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
123	CC	74352465	GARCIA FERNANDEZ SAUL ANTONIO	230301	30	$1,200,000	$192,000	CCFC55	30	$1,200,000	$48,000	CCF10	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
124	CC	1124400977	RAMIREZ MARTINEZ LUIS PEDRO	230301	30	$1,432,292	$229,200	EPS037	30	$1,432,292	$57,300	CCF10	30	$1,432,292	$57,300	14-7	30	$1,432,292	$99,700	30	$0	$0
Ciudad: SANTA MARIA Depto: BOYACA (14 Afiliados)						**$20,222,060**	**$3,235,900**			**$29,822,060**	**$2,009,500**			**$29,822,060**	**$1,193,500**			**$29,822,060**	**$2,076,200**		**$9,600,000**	**$480,000**
125	CC	4150433	ALGARRA PINEDA JOSE VICENTE	230301	30	$1,550,000	$248,000	CCFC24	30	$1,550,000	$62,000	CCF10	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
126	CC	74324535	ARDILA DAZA PABLO ALFONSO	230301	1	$33,334	$5,400	CCFC55	1	$33,334	$1,400	CCF10	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
127	CC	1054658745	AVILA GAMBA YILBER DANILO	230301	30	$1,959,376	$313,600	CCFC55	30	$1,959,376	$78,400	CCF10	30	$1,959,376	$78,400	14-7	30	$1,959,376	$136,400	30	$0	$0
128	CC	1120870210	BRAVO ROLDAN ROBINSON	230301	30	$2,265,625	$362,500	EPS037	30	$2,265,625	$90,700	CCF10	30	$2,265,625	$90,700	14-7	30	$2,265,625	$157,700	30	$0	$0
129	CC	7334813	CASTAÑEDA AREVALO OSCAR JAVIER	230301	28	$954,166	$152,700	EPS037	28	$954,166	$38,200	CCF10	28	$954,166	$38,200	14-7	28	$954,166	$66,500	28	$0	$0
130	CC	4055332	LEMUS MONTAÑA DELIO GILBERTO	230301	28	$2,040,579	$326,500	EPS037	28	$2,040,579	$81,700	CCF10	28	$2,040,579	$81,700	14-7	28	$2,040,579	$142,100	28	$0	$0
131	CC	74324703	MONROY SANCHEZ NEIL ALFONSO	230301	21	$1,038,906	$166,300	CCFC24	21	$1,038,906	$41,600	CCF10	21	$1,038,906	$41,600	14-7	21	$1,038,906	$72,400	21	$0	$0
132	CC	3672454	OCHOA VASQUEZ ALIRIO DE JESUS	230301	30	$1,375,000	$220,000	ESSC24	30	$1,375,000	$55,000	CCF10	30	$1,375,000	$55,000	14-7	30	$1,375,000	$95,700	30	$0	$0
133	CC	1097332234	PEÑA QUIROGA EDINSON FERNEY	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF10	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
134	CC	1053607166	RACHE RINCON RAFAEL ANTONIO	230201	30	$2,735,625	$437,700	EPS017	30	$2,735,625	$109,500	CCF10	30	$2,735,625	$109,500	14-7	30	$2,735,625	$190,400	30	$0	$0
135	CC	1058324152	RAMIREZ SANCHEZ LUIS CARLOS	230301	30	$1,561,115	$249,800	EPS037	30	$1,561,115	$62,500	CCF10	30	$1,561,115	$62,500	14-7	30	$1,561,115	$108,700	30	$0	$0
136	CC	1019040180	RUIZ HUERTAS CLAUDIA MIREYA	230201	30	$1,242,709	$198,900	EPSC25	30	$1,242,709	$49,800	CCF10	30	$1,242,709	$49,800	14-7	30	$1,242,709	$86,500	30	$0	$0
137	CC	74325762	SALGADO SALGADO IBAN	230301	28	$1,065,625	$170,500	EPS037	28	$1,065,625	$42,700	CCF10	28	$1,065,625	$42,700	14-7	28	$1,065,625	$74,200	28	$0	$0
138	CC	19202146	SANTAMARIA GOMEZ ALVARO		0	$0	$0	EPS017	30	$9,600,000	$1,200,000	CCF10	30	$9,600,000	$384,000	14-7	30	$9,600,000	$668,200	30	$9,600,000	$480,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (5 Afiliados)						**$9,037,500**	**$1,446,300**			**$9,037,500**	**$361,800**			**$9,177,258**	**$367,400**			**$9,037,500**	**$629,300**		**$0**	**$0**
139	CC	1065599204	DE LA HOZ MAESTRE JORGE IVAN	230301	28	$1,496,457	$239,500	EPS017	28	$1,496,457	$59,900	CCF10	28	$1,496,457	$59,900	14-7	28	$1,496,457	$104,200	28	$0	$0
140	CC	1024483270	MONTOYA GARCIA URIEL AUGUSTO	230301	30	$2,330,375	$372,900	EPS008	30	$2,330,375	$93,300	CCF10	30	$2,330,375	$93,300	14-7	30	$2,330,375	$162,200	30	$0	$0
141	CC	74084850	PLAZAS ROMERO PEDRO MAURICIO	230301	1	$76,667	$12,300	EPS005	1	$76,667	$3,100	CCF10	1	$216,425	$8,700	14-7	1	$76,667	$5,400	1	$0	$0
142	CC	74325689	SANCHEZ RAMIREZ YIMI GIOVANI	25-14	30	$2,547,667	$407,700	EPS037	30	$2,547,667	$102,000	CCF10	30	$2,547,667	$102,000	14-7	30	$2,547,667	$177,400	30	$0	$0
143	CC	1116548712	VELASCO ANGEL ADRIANA KATERINE	230301	30	$2,586,334	$413,900	EPS005	30	$2,586,334	$103,500	CCF10	30	$2,586,334	$103,500	14-7	30	$2,586,334	$180,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(112)**					$208,662,012	$33,631,900			$218,262,012	$9,469,900			$213,009,430	$8,524,900			$218,262,012	$14,468,000		$9,600,000	$480,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1401736699	9433380195	E	2022/04/06	2022/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$929,151,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				111	$33,631,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,448,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,692,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	$23,865,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,860,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$765,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				110	$14,468,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	110	$14,468,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				111	$8,524,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	110	$8,432,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$92,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				112	$9,469,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$127,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	$178,300
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	6	$313,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$429,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$248,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$58,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$92,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$2,230,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$180,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	$2,873,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$275,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$519,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,890,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$288,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$192,000
TOTAL				**112**	**$66,574,700**

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO CONSTRUCTOR SISGA identificado(a) con NI 901038609 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para TOMAS STEEWARTH ALFARO GUTIERREZ identificado(a) con CC 7174689

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9433113475	1392079436	E	2022-03-31	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30
9433113475	1392079436	E	2022-03-31	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30
9433113475	1392079436	E	2022-03-31	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-03	30
9433113475	1392079436	E	2022-03-31	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-03	30
9433113475	1392079436	E	2022-03-31	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-03	30
9433113475	1392079436	E	2022-03-31	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-03	30
9433113475	1392079436	E	2022-03-31	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30
9433113475	1392079436	E	2022-03-31	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30
9433113475	1392079436	E	2022-03-31	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30
9433113475	1392079436	E	2022-03-31	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30

Este certificado se expide el día 2022-04-06 a las 02:21.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14751273091

(415)7707212489984(8020) 000001475127309 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 11 41 EDIFICIO GRUPO AREA PISO 22 BOCAGRANDE

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 8	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 8					0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	4	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 10 61. Fecha 2021 - 04 - 08 / 11 : 18: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OLAYA TOVAR NORMA CONSTANZA
985. Cargo Gestor I

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751273091

(415)7707212489984(8020) **000001475127309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 8	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751273091

(415)7707212489984(8020) **000001475127309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751273091

(415)7707212489984(8020) **000001475127309 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 0 2 8	8	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 1 0 2 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14697413092

(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCTORA EMMA LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 2 4 5 0 5	6 4 2 4 5 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 06 / 07 : 42: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE EFRAIN FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5	
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) 000001469741309 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 4 0 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 4 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2		7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8		1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697413092

(415)7707212489984(8020) **000001469741309 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR MANGA CL 25 16 A 24 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono: 6 4 2 4 5 0 5	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14729912674

(415)7707212489984(8020) 000001472991267 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 11 41 OF 2206

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 3 9 2 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 5 1 1	2 0 0 1 1 1 2 1	4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	1	0	1	4	1	8	1	9	2	6	4	2	4	8	5	2						

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 8 61. Fecha 2021 - 01 - 07 / 14 : 22: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA
985. Cargo Gestor III

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720083488

(415)7707212489984(8020) 000001472008348 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 5 3 7 0 8 2	6 5 3 8 3 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 2 2 0	4 2 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 30 / 09 : 51: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 0 5 3 6 1 8		1 6 4 9 5 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MEJIA	CARO	BELSY	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 1 3 3 0 4		9 6 4 3 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ESTRADA	HERNANDEZ	BLEIDIS	DEL SOCORRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720083488

(415)7707212489984(8020) **000001472008348 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR LOS ALPES TV 54 31 A 43

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 3 7 0 8 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: TV 54 31 A 43 BRR LOS ALPES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 5 3 7 0 8 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 978 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES

MES INFORME MENSUAL: mar-22 **PROYECTO:** RUTA DE LOS LIBERTADORES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1038 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	RP 420921	C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 6,703,084,932.00	$ 954,010,819.00
		C-2401-0600-108-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 128,815,368.00	$ 128,815,368.00
		C-2401-0600-132-0-2401008-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 1,643,914,710.00	$ 1,643,914,710.00
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 62,085,290.00	$ 62,085,290.00
		C-2401-0600-108-0-2401041-02	54	NACION	978 DE 2021	$ 770,360,488.00	$ 770,360,488.00
2021	RP 1060021	C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	ADICIONAL No. 1	$ 12,211,840,972.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	ADICIONAL No. 1	$ 3,848,000,000.00	$ 0.00
		C-2401-0600-108-0-2401008-02	54	NACION	ADICIONAL No. 1	$ 4,000,000,000.00	$ 0.00
				TOTAL		$ 29,368,101,760.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 342,849,969,892.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,308,260,788.00	$ 322,790,128,920.00			x	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
2	PARCIAL	jul-21	$ 11,855,060.00	$ 86,633.00	$ 11,941,693.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,296,319,095.00	$ 322,778,187,227.00		x		
3	PARCIAL	ago-21	$ 54,599,244.00	$ 398,995.00	$ 66,939,932.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 9,241,320,856.00	$ 322,723,188,988.00		x		
4	PARCIAL	sep-21	$ 981,650,908.00	$ 7,173,603.00	$ 1,055,764,443.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 8,252,496,345.00	$ 321,734,364,477.00		x		
5	PARCIAL	oct-21	$ 1,073,590,564.00	$ 7,845,470.00	$ 2,137,200,477.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,171,060,311.00	$ 319,597,164,000.00		x		
										ADICIÓN 1	$ 20,059,840,972.00				
1	AJUSTE	jun-21	$ -	$ -	$ 2,137,200,477.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,171,060,311.00	$ 340,712,769,415.00			x	EL VALOR DEL ACTA ES CERO
2	AJUSTE	jul-21	$ 152,239.00	$ 1,113.00	$ 2,137,353,829.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 7,170,906,959.00	$ 340,712,616,063.00		x		
6	PARCIAL	nov-21	$ 871,236,823.00	$ 6,366,731.00	$ 3,014,957,383.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 6,293,303,405.00	$ 339,835,012,509.00		x		
7	PARCIAL	dic-21	$ 811,030,111.00	$ 5,926,759.00	$ 3,831,914,253.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,476,346,535.00	$ 339,018,055,639.00		x		
3	PROV.	ago-21	$ 1,539,480.00	$ 11,250.00	$ 3,833,464,983.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,474,795,805.00	$ 339,016,504,909.00				
4	PROV.	sep-21	$ 42,120,541.00	$ 307,804.00	$ 3,875,893,328.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,432,367,460.00	$ 338,974,076,564.00				
5	PROV.	oct-21	$ 34,026,751.00	$ 248,657.00	$ 3,910,168,736.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,398,092,052.00	$ 338,939,801,156.00				
6	PROV.	nov-21	$ 18,117,762.00	$ 132,399.00	$ 3,928,418,897.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,379,841,891.00	$ 338,921,550,995.00				
7	PROV.	dic-21	$ 17,842,641.00	$ 130,389.00	$ 3,946,391,927.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 5,361,868,861.00	$ 338,903,577,965.00				
8	PARCIAL	ene-22	$ 894,569,675.00	$ 6,537,240.00	$ 4,847,498,842.00	$ -	$ -	$ -	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 4,460,761,946.00	$ 338,002,471,050.00				
					ANTICIPO 1			$ 20,059,840,972.00	RP. 1060021 (23/12/2021)	$ -	$ 338,002,471,050.00				
9	PARCIAL	feb-22	$ 952,772,657.00	$ 6,962,569.00	$ 5,807,234,068.00	$ 58,159,955.00	$ 901,575,271.00	$ 20,001,681,017.00	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 3,559,186,675.00	$ 337,042,735,824.00				
10	PARCIAL	mar-22	$ 1,617,078,642.00	$ 11,817,113.00	$ 7,436,129,823.00	$ 98,873,972.00	$ 1,530,021,783.00	$ 19,902,807,045.00	RP. 420921 (21//05/2021)	$ 2,029,164,892.00	$ 335,413,840,069.00				
TOTALES			**$ 7,382,183,098.00**	**$ 53,946,725.00**	**$ 7,436,129,823.00**	**$ 157,033,927.00**	**$ 1,530,021,783.00**	**$ 19,902,807,045.00**		**$ 2,029,164,892.00**	**$ 335,413,840,069.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 7,268,383,684.00	$ 53,115,113.00	$ 7,321,498,797.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	$ 113,799,414.00	$ 831,612.00	$ 114,631,026.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -		$ -
VALOR TOTAL	**$ 7,382,183,098.00**	**$ 53,946,725.00**	**$ 7,436,129,823.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 25202-07791 CND

Firma
FERNANDO BENJAMIN MONROY
Director de Interventoría
Matrícula No.: 01193-0187 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	2/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Boyacá **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** mar-22 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1,617,078,642.00

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 978 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4


CONTRATISTA: Consorcio Vías Nacionales

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1038 de 2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Interventorias Colombia

PLAZO INICIAL: 102 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 322,790,128,920.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 342,849,969,892.00

PLAZO ACUMULADO: 98 meses y 1 Semana (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 20,059,840,972.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	dic-23	dic-24	dic-25	dic-26	dic-27	dic-28	dic-29	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	$18,861,293,885	7.227%	0.01%	% P		0.004%	0.004%	0.008%	0.014%	0.016%	0.008%	0.029%	0.035%	0.046%	0.063%	0.085%	0.085%	0.085%	0.085%	0.085%	0.074%	0.057%	0.046%	0.817%	0.970%	0.970%	0.970%	0.982%	0.970%	0.720%
				$ P		$9,635,056	$11,618,744	$21,253,799	$35,422,999	$42,507,599	$21,253,799	$75,949,143	$90,490,273	$119,572,533	$163,195,923	$221,360,443	$221,360,444	$221,360,444	$221,360,444	$221,360,444	$192,278,184	$148,654,793	$119,572,533	$2,132,937,533	$2,532,680,140	$2,532,680,139	$2,532,680,139	$2,562,994,197	$2,531,238,596	$1,877,875,543	100%
	$18,861,293,885	7.227%	$20,502,127	$ E		$9,635,056	$11,618,480	$3,003,066	$309,880		$1,276,972			$304,319																	
				% E		0.004%	0.003%	0.000%	0.000%		0.000%			0.000%																	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items 13, 14, 15, 16, 17, 18)	$38,976,391,501	14.935%	0.21%	% P			0.018%	0.042%	0.179%	0.239%	0.119%	0.150%	0.174%	0.249%	0.322%	0.419%	0.419%	0.419%	0.498%	0.498%	0.449%	0.377%	0.328%	1.651%	1.949%	1.949%	1.949%	1.627%	1.949%	1.523%
				$ P			$46,734,242	$109,046,564	$467,342,416	$623,123,221	$311,561,611	$391,919,865	$456,109,287	$650,369,031	$839,937,296	$1,092,694,983	$1,092,694,983	$1,092,694,983	$1,299,337,683	$1,299,337,683	$1,172,958,840	$983,390,574	$857,011,731	$4,307,956,016	$5,085,395,590	$5,085,395,590	$5,085,395,590	$4,247,212,328	$5,085,550,609	$3,975,568,085	
	$45,864,481,501	17.574%	$554,766,507	$ E			$28,320,800	$75,166,026	$112,421,116	$173,879,641	$59,283,888	$5,291,316		$102,392,720																	
				% E			0.010%	0.029%	0.043%	0.067%	0.023%	0.002%		0.040%																	
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Items 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	$60,325,006,180	23.115%	2.42%	% P			0.016%	0.049%	0.081%	0.114%	0.065%	0.158%	0.190%	0.277%	0.373%	0.501%	0.501%	0.501%	0.571%	0.571%	0.506%	0.410%	0.346%	2.526%	2.974%	2.974%	2.974%	2.627%	2.974%	3.074%
				$ P			$20,459,687	$127,306,974	$212,599,788	$297,717,599	$169,808,058	$411,599,458	$496,041,163	$722,607,453	$973,589,647	$1,308,232,575	$1,308,232,576	$1,488,967,057	$1,488,967,057	$1,488,967,057	$1,321,645,593	$1,070,663,397	$903,341,633	$6,592,839,186	$7,761,594,825	$7,761,594,826	$7,761,594,826	$6,858,548,850	$7,761,865,423	$8,023,621,785	
	$66,349,488,794	25.423%	$6,315,972,245	$ E			$20,084,964	$905,724,616	$960,779,568	$819,240,145	$716,324,255	$889,278,359	$882,965,164	$1,321,574,374																	
				% E			0.008%	0.347%	0.368%	0.237%	0.274%	0.341%	0.34%	0.51%																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)	$121,603,512,554	46.595%	0.04%	% P				0.494%	0.494%	0.494%	0.165%	0.339%	0.376%	0.474%	0.587%	0.738%	0.738%	0.804%	0.804%	0.804%	0.729%	0.616%	0.540%	4.144%	5.952%	5.952%	5.952%	6.023%	5.952%	5.636%
				$ P				$1,288,164,910	$1,288,164,910	$1,288,164,910	$429,388,303	$883,947,689	$982,377,941	$1,236,878,109	$1,532,168,865	$1,925,889,873	$1,925,889,873	$2,098,808,865	$2,098,808,865	$2,098,808,865	$1,901,948,361	$1,606,657,605	$1,409,797,101	$10,813,913,985	$15,532,585,980	$15,532,585,980	$15,532,585,980	$15,718,498,016	$15,533,364,902	$14,708,079,065	
	$127,367,478,954	48.804%	$112,305,883	$ E						$76,117,037	$34,186,850	$0																			
				% E						0.237%	0.274%	0.341%	0.34%	0.51%																	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)	$3,694,013,863	1.415%	0.10%	% P				0.005%	0.010%	0.014%	0.019%	0.005%	0.008%	0.013%	0.007%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.012%	0.018%	0.013%	0.154%	0.181%	0.181%	0.181%	0.183%	0.181%	0.144%
				$ P				$12,547,908	$25,095,816	$37,643,724	$50,191,631	$13,074,380	$19,611,570	$32,686,950	$19,471,850	$45,620,609	$45,620,609	$45,620,610	$45,620,610	$45,620,610	$32,546,230	$45,760,330	$32,685,950	$401,739,554	$472,406,500	$472,406,501	$472,406,501	$478,060,811	$472,430,189	$375,145,422	50%
	$3,694,013,863	1.415%	$261,821,922	$ E									$69,806,693	$192,015,229																	
				% E									0.03%	0.07%																	
OBRAS VARIAS (Items 55, 56, 57)	$4,546,394,676	1.742%	0.00%	% P				0.029%	0.029%	0.029%	0.010%	0.005%	0.008%	0.013%	0.012%	0.022%	0.022%	0.022%	0.022%	0.022%	0.017%	0.018%	0.013%	0.187%	0.219%	0.219%	0.219%	0.221%	0.219%	0.166%
				$ P				$76,191,642	$76,191,642	$76,191,642	$25,397,214	$13,388,867	$20,083,300	$33,472,168	$31,311,166	$58,088,900	$58,088,900	$58,088,901	$58,088,901	$58,088,900	$44,700,033	$46,861,035	$33,472,168	$486,831,393	$570,378,137	$570,378,137	$570,378,137	$577,205,086	$570,406,740	$433,111,667	
	$4,546,394,676	1.742%	$0	$ E																										
				% E																										
TRANSPORTES (Items 58, 59, 60)	$12,973,040,057	4.971%	0.00%	% P		0.001%	0.001%	0.009%	0.035%	0.047%	0.023%	0.020%	0.030%	0.050%	0.020%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.040%	0.070%	0.050%	0.549%	0.647%	0.647%	0.647%	0.655%	0.647%	0.483%
				$ P		$2,278,590	$3,797,649	$24,304,956	$91,143,586	$121,524,781	$60,762,390	$52,014,775	$78,022,162	$130,036,936	$52,337,558	$156,367,107	$156,367,107	$156,367,107	$156,367,107	$156,367,107	$104,352,333	$182,051,711	$130,036,937	$1,431,680,168	$1,689,270,331	$1,689,270,331	$1,689,270,331	$1,709,489,481	$1,689,355,045	$1,260,304,468	
	$12,973,040,057	4.971%	$3,015,000	$ E		$2,300,000								$712,000																	
				% E		0.001%								0.00%																	
TOTAL OTROS ITEMS		0.000%	0.00%	% P																										
				$ P																										
	$0	0.00%	$0	$ E																										
				% E																										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 260,979,652,716.00	100%	2.79%																											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 279,656,191,730.00**	107.16%	$7,268,383,684																											
	$ 274,957,659,345.00																													

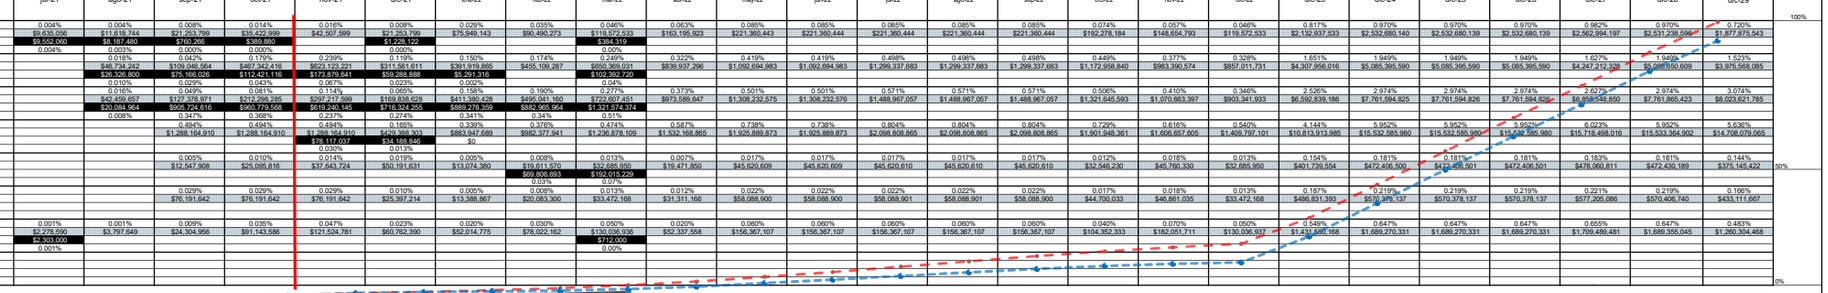

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se suedan acruar oor GPP. se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMACIÓN INICIAL	REPROGRAMACIÓN 1	EJECUTADO
BARRAS			
CURVAS			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.04%	0.64%	0.84%	0.99%	0.41%	0.71%	0.82%	1.12%	1.38%	1.84%	1.84%	2.06%	2.06%	2.06%	1.83%	1.66%	1.34%	10.03%	12.89%	12.89%	12.89%	12.32%	12.89%	11.75%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$11,913,645.00	$104,610,292.00	$1,698,888,790.00	$2,199,698,653.00	$2,498,373,475.00	$1,066,393,577.00	$1,841,675,146.00	$2,140,738,694.00	$2,925,622,179.00	$3,612,812,306.00	$4,800,254,491.00	$4,800,254,493.00	$5,360,550,668.00	$5,360,550,668.00	$5,360,550,667.00	$4,770,429,578.00	$4,084,039,446.00	$3,495,918,354.00	$26,167,797,535.00	$33,644,311,503.00	$33,644,311,503.00	$33,644,311,503.00	$32,148,008,789.00	$33,644,311,503.00	$30,653,706,036.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.04%	0.68%	1.52%	2.47%	2.88%	3.59%	4.41%	5.53%	6.91%	8.76%	10.60%	12.66%	14.71%	16.77%	18.60%	20.16%	21.50%	31.53%	44.42%	57.31%	70.20%	82.52%	95.41%	107.16%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$11,913,645.00	$116,523,937.00	$1,775,412,687.00	$3,971,072,340.00	$6,497,445,816.00	$7,525,839,393.00	$9,367,514,540.00	$11,508,239,235.00	$14,433,872,413.00	$18,045,884,720.00	$22,854,139,213.00	$27,662,393,706.00	$33,023,944,372.00	$38,384,495,039.00	$43,768,046,705.00	$48,538,475,279.00	$52,622,914,724.00	$56,108,433,077.00	$82,276,230,612.00	$115,920,542,115.00	$149,564,853,619.00	$183,209,165,122.00	$215,358,174,191.00	$249,002,485,695.00	$279,656,191,730.00	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.03%	0.35%	0.41%	0.33%	0.31%	0.34%	0.37%	0.62%	0.33%	0.51%	0.51%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%	0.62%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$11,855,060.00	$54,599,244.00	$981,650,908.00	$1,073,590,564.00	$877,236,823	$811,030,111	$884,569,675	$992,772,657	$1,617,078,642																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.03%	0.40%	0.81%	1.15%	1.46%	1.80%	2.17%	2.79%																			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.00	$11,855,060.00	$66,454,304.00	$1,048,105,212.00	$2,121,695,776.00	$2,992,932,599	$3,803,962,710	$4,698,532,385	$5,691,305,042	$7,268,383,684																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 31,071,278,494.00		
	$ 32,309,052,778.00		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 960,000,000.00	$ -	
	$ 960,000,000.00		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,141,452,959.00	$ 11,817,113.00	0.0034%
	$ 2,286,980,633.00		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,038,890,000.00		
	$ 1,038,890,000.00		
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 197,389,100.00	$ -	
	$ 197,389,100.00		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 25,739,616,633.00	$ -	
	$ 25,739,616,633.00		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 631,849,018.00	$ -	
	$ 631,849,018.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 61,810,476,204.00	$ 11,817,113.00	0.0034%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 63,193,778,162.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 322,790,128,920.00**	**$ 1,628,895,755.00**	**0.48%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 342,849,969,892.00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: Aníbal Enrique Ojeda Carrazo
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327

Aprueba Firma:
Nombre: Germán Gómez Turriago
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 10000 COPNIA

Original: Anexo para el caso de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

mar-22

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	200.1	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha			
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha			
3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3			
4	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m			
5	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m			
6	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3			
7	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3			
8	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		37.00	37.00
9	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	2,064.00	0.00	2,064.00
10	220.1	220.1		Terraplenes	m3			
11	221.1	221-13		Pedraplen compacto	m3			
12	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2			
Subtotal								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								
13	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	312,081.00	0.00	312,081.00
14	311.1	311-13		Afirmado	m3	1,255.00	788.00	2,043.00
15	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3			
16	330.1	330-13		Base granular clase A	m3			
17	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3			
18	340.1	340-13		Base estabilizada con emulsión tipo BEE-38	m3			
Subtotal								
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
19	411.2	411-13		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1 ARD	Lt			
20	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	0.00	0.00	0.00
21	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	57,371.00	13,720.00	71,091.00
22	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	5,657.20	1,492.10	7,149.30
23	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3			
24	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4,978.70	1,407.90	6,386.60
25	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3			
26	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m			
Subtotal								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
27	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	420.70	0.00	420.70
28	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3			
29	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3			
30	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3			
31	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m			
32	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3			
33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3			
34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3			
35	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3			
36	630P		630P	Suministro e instalacion de bolsacretos	m3			
37	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg			
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m			
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	632.40	0.00	632.40
40	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3			
41	671.1.1P		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f´c 17,5 mpa)	m3			
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	2,023.60	0.00	2,023.60
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	379.40	0.00	379.40
44	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3			
45	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3			
Subtotal								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
46	1P	Manual de Señalización Vial		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	38,911.20	107,031.90	145,943.10
47	2P	Manual de Señalización Vial		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2			
48	4P	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u			
49	5P	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u			
50	6P	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u			
51	720.1	730-13		Poste de referencia	u			
52	730.1	730-13		Defensa metalica	m			
53	730.2	730-13		Sección final	u			
54	740.1	740-13		Captafaros	u			
Subtotal								

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

mar-22

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
OBRAS VARIAS								
55	800-13	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m			
56	801.6P		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m			
57	810-13	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2			
Subtotal								
TRANSPORTES								
58	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E			
59	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		712.00	712.00
60	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,960.00	0.00	1,960.00
Subtotal								
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				
				VALOR IVA (OBRA) (E)				
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)				
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL			
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				
				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	GL			
				PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL			

FIRMA:
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA NUMERO 25202-07791 CND


FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO BENJAMÍM MONROY
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO 01193-0187 CPITVC

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022	
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPOROJ EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								4,978.70	1,407.90	6,386.60
ITEM:	24.00	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	460.1P	ESPECIF. PARTICULAR		Fresado de pavimento asfaltico	**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:** RUTA 6404

ESQUEMA







LOCALIZACIÓN					AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	CAJA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
1/03/2022	PR6+138.11	PR6+205.10	BELÉN	CARRIL DER.	204.310	0.105	CAJA 238	FRESADO	21.45
1/03/2022	PR6+234.03	PR6+287.98	BELÉN	CARRIL DER.	169.920	0.102	CAJA 239	FRESADO	17.33
1/03/2022	PR6+324.50	PR6+365.06	BELÉN	CARRIL DER.	127.430	0.108	CAJA 240	FRESADO	13.76
1/03/2022	PR6+434.04	PR6+520.62	BELÉN	CARRIL DER.	256.970	0.110	CAJA 241	FRESADO	28.27
2/03/2022	PR6+520.62	PR6+652.60	BELÉN	CARRIL DER.	423.140	0.108	CAJA 242	FRESADO	45.70
4/03/2022	PR6+652.60	PR6+883.72	BELÉN	CARRIL DER.	753.660	0.095	CAJA 243	FRESADO	71.60
5/03/2022	PR6+543.54	PR6+739.00	BELÉN	CARRIL IZQ.	619.560	0.100	CAJA 244	FRESADO	61.96
7/03/2022	PR6+739.00	PR7+016.36	BELÉN	CARRIL IZQ.	848.540	0.098	CAJA 245	FRESADO	83.16
11/03/2022	PR6+883.72	PR7+172.92	BELÉN	CARRIL DER.	874.400	0.105	CAJA 246	FRESADO	91.81
12/03/2022	PR7+172.92	PR7+400.18	BELÉN	CARRIL DER.	751.740	0.108	CAJA 247	FRESADO	81.19
14/03/2022	PR7+016.36	PR7+310.93	BELÉN	CARRIL IZQ.	902.480	0.102	CAJA 248	FRESADO	92.05
15/03/2022	PR7+400.18	PR7+556.51	BELÉN	CARRIL DER.	508.060	0.108	CAJA 249	FRESADO	54.87
16/03/2022	PR7+310.93	PR7+486.48	BELÉN	CARRIL IZQ.	558.820	0.102	CAJA 250	FRESADO	57.00
17/03/2022	PR7+486.48	PR7+784.05	BELÉN	CARRIL IZQ.	954.140	0.108	CAJA 251	FRESADO	103.05
18/03/2022	PR7+556.51	PR7+822.36	BELÉN	CARRIL DER.	845.160	0.108	CAJA 252	FRESADO	91.28
23/03/2022	PR7+822.36	PR8+065.91	BELÉN	CARRIL DER.	836.830	0.111	CAJA 253	FRESADO	92.89
24/03/2022	PR8+065.91	PR8+428.41	BELÉN	CARRIL DER.	1149.410	0.097	CAJA 254	FRESADO	111.49
25/03/2022	PR7+784.05	PR7+955.71	BELÉN	CARRIL IZQ.	532.330	0.103	CAJA 255	FRESADO	54.83
28/03/2022	PR7+955.71	PR8+194.31	BELÉN	CARRIL IZQ.	739.580	0.100	CAJA 256	FRESADO	73.96
29/03/2022	PR8+194.31	PR8+542.16	BELÉN	CARRIL IZQ.	1099.830	0.097	CAJA 257	FRESADO	106.68
30/03/2022	PR8+428.41	PR8+598.27	BELÉN	CARRIL DER.	563.470	0.095	CAJA 258	FRESADO	53.53
								Subtotal	**1,407.90**
								TOTAL	**1,407.90**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO BENJAMIN MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									5,657.20		1,492.10	7,149.30
ITEM:	452,2P	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19		**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN					AREA POR TOPOGRAFIA	ESPESOR	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	PARCHEO		MUNICIPIO	CARRIL					
1/03/2022	PR6+138.11	PR6+205.10	BELÉN	CARRIL DER.	204.310	0.120	CAJA 238	MDC - 19	24.517
1/03/2022	PR6+234.03	PR6+287.98	BELÉN	CARRIL DER.	169.920	0.115	CAJA 239	MDC - 19	19.541
1/03/2022	PR6+324.50	PR6+365.06	BELÉN	CARRIL DER.	127.430	0.114	CAJA 240	MDC - 19	14.527
1/03/2022	PR6+434.04	PR6+520.62	BELÉN	CARRIL DER.	256.970	0.122	CAJA 241	MDC - 19	31.350
2/03/2022	PR6+520.62	PR6+652.60	BELÉN	CARRIL DER.	423.140	0.110	CAJA 242	MDC - 19	46.545
4/03/2022	PR6+652.60	PR6+883.72	BELÉN	CARRIL DER.	753.660	0.102	CAJA 243	MDC - 19	76.873
5/03/2022	PR6+543.54	PR6+739.00	BELÉN	CARRIL IZQ.	619.560	0.107	CAJA 244	MDC - 19	66.293
7/03/2022	PR6+739.00	PR7+016.36	BELÉN	CARRIL IZQ.	848.540	0.104	CAJA 245	MDC - 19	88.248
11/03/2022	PR6+883.72	PR7+172.92	BELÉN	CARRIL DER.	874.400	0.113	CAJA 246	MDC - 19	98.807
12/03/2022	PR7+172.92	PR7+400.18	BELÉN	CARRIL DER.	751.740	0.116	CAJA 247	MDC - 19	87.202
14/03/2022	PR7+016.36	PR7+310.93	BELÉN	CARRIL IZQ.	902.480	0.106	CAJA 248	MDC - 19	95.663
15/03/2022	PR7+400.18	PR7+556.51	BELÉN	CARRIL DER.	508.060	0.113	CAJA 249	MDC - 19	57.411
16/03/2022	PR7+310.93	PR7+486.48	BELÉN	CARRIL IZQ.	558.820	0.104	CAJA 250	MDC - 19	58.117
17/03/2022	PR7+486.48	PR7+784.05	BELÉN	CARRIL IZQ.	954.140	0.112	CAJA 251	MDC - 19	106.864
18/03/2022	PR7+556.51	PR7+822.36	BELÉN	CARRIL DER.	845.160	0.114	CAJA 252	MDC - 19	96.348
23/03/2022	PR7+822.36	PR8+065.91	BELÉN	CARRIL DER.	836.830	0.115	CAJA 253	MDC - 19	96.235
24/03/2022	PR8+065.91	PR8+428.41	BELÉN	CARRIL DER.	1149.410	0.102	CAJA 254	MDC - 19	117.240
25/03/2022	PR7+784.05	PR7+955.71	BELÉN	CARRIL IZQ.	532.330	0.110	CAJA 255	MDC - 19	58.556
28/03/2022	PR7+955.71	PR8+194.31	BELÉN	CARRIL IZQ.	739.580	0.105	CAJA 256	MDC - 19	77.656
29/03/2022	PR8+194.31	PR8+542.16	BELÉN	CARRIL IZQ.	1099.830	0.106	CAJA 257	MDC - 19	116.582
30/03/2022	PR8+428.41	PR8+598.27	BELÉN	CARRIL DER.	563.470	0.102	CAJA 258	MDC - 19	57.474
								Subtotal	**1,492.10**
								TOTAL	**1,492.10**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO BENJAMÍN MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO 0978 DE 2021

Cód: F-EO-009
Versión: 001
Fecha: 02/01/2020
Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								57,371.00	13,720.00	71,091.00	
ITEM:	421.1	GRUPO DE AJUSTE	3	ESPECIF. GENERAL	421-13	ESPECIF. PARTICULAR		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN				MUNICIPIO	AREA	PARCHE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PARCHEO			CARRIL	MUNICIPIO				
1/03/2022	PR6+138.11	PR6+205.10	CARRIL DER.	BELEN	204.31	CAJA 238	RIEGO DE LIGA	204.310
1/03/2022	PR6+234.03	PR6+287.98	CARRIL DER.	BELEN	169.92	CAJA 239	RIEGO DE LIGA	169.920
1/03/2022	PR6+324.50	PR6+365.06	CARRIL DER.	BELEN	127.430	CAJA 240	RIEGO DE LIGA	127.430
1/03/2022	PR6+434.04	PR6+520.62	CARRIL DER.	BELEN	256.970	CAJA 241	RIEGO DE LIGA	256.970
2/03/2022	PR6+520.62	PR6+652.60	CARRIL DER.	BELEN	423.140	CAJA 242	RIEGO DE LIGA	423.140
4/03/2022	PR6+652.60	PR6+883.72	CARRIL DER.	BELEN	753.660	CAJA 243	RIEGO DE LIGA	753.660
5/03/2022	PR6+543.54	PR6+739.00	CARRIL IZQ.	BELEN	619.560	CAJA 244	RIEGO DE LIGA	619.560
7/03/2022	PR6+739.00	PR7+016.36	CARRIL IZQ.	BELEN	848.540	CAJA 245	RIEGO DE LIGA	848.540
11/03/2022	PR6+883.72	PR7+172.92	CARRIL DER.	BELEN	874.400	CAJA 246	RIEGO DE LIGA	874.400
12/03/2022	PR7+172.92	PR7+400.18	CARRIL DER.	BELEN	751.740	CAJA 247	RIEGO DE LIGA	751.740
14/03/2022	PR7+016.36	PR7+310.93	CARRIL IZQ.	BELEN	902.480	CAJA 248	RIEGO DE LIGA	902.480
15/03/2022	PR7+400.18	PR7+556.51	CARRIL DER.	BELEN	508.060	CAJA 249	RIEGO DE LIGA	508.060
16/03/2022	PR7+310.93	PR7+486.48	CARRIL IZQ.	BELEN	558.820	CAJA 250	RIEGO DE LIGA	558.820
17/03/2022	PR7+486.48	PR7+784.05	CARRIL IZQ.	BELEN	954.140	CAJA 251	RIEGO DE LIGA	954.140
18/03/2022	PR7+556.51	PR7+822.36	CARRIL DER.	BELEN	845.160	CAJA 252	RIEGO DE LIGA	845.160
23/03/2022	PR7+822.36	PR8+065.91	CARRIL DER.	BELEN	836.830	CAJA 253	RIEGO DE LIGA	836.830
24/03/2022	PR8+065.91	PR8+428.41	CARRIL DER.	BELEN	1,149.410	CAJA 254	RIEGO DE LIGA	1,149.410
25/03/2022	PR7+784.05	PR7+955.71	CARRIL IZQ.	BELEN	532.330	CAJA 255	RIEGO DE LIGA	532.330
28/03/2022	PR7+955.71	PR8+194.31	CARRIL IZQ.	BELEN	739.580	CAJA 256	RIEGO DE LIGA	739.580
29/03/2022	PR8+194.31	PR8+542.16	CARRIL IZQ.	BELEN	1,099.830	CAJA 257	RIEGO DE LIGA	1,099.830
30/03/2022	PR8+428.41	PR8+598.27	CARRIL DER.	BELEN	563.470	CAJA 258	RIEGO DE LIGA	563.470
					Subtotal Ejecutado Presente Acta			**13,720.00**
					TOTAL			**13,720.00**

DIRECTOR DE OBRA
FIRMA:
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VÍAS NACIONALES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO BENJAMIN MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								1255.00		750.00	2,005.00
ITEM:	311.10	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	311-13	ESPECIF. PARTICULAR		Afirmado	**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA







	LOCALIZACIÓN			AREA POR TOPOGRAFIA	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN TOTAL ACUMULADO
	59+029.998	59+035.000	SOCOTA	0.250	5.00	AFIRMADO	1.25	1.25
	59+035.000	59+040.000	SOCOTA	0.190	5.00	AFIRMADO	0.93	2.18
	59+040.000	59+045.000	SOCOTA	0.440	5.00	AFIRMADO	2.20	4.38
	59+045.000	59+050.000	SOCOTA	0.705	5.00	AFIRMADO	3.53	7.90
	59+050.000	59+055.000	SOCOTA	0.900	5.00	AFIRMADO	4.50	12.40
	59+055.000	59+060.000	SOCOTA	1.265	5.00	AFIRMADO	6.33	18.73
	59+060.000	59+065.000	SOCOTA	1.645	5.00	AFIRMADO	8.21	26.95
	59+065.000	59+070.000	SOCOTA	1.910	5.00	AFIRMADO	9.53	36.48
	59+070.000	59+075.000	SOCOTA	2.100	5.00	AFIRMADO	10.50	46.98
	59+075.000	59+080.000	SOCOTA	2.115	5.00	AFIRMADO	10.57	57.55
	59+080.000	59+085.000	SOCOTA	2.285	5.00	AFIRMADO	11.41	68.96
	59+085.000	59+090.000	SOCOTA	2.055	5.00	AFIRMADO	10.27	79.23
	59+090.000	59+095.000	SOCOTA	1.315	5.00	AFIRMADO	6.65	85.88
	59+095.000	59+100.000	SOCOTA	0.995	5.00	AFIRMADO	5.07	90.95
	59+100.000	59+105.000	SOCOTA	1.020	5.00	AFIRMADO	5.20	96.15
	59+105.000	59+110.000	SOCOTA	1.210	5.00	AFIRMADO	6.14	102.29
	59+110.000	59+115.000	SOCOTA	1.045	5.00	AFIRMADO	5.26	107.55
	59+115.000	59+120.000	SOCOTA	1.045	5.00	AFIRMADO	5.25	112.80
	59+120.000	59+125.000	SOCOTA	1.400	5.00	AFIRMADO	7.03	119.83
	59+125.000	59+130.000	SOCOTA	1.450	5.00	AFIRMADO	7.28	127.10
	59+130.000	59+135.000	SOCOTA	1.335	5.00	AFIRMADO	6.68	133.79
	59+135.000	59+140.000	SOCOTA	1.145	5.00	AFIRMADO	5.73	139.52
	59+140.000	59+145.000	SOCOTA	0.810	5.00	AFIRMADO	4.05	143.57
	59+145.000	59+150.000	SOCOTA	0.405	5.00	AFIRMADO	2.03	145.60
	59+150.000	59+155.000	SOCOTA	0.110	5.00	AFIRMADO	0.56	146.16
	59+155.000	59+160.000	SOCOTA	0.005	5.00	AFIRMADO	0.03	146.19
	59+160.000	59+165.000	SOCOTA	0.000	5.00	AFIRMADO	0.00	146.19
	59+165.000	59+170.000	SOCOTA	0.000	5.00	AFIRMADO	0.00	146.19
	59+170.000	59+175.000	SOCOTA	0.000	5.00	AFIRMADO	0.00	146.19
	59+175.000	59+180.000	SOCOTA	0.000	5.00	AFIRMADO	0.00	146.19
	59+180.000	59+185.000	SOCOTA	0.000	5.00	AFIRMADO	0.00	146.19
	59+185.000	59+190.000	SOCOTA	0.005	5.00	AFIRMADO	0.03	146.22
	59+190.000	59+195.000	SOCOTA	0.045	5.00	AFIRMADO	0.22	146.44
	59+195.000	59+200.000	SOCOTA	0.265	5.00	AFIRMADO	1.31	147.75
	59+200.000	59+205.000	SOCOTA	0.685	5.00	AFIRMADO	3.42	151.17
	59+205.000	59+210.000	SOCOTA	1.150	5.00	AFIRMADO	5.76	156.93
	59+210.000	59+215.000	SOCOTA	1.210	5.00	AFIRMADO	6.08	163.01
	59+215.000	59+220.000	SOCOTA	1.065	5.00	AFIRMADO	5.38	168.39
	59+220.000	59+225.000	SOCOTA	1.130	5.00	AFIRMADO	5.68	174.07
	59+225.000	59+230.000	SOCOTA	1.055	5.00	AFIRMADO	5.30	179.37
	59+230.000	59+235.000	SOCOTA	0.890	5.00	AFIRMADO	4.50	183.88
	59+235.000	59+240.000	SOCOTA	0.780	5.00	AFIRMADO	3.95	187.83
	59+240.000	59+245.000	SOCOTA	0.640	5.00	AFIRMADO	3.23	191.06
	59+245.000	59+250.000	SOCOTA	0.520	5.00	AFIRMADO	2.64	193.70
	59+250.000	59+255.000	SOCOTA	0.475	5.00	AFIRMADO	2.37	196.06
	59+255.000	59+260.000	SOCOTA	0.485	5.00	AFIRMADO	2.40	198.46
	59+260.000	59+265.000	SOCOTA	0.485	5.00	AFIRMADO	2.42	200.88
	59+265.000	59+270.000	SOCOTA	0.410	5.00	AFIRMADO	2.05	202.93
	59+270.000	59+275.000	SOCOTA	0.230	5.00	AFIRMADO	1.13	204.06
	59+275.000	59+280.000	SOCOTA	0.110	5.00	AFIRMADO	0.54	204.59
	59+280.000	59+285.000	SOCOTA	0.185	5.00	AFIRMADO	0.93	205.52
	59+285.000	59+290.000	SOCOTA	0.130	5.00	AFIRMADO	0.66	206.18
	59+290.000	59+295.000	SOCOTA	0.000	5.00	AFIRMADO	0.00	206.19
	59+295.000	59+300.000	SOCOTA	0.000	5.00	AFIRMADO	0.00	206.19
	59+300.000	59+305.000	SOCOTA	0.110	5.00	AFIRMADO	0.53	206.72
	59+305.000	59+310.000	SOCOTA	0.500	5.00	AFIRMADO	2.40	209.13

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								1255.00		750.00	2,005.00
ITEM:	311.10	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	311-13	ESPECIF. PARTICULAR		Afirmado	**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA








	LOCALIZACIÓN			AREA POR TOPOGRAFIA	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN TOTAL ACUMULADO
	59+310.000	59+315.000	SOCOTA	1.310	5.00	AFIRMADO	6.27	215.40
	59+315.000	59+320.000	SOCOTA	2.735	5.00	AFIRMADO	13.16	228.56
	59+320.000	59+325.000	SOCOTA	3.060	5.00	AFIRMADO	14.77	243.33
	59+325.000	59+330.000	SOCOTA	2.280	5.00	AFIRMADO	11.09	254.42
	59+330.000	59+335.000	SOCOTA	2.090	5.00	AFIRMADO	10.30	264.72
	59+335.000	59+340.000	SOCOTA	2.225	5.00	AFIRMADO	11.06	275.78
	59+340.000	59+345.000	SOCOTA	2.425	5.00	AFIRMADO	12.10	287.87
	59+345.000	59+350.000	SOCOTA	2.615	5.00	AFIRMADO	13.05	300.92
	59+350.000	59+355.000	SOCOTA	2.770	5.00	AFIRMADO	13.85	314.78
	59+355.000	59+360.000	SOCOTA	2.690	5.00	AFIRMADO	13.45	328.22
	59+360.000	59+365.000	SOCOTA	2.410	5.00	AFIRMADO	12.03	340.26
	59+365.000	59+370.000	SOCOTA	2.030	5.00	AFIRMADO	10.13	350.39
	59+370.000	59+375.000	SOCOTA	1.560	5.00	AFIRMADO	7.80	358.18
	59+375.000	59+380.000	SOCOTA	1.175	5.00	AFIRMADO	5.84	364.03
	59+380.000	59+385.000	SOCOTA	0.730	5.00	AFIRMADO	3.60	367.63
	59+385.000	59+390.000	SOCOTA	0.290	5.00	AFIRMADO	1.42	369.06
	59+390.000	59+395.000	SOCOTA	0.195	5.00	AFIRMADO	0.99	370.04
	59+395.000	59+400.000	SOCOTA	0.205	5.00	AFIRMADO	1.06	371.10
	59+400.000	59+405.000	SOCOTA	0.150	5.00	AFIRMADO	0.78	371.88
	59+405.000	59+410.000	SOCOTA	0.145	5.00	AFIRMADO	0.73	372.62
	59+410.000	59+415.000	SOCOTA	0.325	5.00	AFIRMADO	1.57	374.19
	59+415.000	59+420.000	SOCOTA	1.070	5.00	AFIRMADO	5.33	379.52
	59+420.000	59+425.000	SOCOTA	2.375	5.00	AFIRMADO	12.05	391.57
	59+425.000	59+430.000	SOCOTA	3.180	5.00	AFIRMADO	16.17	407.74
	59+430.000	59+435.000	SOCOTA	3.200	5.00	AFIRMADO	16.14	423.88
	59+435.000	59+440.000	SOCOTA	2.740	5.00	AFIRMADO	13.70	437.58
	59+440.000	59+445.000	SOCOTA	2.225	5.00	AFIRMADO	11.09	448.68
	59+445.000	59+450.000	SOCOTA	2.165	5.00	AFIRMADO	10.81	459.49
	59+450.000	59+455.000	SOCOTA	1.995	5.00	AFIRMADO	9.98	469.47
	59+455.000	59+460.000	SOCOTA	1.560	5.00	AFIRMADO	7.79	477.26
	59+460.000	59+465.000	SOCOTA	1.230	5.00	AFIRMADO	6.14	483.40
	59+465.000	59+470.000	SOCOTA	0.995	5.00	AFIRMADO	4.99	488.39
	59+470.000	59+475.000	SOCOTA	0.805	5.00	AFIRMADO	4.04	492.43
	59+475.000	59+480.000	SOCOTA	0.615	5.00	AFIRMADO	3.08	495.51
	59+480.000	59+485.000	SOCOTA	0.470	5.00	AFIRMADO	2.35	497.85
	59+485.000	59+490.000	SOCOTA	0.470	5.00	AFIRMADO	2.35	500.20
	59+490.000	59+495.000	SOCOTA	0.640	5.00	AFIRMADO	3.21	503.40
	59+495.000	59+500.000	SOCOTA	0.880	5.00	AFIRMADO	4.38	507.79
	59+500.000	59+505.000	SOCOTA	0.995	5.00	AFIRMADO	4.91	512.70
	59+505.000	59+510.000	SOCOTA	0.765	5.00	AFIRMADO	3.79	516.50
	59+510.000	59+515.000	SOCOTA	0.565	5.00	AFIRMADO	2.84	519.33
	59+515.000	59+520.000	SOCOTA	0.540	5.00	AFIRMADO	2.79	522.12
	59+520.000	59+525.000	SOCOTA	0.335	5.00	AFIRMADO	1.81	523.94
	59+525.000	59+530.000	SOCOTA	0.400	5.00	AFIRMADO	1.79	525.72
	59+530.000	59+535.000	SOCOTA	0.555	5.00	AFIRMADO	2.45	528.17
	59+535.000	59+540.000	SOCOTA	0.995	5.00	AFIRMADO	4.57	532.75
	59+540.000	59+545.000	SOCOTA	1.980	5.00	AFIRMADO	9.04	541.78
	59+545.000	59+550.000	SOCOTA	1.930	5.00	AFIRMADO	9.17	550.95
	59+550.000	59+555.000	SOCOTA	1.090	5.00	AFIRMADO	5.39	556.34
	59+555.000	59+560.000	SOCOTA	0.580	5.00	AFIRMADO	2.88	559.22
	59+560.000	59+565.000	SOCOTA	0.310	5.00	AFIRMADO	1.55	560.78
	59+565.000	59+570.000	SOCOTA	0.195	5.00	AFIRMADO	0.99	561.77
	59+570.000	59+575.000	SOCOTA	0.080	5.00	AFIRMADO	0.41	562.18
	59+575.000	59+580.000	SOCOTA	0.060	5.00	AFIRMADO	0.30	562.48
	59+580.000	59+585.000	SOCOTA	0.135	5.00	AFIRMADO	0.65	563.13
	59+585.000	59+590.000	SOCOTA	0.295	5.00	AFIRMADO	1.57	564.70

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								1255.00		750.00	2,005.00
ITEM:	311.10	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	311-13	ESPECIF. PARTICULAR		Afirmado	**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA



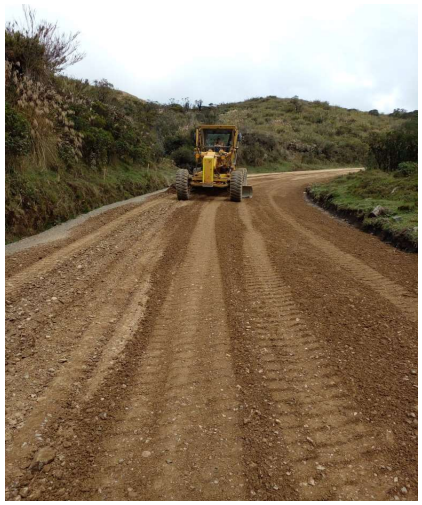



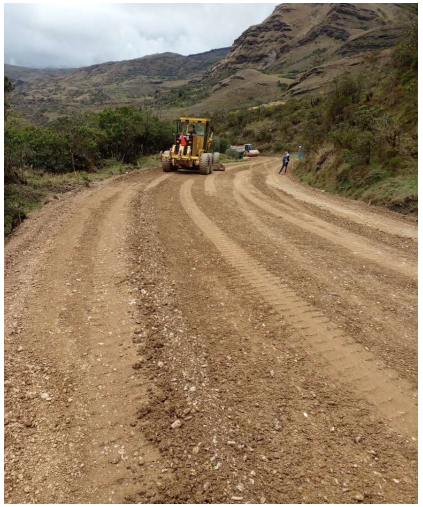


LOCALIZACIÓN			AREA POR TOPOGRAFIA	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN PARCIAL	VOLUMEN TOTAL ACUMULADO
59+590.000	59+595.000	SOCOTA	1.060	5.00	AFIRMADO	5.93	570.63
59+595.000	59+600.000	SOCOTA	1.835	5.00	AFIRMADO	9.89	580.52
59+600.000	59+605.000	SOCOTA	2.100	5.00	AFIRMADO	11.01	591.53
59+605.000	59+610.000	SOCOTA	1.990	5.00	AFIRMADO	10.11	601.64
59+610.000	59+615.000	SOCOTA	1.665	5.00	AFIRMADO	8.32	609.96
59+615.000	59+620.000	SOCOTA	1.670	5.00	AFIRMADO	8.36	618.32
59+620.000	59+625.000	SOCOTA	1.825	5.00	AFIRMADO	9.14	627.45
59+625.000	59+630.000	SOCOTA	1.935	5.00	AFIRMADO	9.68	637.13
59+630.000	59+635.000	SOCOTA	1.980	5.00	AFIRMADO	9.91	647.03
59+635.000	59+640.000	SOCOTA	1.820	5.00	AFIRMADO	9.10	656.13
59+640.000	59+645.000	SOCOTA	1.600	5.00	AFIRMADO	8.00	664.13
59+645.000	59+650.000	SOCOTA	1.875	5.00	AFIRMADO	9.38	673.51
59+650.000	59+655.000	SOCOTA	1.425	5.00	AFIRMADO	7.11	680.62
59+655.000	59+660.000	SOCOTA	0.680	5.00	AFIRMADO	3.38	684.00
59+660.000	59+665.000	SOCOTA	0.770	5.00	AFIRMADO	3.84	687.84
59+665.000	59+670.000	SOCOTA	0.965	5.00	AFIRMADO	4.81	692.65
59+670.000	59+675.000	SOCOTA	1.190	5.00	AFIRMADO	5.94	698.60
59+675.000	59+680.000	SOCOTA	1.425	5.00	AFIRMADO	7.14	705.73
59+680.000	59+685.000	SOCOTA	1.690	5.00	AFIRMADO	8.45	714.19
59+685.000	59+690.000	SOCOTA	1.795	5.00	AFIRMADO	8.96	723.15
59+690.000	59+695.000	SOCOTA	1.930	5.00	AFIRMADO	9.65	732.80
59+695.000	59+700.000	SOCOTA	2.170	5.00	AFIRMADO	10.84	743.64
59+700.000	59+705.000	SOCOTA	2.200	5.00	AFIRMADO	10.99	754.63
59+705.000	59+710.000	SOCOTA	2.110	5.00	AFIRMADO	10.56	765.19
59+710.000	59+715.000	SOCOTA	1.780	5.00	AFIRMADO	8.91	774.10
59+715.000	59+720.000	SOCOTA	1.080	5.00	AFIRMADO	5.42	779.52
59+720.000	59+725.000	SOCOTA	0.490	5.00	AFIRMADO	2.47	781.99
59+725.000	59+730.000	SOCOTA	0.330	5.00	AFIRMADO	1.66	783.65
59+730.000	59+735.000	SOCOTA	0.690	5.00	AFIRMADO	3.46	787.10
59+735.000	59+740.000	SOCOTA	1.320	5.00	AFIRMADO	6.60	793.71
59+740.000	59+745.000	SOCOTA	1.775	5.00	AFIRMADO	8.87	802.58
59+745.000	59+750.000	SOCOTA	2.410	5.00	AFIRMADO	12.04	814.62
59+750.000	59+755.000	SOCOTA	3.040	5.00	AFIRMADO	15.22	829.84
59+755.000	59+760.000	SOCOTA	3.620	5.00	AFIRMADO	18.06	847.90
59+760.000	59+765.000	SOCOTA	3.960	5.00	AFIRMADO	19.62	867.52
59+765.000	59+770.000	SOCOTA	3.825	5.00	AFIRMADO	18.83	886.35
59+770.000	59+775.000	SOCOTA	3.560	5.00	AFIRMADO	17.51	903.86
59+775.000	59+780.000	SOCOTA	2.895	5.00	AFIRMADO	14.25	918.11
59+780.000	59+785.000	SOCOTA	2.000	5.00	AFIRMADO	9.86	927.97
59+785.000	59+790.000	SOCOTA	1.220	5.00	AFIRMADO	6.03	934.00
59+790.000	59+795.000	SOCOTA	0.530	5.00	AFIRMADO	2.65	936.64
59+795.000	59+800.000	SOCOTA	0.140	5.00	AFIRMADO	0.70	937.35
59+800.000	59+805.000	SOCOTA	0.100	5.00	AFIRMADO	0.49	937.83
59+805.000	59+810.000	SOCOTA	0.085	5.00	AFIRMADO	0.41	938.25
59+810.000	59+815.000	SOCOTA	0.080	5.00	AFIRMADO	0.40	938.65
59+815.000	59+820.000	SOCOTA	0.075	5.00	AFIRMADO	0.39	939.03
59+820.000	59+825.000	SOCOTA	0.070	5.00	AFIRMADO	0.35	939.38
59+825.000	59+830.000	SOCOTA	0.060	5.00	AFIRMADO	0.30	939.69
59+830.000	59+835.000	SOCOTA	0.140	5.00	AFIRMADO	0.70	940.38
59+835.000	59+840.000	SOCOTA	0.305	5.00	AFIRMADO	1.52	941.91
59+840.000	59+845.000	SOCOTA	0.335	5.00	AFIRMADO	1.67	943.58
59+845.000	59+850.000	SOCOTA	0.450	5.00	AFIRMADO	2.24	945.82
59+850.000	59+855.000	SOCOTA	0.765	5.00	AFIRMADO	3.83	949.66
59+855.000	59+860.000	SOCOTA	0.605	5.00	AFIRMADO	3.04	952.70
59+860.000	59+865.000	SOCOTA	0.220	5.00	AFIRMADO	1.11	953.81
59+865.000	59+870.000	SOCOTA	0.165	5.00	AFIRMADO	0.84	954.65

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4				
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									1255.00	750.00	2,005.00
ITEM:	311.10	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	311-13	ESPECIF. PARTICULAR		Afirmado		**UNID:**	M3	**UBICACIÓN:** RUTA 6404

ESQUEMA

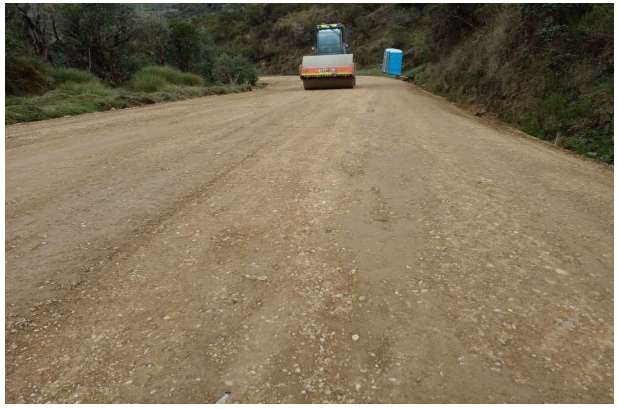

LOCALIZACIÓN				**AREA POR TOPOGRAFIA**	**LONGITUD**	**DESCRIPCIÓN**	**VOLUMEN PARCIAL**	**VOLUMEN TOTAL ACUMULADO**
	59+870.000	59+875.000	SOCOTA	0.265	5.00	AFIRMADO	1.35	956.00
	59+875.000	59+880.000	SOCOTA	0.510	5.00	AFIRMADO	2.58	958.58
	59+880.000	59+885.000	SOCOTA	0.950	5.00	AFIRMADO	4.79	963.37
	59+885.000	59+890.000	SOCOTA	1.560	5.00	AFIRMADO	7.84	971.22
	59+890.000	59+895.000	SOCOTA	2.000	5.00	AFIRMADO	10.04	981.25
	59+895.000	59+900.000	SOCOTA	2.230	5.00	AFIRMADO	11.19	992.45
	59+900.000	59+905.000	SOCOTA	2.040	5.00	AFIRMADO	10.23	1,002.68
	59+905.000	59+910.000	SOCOTA	1.450	5.00	AFIRMADO	7.27	1,009.95
	59+910.000	59+915.000	SOCOTA	1.180	5.00	AFIRMADO	5.90	1,015.85
	59+915.000	59+920.000	SOCOTA	1.030	5.00	AFIRMADO	5.14	1,020.99
	59+920.000	59+925.000	SOCOTA	0.755	5.00	AFIRMADO	3.76	1,024.75
	59+925.000	59+930.000	SOCOTA	0.515	5.00	AFIRMADO	2.56	1,027.31
	59+930.000	59+935.000	SOCOTA	0.310	5.00	AFIRMADO	1.53	1,028.84
	59+935.000	59+940.000	SOCOTA	0.190	5.00	AFIRMADO	0.93	1,029.77
	59+940.000	59+945.000	SOCOTA	0.140	5.00	AFIRMADO	0.70	1,030.47
	59+945.000	59+950.000	SOCOTA	0.140	5.00	AFIRMADO	0.71	1,031.18
	59+950.000	59+955.000	SOCOTA	0.190	5.00	AFIRMADO	0.96	1,032.14
	59+955.000	59+960.000	SOCOTA	0.275	5.00	AFIRMADO	1.39	1,033.53
	59+960.000	59+965.000	SOCOTA	0.370	5.00	AFIRMADO	1.88	1,035.41
	59+965.000	59+970.000	SOCOTA	0.480	5.00	AFIRMADO	2.45	1,037.87
	59+970.000	59+975.000	SOCOTA	0.460	5.00	AFIRMADO	2.35	1,040.22
	59+975.000	59+980.000	SOCOTA	0.315	5.00	AFIRMADO	1.62	1,041.83
	59+980.000	59+985.000	SOCOTA	0.165	5.00	AFIRMADO	0.86	1,042.70
	59+985.000	59+990.000	SOCOTA	0.095	5.00	AFIRMADO	0.49	1,043.18
	59+990.000	59+995.000	SOCOTA	0.170	5.00	AFIRMADO	0.84	1,044.03
	59+995.000	60+000.000	SOCOTA	0.715	5.00	AFIRMADO	3.58	1,047.61
	60+000.000	60+005.000	SOCOTA	1.355	5.00	AFIRMADO	6.78	1,054.39
	60+005.000	60+010.000	SOCOTA	1.650	5.00	AFIRMADO	8.24	1,062.63
	60+010.000	60+015.000	SOCOTA	1.940	5.00	AFIRMADO	9.70	1,072.33
	60+015.000	60+020.000	SOCOTA	2.235	5.00	AFIRMADO	11.20	1,083.53
	60+020.000	60+025.000	SOCOTA	2.505	5.00	AFIRMADO	12.55	1,096.08
	60+025.000	60+030.000	SOCOTA	2.705	5.00	AFIRMADO	13.53	1,109.60
	60+030.000	60+035.000	SOCOTA	2.830	5.00	AFIRMADO	14.13	1,123.73
	60+035.000	60+040.000	SOCOTA	2.765	5.00	AFIRMADO	13.82	1,137.56
	60+040.000	60+045.000	SOCOTA	2.425	5.00	AFIRMADO	12.04	1,149.59
	60+045.000	60+050.000	SOCOTA	2.060	5.00	AFIRMADO	10.01	1,159.60
	60+050.000	60+055.000	SOCOTA	1.580	5.00	AFIRMADO	7.47	1,167.08
	60+055.000	60+060.000	SOCOTA	1.225	5.00	AFIRMADO	5.38	1,172.45
	60+060.000	60+065.000	SOCOTA	1.605	5.00	AFIRMADO	7.18	1,179.63
	60+065.000	60+070.000	SOCOTA	1.895	5.00	AFIRMADO	8.65	1,188.28
	60+070.000	60+075.000	SOCOTA	1.960	5.00	AFIRMADO	9.00	1,197.29
	60+075.000	60+080.000	SOCOTA	2.135	5.00	AFIRMADO	10.13	1,207.42
	60+080.000	60+085.000	SOCOTA	2.200	5.00	AFIRMADO	10.67	1,218.09
	60+085.000	60+090.000	SOCOTA	2.290	5.00	AFIRMADO	11.45	1,229.54
	60+090.000	60+095.000	SOCOTA	2.120	5.00	AFIRMADO	10.60	1,240.13
	60+095.000	60+100.000	SOCOTA	1.830	5.00	AFIRMADO	9.14	1,249.27

Nota: En la presente Acta se realizará un pago parcial de 60% del valor Total del Acta, el 40% restante se pagara en la siguiente acta.
Actividad ejecutada Adecuación y mejoramiento de la Subrasante.

Subtotal	**1,249.27**
Pago Parcial 60%	60%
TOTAL	**750.00**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO BENJAMIN MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022				
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4						
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									2005.00		38.00		2,043.00
ITEM:	311.10	GRUPO DE AJUSTE	2	ESPECIF. GENERAL	311-13	ESPECIF. PARTICULAR		Afirmado		**UNID:**	M3		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6404**

ESQUEMA





Afirmado para Mejoramiento, ampliación y Cajeo de la subrasante

	LOCALIZACIÓN			AREA POR TOPOGRAFIA	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN PARCIAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
	59+240.000	59+245.000	SOCOTA	0.440	5.00	AFIRMADO	2.20	2.20
	59+245.000	59+250.000	SOCOTA	0.485	5.00	AFIRMADO	2.46	4.66
	59+250.000	59+255.000	SOCOTA	0.535	5.00	AFIRMADO	2.65	7.31
	59+255.000	59+260.000	SOCOTA	0.550	5.00	AFIRMADO	2.74	10.05
	59+260.000	59+265.000	SOCOTA	0.595	5.00	AFIRMADO	2.97	13.02
	59+265.000	59+270.000	SOCOTA	0.705	5.00	AFIRMADO	3.52	16.54
	59+270.000	59+275.000	SOCOTA	0.805	5.00	AFIRMADO	4.04	20.58
	59+275.000	59+280.000	SOCOTA	0.850	5.00	AFIRMADO	4.26	24.85
	59+280.000	59+285.000	SOCOTA	0.870	5.00	AFIRMADO	4.35	29.19
	59+285.000	59+290.000	SOCOTA	0.865	5.00	AFIRMADO	4.32	33.52
	59+290.000	59+295.000	SOCOTA	0.835	5.00	AFIRMADO	4.19	37.70
				Subtotal				**38.00**
				TOTAL				**38.00**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO BENJAMIN MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**2022**	22	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022			31 DE MARZO DE 2022				
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4							
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA				**ACUMULADO ANTERIOR:**			**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES										0.00			37.00	37.00
ITEM:	210.2.2	GRUPO DE AJUSTE	1	ESPECIF. GENERAL	210-13	ESPECIF. PARTICULAR		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales			**UNID:**		M3	**UBICACIÓN:**	6404

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN			AREA POR TOPOGRAFIA	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	59+240.000	59+245.000	SOCOTÁ	0.43	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	2.13	2.130
	59+245.000	59+250.000	SOCOTÁ	0.48	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	2.41	4.550
	59+250.000	59+255.000	SOCOTÁ	0.53	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	2.62	7.160
	59+255.000	59+260.000	SOCOTÁ	0.55	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	2.73	9.890
	59+260.000	59+265.000	SOCOTÁ	0.60	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	2.96	12.860
	59+265.000	59+270.000	SOCOTÁ	0.69	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	3.45	16.300
	59+270.000	59+275.000	SOCOTÁ	0.79	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	3.94	20.240
	59+275.000	59+280.000	SOCOTÁ	0.85	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	4.25	24.500
	59+280.000	59+285.000	SOCOTÁ	0.88	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	4.38	28.880
	59+285.000	59+290.000	SOCOTÁ	0.87	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	4.34	33.220
	59+290.000	59+295.000	SOCOTÁ	0.85	5.00	EXCAVACIÓN EXPLANACIÓN	4.27	37.480
Cajeo de la subrasante para Mejoramiento y ampliación de la subrasante						**Subtotal**		37.48
						TOTAL		**37.00**

DIRECTOR DE OBRA
FIRMA:
NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO BENJAMIN MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	Cód: F-EO-009
		Versión: 001
	CONTRATO 0978 DE 2021	Fecha: 02/01/2020
		Pág: 1 de 1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022			
CONTRATO:	0978 DE 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES									0.00		712.00	712.00
ITEM:	900.2	GRUPO DE AJUSTE	8	ESPECIF. GENERAL	900-13	ESPECIF. PARTICULAR		Transporte de materiales provenientes de la excavción de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m)		**UNID:**	M3-Km	**UBICACIÓN:**	**VIA 6404**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**			**LONGITUD**	**N° VIAJES**	**VOLUMEN**		**MUNICIPIO**	**MEDIDA TOTAL**
	PR59+275	PR40+200	MARGEN DERECHO	19.00		37.48		SOCOTÁ	712.12
			Subtotal						712.00
			TOTAL						**712.00**

DIRECTOR OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO BENJAMIN MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Consorcio Vías Nacionales

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO 0978 DE 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									38,911.20		107,031.90	145,943.10
ITEM:		GRUPO DE AJUSTE	7	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS		**UNID:**		M	**UBICACIÓN:** **RUTA 6514**

ESQUEMA





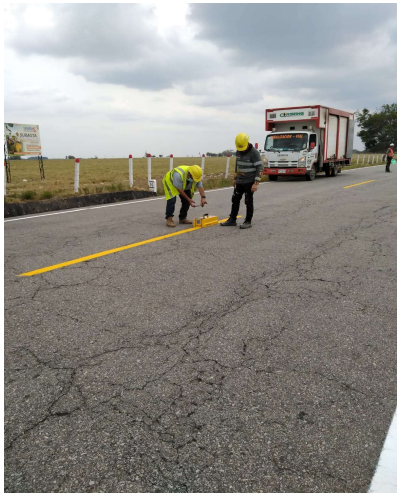



	LOCALIZACIÓN			MUNICIPIO	COLOR LINEA	LONGITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	PR6+000	PR6+994.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	994.50	1.00	DEMARCACIÓN	994.500
	PR6+000	PR6+994.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	994.50	1.00	DEMARCACIÓN	994.500
	PR6+000	PR6+679	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	679.00	1.00	DEMARCACIÓN	679.000
	PR6+000	PR6+679	EJE DISCONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	58.00	DEMARCACIÓN	261.000
	PR6+679	PR6+930	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	251.00	2.00	DEMARCACIÓN	502.000
	PR6+930	PR6+994.5	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	64.50	1.00	DEMARCACIÓN	64.500
	PR6+930	PR6+994.5	EJE DISCONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	5.00	DEMARCACIÓN	22.500
	PR7+000	PR7+990	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	990.00	1.00	DEMARCACIÓN	990.000
	PR7+000	PR7+990	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	990.00	1.00	DEMARCACIÓN	990.000
	PR7+000	PR7+111	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	111.00	1.00	DEMARCACIÓN	111.000
	PR7+000	PR7+111	EJE DISCONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	10.00	DEMARCACIÓN	45.000
	PR7+111	PR7+488	EJE DISCONTINUA CENTRAL	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	31.00	DEMARCACIÓN	139.500
	PR7+488	PR7+659.5	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	171.50	1.00	DEMARCACIÓN	171.500
	PR7+488	PR7+659.5	EJE DISCONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	15.00	DEMARCACIÓN	67.500
	PR7+659.5	PR7+990	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	330.50	2.00	DEMARCACIÓN	661.000
	PR8+000	PR8+983	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	983.00	1.00	DEMARCACIÓN	983.000
	PR8+000	PR8+983	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	983.00	1.00	DEMARCACIÓN	983.000
	PR8+000	PR8+192	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	192.00	1.00	DEMARCACIÓN	192.000
	PR8+000	PR8+192	EJE DISCONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	17.00	DEMARCACIÓN	76.500
	PR8+192	PR8+733.5	EJE DISCONTINUA CENTRAL	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	45.00	DEMARCACIÓN	202.500
	PR8+733.5	PR8+900	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	166.50	1.00	DEMARCACIÓN	166.500
	PR8+733.5	PR8+900	EJE DISCONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	15.00	DEMARCACIÓN	67.500
	PR8+900	PR8+983	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	83.00	2.00	DEMARCACIÓN	166.000
	PR9+000	PR9+973	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	973.00	1.00	DEMARCACIÓN	973.000
	PR9+000	PR9+973	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	973.00	1.00	DEMARCACIÓN	973.000
	PR9+000	PR9+973	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	973.00	2.00	DEMARCACIÓN	1,946.000
	PR10+000	PR10+965	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	965.00	1.00	DEMARCACIÓN	965.000
	PR10+000	PR10+965	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	965.00	1.00	DEMARCACIÓN	965.000
	PR10+000	PR10+965	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	965.00	2.00	DEMARCACIÓN	1,930.000
	PR11+000	PR11+962	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	962.00	1.00	DEMARCACIÓN	962.000


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									38,911.20		107,031.90	145,943.10
ITEM:		GRUPO DE AJUSTE	7	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS		**UNID:**		M	**UBICACIÓN:** **RUTA 6514**

ESQUEMA





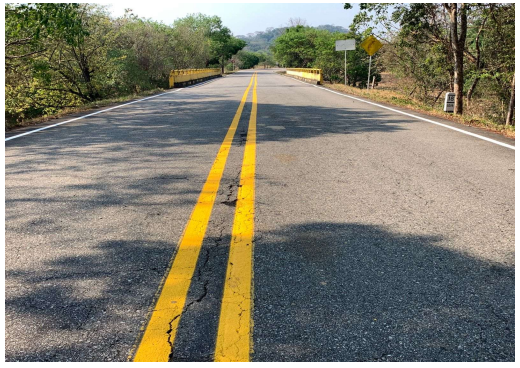

	LOCALIZACIÓN			MUNICIPIO	COLOR LINEA	LONGITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	PR11+000	PR11+962	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	962.00	1.00	DEMARCACIÓN	962.000
	PR11+000	PR11+186.4	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	186.40	2.00	DEMARCACIÓN	372.800
	PR11+186.4	PR11+322.4	EJE DISCONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	12.00	DEMARCACIÓN	54.000
	PR11+186.4	PR11+322.4	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	136.00	1.00	DEMARCACIÓN	136.000
	PR11+322.4	PR11+962	EJE DISCONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	56.00	DEMARCACIÓN	252.000
	PR12+000	PR12+980	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	980.00	1.00	DEMARCACIÓN	980.000
	PR12+000	PR12+980	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	980.00	1.00	DEMARCACIÓN	980.000
	PR12+000	PR12+063	EJE DISCONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	4.00	DEMARCACIÓN	18.000
	PR12+063	PR12+321	EJE DISCONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	22.00	DEMARCACIÓN	99.000
	PR12+063	PR12+321	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	258.00	1.00	DEMARCACIÓN	258.000
	PR12+321	PR12+700	EJE DISCONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	31.00	DEMARCACIÓN	145.700
	PR12+700	PR12+980	EJE DISCONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	21.00	DEMARCACIÓN	94.500
	PR12+700	PR12+980	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	280.00	1.00	DEMARCACIÓN	280.000
	PR13+000	PR13+963.6	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	963.60	1.00	DEMARCACIÓN	963.600
	PR13+000	PR13+963.6	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	963.60	1.00	DEMARCACIÓN	963.600
	PR13+000	PR13+054.3	EJE DISCONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	5.00	DEMARCACIÓN	22.500
	PR13+000	PR13+054.3	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	54.30	1.00	DEMARCACIÓN	54.300
	PR13+054.3	PR13+654.4	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	50.00	DEMARCACIÓN	225.000
	PR13+654.4	PR13+796	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	141.60	1.00	DEMARCACIÓN	141.600
	PR13+654.4	PR13+796	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	12.00	DEMARCACIÓN	54.000
	PR13+796	PR13+911.5	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	115.50	2.00	DEMARCACIÓN	231.000
	PR13+911.5	PR13+963.6	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	52.10	1.00	DEMARCACIÓN	52.100
	PR13+911.5	PR13+963.6	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	6.00	DEMARCACIÓN	27.000
	PR14+000	PR14+985.7	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	985.70	1.00	DEMARCACIÓN	985.700
	PR14+000	PR14+985.7	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	985.70	1.00	DEMARCACIÓN	985.700
	PR14+000	PR14+086	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	86.00	1.00	DEMARCACIÓN	86.000
	PR14+000	PR14+086	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	7.00	DEMARCACIÓN	31.500
	PR14+086	PR14+576	EJE SEGMENTADO	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	42.00	DEMARCACIÓN	197.400
	PR14+576	PR14+876	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	300.00	1.00	DEMARCACIÓN	300.000
	PR14+576	PR14+876	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	26.00	DEMARCACIÓN	122.200
	PR14+876	PR14+985.7	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	9.00	DEMARCACIÓN	42.300
	PR15+000	PR15+993	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	993.00	1.00	DEMARCACIÓN	993.000
	PR15+000	PR15+993	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	993.00	1.00	DEMARCACIÓN	993.000
	PR15+000	PR15+147.5	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	13.00	DEMARCACIÓN	61.100
	PR15+147.5	PR15+250	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	8.00	DEMARCACIÓN	37.600

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2022		
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4			
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES							38,911.20	107,031.90		145,943.10
ITEM:		GRUPO DE AJUSTE	7	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS	**UNID:**	M	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6514**

ESQUEMA







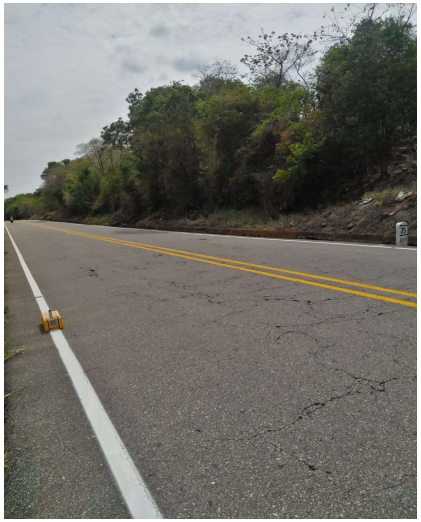



	LOCALIZACIÓN			MUNICIPIO	COLOR LINEA	LONGITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	PR15+147.5	PR15+250	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	102.50	1.00	DEMARCACIÓN	102.500
	PR15+250	PR15+640.5	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	390.50	2.00	DEMARCACIÓN	781.000
	PR15+640.5	PR15+993	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	25.00	DEMARCACIÓN	112.500
	PR16+000	PR16+1093.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,093.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,093.500
	PR16+000	PR16+1093.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,093.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,093.500
	PR16+000	PR16+396.4	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	34.00	DEMARCACIÓN	153.000
	PR16+396.4	PR16+539.5	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	143.10	1.00	DEMARCACIÓN	143.100
	PR16+396.4	PR16+539.5	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	11.00	DEMARCACIÓN	49.500
	PR16+539.5	PR16+1093.5	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	554.00	2.00	DEMARCACIÓN	1,108.000
	PR17+000	PR17+1092.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,092.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,092.500
	PR17+000	PR17+1092.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,092.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,092.500
	PR17+000	PR17+086	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	86.00	2.00	DEMARCACIÓN	172.000
	PR17+086	PR17+400	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	314.00	1.00	DEMARCACIÓN	314.000
	PR17+086	PR17+400	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	24.00	DEMARCACIÓN	108.000
	PR17+400	PR17+528	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	128.00	2.00	DEMARCACIÓN	256.000
	PR17+528	PR17+696	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	12.00	DEMARCACIÓN	54.000
	PR17+696	PR17+1092.5	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	396.50	2.00	DEMARCACIÓN	793.000
	PR18+000	PR18+1031.7	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,031.70	1.00	DEMARCACIÓN	1,031.700
	PR18+000	PR18+1031.7	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,031.70	1.00	DEMARCACIÓN	1,031.700
	PR18+000	PR18+573	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	573.00	2.00	DEMARCACIÓN	1,146.000
	PR18+573	PR18+721.5	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	12.00	DEMARCACIÓN	54.000
	PR18+573	PR18+721.5	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	148.50	1.00	DEMARCACIÓN	148.500
	PR18+721.5	PR18+881	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	14.00	DEMARCACIÓN	63.000
	PR18+721.5	PR18+881	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	159.50	1.00	DEMARCACIÓN	159.500
	PR18+881	PR18+1031.7	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	150.70	2.00	DEMARCACIÓN	301.400
	PR19+000	PR19+919	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	919.00	1.00	DEMARCACIÓN	919.000
	PR19+000	PR19+919	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	919.00	1.00	DEMARCACIÓN	919.000
	PR19+000	PR19+344	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	344.00	1.00	DEMARCACIÓN	344.000
	PR19+000	PR19+344	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	27.00	DEMARCACIÓN	121.500
	PR19+344	PR19+482	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	138.00	2.00	DEMARCACIÓN	276.000
	PR19+482	PR19+600	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	9.00	DEMARCACIÓN	40.500
	PR19+600	PR19+792	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	192.00	1.00	DEMARCACIÓN	192.000
	PR19+600	PR19+792	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	13.00	DEMARCACIÓN	58.500
	PR19+792	PR19+919	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	11.00	DEMARCACIÓN	51.700
	PR20+000	PR20+1016	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,016.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,016.000

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								38,911.20	107,031.90		145,943.10
ITEM:		GRUPO DE AJUSTE	7	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS	**UNID:**	M	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6514**

ESQUEMA

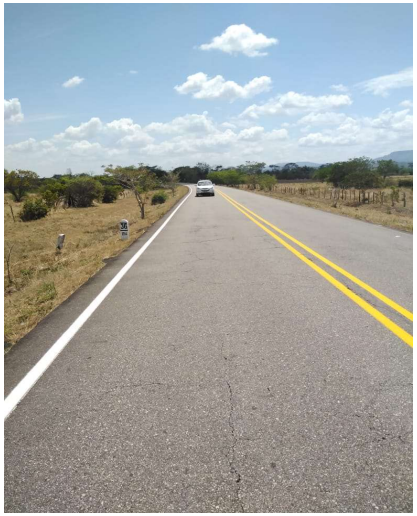

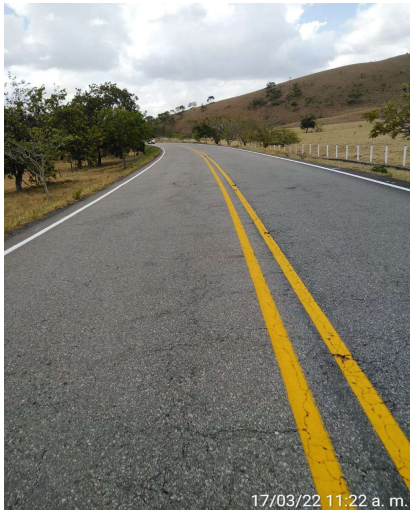



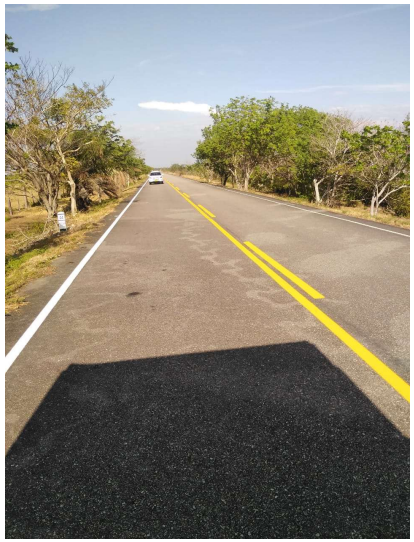


LOCALIZACIÓN			MUNICIPIO	COLOR LINEA	LONGITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
PR20+000	PR20+1016	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,016.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,016.000
PR20+000	PR20+106.5	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	8.00	DEMARCACIÓN	36.000
PR20+106.5	PR20+626	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	519.50	2.00	DEMARCACIÓN	1,039.000
PR20+626	PR20+863	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	20.00	DEMARCACIÓN	90.000
PR20+626	PR20+863	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	237.00	1.00	DEMARCACIÓN	237.000
PR20+863	PR20+1016	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	153.00	2.00	DEMARCACIÓN	306.000
PR21+000	PR21+986	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	986.00	1.00	DEMARCACIÓN	986.000
PR21+000	PR21+986	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	986.00	1.00	DEMARCACIÓN	986.000
PR21+000	PR21+350	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	350.00	2.00	DEMARCACIÓN	700.000
PR21+350	PR21+570	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	220.00	1.00	DEMARCACIÓN	220.000
PR21+350	PR21+570	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	17.00	DEMARCACIÓN	79.900
PR21+570	PR21+750	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	180.00	2.00	DEMARCACIÓN	360.000
PR21+750	PR21+986	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	16.00	DEMARCACIÓN	75.200
PR22+000	PR22+1013	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,013.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,013.000
PR22+000	PR22+1013	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,013.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,013.000
PR22+000	PR22+188	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	15.00	DEMARCACIÓN	70.500
PR22+188	PR22+263	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	75.00	1.00	DEMARCACIÓN	75.000
PR22+188	PR22+263	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	5.00	DEMARCACIÓN	23.500
PR22+263	PR22+1013	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	750.00	2.00	DEMARCACIÓN	1,500.000
PR23+000	PR23+1011	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,011.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,011.000
PR23+000	PR23+1011	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,011.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,011.000
PR23+000	PR23+237	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	237.00	2.00	DEMARCACIÓN	474.000
PR23+237	PR23+500	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	22.00	DEMARCACIÓN	103.400
PR23+500	PR23+1011	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	511.00	2.00	DEMARCACIÓN	1,022.000
PR24+000	PR24+1059.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,059.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,059.500
PR24+000	PR24+1059.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,059.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,059.500
PR24+000	PR24+235	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	235.00	2.00	DEMARCACIÓN	470.000
PR24+235	PR24+469	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	234.00	1.00	DEMARCACIÓN	234.000
PR24+235	PR24+469	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	20.00	DEMARCACIÓN	94.000
PR24+469	PR24+730	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	261.00	2.00	DEMARCACIÓN	522.000
PR24+730	PR24+860	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	13.00	DEMARCACIÓN	61.100
PR24+860	PR24+1059.5	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	199.50	2.00	DEMARCACIÓN	399.000
PR25+000	PR25+900.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	900.50	1.00	DEMARCACIÓN	900.500
PR25+000	PR25+900.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	900.50	1.00	DEMARCACIÓN	900.500
PR25+000	PR25+600	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	600.00	2.00	DEMARCACIÓN	1,200.000

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**			**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								38,911.20	107,031.90			145,943.10
ITEM:		GRUPO DE AJUSTE	7	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS	**UNID:**	M		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6514**

ESQUEMA

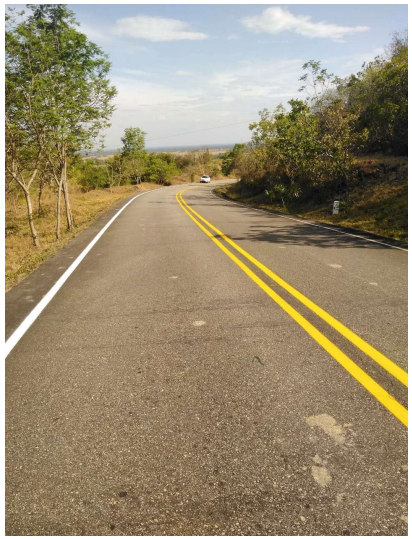





	LOCALIZACIÓN			MUNICIPIO	COLOR LINEA	LONGITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	PR25+600	PR25+840	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	240.00	1.00	DEMARCACIÓN	240.000
	PR25+600	PR25+840	EJE SEGMENTADA CARIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	21.00	DEMARCACIÓN	98.700
	PR25+840	PR25+900.5	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.70	5.00	DEMARCACIÓN	23.500
	PR26+000	PR26+1003.8	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,003.80	1.00	DEMARCACIÓN	1,003.800
	PR26+000	PR26+1003.8	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,003.80	1.00	DEMARCACIÓN	1,003.800
	PR26+000	PR+26+535	EJE SEGMENTADO	HATO COROZAL	AMARILLA	4.40	45.00	DEMARCACIÓN	198.000
	PR26+535	PR26+750	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	215.00	1.00	DEMARCACIÓN	215.000
	PR26+535	PR26+750	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	13.00	DEMARCACIÓN	58.500
	PR26+750	PR26+1003.8	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	253.80	2.00	DEMARCACIÓN	507.600
	PR27+000	PR27+957	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	957.00	1.00	DEMARCACIÓN	957.000
	PR27+000	PR27+957	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	957.00	1.00	DEMARCACIÓN	957.000
	PR27+000	PR27+050	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	50.00	2.00	DEMARCACIÓN	100.000
	PR27+050	PR27+260	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	14.00	DEMARCACIÓN	63.000
	PR27+260	PR27+465	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	17.00	DEMARCACIÓN	76.500
	PR27+260	PR27+465	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	205.00	1.00	DEMARCACIÓN	205.000
	PR27+465	PR27+850	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	32.00	DEMARCACIÓN	144.000
	PR27+465	PR27+850	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	385.00	1.00	DEMARCACIÓN	385.000
	PR27+850	PR27+957	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	107.00	2.00	DEMARCACIÓN	214.000
	PR28+000	PR28+1040.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,040.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,040.500
	PR28+000	PR28+1040.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,040.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,040.500
	PR28+000	PR28+490	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	490.00	2.00	DEMARCACIÓN	980.000
	PR28+490	PR28+630	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	140.00	1.00	DEMARCACIÓN	140.000
	PR28+490	PR28+630	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	14.00	DEMARCACIÓN	63.000
	PR28+630	PR28+1040.5	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	410.50	2.00	DEMARCACIÓN	821.000
	PR29+000	PR29+1052	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,052.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,052.000
	PR29+000	PR29+1052	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,052.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,052.000
	PR29+000	PR29+330	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	24.00	DEMARCACIÓN	108.000
	PR29+330	PR29+572	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	242.00	1.00	DEMARCACIÓN	242.000
	PR29+330	PR29+572	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	18.00	DEMARCACIÓN	81.000
	PR29+572	PR29+800	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	228.00	1.00	DEMARCACIÓN	228.000
	PR29+572	PR29+800	EJE SEGMENTADA CARRI IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	17.00	DEMARCACIÓN	76.500
	PR29+800	PR29+1052	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	252.00	2.00	DEMARCACIÓN	504.000
	PR30+000	PR30+928	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	928.00	1.00	DEMARCACIÓN	928.000
	PR30+000	PR30+928	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	928.00	1.00	DEMARCACIÓN	928.000
	PR30+000	PR30+180	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	180.00	2.00	DEMARCACIÓN	360.000

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA			**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES									38,911.20		107,031.90	145,943.10
ITEM:		GRUPO DE AJUSTE	7	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS		**UNID:**		M	**UBICACIÓN:** RUTA 6514

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN			MUNICIPIO	COLOR LINEA	LONGITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	PR30+180	PR30+350	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	170.00	1.00	DEMARCACIÓN	170.000
	PR30+180	PR30+350	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	12.00	DEMARCACIÓN	54.000
	PR30+350	PR30+928	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	48.00	DEMARCACIÓN	216.000
	PR31+000	PR31+1049	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,049.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,049.000
	PR31+000	PR31+1049	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,049.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,049.000
	PR31+000	PR31+430	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	33.00	DEMARCACIÓN	148.500
	PR31+430	PR31+586	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	156.00	1.00	DEMARCACIÓN	156.000
	PR31+430	PR31+586	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	12.00	DEMARCACIÓN	54.000
	PR31+586	PR31+1049	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	463.00	2.00	DEMARCACIÓN	926.000
	PR32+000	PR32+953.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	953.50	1.00	DEMARCACIÓN	953.500
	PR32+000	PR32+953.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	953.50	1.00	DEMARCACIÓN	953.500
	PR32+000	PR32+313	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	313.00	2.00	DEMARCACIÓN	626.000
	PR32+313	PR32+413	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	100.00	1.00	DEMARCACIÓN	100.000
	PR32+313	PR32+413	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	8.00	DEMARCACIÓN	36.000
	PR32+413	PR32+560	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	8.00	DEMARCACIÓN	36.000
	PR32+560	PR32+785	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	225.00	1.00	DEMARCACIÓN	225.000
	PR32+560	PR32+785	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	20.00	DEMARCACIÓN	90.000
	PR32+785	PR32+953.5	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	168.50	1.00	DEMARCACIÓN	168.500
	PR32+785	PR32+953.5	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	13.00	DEMARCACIÓN	58.500
	PR33+000	PR33+983.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	983.50	1.00	DEMARCACIÓN	983.500
	PR33+000	PR33+983.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	983.50	1.00	DEMARCACIÓN	983.500
	PR33+000	PR33+300	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	300.00	1.00	DEMARCACIÓN	300.000
	PR33+000	PR33+300	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	24.00	DEMARCACIÓN	108.000
	PR33+300	PR33+620	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	320.00	2.00	DEMARCACIÓN	640.000
	PR33+620	PR33+983.5	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	363.50	1.00	DEMARCACIÓN	363.500
	PR33+620	PR33+983.5	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	29.00	DEMARCACIÓN	130.500
	PR34+000	PR34+1068.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,068.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,068.500
	PR34+000	PR34+1068.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,068.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,068.500
	PR34+000	PR34+350	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	350.00	2.00	DEMARCACIÓN	700.000
	PR34+350	PR34+600	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	250.00	1.00	DEMARCACIÓN	250.000
	PR34+350	PR34+600	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	19.00	DEMARCACIÓN	85.500
	PR34+600	PR34+1068.5	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	468.50	2.00	DEMARCACIÓN	937.000
	PR35+000	PR35+1051.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,051.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,051.500
	PR35+000	PR35+1051.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,051.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,051.500
	PR35+000	PR35+110	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	110.00	1.00	DEMARCACIÓN	110.000

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022		31 DE MARZO DE 2022			
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4					
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								38,911.20		107,031.90		145,943.10
ITEM:		GRUPO DE AJUSTE	7	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS	**UNID:**		M		**UBICACIÓN:**	**RUTA 6514**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN			MUNICIPIO	COLOR LINEA	LONGITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	PR35+000	PR35+110	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	9.00	DEMARCACIÓN	40.500
	PR35+110	PR35+440	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	28.00	DEMARCACIÓN	126.000
	PR35+440	PR35+590	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	150.00	1.00	DEMARCACIÓN	150.000
	PR35+440	PR35+590	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	15.00	DEMARCACIÓN	67.500
	PR35+590	PR35+1051.5	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	461.50	2.00	DEMARCACIÓN	923.000
	PR36+000	PR36+1071	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,071.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,071.000
	PR36+000	PR36+1071	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,071.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,071.000
	PR36+000	PR36+290	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	290.00	2.00	DEMARCACIÓN	580.000
	PR36+290	PR36+530	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	240.00	1.00	DEMARCACIÓN	240.000
	PR36+290	PR36+530	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	16.00	DEMARCACIÓN	76.800
	PR36+530	PR36+737	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	207.00	1.00	DEMARCACIÓN	207.000
	PR36+530	PR36+737	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	15.00	DEMARCACIÓN	72.000
	PR36+737	PR36+930	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	193.00	1.00	DEMARCACIÓN	193.000
	PR36+737	PR36+930	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	17.00	DEMARCACIÓN	81.600
	PR36+930	PR36+1071	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	11.00	DEMARCACIÓN	52.800
	PR37+000	PR37+1059	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,059.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,059.000
	PR37+000	PR37+1059	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,059.00	1.00	DEMARCACIÓN	1,059.000
	PR37+000	PR37+665	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	56.00	DEMARCACIÓN	268.800
	PR37+665	PR37+780	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	115.00	1.00	DEMARCACIÓN	115.000
	PR37+665	PR37+780	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	10.00	DEMARCACIÓN	48.000
	PR37+780	PR37+1059	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	279.00	2.00	DEMARCACIÓN	558.000
	PR38+000	PR38+1080.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,080.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,080.500
	PR38+000	PR38+1080.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,080.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,080.500
	PR38+000	PR38+280	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	280.00	1.00	DEMARCACIÓN	280.000
	PR38+000	PR38+280	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	22.00	DEMARCACIÓN	105.600
	PR38+280	PR38+1080.5	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	58.00	DEMARCACIÓN	278.400
	PR39+000	PR39+1020.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,020.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,020.500
	PR39+000	PR39+1020.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,020.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,020.500
	PR39+000	PR39+370	EJE SEGMENTADO	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	31.00	DEMARCACIÓN	148.800
	PR39+370	PR39+1020.5	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	650.50	2.00	DEMARCACIÓN	1,301.000
	PR40+000	PR40+726.30	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	726.30	1.00	DEMARCACIÓN	726.300
	PR40+000	PR40+726.30	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	726.30	1.00	DEMARCACIÓN	726.300
	PR40+000	PR40+500	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	500.00	2.00	DEMARCACIÓN	1,000.000
	PR40+500	PR40+726.30	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	18.00	DEMARCACIÓN	86.400
	PR40+500	PR40+726.30	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	226.30	1.00	DEMARCACIÓN	226.300

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	31	**MM**	3	**AA**	2,022	**PERIODO:**	1 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2022				
CONTRATO:	0978 de 2021						**OBJETO CONTRATO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4						
CONTRATANTE:	INVIAS				**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA		**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES								38,911.20		107,031.90		145,943.10
ITEM:		GRUPO DE AJUSTE	7	ESPECIF. GENERAL		ESPECIF. PARTICULAR		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA PARA LINEAS DE DEMARCACION DE PAVIMENTOS	**UNID:**		M	**UBICACIÓN:**	**RUTA 6514**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN			MUNICIPIO	COLOR LINEA	LONGITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	PR41+000	PR41+726.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	726.50	1.00	DEMARCACIÓN	726.500
	PR41+000	PR41+726.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	726.50	1.00	DEMARCACIÓN	726.500
	PR41+000	PR41+140	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	11.00	DEMARCACIÓN	49.500
	PR41+000	PR41+140	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	140.00	1.00	DEMARCACIÓN	140.000
	PR41+140	PR41+726.5	EJE DISCONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.50	48.00	DEMARCACIÓN	216.000
	PR42+000	PR42+718.3	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	718.30	1.00	DEMARCACIÓN	718.300
	PR42+000	PR42+718.3	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	718.30	1.00	DEMARCACIÓN	718.300
	PR42+000	PR42+350	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	29.00	DEMARCACIÓN	139.200
	PR42+350	PR42+600	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	250.00	1.00	DEMARCACIÓN	250.000
	PR42+350	PR42+600	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	19.00	DEMARCACIÓN	91.200
	PR42+600	PR42+718.3	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	11.00	DEMARCACIÓN	52.800
	PR42+600	PR42+718.3	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	118.30	1.00	DEMARCACIÓN	118.300
	PR43+000	PR43+923	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	923.00	1.00	DEMARCACIÓN	923.000
	PR43+000	PR43+923	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	923.00	1.00	DEMARCACIÓN	923.000
	PR43+000	PR43+110	EJE SEGMENTADA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	9.00	DEMARCACIÓN	43.200
	PR43+000	PR43+110	EJE CONTINUA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	110.00	1.00	DEMARCACIÓN	110.000
	PR43+110	PR43+800	EJE SEGMENTADA	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	57.00	DEMARCACIÓN	273.600
	PR43+800	PR43+923	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	123.00	1.00	DEMARCACIÓN	123.000
	PR43+800	PR43+923	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	12.00	DEMARCACIÓN	57.600
	PR44+000	PR44+1018.5	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	1,018.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,018.500
	PR44+000	PR44+1018.5	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	1,018.50	1.00	DEMARCACIÓN	1,018.500
	PR44+000	PR44+165	EJE CONTINUA CARRIL DER.	HATO COROZAL	AMARILLA	165.00	1.00	DEMARCACIÓN	165.000
	PR44+000	PR44+165	EJE SEGMENTADA CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	AMARILLA	4.80	13.00	DEMARCACIÓN	62.400
	PR44+165	PR44+1018.5	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	853.50	2.00	DEMARCACIÓN	1,707.000
	PR45+000	PR45+959.3	CARRIL DER.	HATO COROZAL	BLANCA	959.30	1.00	DEMARCACIÓN	959.300
	PR45+000	PR45+959.3	CARRIL IZQ.	HATO COROZAL	BLANCA	959.30	1.00	DEMARCACIÓN	959.300
	PR45+000	PR45+959.3	EJE DOBLE LINEA CONTINUA	HATO COROZAL	AMARILLA	959.30	2.00	DEMARCACIÓN	1,918.600
					Subtotal				**131,532.50**
					VALOR A DESCONTAR (facturado Acta No. 9 Febrero 2022)				**24,500.60**
					TOTAL				**107,031.90**

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: ALVARO SANTAMARIA GOMEZ
CONSORCIO VIAS NACIONALES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO BENJAMIN MONROY
CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2 (Día) | 4 (Mes) | 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACÁ

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 10
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (Indicar con una X)

Resolución N° _____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4

N° CONTRATO 0978 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 23/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2029

Valor Inicial Contrato Obra	$ 322,790,128,920.00
Valor Adicional No.	$ 20,059,840,972.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 342,849,969,892.00

AIU %:	30%
U %:	0.05

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ -
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ -

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA- SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - MODULO 5

N° CONTRATO 1038 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 23/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2029

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 27,399,730,108.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 27,399,730,108.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° _____ Fecha _____										EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
											$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00				$ 0.00											
											$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0			$ 0.00				$ 0.00									
											$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00				$ 0.00								
											SUBTOTAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	**0**	$ 0.00									

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BASICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VIAS NACIONALES
Matricula No. : 25202-57327

Firma
Nombre: GERMÁN GÓMEZ TURRIAGO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matricula No. : COPNIA 10.000
GT

Vo. Bo. Firma
Nombre : BELQUIS OLIVOS MORALES
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. : 2594100953BCND

Vo. Bo. Firma
Nombre : LUZ AMELIA MESA MESA
Profesional Ambiental
Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA
Matricula No. : 68238197391STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

TIPO DE DOCUMENTO		**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	**10**	FECHA	**02 ABRIL 2022** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 3**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4**	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**978 DE 2021**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Boyacá**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**1038 DE 2021**

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1		ENERO 2020									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	ÍTEM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
								$ -	0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
								$ -	0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1		ENERO 2000									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	ÍTEM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
								$ -	0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
								$ -	0	$ -	0.0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0.00%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **ANIBAL OJEDA CARRIAZO**
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: **25202 - 57327**

Firma
Nombre: **ERIKA VIVIANA TORRES TORRES**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **133180**

Firma
Nombre: **GERMAN GOMEZ TURRIAGO**
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐ GT
Matrícula Profesional No.: **10000 COPNIA**

Firma
Nombre: **JUAN MARIA QUINTERO AVELLA**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.:

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

FECHA: 2/04/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	BOYACA
3. AÑO: 2022	MES 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12		mar-22
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 6404 6405 6514	TRAMO: BELEN - SACAMA , SACAMA - LA CABUYA, PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA	
6. CONTRATO DE OBRA No:	978 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES	NIT	901474028-8
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NIT	901479577-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1038 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	102 MESES	12. FECHA DE INICIO:	23/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	98 MESES 7 DIAS	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2029
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	0	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	0

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	322,790,128,920.00
21. VR. ANTICIPO:	$	20,059,840,972.00
22. VR. ADICIÓN No: 1	$	20,059,840,972.00
23. VR. ADICIÓN No:		
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	20,059,840,972.00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	342,849,969,892.00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0		0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0		0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0		0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0		0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0		0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL	0		0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0		0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0		0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0		0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0		0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0		0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0		0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0		0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0		0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0		0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0		0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0		0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0		0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0		0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0		0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0		0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0		0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0		0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0		0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0		0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0		0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0		0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0		0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0		0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0		0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0		0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0		0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0		0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0		0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0		0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0		0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		0
IVA				0%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 2

FECHA: 2/04/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOYACA
3. AÑO 2022	MES 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12		mar-22
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 6404 6405 6514	TRAMO: BELEN - SACAMA , SACAMA - LA CABUYA, PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA	
6. CONTRATO DE OBRA No:	978 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES	NIT	901474028-8
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	NIT	901479577-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1038 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	102 MESES	12. FECHA DE INICIO:	23/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	98 MESES 7 DIAS	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2029
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	0	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	0

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. OTROS	0
65. IVA	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	0
68. IVA PRESENTE PREACTA	0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**0**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	
74. OTROS	
75. IVA	
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	
77. SALDO POR EJECUTAR	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL OJEDA CARRIAZO		NOMBRES Y APELLIDOS	GERMAN GÓMEZ TURRIAGO	
C.C. X C.E. __	NUMERO	92.519.730 de Sincelejo	C.C. X C.E. __	NUMERO	17.175.956 de Bogotá
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202 - 57327	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	10000 COPNIA
Representante Legal	X	Apoderado	Representante Legal	X	Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad
