ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**	VALLEDUPAR EN ORDEN

Valledupar, 28 de noviembre de 2022

VA-SOPM-1203-2022

ALCALDIA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECEPCIÓN
RECIBIDO 3 0 NOV 2022
RECIBIDO

Para: **CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO**
Secretario de Hacienda Municipal

DE: **Ing. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA**
Supervisor del contrato

Asunto: **Remisión de cuenta de cobro.**

Cordial Saludo:

Comedidamente y en atención al asunto de la referencia, me permito remitir los documentos necesarios para la realización del **pago del ACTA PARCIAL N° 02**, Es decir, la suma de: DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 36/100 M/L (**$ 208.422.320,36**) correspondiente al **CONTRATO DE OBRAS No.: 112 de 2022 OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

Periodo: 08 de noviembre de 2022 al 25 de noviembre de 2022

Para los efectos se envía:

- Cuenta de Cobro
- Minuta del Contrato
- Acta de Inicio de Obras
- Informe de supervisión e Interventoría.
- Acta de Compromiso correspondiente a los impuestos municipal, (Estampilla procultura, Estampilla proancianos y estampilla pro-universidad, Pro Deporte y Recreación.
- Copia de Pólizas y resolución de aprobación.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Registro Presupuestal de Compromiso.
- Copia del RUT
- Recibos de Pagos de Impuestos
- Constancia del pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Lo anterior se envía para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,

Ing. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA
Secretario de Obras Publica Municipal.

Proyectó: Arq. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ
Apoyo a la Supervisión

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a2e08401188abcc41fb7fb2013c80be5d5422ce7548928f81a53067c30b6ad6e4c0cfb3355ab00ded8b6bb2c674c16db

Número de Factura: FEV-7
Fecha de Emisión: 28/11/2022
Fecha de Vencimiento: 06/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SARRIA AGUILERA JUAN CARLOS
Nombre Comercial: SARRIA AGUILERA JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 12647743
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 13 A 6 B 62 BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3016756861
Correo: juancasarria@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800098911
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Carrera 5 No.15-69
Teléfono / Móvil: 6055842444
Correo: tesorero@valledupar-cesar.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Costo Directo	NIU	1,00	$ 219.651.031,99	$ 0,00	$ 0,00					$ 219.651.031,99
2	002	Administración 24%	NIU	1,00	$ 52.716.247,68	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.716.247,68
3	003	Imprevisto 1%	NIU	1,00	$ 2.196.510,32	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.196.510,32
4	004	Utilidad 5%	NIU	1,00	$ 10.982.551,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.982.551,60

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Amortización del Anticipo	27,01	$ 77.124.021,23

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-28 16:59:51
Documento generado el: 2022-11-28 16:59:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			285.546.341,59
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			285.546.341,59
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			285.546.341,59
Descuento Global (-)			77.124.021,23
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	208.422.320,36

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764031139831 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2023-01-12

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº2 - CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 112 - SOP DE 2022

Alcaldía de Valledupar	OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		VALOR INICIAL		VALOR ANTICIPO (50%)CONTRATO INICIAL			VALOR MODIFICACIONES SIN RECIBO DE ANTICIPO	NUEVAS CONDICIONES
			$ 549.454.417,98		$ 271.727.208,70			$ 268.540.000,00	$ 831.994.417,98
VALLEDUPAR	CONTRATISTA	ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA	CONTROL DE POLIZAS		COMPAÑÍA:			PREVISORA SEGUROS	VIGENCIA
	IDENTIFICACIÓN / NIT No:	C.C. 12.647.743 de Valledupar	ITEM	DESCRECCIÓN	No.:			DESDE / HASTA	VALOR ASEGURADO
	SUPERVISOR:	EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA	1,00	CUMPLIMIENTO	47-44-101021331			31-ago.-22 / 1-jul.-23	$81.199.441,74
	SUPERVISOR DE APOYO TÉCNICO:	EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ	2,00	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES	47-44-101021331			31-ago.-22 / 31-dic.-25	$40.599.720,87
	SUPERVISOR DE APOYO JURÍDICO:	ADULFO DIAZ HERRERA	3,00	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	47-44-101021331			31-dic.-22 / 31-dic.-27	$243.598.325,22
	FECHA DE INICIO:	31 DE AGOSTO DEL 2022	4,00	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO	47-44-101021331			31-ago.-22 / 1-jul.-23	$405.997.208,70
	FECHA TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DEL 2022	5,00	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	47-40-10100644?			31-ago.-22 / 31-dic.-22	$200.000.000,00
Secretaría de Obras Publicas Municipal	FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº2:	25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	VALOR DEL ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº2		285.546.341,59		VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA:		$ 874.782.718,81

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, a los veinticinco **(25)** días del mes de noviembre del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**, se reunieron en las oficinas de la **SECRETARIA OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**, los señores : **Ing. EFRAÍN ALFREDO QUINTERO TERNERA**, Secretario de Obras públicas Públicas en su calidad de **SUPERVISOR;** el Arq. **JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA**, Contratista; el **Arq.** EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ, Supervisor de Apoyo Técnico, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE AVANCE DE OBRA **N° 02 - CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 112-SOP DE 2022** de acuerdo a lo relacionado a continuación:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRATADAS					NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA Nº1		ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº1		ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº2		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR		CANTIDADES Y VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS CONDICIONES	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES	VR. TOTAL	CANTIDADES	VR. TOTAL			CANTIDADES	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	**PRELIMINARES**														
1,10	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	50,00	17.460,00	873.000,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
1,20	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	M2	320,00	17.460,00	5.587.200,00	320,00	5.587.200,00	320,00	5.587.200,00	-	-	0,00	-	320,00	5.587.200,00
1,30	DESMONTE DE PUERTAS incluye marcos	m2	70,00	14.805,00	1.036.350,00	70,00	1.036.350,00	55,51	821.807,78	14,49	214.542,22	0,00	-	70,00	1.036.350,00
1,40	DESMONTE DE MUEBLES BAJO MESONES	ML	35,00	24.148,00	845.180,00	55,00	1.328.140,00	55,00	1.328.140,00	-	-	0,00	-	55,00	1.328.140,00
1,50	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS	UN	8,00	53.298,00	426.384,00	14,00	746.172,00	14,00	746.172,00	-	-	0,00	-	14,00	746.172,00
1,60	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	UN	8,00	85.304,00	682.432,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
1,70	DEMOLICION ENCHAPES	M2	480,00	9.300,00	4.464.000,00	400,00	3.720.000,00	400,00	3.720.000,00	-	-	0,00	-	400,00	3.720.000,00
1,80	DEMOLICION PLANTILLA	M2	96,00	14.805,00	1.421.280,00	70,00	1.036.350,00	70,00	1.036.350,00	-	-	0,00	-	70,00	1.036.350,00
1,90	RETIRO DE TUBERIAS AGUAS NEGRAS DE 2,3,4,6"	ML	90,00	6.800,00	612.000,00	90,00	612.000,00	90,00	612.000,00	-	-	0,00	-	90,00	612.000,00
1,10	DEMOLICION PISOS EN BALDOSA DE GRANITO INLUYE RETIRO	M2	96,00	8.500,00	816.000,00	70,00	595.000,00	70,00	595.000,00	-	-	0,00	-	70,00	595.000,00
1,11	EXCAVACION MANUALPARA TUBERIA NUEVA DE AGUAS NEGRAS BAÑOS	M3	16,00	35.028,00	560.448,00	8,00	280.224,00	8,00	280.224,00	-	-	0,00	-	8,00	280.224,00
1,12	ACARREO MATERIAL REUTILIZABLE PARA CENTRO DE ACOPIO	M3	30,00	26.134,00	784.020,00	60,00	1.568.040,00	60,00	1.568.040,00	-	-	0,00	-	60,00	1.568.040,00
1,13	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	80,00	46.092,00	3.687.360,00	80,00	3.687.360,00	80,00	3.687.360,00	-	-	0,00	-	80,00	3.687.360,00
	SUBTOTAL				**21.796.864,00**		**20.196.836,00**		**19.982.293,78**		**214.542,22**		**-**		**20.196.836,00**
2	**PISOS**														
2,1	PLANTILLA DE NIVELACION CONTRA PISO E=0,07CM	M2	96,00	40.570,00	3.894.720,00	70,00	2.839.900,00	70,00	2.839.900,00	-	-	0,00	-	70,00	2.839.900,00
2,2	PISO EN BALDOSA DE GRANITO .33X.33, MORTERO DE PEGA 1 4-INSTALADO CON PULIR	M2	96,00	121.756,00	11.688.576,00	70,00	8.522.920,00	70,00	8.522.920,00	-	-	0,00	-	70,00	8.522.920,00
	SUBTOTAL				**15.583.296,00**		**11.362.820,00**		**11.362.820,00**		**-**		**-**		**11.362.820,00**
3	**MAMPOSTERIA**														
3,1	MURO SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE MORTERO 1:4	M2	25,00	71.969,00	1.799.225,00	75,00	5.397.675,00	75,00	5.397.675,00	-	-	0,00	-	75,00	5.397.675,00
3,2	MURO DOBLE 0.25, LADRILLO COMUN .07X.11X.22, INCLUYE MORTERO 1:4 EN CUCHILLAS	M2	25,00	138.806,00	3.470.150,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	SUBTOTAL				**5.269.375,00**		**5.397.675,00**		**5.397.675,00**		**-**	0,00	**-**		**5.397.675,00**
4	**PAÑETES**														
4,1	PAÑETE LISO MUROS	M2	480,00	34.592,00	16.604.160,00	480,00	16.604.160,00	480,00	16.604.160,00	-	-	0,00	-	480,00	16.604.160,00
4,2	PAÑETES MENORES DE 50CM	ML	106,00	29.800,00	3.158.800,00	184,00	5.483.200,00	184,00	5.483.200,00	-	-	0,00	-	184,00	5.483.200,00
	SUBTOTAL				**19.762.960,00**		**22.087.360,00**		**22.087.360,00**		**-**		**-**		**22.087.360,00**
5	**ENCHAPES**														
5,1	ENCHAPE CERAMICA .35X.20 EN BAÑOS Y ESPACIOS DE ASEO Y LIEMPIEZA POR TRES CARAS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. PARED Y PISO	M2	160,00	76.191,00	12.190.560,00	170,00	12.952.470,00	170,00	12.952.470,00	-	-	0,00	-	170,00	12.952.470,00
5,2	ENCHAPE CERAMICA .35X.20 EN BAÑOS Y ESPACIOS DE ASEO Y LIEMPIEZA POR TRES CARAS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. PARED Y PISO	M2	58,00	76.191,00	4.419.078,00	32,00	2.438.112,00	32,00	2.438.112,00	-	-	0,00	-	32,00	2.438.112,00
5,3	ENCHAPE CERAMICA .35X.20 EN BAÑOS Y ESPACIOS DE ASEO Y LIEMPIEZA POR TRES CARAS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. PARED Y PISO	ML	80,00	42.871,00	3.429.680,00	55,00	2.357.905,00	55,00	2.357.905,00	-	-	0,00	-	55,00	2.357.905,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN MARMOL POLIESTERIZADO, FALDONES Y SALPICADERAS, COLOR NEGRO ABSOLUTO DE 12MM DE ESPESOR	ML	12,00	725.500,00	8.706.000,00	16,00	11.608.000,00		-	16,00	11.608.000,00	0,00	-	16,00	11.608.000,00
5,5	MEDIACAÑA EN CIELO RASO ESPECIAL PARA HOSPITALES Y CLINICAS	ML	345,00	26.200,00	9.039.000,00	345,00	9.039.000,00	345,00	9.039.000,00	-	-	0,00	-	345,00	9.039.000,00
	SUBTOTAL				**37.784.318,00**		**38.396.487,00**		**26.787.487,00**		**11.608.000,00**		**-**		**38.396.487,00**

6	**CIELO FALSO Y CUBIERTA**															
6.1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO	M2	50,00	39.668,00	1.983.400,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
6.2	CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #8, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO.	M2	320,00	116.871,00	37.398.720,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
6.3	MURO EN LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #8, INCLUYE ESTRCUTURA PERFIL DE ALUMINIO Y PINTURA	M2	32,00	233.742,00	7.479.744,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
6.4	SUMINISTRO E EINSTALACION DE CABALLETES FIJOS, PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 INCLUYE ACCESORIOS GANCHOS Y TORNILLOS	ML	30,00	73.525,00	2.205.750,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	SUBTOTAL				**49.067.614,00**		-		-		-		-			-
7	**IMPERMEABILIZACION**															
7.1	MANTO ASFALTICO 3MM, ICLUYE ALUMOL CUBIERTA	M2	380,00	44.800,00	17.024.000,00	660,00	29.568.000,00	660,00	29.568.000,00	-	-	0,00	-	660,00	29.568.000,00
	SUBTOTAL				**17.024.000,00**		**29.568.000,00**		**29.568.000,00**		-		-			**29.568.000,00**
8	**ESTUCOS**															
8.1	PICADA Y EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERIORES	M2	480,00	28.026,00	13.452.480,00	280,00	7.847.280,00	140,00	3.923.640,00	140,00	3.923.640,00	0,00	-	280,00	7.847.280,00
8.2	EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERNOS MANTENIMIENTO AL EXISTENTE	M2	420,00	19.990,00	8.395.800,00	500,00	9.995.000,00	250,00	4.997.500,00	250,00	4.997.500,00	0,00	-	500,00	9.995.000,00
	SUBTOTAL				**21.848.280,00**		**17.842.280,00**		**8.921.140,00**		**8.921.140,00**		-			**17.842.280,00**
9	**PINTURAS**															
9.1	PINTURA SOBRE GRANIPLAS EXTERIOR TIPO KORAZA DE PINTUCO	M2	260,00	19.115,00	4.969.900,00	200,00	3.823.000,00	0,00	-	100,00	1.911.500,00	100,00	1.911.500,00	100,00	1.911.500,00
9.2	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	M2	900,00	39.164,00	35.247.600,00	900,00	35.247.600,00	0,00	-	900,00	35.247.600,00	0,00	-	900,00	35.247.600,00
	SUBTOTAL				**40.217.500,00**		**39.070.600,00**		-		**37.159.100,00**		**1.911.500,00**			**37.159.100,00**
10	**CARPINTERIA METALICA**															
10.1	MARCO EN ALUMINIO CON PESTAÑA 0,08 MAS LUCETA PARA PUERTA DE -0,7-1.0*2,50 INCLUYE INSTALACION	UN	20,00	298.000,00	5.960.000,00	21,00	6.258.000,00	0,00	-	21,00	6.258.000,00	0,00	-	21,00	6.258.000,00
10.2	MARCO EN ALUMINIO CON PESTAÑA DE 0.10 PUERTA DOBLE 2,00x250 CON LUCETA	UN	3,00	698.500,00	2.095.500,00	2,00	1.397.000,00	0,00	-	2,00	1.397.000,00	0,00	-	2,00	1.397.000,00
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA EN PERFIL PHR-C 220X80 CAL. 14-2MM-INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE PARA AUMENTO DE CAPACIDAD DE CARGA DEL CIELO RAZO NUEVO.	ML	120,00	114.500,00	13.740.000,00	44,00	5.038.000,00	44,00	5.038.000,00	-	-	0,00	-	44,00	5.038.000,00
10.4	MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA METALICA BAJO CUBIERTAS EXISTENTES INCLUYE LIJADA, MATERIALES, MANO DE OBRA ACABADO	ML	100,44	26.531,71	2.664.844,97	104,00	2.759.297,86	104,00	2.759.297,86	-	-	0,00	-	104,00	2.759.297,86
	SUBTOTAL				**24.460.344,97**		**15.452.297,86**		**7.797.297,86**		**7.655.000,00**		-			**15.452.297,86**
11	**CARPINTERIA EN MADERA**															
11.1	PUERTAS EN MADERA MELAMINICAS 0,70 - 1.0, INCLUYE PINTURAS, CERRADURA E INSTALACION	UN	20,00	768.500,00	15.370.000,00	21,00	16.138.500,00	0,00	-	-	-	21,00	16.138.500,00	0,00	-
11.2	PUERTAS DOBLE EN MADERA MELAMINICAS DE 1.80 DE ANCHO X 2,50 INCLUYE , CERRADURA E INSTALACION	UN	3,00	2.071.044,46	6.213.133,39	2,00	4.142.088,93	0,00	-	-	-	2,00	4.142.088,93	0,00	-
11.3	Suministro de vidrios laminado transparente de 6mm, varias medidas sobre marcos de las puertas	M2	16,00	121.245,11	1.939.921,76	12,00	1.454.941,32	0,00	-	-	-	12,00	1.454.941,32	0,00	-
	SUBTOTAL				**23.523.055,15**		**21.735.530,24**		-		-		**21.735.530,24**			-
12	**APARATOS SANITARIOS**															
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA HOSPITALARIA, COMPLETO	UN	7,00	608.700,00	4.260.900,00	7,00	4.260.900,00	7,00	4.260.900,00	-	-	0,00	-	7,00	4.260.900,00
12.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	7,00	209.820,00	1.468.740,00	8,00	1.678.560,00	8,00	1.678.560,00	-	-	0,00	-	8,00	1.678.560,00
12.3	GRIFERIA LLAVE AUTOMATICA QK23051 PARA LAVAMANOS O SIMILAR	UN	7,00	226.960,03	1.588.720,22	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA COMPLETA	UN	7,00	138.687,16	970.810,12	7,00	970.810,12	6,00	832.122,96	-	-	1,00	138.687,16	6,00	832.122,96
	SUBTOTAL				**8.289.170,34**		**6.910.270,12**		**6.771.582,96**		-		**138.687,16**			**6.771.582,96**
13	**SEÑALIZACION**															
13.1	SEÑALIZACION DE SERVICIOS, ESPACIOS Y AMBIENTES	UN	28,00	112.793,00	3.158.204,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	SUBTOTAL				**3.158.204,00**		-		-		-		-			-
14,0	**CLIMATIZACION**															
14.1	REINSTALACION MINI SPLIT 12.000 BTU , INCLUYE TUB., ACC. + SOPORTE PARED, MANTENIMIENTO	UN	2,00	830.060,96	1.660.121,92	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
14.2	REINSTALACION MINI SPLIT 18.000 BTU , INCLUYE TUB., ACC. + SOPORTE PARED MANTENIMIENTO	UN	1,00	924.444,15	924.444,15	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
14.3	REINSTALACION MINI SPLIT 24.000 BTU , INCLUYE TUB., ACC. + SOPORTE PARED MANTENIMINETO	UN	1,00	946.059,57	946.059,57	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION MINI SPLIT 24.000 BTU, INCLUYE TUB., ACC. + SOPORTE PARED DE ALTA RESISTENCIA	UN	4,00	5.246.909,57	20.987.638,28	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	SUBTOTAL				**24.518.263,92**		-		-		-		-			-

15,0	**PISOS**														
15.1	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLO PISO EN GRANITO VACIADO EXISTENTE	M2	400,00	$ 40.306,00	16.122.400,00	400,00	16.122.400,00	220,00	8.867.320,00	180,00	7.255.080,00	0,00	-	400,00	16.122.400,00
15.2	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLO MEDIA CAÑA EN GRANITO VACIADO EXISTENTE	ML	320,00	$ 27.346,00	8.750.720,00	320,00	8.750.720,00	320,00	8.750.720,00	-	-	0,00	-	320,00	8.750.720,00
15.3	RESTAURACION DE MESONES EN GRANITO, RETIRO DE BOQUILLAS PARA JUNTAS, APLICACIÓN DE NUEVAS BOQUILLAS, SELLADO,BRILLADO, Y ESMALTADO AVRIAS CARAS	ML	19,00	$ 67.306,00	1.278.814,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	SUBTOTAL				**26.151.934,00**		**24.873.120,00**		**17.618.040,00**		**7.255.080,00**		-		**24.873.120,00**
16,0	**CARPINTERIA PVC**														
16.1	MESON DE ENFERMERIA EN MADERA MELAMINICA	ML	6,50	$ 468.079,57	3.042.517,23	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
16.2	MUEBLE BAJO MESONES EN MADERA MELAMINICA FORRADOS PINTADOS LACA TRANSPARENTE	ML	24,00	$ 575.494,67	13.811.872,07	24,00	13.811.872,07	0,00	-	-	-	24,00	13.811.872,07	0,00	-
16.3	CLOSET EN MADERA MELAMINICA INCLUYE CERRADURA E INSTALACION	M2	22,00	$ 594.744,67	13.084.382,73	31,00	18.437.084,76	0,00	-	-	-	31,00	18.437.084,76	0,00	-
					29.938.772,03		**32.248.956,83**		-		-		**32.248.956,83**		-
17,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**														
17.1	ADECUACIÓN CAJAS INSPECCION SANITARIAS Y ELECTRICAS	UN	4,00	$ 287.041,90	1.148.167,60	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
17.2	ADECUACIÓN RED ALCANTARILLADO, INCLUYE TUBERIA AGUAS NEGRAS ACCESORIOS MANO DE OBRA	UND	1,00	$ 8.152.345,09	8.152.345,09	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
					9.300.512,69		-		-		-		-		-
18,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**38.383.005,44**										
18.1.0	RED ELECTRICAS DE BAJA TENSION														
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3#8F+1#8N+1#10T THHN, PARA MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES EN REEMPLAZO DE LAS DETERIORADAS	ML	400,00	$ 34.249,26	13.699.702,51	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
					13.699.702,51		-		-		-		-		
18.2.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**														
18.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE A 240V CON POLO A TIERRA (INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC SCH 40 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG) DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS	UN	8,00	$ 257.894,78	2.063.158,21	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACION. (TUBERIA PVC SCH 40 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG). DISTANCIA PROMEDIO 10 METROS	UN	76,00	$ 151.286,04	11.497.739,23	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED TORTUGA 12W / 100-240V / 960LM	UN	$ 30,00	$ 54.656,00	1.639.680,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 18W / 100-240V / 1.260LM	UN	$ 18,00	$ 48.340,00	870.120,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 24W / 100-240V /1.680LM	UN	$ 14,00	$ 58.982,00	825.748,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO 40W / 100-240V /4000LM	UN	$ 14,00	$ 150.909,00	2.112.726,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO(INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG)	UN	$ 14,00	$ 142.312,00	1.992.368,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES EN REMPLAZO DE LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO, INCLUYE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO	UN	$ 40,00	$ 92.044,09	3.681.763,49	0,00		0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
					24.683.302,93		-		-		-		-		-
21,0	**ASEO GENERAL**														
21,1	**ASEO GENERAL DE OBRA**	M2	800,00	$ 2.457,00	1.965.600,00	400,00	982.800,00	0,00	-	-	-	400,00	982.800,00	0,00	-
					1.965.600,00		**982.800,00**		-		-		**982.800,00**		-
INPC	**ITEMS COMPLEMENTARIOS NO PREVISTOS**														
INP1	TRAZADO Y REPLANTEO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL AREA DE HOSPITALIZACION HASTA MH A CONECTAR EQUIPO Y PERSONAL DE TOPOGRAFIA	ML		5.400,00		90,00	486.000,00	90,00	486.000,00	-	-	0,00	-	90,00	486.000,00
INP2	CORTE DE PISO Y PLANTILLA CON MAQUINA CORTADORA CON DISCO DIAMANTADO	ML		17.493,00		180,00	3.148.740,00	180,00	3.148.740,00	-	-	0,00	-	180,00	3.148.740,00
INP3	DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO E=0,17 AREA PARQUEADERO HASTA EL MH DE DESCARGA	ML		32.000,00		28,00	896.000,00	28,00	896.000,00	-	-	0,00	-	28,00	896.000,00
INP4	EXCAVACION MANUAL ALTURA PROMEDIO DE 2.00 DESDE MH DE DESCARGA HASTA CAJILLA DOMICILIARIA	M3		35.028,00		21,84	765.011,52	21,84	765.011,52	-	-	0,00	-	21,84	765.011,52
INP5	TAPE DE SANJA CON MATERIAL DE EXCAVACION EN VIA DESDE MH A ACCESO PARQUEADERO PLACA EN CONCRETO E= 0.18 DE 3000 PSI INCLIYE COMPACTACION CON EQUIPO TIPO CANGURO	M3		17.514,00		21,84	382.505,76	21,84	382.505,76	-	-	0,00	-	21,84	382.505,76
INP6	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PAVIMENTO ESPESOR 0.18 MTS CON ACELERANTE	ML		95.800,00		28,00	2.682.400,00	28,00	2.682.400,00	-	-	0,00	-	28,00	2.682.400,00

INP7	PUNTO SANITARIO DE 2"	UN		78.853,00		22,00	1.690.766,00	22,00	1.690.766,00	-	-	0,00	-	22,00	1.690.766,00
INP8	PUNTO SANITARIO DE 3"	UN		89.977,00		10,00	899.770,00	10,00	899.770,00	-	-	0,00	-	10,00	899.770,00
INP9	PUNTO SANITARIO DE 4"	UN		103.101,00		10,00	1.031.010,00	10,00	1.031.010,00	-	-	0,00	-	10,00	1.031.010,00
INP10	RED SANITARIA DE 2"PVC	#¡REF!		31.426,00		32,00	1.005.632,00	32,00	1.005.632,00	-	-	0,00	-	32,00	1.005.632,00
INP11	RED SANITARIA DE 3" PVC	#¡REF!		43.158,00		28,00	1.208.424,00	28,00	1.208.424,00	-	-	0,00	-	28,00	1.208.424,00
INP12	RED SANITARIA DE 4" PVC	#¡REF!		54.890,00		42,00	2.305.380,00	42,00	2.305.380,00	-	-	0,00	-	42,00	2.305.380,00
INP13	RED SANITARIA DE 6" PVC	ML		94.830,00		30,00	2.844.900,00	30,00	2.844.900,00	-	-	0,00	-	30,00	2.844.900,00
INP14	TUBERIA VENTILACION PVC 2"	ML		18.540,00		20,00	370.800,00	20,00	370.800,00	-	-	0,00	-	20,00	370.800,00
INP15	CAMA EN ARENA ESPESOR .10MT	M3		82.766,00		10,80	893.872,80	10,80	893.872,80	-	-	0,00	-	10,80	893.872,80
INP16	CAJAS INSPECCION 80 X 80 EN LADRILLO CORRIENTE, PAÑETADA IMPERMABILIZADA INTEGRALMENTE, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		428.864,00		4,00	1.715.456,00	4,00	1.715.456,00	-	-	0,00	-	4,00	1.715.456,00
INP17	KIT DE SILLA YEE DE 8"X6" PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		385.000,00		1,00	385.000,00	1,00	385.000,00	-	-	0,00	-	1,00	385.000,00
INP18	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2"	UND		42.313,00		40,00	1.692.520,00	40,00	1.692.520,00	-	-	0,00	-	40,00	1.692.520,00
INP19	RED SUMINISTRO PVC 1/2	ML		16.300,00		80,00	1.304.000,00	80,00	1.304.000,00	-	-	0,00	-	80,00	1.304.000,00
INP20	CORTE Y SELLADO DE PUNTOS TUBERIAS SANITARIAS ANTIGUAS EN MAL ESTADO DE 2" A 4"	UND		9.500,00		40,00	380.000,00	40,00	380.000,00	-	-	0,00	-	40,00	380.000,00
INP21	REGISTRO RED WHITE 1/2 PULG. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 PULG Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND		96.500,00		20,00	1.930.000,00	10,00	965.000,00	5,00	482.500,00	5,00	482.500,00	15,00	1.447.500,00
INP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS	UND		188.500,00		10,00	1.885.000,00	0,00	-	10,00	1.885.000,00	0,00	-	10,00	1.885.000,00
INP23	SUMINISTRO E INSTALACION DE Check Anti-Retorno de Aguas Residuales de 6 pulgTUBERIA SANITARIA AGUAS NEGRAS	UND		1.240.000,00		1,00	1.240.000,00	1,00	1.240.000,00	-	-	0,00	-	1,00	1.240.000,00
INP24	SIFON SANITARIO DE 3" COMPLETO	UND		74.500,00		10,00	745.000,00	10,00	745.000,00	-	-	0,00	-	10,00	745.000,00
INP25	REJILLA C/SOSCO 3x2 BRONCE ANTICUCARACHA	UND		25.299,00		10	252.990,00	0,00	-	10,00	252.990,00	0,00	-	10,00	252.990,00
INP26	TAPAS PLASTICAS 0.20X0.20 PARA VALVULAS DE PASO	UND		28.500,00		20,00	570.000,00	0,00	-	17,00	484.500,00	3,00	85.500,00	17,00	484.500,00
INP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR	JUEGO		131.272,00		8,00	1.050.176,00	0,00	-	8,00	1.050.176,00	0,00	-	8,00	1.050.176,00
INP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL PORCELANICO PARA LAVAMANOS W.C.	UN		128.000,00		6,00	768.000,00	0,00	-	6,00	768.000,00	0,00	-	6,00	768.000,00
INP29	DEMOLICION PARA CIMENTACION VIGA DE PISO	ML		32.000,00		22,00	704.000,00	22,00	704.000,00	-	-	0,00	-	22,00	704.000,00
INP30	EXCAVACION ML CIMENTACION	ML		14.500,00		22,00	319.000,00	22,00	319.000,00	-	-	0,00	-	22,00	319.000,00
INP31	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI. 0.30 X 0.40	ML		184.500,00		22,00	4.059.000,00	22,00	4.059.000,00	-	-	0,00	-	22,00	4.059.000,00
INP32	VIGA SOBRE MURO DE AMARRE ESTRUCTURA	ML		204.500,00		22,00	4.499.000,00	22,00	4.499.000,00	-	-	0,00	-	22,00	4.499.000,00
INP33	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO	ML		184.500,00		20,30	3.745.350,00	20,30	3.745.350,00	-	-	0,00	-	20,30	3.745.350,00
INP34	ACERO DE 60.000 PSI	KG		9.100,00		240,00	2.184.000,00	240,00	2.184.000,00	-	-	0,00	-	240,00	2.184.000,00
INP35	MESON EN CONCRETO E=0,10MTS	ML		163.740,00		14,00	2.292.360,00	14,00	2.292.360,00	-	-	0,00	-	14,00	2.292.360,00
INP36	CONSTRUCCION DE POLLITO EN PISO PARA MUEBLES BAJO MESON	ML		53.622,00		14,00	750.708,00	14,00	750.708,00	-	-	0,00	-	14,00	750.708,00
INP37	PICADA Y EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERIORES	ML		17.200,00		140,00	2.408.000,00	80,00	1.376.000,00	60,00	1.032.000,00	0,00	-	140,00	2.408.000,00
INP38	EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERNOS MANTENIMIENTO AL EXISTENTE	ML		8.800,00		140,00	1.232.000,00	70,00	616.000,00	70,00	616.000,00	0,00	-	140,00	1.232.000,00
INP39	DESGASTE MECANICO DE MEDIACAÑA EXISTENTE DEBASTADO CON MAQUINA	ML		10.900,00		330,00	3.597.000,00	330,00	3.597.000,00	-	-	0,00	-	330,00	3.597.000,00
INP40	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO 7.5 CM INCLUYE PULIDA Y BRILLADA	ML		36.464,00		40,00	1.458.560,00	40,00	1.458.560,00	-	-	0,00	-	40,00	1.458.560,00
INP41	FILOS Y DILATACIONES	ML		5.474,00		190,00	1.040.060,00	25,00	136.850,00	145,00	793.730,00	20,00	109.480,00	170,00	930.580,00
INP42	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural montante superior 2 hojas mobiles en vidrio 5mm templado y 1 fijo 1.50mts x 3.0 mts	UND		2.148.000,00		6,00	12.888.000,00	0,00	-	6,00	12.888.000,00	0,00	-	6,00	12.888.000,00
INP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO NATURAL MONTANTE SUPERIOR 4 HOJAS MOBILES vidrio 6mm templado DE 2.00X3.30MTS	UND		2.980.000,00		1,00	2.980.000,00	0,00	-	1,00	2.980.000,00	0,00	-	1,00	2.980.000,00
INP44	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural corredizas 0.50 mts x 0.88	UN		375.000,00		2,00	750.000,00	0,00	-	2,00	750.000,00	0,00	-	2,00	750.000,00
INP45	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural corredizas 0.50 mts x 2.0	UN		460.000,00		2,00	920.000,00	0,00	-	2,00	920.000,00	0,00	-	2,00	920.000,00
INP46	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural corredizas 0.50 mts x 0.88	UN		330.000,00		1,00	330.000,00	0,00	-	1,00	330.000,00	0,00	-	1,00	330.000,00
INP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CORREDIZA 0.50 a 0.40 MTSX0.50MTS	UN		305.000,00		8,00	2.440.000,00	0,00	-	8,00	2.440.000,00	0,00	-	8,00	2.440.000,00
INP48	SUMINISTRO E INSTLACION PUERTA CORREDIZA DOBLE CON MONTANTE, UNA HOJA FIJA Y OTRA CORREDIZA, VIDRIO TEMPLADO 6MM 2.0X2.50MTS	UN		2.460.000,00		1,00	2.460.000,00	0,00	-	-	-	1,00	2.460.000,00	0,00	-
INP49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, LIJADA, APLICACIÓN DE WASPRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA PROTEXTORES METALICOS EXISTENTES	M2		38.900,00		32,00	1.244.800,00	0,00	-	32,00	1.244.800,00	0,00	-	32,00	1.244.800,00
INP50	SUMINISTRO E INSTLACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 0.55 MTS	ML		672.000,00		20,00	13.440.000,00	0,00	-	18,40	12.364.800,00	1,60	1.075.200,00	18,40	12.364.800,00
INP51	SUMINISTRO E INSTLACION DE POCETAS METALICA	UND		185.000,00		7,00	1.295.000,00	0,00	-	7,00	1.295.000,00	0,00	-	7,00	1.295.000,00
INP52	SUMINISTRO E INSTLACION DE POCETA METALICA 0.60X0.45 PARA HABITACIONES DE PEDIATRIA	UND		245.000,00		2,00	490.000,00	0,00	-	1,00	245.000,00	1,00	245.000,00	1,00	245.000,00
INP53	GRIFERIA PARA POCETA CUELLO DE CISNE DOBLE	UND		220.000,00		9,00	1.980.000,00	0,00	-	8,00	1.760.000,00	1,00	220.000,00	8,00	1.760.000,00
INP54	SUMINISTRO E INSTLACION DE FLUXOMETRO PARA LAVA PATO METALICO ACERO INOXIDABLE	UND		820.000,00		1,00	820.000,00	0,00	-	1,00	820.000,00	0,00	-	1,00	820.000,00
INP55	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE DE APOYO EN BAÑOS, PARA SANITARIO ABATIBLE	UN		420.000,00		6,00	2.520.000,00	0,00	-	-	-	6,00	2.520.000,00	0,00	-
INP56	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE DE APOYO EN BAÑOS, PARA DUCHA	UN		260.000,00		12,00	3.120.000,00	0,00	-	-	-	12,00	3.120.000,00	0,00	-
INP57	CIELO RASO PLANO DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2		86.044,00		312,00	26.845.728,00	280,00	24.092.320,00	32,00	2.753.408,00	0,00	-	312,00	26.845.728,00
INP58	DESMONTE DE DUCTERIA SOBRE CIELO RAZO TUBERIA A.A	ML		3.800,00		80,00	304.000,00	80,00	304.000,00	-	-	0,00	-	80,00	304.000,00

4/6

INP59	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES CABLE, ALAMBRE CONVENCIONAL	ML		2.200,00		700,00	1.540.000,00	700,00	1.540.000,00	-	-	0,00	-	700,00	1.540.000,00
INP60	DESMONTE DE LAMPARAS SLIM LINE DOBLES 1.20 DE LONGITUD	UND		14.500,00		30,00	435.000,00	30,00	435.000,00	-	-	0,00	-	30,00	435.000,00
INP61	DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL EXISTENTES	M2		6.500,00		45,00	292.500,00	45,00	292.500,00	-	-	0,00	-	45,00	292.500,00
INP62	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1	ML		39.026,00		40,00	1.561.040,00	40,00	1.561.040,00	-	-	0,00	-	40,00	1.561.040,00
	SUBTOTAL						**141.474.460,00**		**83.009.876,00**		**48.156.804,00**		**10.317.680,00**		**131.166.780,00**
	GASES MEDICINALES														**41.793.691,14**
INP63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" (TUBERIA SOPORTADA, PINTADA, RITULADA Y SOLDADURA AL 5% (INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML		91.500,00		180,00	16.470.000,00	0,00	-	150,00	13.725.000,00	30,00	2.745.000,00	150,00	13.725.000,00
INP64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" (TUBERIA SOPORTADA, PINTADA, RITULADA Y SOLDADURA AL 5% (INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML		119.137,60		138,00	16.440.988,63	0,00	-	100,00	11.913.759,88	38,00	4.527.228,75	100,00	11.913.759,88
INP65	SUMINISTRO E INSTLACION DE VALVULAS 3/4 (VALVULA EN ACERO INOXIDABLE4 TORNILLOS, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		225.000,00		2,00	450.000,00	0,00	-	2,00	450.000,00	0,00	-	2,00	450.000,00
INP66	SUMINISTRO E INSTLACION DE VALVULAS 1/2 (VALVULA EN ACERO INOXIDABLE4 TORNILLOS, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		132.500,00		14,00	1.855.000,00	0,00	-	14,00	1.855.000,00	0,00	-	14,00	1.855.000,00
INP67	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CORTE DE 2 GASES (FABRICACION NACIONAL, VALVULA 4 TORNILLOS EN BRONCE SOLDABLE TRES PIEZAS, PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		2.275.000,00		1,00	2.275.000,00	0,00	-	1,00	2.275.000,00	0,00	-	1,00	2.275.000,00
INP68	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA GASES MEDICINALES DIGITAL 2 GASES (INCLUYE PANTALLA TOUCH SCREEN, CON TRANSDUCTOR DE PRESION DIGITAL, INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		7.517.977,49		1,00	7.517.977,49	0,00	-	1,00	7.517.977,49	0,00	-	1,00	7.517.977,49
INP69	TOMA DE SALIDA DE PARED DE OXIGENO TIPO CHEMETROM	UN		202.847,69		10,00	2.028.476,88	0,00	-	10,00	2.028.476,88	0,00	-	10,00	2.028.476,88
INP70	TOMA DE SALIDA DE PARED DE VACIO TIPO CHEMETROM	UN		202.847,69		10,00	2.028.476,88	0,00	-	10,00	2.028.476,88	0,00	-	10,00	2.028.476,88
							48.065.918,89		-		**41.793.691,14**		**7.272.228,75**		
	INSTALACIONES ELECTRICAS														
INP71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE A 120V PAT HOSPITALARIO BLANCO CIRCUITO NORMA (INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC SCH 40 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG). DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS	UND		178.800,00		48,00	8.582.400,00	30,00	5.364.000,00	18,00	3.218.400,00	0,00	-	48,00	8.582.400,00
INP72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE A 120 V PAT HOSPITALARIO TOMA REGULADO COLOR NARANJA (INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC SCH 40 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG). DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS	UND		198.500,00		30,00	5.955.000,00	30,00	5.955.000,00	-	-	0,00	-	30,00	5.955.000,00
INP73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE A 220V A 240V PAT (INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC SCH 40 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG). DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS	UND		247.800,00		10,00	2.478.000,00	10,00	2.478.000,00	-	-	0,00	-	10,00	2.478.000,00
INP74	PARCIAL DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE EN 2#12 AWG+1#14 AWG N, PARA REDES ELECTRICAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTE EN TUBERIA PVC SCH 40 3/4" MANO D EOBRA Y ACCESORIOS	ML		21.718,59		600,00	13.031.154,94	600,00	13.031.154,94	-	-	0,00	-	600,00	13.031.154,94
INP75	PARCIAL DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE SIETE HILOS EN 3N°10 + 1 N°10PAT PARA AIRES ACONDICIONADO	ML		25.751,51		110,00	2.832.666,14	110,00	2.832.666,14	-	-	0,00	-	110,00	2.832.666,14
INP76	PARCIAL DE ACOMETIDA EN CABLE 7 HILOS LIBRE DE HALOGENO EN N° 10 EN 2#10+1#10 N, PARA REDES ELECTRICAS TUBERIA PVC SCH 40 3/4" MANO D EOBRA Y ACCESORIOS	ML		29.800,85		220,00	6.556.185,97	220,00	6.556.185,97	-	-	0,00	-	220,00	6.556.185,97
INP77	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		88.897,44		20,00	1.777.948,75	0,00	-	-	-	20,00	1.777.948,75	0,00	-
INP78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		104.171,15		12,00	1.250.053,83	0,00	-	-	-	12,00	1.250.053,83	0,00	-
INP79	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE	UND		125.948,46		15,00	1.889.226,91	0,00	-	-	-	15,00	1.889.226,91	0,00	-
INP80	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTABLE 2 VIAS	UND		156.872,98		10,00	1.568.729,82	0,00	-	-	-	10,00	1.568.729,82	0,00	-
INP81	SUMINISTRO 24W	UND		230.917,10		75,00	17.318.782,22	0,00	-	-	-	75,00	17.318.782,22	0,00	-
INP82	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LAMPARA DE EMERGECIA DOBLE 2.6 W CON BATERIA RECARGABLE DURACION 90 MINUTOS	UND		278.000,00		10,00	2.780.000,00	0,00	-	-	-	10,00	2.780.000,00	0,00	-
INP83	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AVISOS INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA	UND		379.716,22		6,00	2.278.297,33	0,00	-	-	-	6,00	2.278.297,33	0,00	-
INP84	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE TIPO THWN EN 1 NO. 1/0 +1No 0T-TUB. CONDUIT PVC DE 2" ADICIONALES AL EXISTENTE	ML		354.007,23		45,00	15.930.325,44	45,00	15.930.325,44	-	-	0,00	-	45,00	15.930.325,44
INP85	SUMINISTRO ADECUACION Y MONTAJE DE GABINETE TIPO PESADO CON BARRAJE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 18 CTOS 3F, 3+ N+ T, 250A CERTIFICADO CON PUERTA	UND		971.385,49		1,00	971.385,49	0,00	-	1,00	971.385,49	0,00	-	1,00	971.385,49
INP86	SUMINISTRO ADECUACION Y MONTAJE DE GABINETE TIPO PESADO CON BARRAJE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 24 CTOS 3F, 3+ N+ T, 250A CERTIFICADO CON PUERTA	UND		1.252.702,56		1,00	1.252.702,56	0,00	-	1,00	1.252.702,56	0,00	-	1,00	1.252.702,56
INP87	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA ONLINE 10 KVA 220V 10 MINT AUTONOMIA	UND		12.055.724,36		1,00	12.055.724,36	0,00	-	1,00	12.055.724,36	0,00	-	1,00	12.055.724,36
	SUBTOTAL						**98.606.583,78**		**52.147.332,49**		**17.498.192,41**		**28.863.038,85**		**69.646.624,90**
						0									
	REDES DE VOZ Y DATO														
INP88	CABLE F/UTP CAT 6A LSZH 305MTRS POWEST	ML		4.850,00		1.400,00	6.790.000,00	850,00	4.122.500,00	550,00	2.667.500,00	0,00	-	1.400,00	6.790.000,00
INP89	JACK AZUL CAT 6A UTP POWEST	UND		28.000,00		32,00	896.000,00	0,00	-	25,00	700.000,00	7,00	196.000,00	25,00	700.000,00
INP90	SWITCH D-LINK 24 PUERTOS GBPS + 2 PUERTOS SFP 100/1000MBPS SMART MAN	UND		2.250.000,00		1,00	2.250.000,00	0,00	-	1,00	2.250.000,00	0,00	-	1,00	2.250.000,00
INP91	PATCH CORD UTP CAT 6A 3FT AZUL POWEST	UND		31.250,33		32,00	1.000.010,58	0,00	-	25,00	781.258,27	7,00	218.752,31	25,00	781.258,27
INP92	PATCH CORD UTP CAT 6A 7FT AZUL POWEST	UND		32.794,98		32,00	1.049.439,43	0,00	-	25,00	819.874,55	7,00	229.564,87	25,00	819.874,55

INP93	UPS ONLINE 3KVA MARCA ATLANTIC POWER 3 MINUTOS DE AUTONOMÍA	UND		3.921.591,06		1,00	3.921.591,06	0,00	-	1,00	3.921.591,06	0,00	-	1,00	3.921.591,06
INP94	RECEPTOR	UND		1.052.299,13		1,00	1.052.299,13	0,00	-	1,00	1.052.299,13	0,00	-	1,00	1.052.299,13
INP95	LLAMADORES DE CAMILLA	UND		590.598,12		11,00	6.496.579,32	0,00	-	10,00	5.905.981,20	1,00	590.598,12	10,00	5.905.981,20
INP96	Servicio de INSTALACION FISICA, CONFIGURACION Y CAPACITACION de la solución DE LLAMADORES Y RECEPTOR	UND		2.700.000,00		1,00	2.700.000,00	0,00	-	1,00	2.700.000,00	0,00	-	1,00	2.700.000,00
INP97	GABINETE DE PISO 60X60X45U (AXPXAL)	UND		3.350.428,46		1,00	3.350.428,46	0,00	-	1,00	3.350.428,46	0,00	-	1,00	3.350.428,46
INP98	BANDEJA REJIBAND TIPO MALLA 60x300 C8 Tramo 3m	UND		187.750,01		2,00	375.500,02	0,00	-	2,00	375.500,02	0,00	-	2,00	375.500,02
INP99	SALIDA DE TUBO BANDEJA REJIBAND REJIBAND	UND		18.501,00		12,00	222.012,00	0,00	-	10,00	185.010,00	2,00	37.002,00	10,00	185.010,00
INP100	UNION CURVAS REJIBAND EZ	UND		3.485,00		6,00	20.910,00	0,00	-	6,00	20.910,00	0,00	-	6,00	20.910,00
INP101	UNION REFORZADA EZ	UND		6.850,00		2,00	13.700,00	0,00	-	2,00	13.700,00	0,00	-	2,00	13.700,00
INP102	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8 X 3M	UND		54.450,00		1,00	54.450,00	0,00	-	1,00	54.450,00	0,00	-	1,00	54.450,00
INP103	PERNO MULTIPROPOSITO PARA VARILLA 3/8	UND		45.680,00		1,00	45.680,00	0,00	-	1,00	45.680,00	0,00	-	1,00	45.680,00
INP104	BORNA DE TIERRA - LATON PARA BANDEJA REJIBAND TIPO MALLA	UND		52.300,00		6,00	313.800,00	0,00	-	6,00	313.800,00	0,00	-	6,00	313.800,00
INP105	Tubo conduit PVC 3/4" x 3m	UND		8.900,00		90,00	801.000,00	0,00	-	90,00	801.000,00	0,00	-	90,00	801.000,00
INP106	PATCH PANEL PLANO 6A F/UTP 24 PUERTOS INCLUYE HERRAJE POWEST	UND		998.090,65		2,00	1.996.181,30	0,00	-	2,00	1.996.181,30	0,00	-	2,00	1.996.181,30
INP107	FACEPLATE DOBLE	UND		12.500,00		19,00	237.500,00	0,00	-	15,00	187.500,00	4,00	50.000,00	15,00	187.500,00
INP108	TAPA ESPACIO PARA FACE PLATE	UND		1.800,00		9,00	16.200,00	0,00	-	5,00	9.000,00	4,00	7.200,00	5,00	9.000,00
INP109	Tubo conduit PVC1" x 3m	UND		14.800,00		140,00	2.072.000,00	140,00	2.072.000,00	-	-	0,00	-	140,00	2.072.000,00
INP110	Caja de Paso 40X40X20 cm C20	UND		198.414,00		1,00	198.414,00	1,00	198.414,00	-	-	0,00	-	1,00	198.414,00
INP111	CAJAS 4X4 DOBLE FONDO empotrar para fijación face plate	UND		7.800,00		19,00	148.200,00	19,00	148.200,00	-	-	0,00	-	19,00	148.200,00
INP112	NVR 8MP 4K, 16 CH IP, 16 PUERTOS POE, 2 BAHIAS DD, SWITCH POE 300MTRS, HDMI 4K, incluye disco duro de 4tb purple wd 24/7	UND		2.149.474,00		1,00	2.149.474,00	0,00	-	1,00	2.149.474,00	0,00	-	1,00	2.149.474,00
INP113	Cámara IP PRO Serie IPC 4MP Tipo DOMO 2.8mm Lente Fijo SMALL	UND		657.437,00		12,00	7.889.244,00	0,00	-	12,00	7.889.244,00	0,00	-	12,00	7.889.244,00
INP114	Conectores RJ-45 Cat 6 100% Cu	UND		6.900,00		13,00	89.700,00	0,00	-	-	-	13,00	89.700,00	0,00	-
INP115	Extender HDMI 30M para visual en TV STAFF ENFERMERIA, incluye conectores y certificación continuidad	UND		324.500,00		1,00	324.500,00	0,00	-	-	-	1,00	324.500,00	0,00	-
INP116	Kit conectores, chazos, tornillería, termoencogible, bomeras, clavijas, Trapa	UND		287.900,00		1,00	287.900,00	0,00	-	-	-	1,00	287.900,00	0,00	-
INP117	CABLE UTP CAT 6 UNV Cu 100%	UND		4.850,00		290,00	1.406.500,00	290,00	1.406.500,00	-	-	0,00	-	290,00	1.406.500,00
INP118	Regleta Multitoma de 6p Supresor de Picos	UND		32.400,00		1,00	32.400,00	0,00	-	-	-	1,00	32.400,00	0,00	-
INP119	Patch Corda cat 6 (para DVR hasta router)	UND		36.500,00		1,00	36.500,00	0,00	-	-	-	1,00	36.500,00	0,00	-
INP120	Medición tramos cableado, Sondeo, orientaciones básicas en obra civil para distribución, trabajo en altura, organización acopio, parametrización y configuración en móviles. Tratamiento a 15 puntos	UND		1.200.000,00		1,00	1.200.000,00	0,00	-	1,00	1.200.000,00	0,00	-	1,00	1.200.000,00
							49.438.113,30		7.947.814,00		39.390.382,00				
	SUBTOTAL												2.100.117,31		47.337.996,00
	SUBTOTAL														

COSTO DIRECTO		416.641.889,63	624.611.090,07	299.389.819,17	219.651.031,99	105.870.539,14	619.040.881,10
24%	ADMINISTRACIÓN	100.330.046,29	149.906.661,62	71.853.484,60	52.716.247,68	25.336.929,39	124.569.732,28
1%	IMPREVISTO	4.180.418,60	6.246.110,90	2.993.895,19	2.196.510,32	1.055.705,39	5.190.405,51
6%	UTILIDAD	20.902.092,98	31.230.554,50	14.969.475,96	10.982.551,60	5.278.526,96	25.952.027,56
COSTO INDIRECTO		125.412.557,88	187.383.327,02	89.816.855,75	65.895.309,60	31.671.161,74	155.712.165,35
TOTAL NETO		543.454.417,39	811.994.417,39	389.206.374,92	285.546.341,59	137.241.700,88	674.752.716,51

VALOR TOTAL DEL ACTAN°2: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($285.546.341,59)

VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR 50%: DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILTRESCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.($208.422.320,36)

RESUMEN	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 543.454.417,39**
VALOR ANTICIPO 50%	**$ 271.727.208,69**
VALOR ACTA N°1	**$ 389.206.374,92**
VALOR PRESENTE ACTA N°2	**$ 285.546.341,59**
AMORTIZACION ACTA N°1	**$ 194.603.187,46**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA N°2	**$ 77.124.021,23**
TOTAL AMORTIZADO HASTA LA PRESENTE ACTA 2	**$ 271.727.208,69**
SALDO POR AMORTIZAR	**$ 0,00**
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA N°2 DESPUES DE AMORTIZAR	**$ 208.422.320,36**
VALOR DE LAS MODIFICACIONES	**$ 268.540.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 811.994.417,39**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 674.752.716,51**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	**$ 137.241.700,88**

ING. EFRAÍN ALFREDO QUINTERO TERNERA
Secretario de Obras Públicas
Supervisor

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
Contratista

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ
Supervisor de Apoyo

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE VALLEDUPAR

CERTIFICA:

Que **JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA**, C.C. 12.647.743 de Valledupar, en su calidad de Contratista, ha iniciado labores pactadas en el Contrato de Obras No112 de 2022, cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.**

Es preciso señalar que el contratista se acogió al acuerdo Municipal 022 del 21 de Diciembre del año 2021 (Indupal) y el Decreto 000252 del 25 de Marzo del 2022 donde se establece descontar el valor en porcentajes correspondientes a los impuestos municipales, (Estampilla bienestar adulto, estampilla pro- cultura, Pro Unicesar) se proceda a realizar el respectivo descuento en la primera acta o cuenta de cobro del contrato de Obras 112 de 2022, al igual el contratista canceló los impuestos pro-desarrollo fronterizo, e Indupal.

Igualmente, se deja constancia del cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral, frente a los Aportes Parafiscales y demás obligaciones derivadas del contrato.

LIQUIDACION IMPUESTOS INICIAL

ESTAMPILLA PRO – DEPORTE Y RECREACION	1.0%	RECIBO N° VALOR:	**20220136968** $4.180.419,00	
ESTAMPILLA PRO – UNICESAR	0,5%	RECIBO N° VALOR:	**20220136960** $2.090.209,00	
ESTAMPILLA PRO – CULTURA	2 %	RECIBO N° VALOR:	**20220136960** $8.360.837,00	
ESTAMPILLA PRO – BIENESTAR ADULTO MAYOR	4 %	RECIBO N° VALOR:	**20220136960** $16.721.674,00	
ESTAMPILLA PRO – DESARROLLO FRONTERIZO	1.5%	$8.152.000,0	**LIQUIDACION N°** 32022017035	**FECHA DE PAGO** 22/08/2022

LIQUIDACION IMPUESTOS ADICIONAL N° 1

ESTAMPILLA PRO – DEPORTE Y RECREACION	1.0%	RECIBO N° VALOR:	**20220163105** $2.685.400,00
ESTAMPILLA PRO – UNICESAR	0,5%	RECIBO N° VALOR:	**20220163105** $1.342.700,00
ESTAMPILLA PRO – CULTURA	2 %	RECIBO N° VALOR:	**20220163105** $5.370.800,00

ESTAMPILLA PRO – BIENESTAR ADULTO MAYOR	4 %	RECIBO N° VALOR:	**20220163105** $10.741.600,00	
ESTAMPILLA PRO – DESARROLLO FRONTERIZO	1.5%	$4.028.000,0	**LIQUIDACION N°** 32022024915	**FECHA DE PAGO** 08/112022

Se expide este Informe para trámite de Cobro de **ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 02**

Periodo: 8 de noviembre de 2022 al 25 de noviembre de 2022

VALOR INICIAL CONTRATO:	**$ 543.454.417,39**
VALOR ADICIONAL N° 01:	**$ 268.540.000,39**
VALOR FINAL TOTAL CONTRATO:	**$ 811.994.417,39**
VALOR ACTA PARCIAL N° 001:	$ 388.124.615,08
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%:	$ 194.062.307,54
TOTAL PAGADO ACTA PARCIAL N° 01:	$ 194.062.307,54
VALOR ACTA PARCIAL N° 002:	**$ 285.546.341,59**
AMORTIZACION ACTA PARCIAL N° 2	**$ 77.124.021,23**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N° 02:	**$ 208.422.320,36**

Es decir, la suma de: DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 36/100 M/L (**$ 208.422.320,36**)

Para constancia, se firma la presente Certificación, en Valledupar, Cesar, a los Veintiocho (28) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022).

Ing. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA
Secretario de Obras Públicas Municipal

Proyecto. ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ
Apoyo a la Supervision. S.O.P.M

INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA No.:	*112-SOP DE 2022*
OBJETO DEL CONTRATO:	*MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.*
CONTRATANTE:	*MUNICIPIO DE VALLEDUPAR*
CONTRATISTA:	*JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA.* *C.C. 12.647.743 de Valledupar*
SUPERVISOR:	*ING. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA* *Secretario de Obras Públicas Municipal*
APOYO SUPERVISION:	*ARQ. EDUARDO MONSALVO RODRIGUEZ* *Contratista Secretaria de Obras*
APOYO SUPERVISION:	*ADULFO DIAZ HERRERA* *Supervisor juridico SOPM*
VALOR INICIAL:	*El presente contrato tiene un valor de* ***QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS M/CTE ($ 543.454.417,39), INCLUIDO EL VALOR DEL AIU.***
ADICIONAL Nº 1:	*DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 268.540.000,00), INCLUIDO EL VALOR DEL AIU.*
VALOR FINAL:	*OCHOCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 39/100 M/CTE ($ 811.994.417,39), INCLUIDO EL VALOR DEL AIU.*
PLAZO:	*CUATRO (04) MESES*
DOMICILIO:	*El lugar de ejecución del Contrato será el Municipio de Valledupar. Para todos los efectos derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, el domicilio contractual será el Municipio de Valledupar.*
FECHA ACTA DE INICIACIÒN:	*TREINTA Y UNO (31) días del mes de AGOSTO del año Dos Mil Veintidós (2022)*

FECHA TERMINACIÓN: *TREINTA (30) dias del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Veintidós (2022)*

De acuerdo con lo contemplado en la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del Contrato de Obras No112 de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (constitución y aprobación de la garantía única del contrato y registro presupuestal), Presentación de la Cuenta Bancaria y Constancia del pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, Impuesto Departamental, Impuestos Municipales, Impuesto a la sobretasa deportiva para el fomento del deporte la recreación INDUPAL, documentos que se exigen para proceder el pago del **ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 02** del contrato de Obras, los cuales fueron entregados en medio físico a satisfacción de la Secretaría de Obras públicas; por consiguiente, **se puede proceder al pago DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 02, del contrato 112 DE 2022.**

Se expide este Informe para trámite de Cobro de **ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 02**

Periodo: 8 de noviembre de 2022 al 25 de noviembre de 2022

VALOR INICIAL CONTRATO:	**$ 543.454.417,39**
VALOR ADICIONAL N° 01:	**$ 268.540.000,39**
VALOR FINAL TOTAL CONTRATO:	**$ 811.994.417,39**
VALOR ACTA PARCIAL N° 001:	$ 388.124.615,08
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%:	$ 194.062.307,54
TOTAL PAGADO ACTA PARCIAL N° 01:	$ 194.062.307,54
VALOR ACTA PARCIAL N° 002:	**$ 285.546.341,59**
AMORTIZACION ACTA PARCIAL N° 2	**$ 77.124.021,23**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N° 02:	**$ 208.422.320,36**

Es decir, la suma de: DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 36/100 M/L (**$ 208.422.320,36**)

Para constancia, se firma la presente Certificación, en Valledupar, Cesar, a los Veintiocho (28) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022).

Ing. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA
Secretario de Obras Públicas Municipal

INFORME DE SUPERVISIÓN INTERVENTORIA DE APOYO

CONTRATO DE OBRA No.:	*112-SOP DE 2022*
OBJETO DEL CONTRATO:	*MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.*
CONTRATANTE:	*MUNICIPIO DE VALLEDUPAR*
CONTRATISTA:	*JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA.* *C.C. 12.647.743 de Valledupar*
SUPERVISOR:	*ING. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA* *Secretario de Obras Públicas Municipal*
APOYO SUPERVISION:	*ARQ. EDUARDO MONSALVO RODRIGUEZ* *Contratista Secretaría de Obras*
APOYO SUPERVISION:	*ADULFO DIAZ HERRERA* *Supervisor jurídico SOPM*
VALOR INICIAL:	*El presente contrato tiene un valor de* ***QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS M/CTE ($ 543.454.417,39), INCLUIDO EL VALOR DEL AIU.***
ADICIONAL N° 1:	*DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 268.540.000,00), INCLUIDO EL VALOR DEL AIU.*
VALOR FINAL:	*OCHOCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 39/100 M/CTE ($ 811.994.417,39), INCLUIDO EL VALOR DEL AIU.*
PLAZO:	*CUATRO (04) MESES*
DOMICILIO:	*El lugar de ejecución del Contrato será el Municipio de Valledupar. Para todos los efectos derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, el domicilio contractual será el Municipio de Valledupar.*
FECHA ACTA DE INICIACIÒN:	*TREINTA Y UNO (31) dias del mes de AGOSTO del año Dos Mil Veintidós (2022)*

FECHA TERMINACIÓN: *TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Veintidós (2022)*

De acuerdo con lo contemplado en la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte Integral del Contrato de Obra No 112 de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (constitución y aprobación de la garantía única del contrato y registro presupuestal), Presentación de la Cuenta Bancaria y Constancia del pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, Impuesto Departamental, Impuestos Municipales, Impuesto a la sobretasa deportiva para el fomento del deporte la recreación INDUPAL, documentos que se exigen para proceder el pago del **ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 02** del contrato de Obras, los cuales fueron entregados en medio físico a satisfacción de la Secretaría de Obras públicas; por consiguiente, **se puede proceder al pago DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 02, del contrato 112 DE 2022.**

Periodo: 08 de noviembre al 25 de noviembre de 2022

Se expide este Informe para trámite de Cobro de **ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 02**

VALOR INICIAL CONTRATO:	**$ 543.454.417,39**
VALOR ADICIONAL N° 01:	**$ 268.540.000,39**
VALOR FINAL TOTAL CONTRATO:	**$ 811.994.417,39**
VALOR ACTA PARCIAL N° 001:	$ 388.124.615,08
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%:	$ 194.062.307,54
TOTAL PAGADO ACTA PARCIAL N° 01:	$ 194.062.307,54
VALOR ACTA PARCIAL N° 002:	**$ 285.546.341,59**
AMORTIZACION ACTA PARCIAL N° 2	**$ 77.124.021,23**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N° 02:	**$ 208.422.320,36**

Es decir, la suma de: DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 36/100 M/L (**$ 208.422.320,36**)

Para constancia, se firma la presente Certificación, en Valledupar, Cesar, a los Veintiocho (28) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022).

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ
Apoyo a la Supervisión.

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
1,30	M2	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE MARCOS	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO







Item No.	Dimensiones: Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	Medida Total
PUERTAS P Y P	1,02	2,48		2,53	4,00	10,12
PUERTAS BODEGA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P Y P	0,90	2,48		2,23	2,00	4,46

Unidad: **M2**

Subtotal: 14,58

Total corte a la fecha: 14,58

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
5,40	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN MARMOL POLIESTERIZADO, FALDONES Y SALPICADERAS, COLOR NEGRO ABSOLUTO DE 12MM DE ESPESOR	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO







Item No.		Dimensiones					Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	CUBIERTA PARA BARRA SUPERIOR EN MARMOL POLIESTERIZADO NEGRO			7,90			7,90
	CUBIERTA PARA BARRA INFERIOR EN MARMOL POLIESTERIZADO NEGRO			8,16			8,16
	CUBIERTA PARA FONDO DE BARRA INTERNA			8,60			8,60
	CUBIERTA PARA BASE INFERIOR BAJO BARRA			6,77			6,77
						Subtotal	31,43
	Unidad: ML					Total corte a la fecha:	31,43

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
8.01	M2	PICADA Y EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERIORES	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO






Item No.	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	Medida Total
BARRA ESTAR ENFERMERAS		1,50	9,50	1,00	1,00	**14,25**
PARED ACCESO HABITACIONES		1,50	15,31	1,00	1,00	**22,97**
ACCESO LATERAL IZQ		1,50	7,50	1,00	1,00	**11,25**
PERIMETRO ACCESO A HOSPITALIZACION		1,50	39,40	1,00	1,00	**59,10**
AREA DE TRABAJO LIMPIO		1,50	10,10	1,00	1,00	**15,15**
AREA DE TRABAJO SUCIO		1,50	1,00	1,00	1,00	**1,50**
MUROS INTERIORES AREAS DE TRABAJO LIMPIO, SUCIO, BODEGAS,		1,60	30,00	1,00	1,00	**48,00**
baño enfermeria		1,60	2,00	1,00	1,00	**3,20**
habitacion p y p N°6		30,00	1,60	1,00	1,00	**48,00**
hab 1 acceso interno		4,00	1,60	1,00	1,00	**6,40**
cuarto lava traperos y hoy cuarto de maquinas		10,00	1,60	1,00	1,00	**16,00**
area de guarda camilla		6,00	1,50	1,00	1,00	**9,00**
muros nuevos area de extraccion leche materna, alimentos, sala de espera. muros habitaciones		20,00	3,00	1,80	1,00	**108,00**
Unidad:				Subtotal		362,82
M2				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022


OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
8,02	M2	EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERNOS MANTENIMIENTO AL EXISTENTE	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO








Item No.	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	N° DE VECES	Medida Total
MUROS MANTENIMIENTO HABITACIONES		1,20	8,15			9,78
		1,20	3,46			4,15
		1,20	5,83			7,00
		2,70	1,40			3,78
						24,71
						148,25
PARED ACCESO HABITACIONES		1,20	15,31	1,00	1,00	18,37
ACCESO LATERAL IZQ		1,20	7,50	1,00	1,00	9,00
PERIMETRO INTERIOR ACCESO A HOSPITALIZACION		1,20	68,90	1,00	1,00	82,68
		1,20				
BARRA ESTAR ENFERMERAS		1,20	7,10	1,00	1,00	8,52
MUROS INTERIORES AREAS DE TRABAJO LIMPIO, SUCIO, BODEGAS,		1,30	30,00	1,00	1,00	39,00
baño enfermeria		1,30	2,00	1,00	1,00	2,60
habitacion p y p N°6		30,00	1,20	1,00	1,00	36,00
hab 1 acceso interno		4,00	1,20	1,00	1,00	4,80
cuarto lava traperos y hoy cuarto de maquinas		10,00	1,20	1,00	1,00	12,00
area de guarda camilla		6,00	1,30	1,00	1,00	7,80
resto de area nueva		84m2				84,00
Unidad:				Subtotal		502,44
M2				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
9,10	M2	PINTURA SOBRE GRANIPLAS EXTERIOR TIPO KORAZA DE PINTUCO	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
lateral acceso desde garita hasta hospitalizacion		2,40	15,00	1,00		**36,00**
fachada ventanales		2,00	25,80	1,00		**51,60**
cerramiento		1,60	26,00	1,00		**41,60**
internos		1,00	20,00	1,00		**20,00**
patio		3,00	17,00	1,00		**51,00**
Unidad:				Subtotal		200,20
M2				**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
9,20	M2	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO







Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
MUROS MANTENIMIENTO HABITACIONES		2,80	8,15			22,82
		2,80	3,46			9,69
		2,80	5,83			16,32
		2,80	1,40			3,92
						52,75
						318,51
PARED ACCESO HABITACIONES		2,80	15,31	1,00	1,00	42,87
ACCESO LATERAL IZQ		2,80	7,50	1,00	1,00	21,00
PERIMETRO INTERIOR ACCESO A HOSPITALIZACION		2,80	68,90	1,00	1,00	192,92
		2,80				
BARRA ESTAR ENFERMERAS		2,80	7,10	1,00	1,00	19,88
MUROS INTERIORES AREAS DE TRABAJO LIMPIO, SUCIO, BODEGAS.		2,80	30,00	1,00	1,00	84,00
baño enfermeria		2,80	2,00	1,00	1,00	5,60
habitacion p y p Nº6		30,00	2,80	1,00	1,00	84,00
hab 1 acceso interno		4,00	2,80	1,00	1,00	11,20
cuarto lava traperos y hoy cuarto de maquinas		10,00	2,80	1,00	1,00	28,00
area de guarda camilla		6,00	2,80	1,00	1,00	16,80
resto de area nueva		84m2				84,00
Unidad:				Subtotal		906,78
M2				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
10,1	und	MARCO EN ALUMINIO CON PESTAÑA 0,08 MAS LUCETA PARA PUERTA DE -0,7-1.0*2,50 INCLUYE INSTALACION	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO






Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
marco puertas de acceso hab				6,00		**6,00**
marco baños hab				6,00		**6,00**
sala ext leche materna				1,00		**1,00**
sala de alimentos				1,00		**1,00**
baño enfermeras				2,00		**2,00**
cuarto trabajo sucio				1,00		**1,00**
cuarto trabajo limpio				1,00		**1,00**
bodegas				2,00		**2,00**
lava traperos				1,00		**1,00**
habitacion de equipos				1,00		**1,00**
Unidad:			Subtotal			22,00
und			**Total corte a la fecha:**			

ARQ. JUAN CARLOS GARCIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
10,02	und	MARCO EN ALUMINIO CON PESTAÑA DE 0.10 PUERTA DOBLE 2,00x250 CON LUCETA	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

2







Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
accesos 1 y 2				2,00		2
					Subtotal	2,00
Unidad:					Total corte a la fecha:	
und						

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA GUERRA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
15,01	M2	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLO PISO EN GRANITO VACIADO EXISTENTE	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO






Item No.	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	Medida Total
PISO HABITACIONES X 6	3,46		5,46		18,89	132,54
	2,71		1,18		3,20	
					22,09	
HALL CIRCULACION	2,50		19,20		48,00	48,00
ESTACION ENFERMERIA	1,80		14,46		26,03	26,03
ACCESO A HOSPITALIZACION 1	2,55		3,10		7,91	7,91
ACCESO HOSPITALIZACION 2	3,20		2,20		7,04	7,04
corredor administracion	2,40		15,00			**36,00**
corredor administracion a hospitalizacion	2,40		14,00			**33,60**
corredor frente a hospitalizacion	2,40		18,00			**43,20**
baño enfermeras	1,77		0,81			**1,43**
zona trabajo sucio	1,70		2,22			**3,77**
zona trabajo limpio	3,10		1,00			**3,10**
bodegas	2,25		1,20			**5,40**
halls interiores	22,00		2,40			**52,80**
						0,00
						0,00
Unidad:				Subtotal		400,82
M2				**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP21	UND	REGISTRO RED WHITE 1/2 PULG. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 PULG Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
MESOPN HAB 6				1,00		1,00
MESON HAB 1				1,00		1,00
BAÑOS 1,2,3,4,5,6				6,00		6,00
RED BAÑO ENFERMERIA				1,00		1,00
RED INTERNA LAVATRAPEROS A BAÑO ENFERMERIA				1,00		1,00
EXTRACCION LECHE MATERNA				1,00		1,00
ALIMENTOS				1,00		1,00
TRABAJO SUCIO				1,00		1,00
TRABAJO LIMPIO				1,00		1,00
GARITA CELADOR				1,00		1,00
						0,00

Unidad:	Subtotal		15.00
UND	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS BARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP22	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
baños habitaciones				6,00		
baño enfermera				1,00		
trabajo sucio				1,00		
trabajo limpio				1,00		
baño celadores garita				1,00		

Unidad:		Subtotal		10,00
UND		Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS RABRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP22	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
baños habitaciones				6,00		6,00
baño enfermera				1,00		1,00
trabajo sucio				1,00		1,00
trabajo limpio				1,00		1,00
baño celadores garita				1,00		1,00
Unidad:				Subtotal		10,00
UND				**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS SARMIENTO AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP25	UND	REJILLA C/SOSCO 3x2 BRONCE ANTICUCARACHA	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
baños habitaciones				6,00		6,00
baño enfermera				1,00		1,00
trabajo sucio				1,00		1,00
trabajo limpio				1,00		1,00
baño celadores garita				1,00		1,00
LAVA TRAPEROS				1,00		1,00
Unidad:				Subtotal		11,00
UND				**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP26	UND	TAPAS PLASTICAS 0.20X0.20 PARA VALVULAS DE PASO	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
baños habitaciones				6,00		6,00
baño enfermera				1,00		1,00
trabajo sucio				1,00		1,00
trabajo limpio				1,00		1,00
baño celadores garita				1,00		1,00
LAVA TRAPEROS				1,00		1,00
SALA DE EXTRACCION LECHE				1,00		1,00
ALIMENTOS				1,00		1,00
MESON HAB 1				1,00		1,00
MESON HAB 6				1,00		1,00
SOBRE CORREDOR HABITA 2 Y 4				2,00		2,00
Unidad:				Subtotal		17,00
UND				**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA CABRERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP27	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



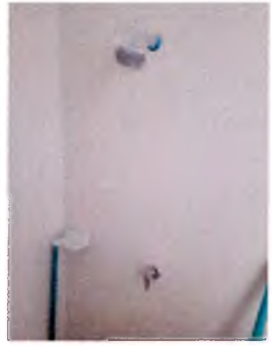

Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
baños habitaciones				6,00		6,00
baño enfermera				1,00		1,00
BAÑO CELADORES GARITA				1,00		1,00
Unidad:				Subtotal		8,00
UND				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS GARRIDO BOLERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP28	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL PORCELANICO PARA LAVAMANOS W.C.	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
HAB 1,2,3,6				4,00	1,00	**4,00**
BAÑO ENFERMERAS				1,00	1,00	**1,00**
BAÑO CELADORES				1,00	1,00	**1,00**
AREA DE TRABAJO LIMPIO				1,00	1,00	**1,00**

Unidad:	Subtotal		7,00
UND	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP37	ML	PICADA Y EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERIORES	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 01	02 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
PUERTAS ACCESO HABITACIONES	1,05	2,45	2,45	5,95	7,00	**41,65**
VENTANALES HABITACIONES HORIZONTAL			3,50	6,00	1,00	**21,00**
PUERTA DE ACCESO ESTAR DE ENFERMERIAS	0,85	2,45	2,45	5,75	4,00	**23,00**
VENTANAS ACCESO HABITACIONES	0,49	0,50	0,99	2,00	8,00	**15,84**
VENTANALES HABITACIONES INTERNOS	1,50	3,00	4,50	2,00	6,00	**54,00**
Unidad: **ML**				Subtotal		155,49
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS SANJIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP38	ML	EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERNOS MANTENIMIENTO AL EXISTENTE	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 01	02 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO







Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
PUERTAS ACCESO HABITACIONES		1,50		2,00	7,00	**14,00**
VENTANAS ACCESO HABITACIONES	0,49	0,50	0,99	2,00	8,00	**15,84**
VENTANALES HABITACIONES	1,50	3,00	4,50	2,00	6,00	**54,00**
PUERTA DE ACCESO GARITA	0,70	2,25	2,25	5,20	1,00	**5,20**
COLUMNAS		2,70		3,00	4,00	**32,40**
MUROS ACCESO		2,70		1,00	1,00	**2,70**
LINEALES INTERNOS AREAS DEMOLIDAS		30,00		1,00	1,00	**30,00**

Unidad:	Subtotal		154,14
ML	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS BARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP41	ML	FILOS Y DILATACIONES	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO







Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
SALA DE ESPERA		2,90			1,00	2,90
DILATACION COLUMNAS HAB 6,5,		2,90		6,00	4,00	69,60
COLUMNAS CORREDOR EXT		2,40		8,00	1,00	19,20
ESTAR DE ENFERMERIA		2,40		6,00	1,00	14,40
ENTRADA A HABITACIONES CAJAS DE CORTE GASES		2,90		8,00	1,00	23,20
ACCESO A HOSPITALIZACION 1 Y 2		2,40		8,00	1,00	19,20
DILATACION EN VIGAS		22,00		1,00	1,00	22,00

Unidad:	Subtotal		170,50
ML	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS GARCIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP42	UND	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural montante superior 2 hojas mobiles en vidrio 5mm templado y 1 fijo 1.50mts x 3.0 mts	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
HABITACIONES 1,2,3,4,5,6				1,00	6,00	6,00
Unidad: UND				Subtotal		6,00
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS SIERRA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP43	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO NATURAL MONTANTE SUPERIOR 4 HOJAS MOBILES vidrio 6mm templado DE 2.00X3,30MTS	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
SALIDA A JARDIN SALA DE ESPERA				1,00	1,00	
					Subtotal	1,00
					Total corte a la fecha:	

Unidad: **UND**

ARQ. JUAN CARLOS SARMA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP44	UND	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural corredizas 0.50 mts x 0,88	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
CORREDOR EXTERIOR HOSPITALIZACION				2,00	1,00	
					Subtotal	2,00
					Total corte a la fecha:	

Unidad: **UND**

ARQ. JUAN CARLOS SARMIENTO AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP45	UND	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural corredizas 0.50 mts x 2,0	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
CORREDOR EXTERIOR HOSPITALIZACION				2,00	1,00	
					Subtotal	2,00
					Total corte a la fecha:	

Unidad: **UND**

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP46	UND	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural corredizas 0.50 mts x 0,68	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
CORREDOR EXTERIOR HOSPITALIZACION				1,00	1,00	

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP47	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CORREDIZA 0.50 a 0,40 MTSX0.50MTS	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO







Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
BAÑOS HABITACIONES				1,00	6,00	**6,00**
SALA EXTRACCION LECHE MATERNA				1,00	1,00	**1,00**
SALON DE ALIMENTOS				1,00	1,00	**1,00**

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP49	M2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, LIJADA, APLICACIÓN DE WASPRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA PROTEXTORES METALICOS EXISTENTES	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
PROTECTORES VENTANALES EXTERNOS HABITACIONES	3,02	1,52		7,00		32,08
Unidad: M2				Subtotal		32,08
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS SARDA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP50	ML	SUMINISTRO E INSTLACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 0.55 MTS	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
MESON HAB 1			2,40			2,40
MESON HAB4			1,20			1,20
MESON HAB 5			1,20			1,20
MESON HAB 6			2,10			2,10
MESON SALA DE EXTRACCION			2,40			2,40
MESON ALIMENTOS			2,30			2,30
MESON AREA DE TRABAJO SUCIO			4,40			4,40
MESON AREA DE TRABAJO LIMPIO			2,40			2,40

Unidad:		Subtotal	18,40
ML		Total corte a la fecha:	

ARQ. JUAN CARLOS GARCIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP51	UND	SUMINISTRO E INSTLACION DE POCETAS METALICA	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
MESON HAB 1				1,00		1,00
MESON HAB4						0,00
MESON HAB 5						0,00
MESON HAB 6				1,00		1,00
MESON SALA DE EXTRACCION				1,00		1,00
MESON ALIMENTOS				1,00		1,00
MESON AREA DE TRABAJO SUCIO				2,00		2,00
MESON AREA DE TRABAJO LIMPIO				1,00		1,00
Unidad: UND				Subtotal		7,00
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP52	UND	SUMINISTRO E INSTLACION DE POCETA METALICA 0.60X0.45 PARA HABITACIONES DE PEDIATRIA	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
MESON HAB4				1,00		1
MESON HAB 5				1,00		1

Unidad:		Subtotal		2,00
UND		**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP53	UND	GRIFERIA PARA POCETA CUELLO DE CISNE DOBLE	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
MESON HAB 1				1,00		1,00
MESON HAB4				1,00		1,00
MESON HAB 5				1,00		1,00
MESON HAB 6				1,00		1,00
MESON SALA DE EXTRACCION				1,00		1,00
MESON ALIMENTOS				1,00		1,00
MESON AREA DE TRABAJO SUCIO				1,00		1,00
MESON AREA DE TRABAJO LIMPIO				1,00		1,00

Unidad:	Subtotal		8,00
UND	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS BARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP54	UND	SUMINISTRO E INSTLACION DE FLUXOMETRO PARA LAVA PATO METALICO ACERO INOXIDABLE	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
FLUXOMETRO AREA DE TRABAJO SUCIO				1,00		

Unidad:		Subtotal	1,00
UND		**Total corte a la fecha:**	

ARQ. JUAN CARLOS BARRIOS AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP57	M2	CIELO RASO PLANO DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO







Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
HALL SALIDA GARITA	10,20		2,35	1,00	1,00	23,97
EXT LECHE Y ALIMENTOS	2,40		4,25		1,00	10,20
SALA DE ESPERA	2,00		4,50		1,00	9,00
PISO HABITACIONES X 6	3,46		5,46		18,89	132,54
	2,71		1,18		3,20	
					22,09	
HALL CIRCULACION	2,50		19,10		47,75	47,75
ESTACION ENFERMERIA	2,20		19,00		41,80	41,80
ACCESO A HOSPITALIZACION 1	2,55		3,10		7,91	7,91
ACCESO HOSPITALIZACION 2	3,20		2,20		7,04	7,04
TOTAL PAGADO ACTA 1						**280,20**
AREA DE HOSPITALIZACION CIELO RAZO TOTAL						**310,00**
REPARACIONES SOBRE CIRCULACION PASILLO EXTERIOR HOSPITALIZACION - SALIDA GARITA - ADMINISTRACION	10,20		2,35			**23,97**
TOTAL LAS 2 AREAS						**333,97**
MENOS PAGADO ACTA 1						**-280,20**
TOTAL A PAGAR ACTA 2						**53,77**

Unidad:		Subtotal	53,77
M2		**Total corte a la fecha:**	

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP63	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" (TUBERIA SOPORTADA, PINTADA, RITULADA Y SOLDADURA AL 5% (INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO







Item No.	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
TUBERIA DE COBRE EN PARED HAB		1,40		1,00	10,00	14,00
TUBERIA DE COBRE SOBRE HABITACION		6,00		1,00	10,00	60,00
TUBERIA SOBRE CORREDOR CIRCULACION		76,00		1,00	1,00	76,00
				Subtotal		150,00
Unidad: ML				**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS GARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP64	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" (TUBERIA SOPORTADA, PINTADA, RITULADA Y SOLDADURA AL 5% (INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
TUBERIA DE COBRE EN PARED HAB		1,40		1,00	10,00	14,00
TUBERIA DE COBRE SOBRE HABITACION		6,00		1,00	10,00	60,00
TUBERIA SOBRE CORREDOR CIRCULACION		76,00		1,00	1,00	76,00
Unidad:				Subtotal		150,00
ML				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS BARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP65	UND	SUMINISTRO E INSTLACION DE VALVULAS 3/4 (VALVULA EN ACERO INOXIDABLE4 TORNILLOS, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
VALVULAS 3/4 EN CAJA DE CORTE DE GASES				2,00		2,00

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP66	UND	SUMINISTRO E INSTLACION DE VALVULAS 1/2 (VALVULA EN ACERO INOXIDABLE4 TORNILLOS, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
VALVULAS 1/2EN CAJA DE CORTE DE GASES				2,00		2,00

Unidad:	Subtotal		2,00
UND	Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP67	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CORTE DE 2 GASES (FABRICACION NACIONAL, VALVULA 4 TORNILLOS EN BRONCE SOLDABLE TRES PIEZAS, PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
CAJA DE CORTE DE 2 GASES EN PASILLO FRENTE A ESTACION DE ENFERMERIA				1,00		1,00

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP69	UND	TOMA DE SALIDA DE PARED DE OXIGENO TIPO CHEMETROM	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO







Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
TOMAS DE SALIDA DE PARED OXIGENO HAB 1,6				2,00		2,00
TOMAS DE SALIDA DE PARED OXIGENO HAB 2,3,4,5				8,00		8,00
Unidad:				Subtotal		10,00
UND				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022


OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP70	UND	TOMA DE SALIDA DE PARED DE VACIO TIPO CHEMETROM	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





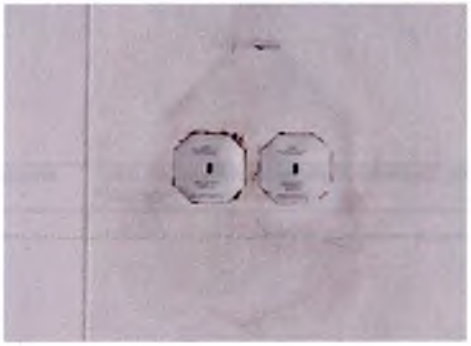

Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
TOMAS DE SALIDA DE PARED VACIO HAB 1,6				2,00		2,00
TOMAS DE SALIDA DE PARED VACIO HAB 2,3,4,5				8,00		8,00

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP86	UND	SUMINISTRO ADECUACION Y MONTAJE DE GABINETE TIPO PESADO CON BARRAJE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 24 CTOS 3F, 3+ N+ T, 250A CERTIFICADO CON PUERTA	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	TRANSVERSALES					
GABINETE PESADO INCLUYE TOTALIZADOR 24 CTOS CUARTO ELECTRICO Y EQUIPOS				1,00		1,00
Unidad: UND				Subtotal		1,00
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS BARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP87	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA ONLINE 10 KVA 220V 10 MINT.AUTONOMIA	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	TRANSVERSALES					
UPS BIFASICA 10KVA 220V 10 MINS AUTONOMIA				1,00		1,00
Unidad:				Subtotal		1,00
UND				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS GARCIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP88	ML	CABLE F/UTP CAT 6A LSZH 305MTRS POWEST	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO







Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	TRANSVERSALES					
AREA DE HABITACIONES 1,2,3,4,5,6 SOBRE CIELO RAZO HASTA CUARTO DE TABLEROS Y MAQUINA			60,00		6,00	360,00
SOBRE HALL DE CIRCULACION SALA DE EXTRACCION MATERNA - AMBIENTE DE ALIMENTOS			136,00		1,00	136,00
EN ESTAR ENFERMERIA Y AMBIENTES POSTERIORES			18,00		8,00	144,00
BAÑOS			36,00		6,00	**216,00**
complemento habitaciones			40,00		6,00	240,00
sala de espera			80,00		1,00	80,00
complemento baños			34,00		6,00	204,00
cuarto de equipos			6,00		6,00	36,00
Unidad:			Subtotal			1416,00
ML			**Total corte a la fecha:**			

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP89	UND	JACK AZUL CAT 6A UTP POWEST	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
JACK AZUL CAT 6A UTP POWEST						

Unidad:	Subtotal		0.00
UND	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS GARCIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP90	UND	SWITCH D-LINK 24 PUERTOS GBPS + 2 PUERTOS SFP 100/1000MBPS SMART MAN	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
SWITCH D-LINK 24 PUERTOS GBPS + 2 PUERTOS SFP 100/1000MBPS SMART MAN				1,00		1,00

Unidad:	Subtotal		1,00
UND	Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS GARCIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP91	UND	PATCH CORD UTP CAT 6A 3FT AZUL POWEST	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO	Item No.	Dimensiones					Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	PATCH CORD UTP CAT 6A 3FT AZUL POWEST				32,00		32,00

PATCH CORD



ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AC	ORES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR	Unidad:	Subtotal		32,00
CONTRATISTA DE OBRA		UND	Total corte a la fecha:		

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP92	UND	PATCH CORD UTP CAT 6A 7FT AZUL POWEST	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO	Item No.	Dimensiones					Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	PATCH CORD UTP CAT 6A 7FT AZUL POWEST				32,00		32,00

ARQ. JUAN CARLOS BARRIA AGUILERA CONTRATISTA DE OBRA	ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO	Unidad: UND	Subtotal	32,00
			Total corte a la fecha:	

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP93	UND	UPS ONLINE 3KVA MARCA ATLANTIC POWER - 3 MINUTOS DE AUTONOMÍA	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
UPS ONLINE 3KVA MARCA ATLANTIC POWER - 3 MINUTOS DE AUTONOMÍA				1,00		1,00
					Subtotal	1,00
Unidad: UND					Total corte a la fecha:	

ARQ. JUAN CARLOS SIERRA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP94	UND	RECEPTOR	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO	Item No.	Dimensiones					Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
							
	RECEPTOR				1,00		1,00
	Unidad: UND			Subtotal			1,00
				Total corte a la fecha:			

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO


Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP95	UND	LLAMADORES DE CAMILLA	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO

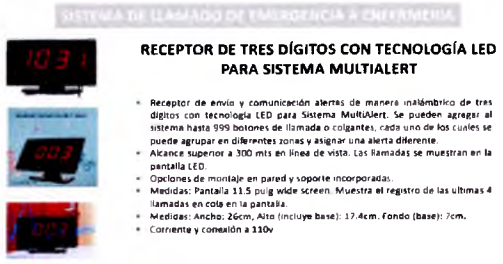

Item No.	Dimensiones: Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	Medida Total
LLAMADORES DE CAMILLA 1 POR HABITACION +1 POR BAÑO				11,00		11,00

Unidad: **UND**

Subtotal: 11,00

Total corte a la fecha:

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP96	UND	Servicio de INSTALACION FISICA, CONFIGURACION Y CAPACITACION de la solución DE LLAMADORES Y RECEPTOR	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
Servicio de INSTALACION FISICA, CONFIGURACION Y CAPACITACION de la solución DE LLAMADORES Y RECEPTOR				1,00		1,00
Unidad: UND				Subtotal		1,00
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS BARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP97	UND	GABINETE DE PISO 60X60X45U (AXPXAL)	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
GABINETE DE PISO 60X60X45U (AXPXAL)				1,00		1,00

Unidad:	Subtotal		1,00
UND	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP98	UND	BANDEJA REJIBAND TIPO MALLA 60x300 C8 Tramo 3m	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
BANDEJA REJIBAND TIPO MALLA 60x300 C8 Tramo 3m SOBRE HABITACION DE EQUIPOS				2,00		2,00
Unidad: UND				Subtotal		2,00
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS SANTA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP99	UND	SALIDA DE TUBO BANDEJA REJIBAND REJIBAND	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO	Item No.	Dimensiones					Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
							
	SALIDA DE TUBO BANDEJA REJIBAND REJIBAND				12,00		12,00
	Unidad: UND				Subtotal		12,00
					Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

UNION CURV

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP100	UND	UNION CURVAS REJIBAND EZ	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO	Item No.	Dimensiones					Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	UNION CURVAS REJIBAND EZ				12,00		12,00

ARQ. JUAN CARLOS SA[illegible]AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Unidad:	Subtotal		12,00
UND	**Total corte a la fecha:**		

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP101	UND	UNION REFORZADA EZ	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
UNION REFORZADA EZ				2,00		2,00
Unidad: UND				Subtotal		2,00
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP102	UND	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8 X 3M	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8 X 3M				1,00		1,00
Unidad: UND				Subtotal		1,00
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP103	UND	PERNO MULTIPROPOSITO PARA VARILLA 3/8	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
PERNO MULTIPROPOSITO PARA VARILLA 3/8				1,00		1,00

Unidad:	Subtotal		1,00
UND	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS GARCIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP104	UND	BORNA DE TIERRA - LATON PARA BANDEJA REJIBAND TIPO MALLA	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
BORNA DE TIERRA - LATON PARA BANDEJA REJIBAND TIPO MALLA				6,00		6,00
Unidad: UND				Subtotal		6,00
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP105	UND	Tubo conduit PVC 3/4" x 3m	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO





Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
Tubo conduit PVC 3/4" x 3m DESDE HABITACIONES, BAÑOS, ESTAR DE ENFERMERIA, SALA DE ESPERA, Y OTROS.				90,00		90,00

Unidad:	Subtotal		90,00
UND	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP106	UND	PATCH PANEL PLANO 6A F/UTP 24 PUERTOS INCLUYE HERRAJE POWEST	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
PATCH PANEL PLANO 6A F/UTP 24 PUERTOS INCLUYE HERRAJE POWEST				1,00		1,00
					Subtotal	1,00
					Total corte a la fecha:	

Unidad: **UND**

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP107	UND	FACEPLATE DOBLE	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
FACEPLATE DOBLE				19,00		19,00
Unidad: **UND**				Subtotal		19,00
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS PARRA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP108	UND	TAPA ESPACIO PARA FACE PLATE	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
TAPA ESPACIO PARA FACE PLATE				9,00		9,00

Unidad:	Subtotal		9,00
UND	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS SARMIENTO AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP109	UND	Tubo conduit PVC1" x 3m	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 01	02 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	TRANSVERSALES					
AREA DE HABITACIONES 1,2,3,4,5,6 SOBRE CIELO RAZO HASTA CUARTO DE TABLEROS Y MAQUINA			8,00		6,00	48,00
SOBRE HALL DE CIRCULACION SALA DE EXTRACCION MATERNA - AMBIENTE DE ALIMENTOS			40,00		1,00	40,00
EN ESTAR ENFERMERIA Y AMBIENTES POSTERIORES			16,00		1,00	16,00
BAÑOS			6,00		6,00	36,00

Unidad:	Subtotal		140,00
UND	**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP110	UND	Caja de Paso 40X40X20 cm C20	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 01	02 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	TRANSVERSALES					
ENTRE GABINETE Y ALIMENTADOR				1,00	1,00	1,00
Unidad:				Subtotal		1,00
UND				**Total corte a la fecha:**		

ARQ. JUAN CARLOS [illegible] AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP112	UND	NVR 8MP 4K, 16 CH IP, 16 PUERTOS POE, 2 BAHIAS DD, SWITCH POE 300MTRS, HDMI 4K, incluye disco duro de 4tb purple wd 24/7	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones				Nº DE VECES	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad		
	TRANSVERSALES					
NVR 8MP 4K, 16 CH IP, 16 PUERTOS POE, 2 BAHIAS DD, SWITCH POE 300MTRS, HDMI 4K, incluye disco duro de 4tb purple wd 24/7				1,00		1,00
Unidad: UND			Subtotal			1,00
			Total corte a la fecha:			

ARQ. JUAN CARLOS GARCIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP113	UND	Cámara IP PRO Serie IPC 4MP Tipo DOMO 2.8mm Lente Fijo SMALL	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	TRANSVERSALES					
Cámara IP PRO Serie IPC 4MP Tipo DOMO 2.8mm Lente Fijo SMALL				12,00		12,00
HABITACIONES 1,2,3,4,5,6				6,00		
ESTAR ENFERMERIA				3,00		
SALA DE ESPERA				1,00		
SALIDAS				2,00		
Unidad:			Subtotal			12,00
UND			Total corte a la fecha:			

ARQ. JUAN CARLOS GARCIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

Secretaria de Obras Publicas Municipal — Alcaldia de Valledupar

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 112 - SOP DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte	Fecha
INP120	UND	Medición tramos cableado, Sondeo, orientaciones básicas en obra civil para distribución, trabajo en altura, organización acopio, parametrización y configuración en móviles. Tratamiento a 15 puntos	AREA DE HOSPITALIZACION HEAD	ACTA 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



Item No.	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud	Cantidad	Nº DE VECES	
	TRANSVERSALES					
Medición tramos cableado, Sondeo, orientaciones básicas en obra civil para distribución, trabajo en altura, organización acopio, parametrización y configuración en móviles. Tratamiento a 15 puntos				1,00		1,00
Unidad: UND				Subtotal		1,00
				Total corte a la fecha:		

ARQ. JUAN CARLOS GARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE APOYO

JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
ARQUITECTO CONSTRUCTOR-INTERVENTOR-DISEÑADOR-CONSULTOR

Valledupar 25 de noviembre del 2022.

Señores:
Secretaria de Obras Publicas
Ingeniero EFRAIN QUINTERO TERNERA
Secretario de Obras Publicas
Arq. EDUARDO MONSALVO RODRIGUEZ
Supervisor de apoyo técnico

Asunto: CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 112 – SOP -DE 2022, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de contratista de obra del contrato de la referencia y me permito CERTIFICAR:

Que yo, JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA, identificado con la cedula de ciudadanía Nº12.647.743 de Valledupar, en mi calidad de contratista de obra del contrato de obra pública de la referencia, me encuentro a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, hasta la fecha.

Igualmente certifico que JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA, ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, con el pago de tales aportes.

JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

CARRERA 13 A # 6B-62 BARRIO LOS ANGELES EN VALLEDUPAR – CESAR, CEL:3016756861, CORREO ELECTRONICO juancasarria@hotmail.com – juansarria80@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12647743
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 13A N 6- 20B - 62	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4467320948**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991890637

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 384.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 624.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 150.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 337.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 487.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	3	$ 156.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 156.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 194.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 194.300**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	$ 78.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	$ 117.000
		SUBTOTAL:		**$ 195.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.656.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12647743
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 13A N 6- 20B - 62	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4467320948**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991890637

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 384.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 624.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 150.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 337.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 487.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	3	$ 156.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 156.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 194.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 194.300**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	$ 78.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	$ 117.000
		SUBTOTAL:		**$ 195.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.656.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12647743
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 13A N 5- 20B - 62	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4467320948			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0991890837		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES:										$ 624.000	$ 0	$ 624.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 337.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.500	$ 0	$ 0	$ 337.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 150.000
SUBTOTALES:													$ 487.500	$ 0	$ 0	$ 487.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 194.300	$ 194.300	$ 0	$ 0	$ 194.300	
SUBTOTALES:									$ 194.300	$ 0	$ 0	$ 194.300	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	3	$ 156.000	$ 0	$ 156.000
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 0	$ 156.000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 117.000	$ 0	$ 117.000
PASENA	PASENA - SENA	3	$ 78.000	$ 0	$ 78.000
SUBTOTALES:			$ 195.000	$ 0	$ 195.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	ING	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 12646672	MARTINEZ PEÑALOZA JOSE JORGE	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS002-SALUD TOTAL	1.200.000	$ 150.000	$ 0	$ 150.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1.200.000	12647743	$ 6.300	1.200.000	CCF15-COMFACESAR	$ 48.000	$ 24.000	$ 36.000	$ 0	$ 0
2	CC 12548060	PEREZ CORDERO ALEXANDRA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		NO								01-30								230301-PORVENIR	1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS002-SALUD TOTAL	1.500.000	$ 187.500	$ 0	$ 187.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1.500.000	12647743	104.400	1.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 60.000	$ 30.000	$ 45.000	$ 0	$ 0
3	CC 77185862	MENDOZA JUAREZ CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		NO								01-30								25-14 COLPENSIONES	1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS005-SANITAS S.A.	1.200.000	$ 150.000	$ 0	$ 150.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1.200.000	12647743	$ 83.600	1.200.000	CCF15-COMFACESAR	$ 48.000	$ 24.000	$ 36.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.656.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12647743
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 13A N 6- 20B - 62	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4472522583**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992117139

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 352.000
SUBTOTAL:			1	**$ 352.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 275.000
SUBTOTAL:			1	**$ 275.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 44.000
SUBTOTAL:			1	**$ 44.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 11.500
SUBTOTAL:			1	**$ 11.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 682.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12647743
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 13A N 6- 208 - 62	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4472522583	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992117139

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										$ 352.000	$ 0	$ 352.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 44.000	$ 0	$ 44.000
SUBTOTALES:			$ 44.000	$ 0	$ 44.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 12647743	SARRIA AGUILERA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.500.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 1	$ 1	Normal	$ 352.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.200.000	$ 12647743	$ 11.500	30	$ 2.200.000	CCF15-COMFACESAR	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 682.500

Certificación Bancaria

Bancolombia

Martes, 08 de noviembre de 2022

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA** identificado(a) con C.C. **12647743** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	197-000044-90	2022/09/06	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
ARQUITECTO CONSTRUCTOR-INTERVENTOR-DISEÑADOR-CONSULTOR

Valledupar 25 de noviembre del 2022.

Señores:
Secretaria de Obras Publicas
Ingeniero EFRAIN QUINTERO TERNERA
Secretario de Obras Publicas
Arq. EDUARDO MONSALVO RODRIGUEZ
Supervisor de apoyo técnico

Asunto: RENUNCIA VOLUNTARIA A TRAMITE DESEMBOLSO ANTICIPO ADICONAL.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 112 – SOP -DE 2022, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

Cordial saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de contratista de obra del contrato de la referencia y me permito realizar renuncia voluntaria a tramite de desembolso del anticipo del adicional del contrato de obra N°112 – SOP -DE 2022, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

Es mi voluntad mantener la dinámica de ejecución de obra sin desmejorar el flujo financiero de la misma y si aplicar el cobro actas de avance de obra parciales, según ejecución de obra.

Agradezco de antemano dar trámite a la presente.

Cordialmente,

JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
CONTRATISTA DE OBRA

CARRERA 13 A # 6B-62 BARRIO LOS ANGELES EN VALLEDUPAR – CESAR, CEL:3016756861, CORREO ELECTRONICO juancasarria@hotmail.com – juansarria80@gmail.com

CONTRATO DE OBRA No. 112 – SOP DEL 2022 del DEL 12 DE AGOSTO DEL 2022.








OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

CONTRATISTA: ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

PERIODO DEL INFORME: 08 DE NOVIEMBRE 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

SUPERVISOR: ING. EFRAIN QUINTERO TERNERA

INFORME DE AVANCE DE OBRA N°2

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS DE LA OBRA
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
4. GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA
5. INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
6. AVANCES DE PLAZOS CONTRACTUALES
7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
8. CONTROL DEL ESTADO DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INTRODUCCION.

El Arquitecto **JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA**, en su calidad de Contratista, tiene como único fin, cumplir con las obligaciones establecidas por **LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR - CESAR**, en el contrato de obra **N°112 – SOP DE 2022 del 12 DE AGOSTO DEL 2022**, bajo un contexto de calidad y eficiencia.

Con el objeto de dar a conocer el avance y estado de las actividades de la **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR".**

El actual informe se elaboró de acuerdo con los compromisos adquiridos con la **ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR - CESAR**. Y en las obligaciones contractuales del contrato de obra **N°112 – SOP DE 2022 del 12 DE AGOSTO DEL 2022.**

OBJETIVOS

- GENERAL

Dar cumplimiento al objeto contractual del presente contrato de obra, e Informar a la entidad contratante, acerca de los avances en la ejecución y desarrollo de la obra, de la **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR".**

ESPECIFICO:

Realizar una correcta inversión de los recursos destinados para la ejecución del contrato de obra **N°01-2207-22 del 22 DE JULIO DEL 2022.** Y dar estricto cumplimiento al objeto contractual.

Cumplir con los plazos establecidos inicialmente para la ejecución del contrato de obra.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS DE LA OBRA
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
4. GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA
5. INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
6. AVANCES DE PLAZOS CONTRACTUALES
7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
8. CONTROL DEL ESTADO DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA No. 112 – SOP DEL 2022 del DEL 12 DE AGOSTO DEL 2022.



OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"

CONTRATISTA: ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

PERIODO DEL INFORME: 08 DE NOVIEMBRE 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

SUPERVISOR: ING. EFRAIN QUINTERO TERNERA

INFORME DE AVANCE DE OBRA N°2

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR

LOCALIZACION DEL PROYECTO



LOCALIZACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - DENTRO DE COLOMBIA



LOCALIZACION DE VALLEDUPAR DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

UBICACION SATELITAL DEL HEAD SEDE SAN MARTIN



GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°:	**N°112 – SOP DE 2022, 12 DE AGOSTO- 2022.**
OBJETO:	**"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"**
CONTRATISTA:	**ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**"QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($543.454.417,39)"**
VALOR ADICION EN VALOR N°1:	**DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($268.540.000,00)**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**"CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($811.994.417,39)"**
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**CUATRO (04) MESES**
FECHA DE INICIO DE OBRAS:	**31 DE AGOSTO DEL 2022**
FECHA TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	**31 DE DICIEMBRE DEL 2022**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ING. EFRAIN QUINTERO TERNERA**
SUPERVISOR DE APOYO:	**ARQ. EDUARDO MONSALVO RODRIGUEZ**

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	AMPARO	NUMERO DE LA POLIZA	VIGENCIA DESDE - HASTA		VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	CUMPLIMIENTO	47-44-101021311	31-ago.-22	1-jul.-23	$81.199.441,74
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES	47-44-101021311	31-ago.-22	31-dic.-25	$40.599.720,87
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	47-44-101021311	31-dic.-22	31-dic.-27	$243.598.325,22
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO	47-44-101021311	31-ago.-22	1-jul.-23	$405.997.208,70
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	47-40-101006447	31-ago.-22	31-dic.-22	$200.000.000,00

PÓLIZAS CONTRACTUALES. VIGENTES SEGÚN MODIFICACION DE ADICION Nº1 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2022.

INFORME FINANCIERO DE OBRA

AVANCE FISICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 543.454.417,39
VALOR ADICION N°1	$ 268.540.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 811.994.417,39
VALOR TOTAL EJECUTADO AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$ 674.752.716,51
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 137.241.700,88**

AVANCE FINANCIERO

ANTICIPO DEL 50% del valor inicial del contrato:	$ 271.727.208,69
VALOR FACTURADO ACTA 1:	$ 389.206.374,92
VALOR FACTURADO ACTA 2:	$ 285.546.341,59
VALOR FACTURADO ACTA 3:	
VALOR TOTAL FACTURADO:	$ 674.752.716,51
VALOR POR FACTURAR:	**$ 137.241.700,88**

CONTROL AMORTIZACION ANTICIPO

TOTAL ANTICIPO	**$ 271.727.208,69**
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 1	**$ 194.062.307,54**
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 2	**$ 77.664.901,16**
TOTAL AMORTIZADO	**$ 271.727.208,69**
TOTAL POR AMORTIZAR	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ACTA 2	**$ 208.422.320,36**

EJECUCION ACTUAL: INFORME DE AVANCE 2

AVANCES DE PLAZOS CONTRACTUALES

Contrato de obra



VALLEDUPAR	ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"	INFORME N°2 AVANCE DE OBRA ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

CAPITULOS Y ACTIVIDADES CONTRATADAS ORIGINALES Y ACTUALIZADAS

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRATADAS						NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N°1		ACTA DE AVANCE DE OBRA N°1		ACTA DE AVANCE DE OBRA N°2		CANTIDADES Y VALORES POR EJECUTAR		CANTIDADES Y VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
														CONDICIONES	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES	VR. TOTAL	CANTIDADES	VR. TOTAL			CANTIDADES	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES														
1,10	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	50,00	17.460,00	873.000,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
1,20	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	M2	320,00	17.460,00	5.587.200,00	320,00	5.587.200,00	320,00	5.587.200,00	-	-	0,00	-	320,00	5.587.200,00
1,30	DESMONTE DE PUERTAS incluye marcos	m2	70,00	14.805,00	1.036.350,00	70,00	1.036.350,00	55,51	821.807,78	14,49	214.542,22	0,00	-	70,00	1.036.350,00
1,40	DESMONTE DE MUEBLES BAJO MESONES	ML	35,00	24.148,00	845.180,00	55,00	1.328.140,00	55,00	1.328.140,00	-	-	0,00	-	55,00	1.328.140,00
1,50	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS	UN	8,00	53.298,00	426.384,00	14,00	746.172,00	14,00	746.172,00	-	-	0,00	-	14,00	746.172,00
1,60	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	UN	8,00	85.304,00	682.432,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
1,70	DEMOLICION ENCHAPES	M2	480,00	9.300,00	4.464.000,00	400,00	3.720.000,00	400,00	3.720.000,00	-	-	0,00	-	400,00	3.720.000,00
1,80	DEMOLICION PLANTILLA	M2	96,00	14.805,00	1.421.280,00	70,00	1.036.350,00	70,00	1.036.350,00	-	-	0,00	-	70,00	1.036.350,00
1,90	RETIRO DE TUBERIAS AGUAS NEGRAS DE 2,3,4,6"	ML	90,00	6.800,00	612.000,00	90,00	612.000,00	90,00	612.000,00	-	-	0,00	-	90,00	612.000,00
1,10	DEMOLICION PISOS EN BALDOSA DE GRANITO INLUYE RETIRO	M2	96,00	8.500,00	816.000,00	70,00	595.000,00	70,00	595.000,00	-	-	0,00	-	70,00	595.000,00
1,11	EXCAVACION MANUALPARA TUBERIA NUEVA DE AGUAS NEGRAS BAÑOS	M3	16,00	35.028,00	560.448,00	8,00	280.224,00	8,00	280.224,00	-	-	0,00	-	8,00	280.224,00
1,12	ACARREO MATERIAL REUTILIZABLE PARA CENTRO DE ACOPIO	M3	30,00	26.134,00	784.020,00	60,00	1.568.040,00	60,00	1.568.040,00	-	-	0,00	-	60,00	1.568.040,00
1,13	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	80,00	46.092,00	3.687.360,00	80,00	3.687.360,00	80,00	3.687.360,00	-	-	0,00	-	80,00	3.687.360,00
										-					
	SUBTOTAL				21.795.654,00		20.196.836,00		19.982.293,78		214.542,22		-		20.196.836,00
2	PISOS														
2,1	PLANTILLA DE NIVELACION CONTRA PISO E=0,07CM	M2	96,00	40.570,00	3.894.720,00	70,00	2.839.900,00	70,00	2.839.900,00	-	-	0,00	-	70,00	2.839.900,00
2,2	PISO EN BALDOSA DE GRANITO .33X.33. MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO CON PULIR	M2	96,00	121.756,00	11.688.576,00	70,00	8.522.920,00	70,00	8.522.920,00	-	-	0,00	-	70,00	8.522.920,00
	SUBTOTAL				15.583.296,00		11.362.820,00		11.362.820,00		-		-		11.362.820,00
3	MAMPOSTERIA														
3,1	MURO SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE MORTERO 1:4	M2	25,00	71.969,00	1.799.225,00	75,00	5.397.675,00	75,00	5.397.675,00	-	-	0,00	-	75,00	5.397.675,00
3,2	MURO DOBLE 0.25, LADRILLO COMUN .07X.11X.22, INCLUYE MORTERO 1:4 EN CUCHILLAS	M2	25,00	138.806,00	3.470.150,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	SUBTOTAL				5.269.375,00		5.397.675,00		5.397.675,00		-	0,00	-		5.397.675,00
4	PAÑETES														
4,1	PAÑETE LISO MUROS	M2	480,00	34.592,00	16.604.160,00	480,00	16.604.160,00	480,00	16.604.160,00	-	-	0,00	-	480,00	16.604.160,00
4,2	PAÑETES MENORES DE 50CM	ML	106,00	29.800,00	3.158.800,00	184,00	5.483.200,00	184,00	5.483.200,00	-	-	0,00	-	184,00	5.483.200,00
	SUBTOTAL				19.762.960,00		22.087.360,00		22.087.360,00		-		-		22.087.360,00

	ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA	
VALLEDUPAR	"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"	INFORME N°2 AVANCE DE OBRA ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

5	ENCHAPES														
5,1	ENCHAPE CERAMICA .35X.20 EN BAÑOS Y ESPACIOS DE ASEO Y LIEMPIEZA POR TRES CARAS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. PARED Y PISO	M2	160,00	76.191,00	12.190.560,00	170,00	12.952.470,00	170,00	12.952.470,00	-	-	0,00	-	170,00	12.952.470,00
5,2	ENCHAPE CERAMICA .35X.20 EN BAÑOS Y ESPACIOS DE ASEO Y LIEMPIEZA POR TRES CARAS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. PARED Y PISO	M2	58,00	76.191,00	4.419.078,00	32,00	2.438.112,00	32,00	2.438.112,00	-	-	0,00	-	32,00	2.438.112,00
5,3	ENCHAPE CERAMICA .35X.20 EN BAÑOS Y ESPACIOS DE ASEO Y LIEMPIEZA POR TRES CARAS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. PARED Y PISO	ML	80,00	42.871,00	3.429.680,00	55,00	2.357.905,00	55,00	2.357.905,00	-	-	0,00	-	55,00	2.357.905,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES EN MARMOL POLIESTERIZADO, FALDONES Y SALPICADERAS, COLOR NEGRO ABSOLUTO DE 12MM DE ESPESOR	ML	12,00	725.500,00	8.706.000,00	16,00	11.608.000,00		-	16,00	11.608.000,00	0,00	-	16,00	11.608.000,00
5,5	MEDIACAÑA EN CIELO RASO ESPECIAL PARA HOSPITALES Y CLINICAS	ML	345,00	26.200,00	9.039.000,00	345,00	9.039.000,00	345,00	9.039.000,00	-	-	0,00	-	345,00	9.039.000,00
	SUBTOTAL				37.784.318,00		38.395.487,00		26.787.487,00		11.608.000,00		-		38.395.487,00
6	CIELO FALSO Y CUBIERTA														
6.1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO	M2	50,00	39.668,00	1.983.400,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
6.2	CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #8, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINO Y PINTADO.	M2	320,00	116.871,00	37.398.720,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
6.3	MURO EN LAMINA FIBROCEMENTO SUPERBOARD #8, INCLUYE ESTRCUTURA PERFIL DE ALUMINIO Y PINTURA	M2	32,00	233.742,00	7.479.744,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
6.4	SUMINISTRO E EINSTALACION DE CABALLETES FIJOS, PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 INCLUYE ACCESORIOS GANCHOS Y TORNILLOS	ML	30,00	73.525,00	2.205.750,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	SUBTOTAL				49.067.814,00		-		-		-		-		-
7	IMPERMEABILIZACION														
7.1	MANTO ASFALTICO 3MM, ICLUYE ALUMOL CUBIERTA	M2	380,00	44.800,00	17.024.000,00	660,00	29.568.000,00	660,00	29.568.000,00	-	-	0,00	-	660,00	29.568.000,00
	SUBTOTAL				17.024.000,00		29.568.000,00		29.568.000,00		-		-		29.568.000,00
8	ESTUCOS														
8.1	PICADA Y EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERIORES	M2	480,00	28.026,00	13.452.480,00	280,00	7.847.280,00	140,00	3.923.640,00	140,00	3.923.640,00	0,00	-	280,00	7.847.280,00
8.2	EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERNOS MANTENIMIENTO AL EXISTENTE	M2	420,00	19.990,00	8.395.800,00	500,00	9.995.000,00	250,00	4.997.500,00	250,00	4.997.500,00	0,00	-	500,00	9.995.000,00
	SUBTOTAL				21.848.280,00		17.842.280,00		8.921.140,00		8.921.140,00		-		17.842.280,00
9	PINTURAS														
9.1	PINTURA SOBRE GRANIPLAS EXTERIOR TIPO KORAZA DE PINTUCO	M2	260,00	19.115,00	4.969.900,00	200,00	3.823.000,00	0,00	-	100,00	1.911.500,00	100,00	1.911.500,00	100,00	1.911.500,00
9.2	PINTURA EPOXICA PARA MUROS INTERIORES	M2	900,00	39.184,00	35.247.600,00	900,00	35.247.600,00	0,00	-	900,00	35.247.600,00	0,00	-	900,00	35.247.600,00
	SUBTOTAL				40.217.500,00		39.070.600,00		-		37.159.100,00		1.911.500,00		37.159.100,00
10	CARPINTERIA METALICA														
10.1	MARCO EN ALUMINIO CON PESTAÑA 0,08 MAS LUCETA PARA PUERTA DE -0,7-1,0*2,50 INCLUYE INSTALACION	UN	20,00	298.000,00	5.960.000,00	21,00	6.258.000,00	0,00	-	21,00	6.258.000,00	0,00	-	21,00	6.258.000,00
10.2	MARCO EN ALUMINIO CON PESTAÑA DE 0.10 PUERTA DOBLE 2,00x250 CON LUCETA	UN	3,00	698.500,00	2.095.500,00	2,00	1.397.000,00	0,00	-	2,00	1.397.000,00	0,00	-	2,00	1.397.000,00
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION CERCHA EN PERFIL PHR-C 220X80 CAL. 14-2MM-INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE PARA AUMENTO DE CAPACIDAD DE CARGA DEL CIELO RAZO NUEVO.	ML	120,00	114.500,00	13.740.000,00	44,00	5.038.000,00	44,00	5.038.000,00	-	-	0,00	-	44,00	5.038.000,00
10.4	MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA METALICA BAJO CUBIERTAS EXISTENTES INCLUYE LIJADA, MATERIALES, MANO DE OBRA ACABADO	ML	100,44	26.531,71	2.664.844,97	104,00	2.759.297,86	104,00	2.759.297,86	-	-	0,00	-	104,00	2.759.297,86
	SUBTOTAL				24.460.344,97		15.452.297,86		7.797.297,86		7.655.000,00		-		15.452.297,86
11	CARPINTERIA EN MADERA														
11.1	PUERTAS EN MADERA MELAMINICAS 0,70 - 1.0, INCLUYE PINTURAS, CERRADURA E INSTALACION	UN	20,00	768.500,00	15.370.000,00	21,00	16.138.500,00	0,00	-	-	-	21,00	16.138.500,00	0,00	-
11.2	PUERTAS DOBLE EN MADERA MELAMINICAS DE 1,80 DE ANCHO X 2,50 INCLUYE , CERRADURA E INSTALACION	UN	3,00	2.071.044,46	6.213.133,39	2,00	4.142.088,93	0,00	-	-	-	2,00	4.142.088,93	0,00	-
11.3	Suministro de vidrios laminado transparente de 6mm, varias medidas sobre marcos de las puertas	M2	16,00	121.245,11	1.939.921,76	12,00	1.454.941,32	0,00	-	-	-	12,00	1.454.941,32	0,00	-
	SUBTOTAL				23.523.055,15		21.735.530,24		-		-		21.735.530,24		-

	ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA	
VALLEDUPAR EN ORDEN	"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"	INFORME N°2 AVANCE DE OBRA ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

12	APARATOS SANITARIOS														
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA HOSPITALARIA, COMPLETO	UN	7,00	608.700,00	4.260.900,00	7,00	4.260.900,00	7,00	4.260.900,00	-	-	0,00	-	7,00	4.260.900,00
12.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UN	7,00	209.820,00	1.468.740,00	8,00	1.678.560,00	8,00	1.678.560,00	-	-	0,00	-	8,00	1.678.560,00
12.3	GRIFERIA LLAVE AUTOMATICA QK23051 PARA LAVAMANOS O SIMILAR	UN	7,00	226.960,03	1.588.720,22	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA COMPLETA	UN	7,00	138.687,16	970.810,12	7,00	970.810,12	6,00	832.122,96	-	-	1,00	138.687,16	6,00	832.122,96
	SUBTOTAL				8.289.170,34		6.910.270,12		6.771.582,96		-		138.687,16		6.771.582,96
13	SEÑALIZACION														
13.1	SEÑALIZACION DE SERVICIOS, ESPACIOS Y AMBIENTES	UN	28,00	112.793,00	3.158.204,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	SUBTOTAL				3.158.204,00		-		-		-		-		-
14,0	CLIMATIZACION														
14.1	REINSTALACION MINI SPLIT 12.000 BTU , INCLUYE TUB., ACC. + SOPORTE PARED, MANTENIMIENTO	UN	2,00	830.060,96	1.660.121,92	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
14.2	REINSTALACION MINI SPLIT 18.000 BTU , INCLUYE TUB., ACC. + SOPORTE PARED MANTENIMIENTO	UN	1,00	924.444,15	924.444,15	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
14.3	REINSTALACION MINI SPLIT 24.000 BTU , INCLUYE TUB., ACC. + SOPORTE PARED MANTENIMINETO	UN	1,00	946.059,57	946.059,57	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION MINI SPLIT 24.000 BTU, INCLUYE TUB., ACC. + SOPORTE PARED DE ALTA RESISTENCIA	UN	4,00	5.246.909,57	20.987.638,28	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	SUBTOTAL				24.518.263,92		-		-		-		-		-
15,0	PISOS														
15.1	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLO PISO EN GRANITO VACIADO EXISTENTE	M2	400,00	$ 40.306,00	16.122.400,00	400,00	16.122.400,00	220,00	8.867.320,00	180,00	7.255.080,00	0,00	-	400,00	16.122.400,00
15.2	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLO MEDIA CAÑA EN GRANITO VACIADO EXISTENTE	ML	320,00	$ 27.346,00	8.750.720,00	320,00	8.750.720,00	320,00	8.750.720,00	-	-	0,00	-	320,00	8.750.720,00
15.3	RESTAURACION DE MESONES EN GRANITO, RETIRO DE BOQUILLAS PARA JUNTAS, APLICACIÓN DE NUEVAS BOQUILLAS, SELLADO,BRILLADO, Y ESMALTADO AVRIAS CARAS	ML	19,00	$ 67.306,00	1.278.814,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	SUBTOTAL				26.151.934,00		24.873.120,00		17.618.040,00		7.255.080,00		-		24.873.120,00
16,0	CARPINTERIA PVC														
16.1	MESON DE ENFERMERIA EN MADERA MELAMINICA	ML	6,50	$ 468.079,57	3.042.517,23	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
16.2	MUEBLE BAJO MESONES EN MADERA MELAMINICA FORRADOS PINTADOS LACA TRANSPARENTE	ML	24,00	$ 575.494,67	13.811.872,07	24,00	13.811.872,07	0,00	-	-	-	24,00	13.811.872,07	0,00	-
16.3	CLOSET EN MADERA MELAMINICA INCLUYE CERRADURA E INSTALACION	M2	22,00	$ 594.744,67	13.084.382,73	31,00	18.437.084,76	0,00	-	-	-	31,00	18.437.084,76	0,00	-
					29.938.772,03		32.248.956,83		-		-		32.248.956,83		-
17,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES														
17.1	ADECUACIÓN CAJAS INSPECCION SANITARIAS Y ELECTRICAS	UN	4,00	$ 287.041,90	1.148.167,60	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
17.2	ADECUACIÓN RED ALCANTARILLADO, INCLUYE TUBERIA AGUAS NEGRAS ACCESORIOS MANO DE OBRA	UND	1,00	$ 8.152.345,09	8.152.345,09	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
					9.300.512,69		-		-		-		-		-
18,0	INSTALACIONES ELECTRICAS				38.383.905,44										
18.1.0	RED ELECTRICAS DE BAJA TENSION									-	-				
18.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3#8F+1#8N+1#10T THHN, PARA MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES EN REEMPLAZO DE LAS DETERIORADAS	ML	400,00	$ 34.249,26	13.699.702,51	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
					13.699.702,51		-		-		-		-		

18.2.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**														
18.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE A 240V CON POLO A TIERRA (INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC SCH 40 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG). DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS	UN	8,00	$ 257.894,78	2.063.158,21	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACION. (TUBERIA PVC SCH 40 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG). DISTANCIA PROMEDIO 10 METROS	UN	76,00	$ 151.288,04	11.497.739,23	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED TORTUGA 12W / 100-240V / 960LM	UN	$ 30,00	$ 54.656,00	1.639.680,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 18W / 100-240V / 1.260LM	UN	$ 18,00	$ 48.340,00	870.120,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 24W / 100-240V /1.680LM	UN	$ 14,00	$ 58.882,00	825.748,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO 40W / 100-240V /4000LM	UN	$ 14,00	$ 150.909,00	2.112.726,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO(INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG).	UN	$ 14,00	$ 142.312,00	1.992.368,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
18.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES EN REMPLAZO DE LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO, INCLUYE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO	UN	$ 40,00	$ 92.044,09	3.681.763,49	0,00		0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
					24.683.302,93		-		-	-	-		-		-
21,0	**ASEO GENERAL**														
21,1	**ASEO GENERAL DE OBRA**	M2	800,00	$ 2.457,00	1.965.600,00	400,00	982.800,00	0,00	-	-	-	400,00	982.800,00	0,00	-
					1.965.600,00		982.800,00		-		-		982.800,00		-
INPC	**ITEMS COMPLEMENTARIOS NO PREVISTOS**														
INP1	TRAZADO Y REPLANTEO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL AREA DE HOSPITALIZACION HASTA MH A CONECTAR EQUIPO Y PERSONAL DE TOPOGRAFIA	ML		5.400,00		90,00	486.000,00	90,00	486.000,00	-	-	0,00	-	90,00	486.000,00
INP2	CORTE DE PISO Y PLANTILLA CON MAQUINA CORTADORA CON DISCO DIAMANTADO	ML		17.493,00		180,00	3.148.740,00	180,00	3.148.740,00	-	-	0,00	-	180,00	3.148.740,00
INP3	DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO E=0,17 AREA PARQUEADERO HASTA EL MH DE DESCARGA	ML		32.000,00		28,00	896.000,00	28,00	896.000,00	-	-	0,00	-	28,00	896.000,00
INP4	EXCAVACION MANUAL ALTURA PROMEDIO DE 2,00 DESDE MH DE DESCARGA HASTA CAJILLA DOMICILIARIA	M3		35.028,00		21,84	765.011,52	21,84	765.011,52	-	-	0,00	-	21,84	765.011,52
INP5	TAPE DE SANJA CON MATERIAL DE EXCAVACION EN VIA DESDE MH A ACCESO PARQUEADERO PLACA EN CONCRETO E= 0.18 DE 3000 PSI INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO TIPO CANGURO	M3		17.514,00		21,84	382.505,76	21,84	382.505,76	-	-	0,00	-	21,84	382.505,76
INP6	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PAVIMENTO ESPESOR 0,18 MTS. CON ACELERANTE	ML		95.600,00		28,00	2.682.400,00	28,00	2.682.400,00	-	-	0,00	-	28,00	2.682.400,00
INP7	PUNTO SANITARIO DE 2"	UN		76.853,00		22,00	1.690.766,00	22,00	1.690.766,00	-	-	0,00	-	22,00	1.690.766,00
INP8	PUNTO SANITARIO DE 3"	UN		89.977,00		10,00	899.770,00	10,00	899.770,00	-	-	0,00	-	10,00	899.770,00
INP9	PUNTO SANITARIO DE 4"	UN		103.101,00		10,00	1.031.010,00	10,00	1.031.010,00	-	-	0,00	-	10,00	1.031.010,00
INP10	RED SANITARIA DE 2"PVC	#¡REF!		31.426,00		32,00	1.005.632,00	32,00	1.005.632,00	-	-	0,00	-	32,00	1.005.632,00
INP11	RED SANITARIA DE 3" PVC	#¡REF!		43.158,00		28,00	1.208.424,00	28,00	1.208.424,00	-	-	0,00	-	28,00	1.208.424,00
INP12	RED SANITARIA DE 4" PVC	#¡REF!		54.890,00		42,00	2.305.380,00	42,00	2.305.380,00	-	-	0,00	-	42,00	2.305.380,00
INP13	RED SANITARIA DE 6" PVC	ML		94.830,00		30,00	2.844.900,00	30,00	2.844.900,00	-	-	0,00	-	30,00	2.844.900,00
INP14	TUBERIA VENTILACION PVC 2"	ML		18.540,00		20,00	370.800,00	20,00	370.800,00	-	-	0,00	-	20,00	370.800,00
INP15	CAMA EN ARENA ESPESOR ,10MT	M3		82.766,00		10,80	893.872,80	10,80	893.872,80	-	-	0,00	-	10,80	893.872,80
INP16	CAJAS INSPECCION 80 X 80 EN LADRILLO CORRIENTE, PAÑETADA IMPERMABILIZADA INTEGRALMENTE, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		428.864,00		4,00	1.715.456,00	4,00	1.715.456,00	-	-	0,00	-	4,00	1.715.456,00
INP17	KIT DE SILLA YEE DE 8"X6" PARA ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		385.000,00		1,00	385.000,00	1,00	385.000,00	-	-	0,00	-	1,00	385.000,00
INP18	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2"	UND		42.313,00		40,00	1.692.520,00	40,00	1.692.520,00	-	-	0,00	-	40,00	1.692.520,00
INP19	RED SUMINISTRO PVC 1/2	ML		16.300,00		80,00	1.304.000,00	80,00	1.304.000,00	-	-	0,00	-	80,00	1.304.000,00
INP20	CORTE Y SELLADO DE PUNTOS TUBERIAS SANITARIAS ANTIGUAS EN MAL ESTADO DE 2" A 4"	UND		9.500,00		40,00	380.000,00	40,00	380.000,00	-	-	0,00	-	40,00	380.000,00
INP21	REGISTRO RED WHITE 1/2 PULG. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 PULG Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND		96.500,00		20,00	1.930.000,00	10,00	965.000,00	5,00	482.500,00	5,00	482.500,00	15,00	1.447.500,00
INP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS	UND		188.500,00		10,00	1.885.000,00	0,00	-	10,00	1.885.000,00	0,00	-	10,00	1.885.000,00
INP23	SUMINISTRO E INSTALACION DE Check Anti-Retorno de Aguas Residuales de 6 pulgTUBERIA SANITARIA AGUAS NEGRAS	UND		1.240.000,00		1,00	1.240.000,00	1,00	1.240.000,00	-	-	0,00	-	1,00	1.240.000,00
INP24	SIFON SANITARIO DE 3" COMPLETO	UND		74.500,00		10,00	745.000,00	10,00	745.000,00	-	-	0,00	-	10,00	745.000,00
INP25	REJILLA C/SOSCO 3x2 BRONCE ANTICUCARACHA	UND		25.299,00		10	252.990,00	0,00	-	10,00	252.990,00	0,00	-	10,00	252.990,00
INP26	TAPAS PLASTICAS 0.20X0.20 PARA VALVULAS DE PASO	UND		28.500,00		20,00	570.000,00	0,00	-	17,00	484.500,00	3,00	85.500,00	17,00	484.500,00
INP27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR	JUEGO		131.272,00		8,00	1.050.176,00	0,00	-	8,00	1.050.176,00	0,00	-	8,00	1.050.176,00
INP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL PORCELANICO PARA LAVAMANOS W.C.	UN		128.000,00		6,00	768.000,00	0,00	-	6,00	768.000,00	0,00	-	6,00	768.000,00

	ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA	
VALLEDUPAR EN ORDEN	"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"	INFORME N°2 AVANCE DE OBRA ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

INP25	DEMOLICION PARA CIMENTACION VIGA DE PISO	ML		32.000,00		22,00	704.000,00	22,00	704.000,00	-	-	0,00	-	22,00	704.000,00
INP30	EXCAVACION ML CIMENTACION	ML		14.500,00		22,00	319.000,00	22,00	319.000,00	-	-	0,00	-	22,00	319.000,00
INP31	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI. 0.30 X 0.40	ML		184.500,00		22,00	4.059.000,00	22,00	4.059.000,00	-	-	0,00	-	22,00	4.059.000,00
INP32	VIGA SOBRE MURO DE AMARRE ESTRUCTURA	ML		204.500,00		22,00	4.499.000,00	22,00	4.499.000,00	-	-	0,00	-	22,00	4.499.000,00
INP33	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO	ML		184.500,00		20,30	3.745.350,00	20,30	3.745.350,00	-	-	0,00	-	20,30	3.745.350,00
INP34	ACERO DE 60.000 PSI	KG		9.100,00		240,00	2.184.000,00	240,00	2.184.000,00	-	-	0,00	-	240,00	2.184.000,00
INP35	MESON EN CONCRETO E=0,10MTS	ML		163.740,00		14,00	2.292.360,00	14,00	2.292.360,00	-	-	0,00	-	14,00	2.292.360,00
INP36	CONSTRUCCION DE POLLITO EN PISO PARA MUEBLES BAJO MESON	ML		53.622,00		14,00	750.708,00	14,00	750.708,00	-	-	0,00	-	14,00	750.708,00
INP37	PICADA Y EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERIORES	ML		17.200,00		140,00	2.408.000,00	80,00	1.376.000,00	60,00	1.032.000,00	0,00	-	140,00	2.408.000,00
INP38	EMPASTE ESTUCO PULIPLAST PARA MUROS INTERNOS MANTENIMIENTO AL EXISTENTE	ML		8.800,00		140,00	1.232.000,00	70,00	616.000,00	70,00	616.000,00	0,00	-	140,00	1.232.000,00
INP39	DESGASTE MECANICO DE MEDIACAÑA EXISTENTE DEBASTADO CON MAQUINA	ML		10.900,00		330,00	3.597.000,00	330,00	3.597.000,00	-	-	0,00	-	330,00	3.597.000,00
INP40	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO 7.5 CM INCLUYE PULIDA Y BRILLADA	ML		36.464,00		40,00	1.458.560,00	40,00	1.458.560,00	-	-	0,00	-	40,00	1.458.560,00
INP41	FILOS Y DILATACIONES	ML		5.474,00		190,00	1.040.060,00	25,00	136.850,00	145,00	793.730,00	20,00	109.480,00	170,00	930.580,00
INP42	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural montante superior 2 hojas moviles en vidrio 5mm templado y 1 fijo 1.50mts x 3.0 mts	UND		2.148.000,00		6,00	12.888.000,00	0,00	-	6,00	12.888.000,00	0,00	-	6,00	12.888.000,00
INP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO NATURAL MONTANTE SUPERIOR 4 HOJAS MOBILES vidrio 6mm templado DE 2.00X3.30MTS	UND		2.980.000,00		1,00	2.980.000,00	0,00	-	1,00	2.980.000,00	0,00	-	1,00	2.980.000,00
INP44	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural corredizas 0 50 mts x 0,88	UN		375.000,00		2,00	750.000,00	0,00	-	2,00	750.000,00	0,00	-	2,00	750.000,00
INP45	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural corredizas 0,50 mts x 2,0	UN		460.000,00		2,00	920.000,00	0,00	-	2,00	920.000,00	0,00	-	2,00	920.000,00
INP46	suministro e instalacion de ventanas en aluminio natural corredizas 0,50 mts x 0,88	UN		330.000,00		1,00	330.000,00	0,00	-	1,00	330.000,00	0,00	-	1,00	330.000,00
INP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO NATURAL CORREDIZA 0.50 a 0,40 MTSX0.50MTS	UN		305.000,00		8,00	2.440.000,00	0,00	-	8,00	2.440.000,00	0,00	-	8,00	2.440.000,00
INP48	SUMINISTRO E INSTLACION PUERTA CORREDIZA DOBLE CON MONTANTE, UNA HOJA FIJA Y OTRA CORREDIZA, VIDRIO TEMPLADO 6MM 2.0X2.50MTS	UN		2.460.000,00		1,00	2.460.000,00	0,00	-	-	-	1,00	2.460.000,00	0,00	-
INP49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, LIJADA, APLICACIÓN DE WASPRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA PROTEXTORES METALICOS EXISTENTES	M2		38.900,00		32,00	1.244.800,00	0,00	-	32,00	1.244.800,00	0,00	-	32,00	1.244.800,00
INP50	SUMINISTRO E INSTLACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 0.55 MTS	ML		672.000,00		20,00	13.440.000,00	0,00	-	18,40	12.364.800,00	1,60	1.075.200,00	18,40	12.364.800,00
INP51	SUMINISTRO E INSTLACION DE POCETAS METALICA	UND		185.000,00		7,00	1.295.000,00	0,00	-	7,00	1.295.000,00	0,00	-	7,00	1.295.000,00
INP52	SUMINISTRO E INSTLACION DE POCETA METALICA 0,60X0.45 PARA HABITACIONES DE PEDIATRIA	UND		245.000,00		2,00	490.000,00	0,00	-	1,00	245.000,00	1,00	245.000,00	1,00	245.000,00
INP53	GRIFERIA PARA POCETA CUELLO DE CISNE DOBLE	UND		220.000,00		9,00	1.980.000,00	0,00	-	8,00	1.760.000,00	1,00	220.000,00	8,00	1.760.000,00
INP54	SUMINISTRO E INSTLACION DE FLUXOMETRO PARA LAVA PATO METALICO ACERO INOXIDABLE	UND		820.000,00		1,00	820.000,00	0,00	-	1,00	820.000,00	0,00	-	1,00	820.000,00
INP55	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE DE APOYO EN BAÑOS, PARA SANITARIO ABATIBLE	UN		420.000,00		6,00	2.520.000,00	0,00	-	-	-	6,00	2.520.000,00	0,00	-
INP56	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE DE APOYO EN BAÑOS, PARA DUCHA	UN		260.000,00		12,00	3.120.000,00	0,00	-	-	-	12,00	3.120.000,00	0,00	-
INP57	CIELO RASO PLANO DRYWALL . INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2		86.044,00		312,00	26.845.728,00	280,00	24.092.320,00	32,00	2.753.408,00	0,00	-	312,00	26.845.728,00
INP58	DESMONTE DE DUCTERIA SOBRE CIELO RAZO TUBERIA A.A	ML		3.800,00		80,00	304.000,00	80,00	304.000,00	-	-	0,00	-	80,00	304.000,00
INP59	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES CABLE, ALAMBRE CONVENCIONAL	ML		2.200,00		700,00	1.540.000,00	700,00	1.540.000,00	-	-	0,00	-	700,00	1.540.000,00
INP60	DESMONTE DE LAMPARAS SLIM LINE DOBLES 1,20 DE LONGITUD	UND		14.500,00		30,00	435.000,00	30,00	435.000,00	-	-	0,00	-	30,00	435.000,00
INP61	DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL EXISTENTES	M2		6.500,00		45,00	292.500,00	45,00	292.500,00	-	-	0,00	-	45,00	292.500,00
INP62	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1	ML		39.026,00		40,00	1.561.040,00	40,00	1.561.040,00	-	-	0,00	-	40,00	1.561.040,00
	SUBTOTAL						**141.474.480,08**		**83.060.876,08**		**48.155.904,00**		**10.317.680,00**		**131.156.780,08**
	GASES MEDICINALES														**41.793.691,14**
INP63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2" (TUBERIA SOPORTADA, PINTADA, RITULADA Y SOLDADURA AL 5% (INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML		91.500,00		180,00	16.470.000,00	0,00	-	150,00	13.725.000,00	30,00	2.745.000,00	150,00	13.725.000,00
INP64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4" (TUBERIA SOPORTADA, PINTADA, RITULADA Y SOLDADURA AL 5% (INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML		119.137,60		138,00	16.440.988,63	0,00	-	100,00	11.913.759,88	38,00	4.527.228,75	100,00	11.913.759,88
INP65	SUMINISTRO E INSTLACION DE VALVULAS 3/4 (VALVULA EN ACERO INOXIDABLE4 TORNILLOS. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		225.000,00		2,00	450.000,00	0,00	-	2,00	450.000,00	0,00	-	2,00	450.000,00

	ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA	
VALLEDUPAR EN ORDEN	"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"	INFORME N°2 AVANCE DE OBRA ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

INP66	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 1/2 (VALVULA EN ACERO INOXIDABLE4 TORNILLOS, INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		132.500,00		14,00	1.855.000,00	0,00	-	14,00	1.856.000,00	0,00	-	14,00	1.856.000,00
INP67	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CORTE DE 2 GASES (FABRICACION NACIONAL, VALVULA 4 TORNILLOS EN BRONCE SOLDABLE TRES PIEZAS, PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		2.275.000,00		1,00	2.275.000,00	0,00	-	1,00	2.275.000,00	0,00	-	1,00	2.275.000,00
INP68	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA GASES MEDICINALES DIGITAL 2 GASES (INCLUYE PANTALLA TOUCH SCREEN, CON TRANSDUCTOR DE PRESION DIGITAL, INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND		7.517.977,49		1,00	7.517.977,49	0,00	-	1,00	7.517.977,49	0,00	-	1,00	7.517.977,49
INP69	TOMA DE SALIDA DE PARED DE OXIGENO TIPO CHEMETROM	UN		202.847,69		10,00	2.028.476,88	0,00	-	10,00	2.028.476,88	0,00	-	10,00	2.028.476,88
INP70	TOMA DE SALIDA DE PARED DE VACIO TIPO CHEMETROM	UN		202.847,69		10,00	2.028.476,88	0,00	-	10,00	2.028.476,88	0,00	-	10,00	2.028.476,88
							46.866.818,88		-		**41.793.891,14**		**7.272.228,75**		
	INSTALACIONES ELECTRICAS														
INP71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE A 120V PAT HOSPITALARIO BLANCO CIRCUITO NORMA (INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC SCH 40 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG). DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS	UND		178.800,00		48,00	8.582.400,00	30,00	5.364.000,00	18,00	3.218.400,00	0,00	-	48,00	8.582.400,00
INP72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE A 120 V PAT HOSPITALARIO TOMA REGULADO COLOR NARANJA (INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC SCH 40 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG). DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS	UND		198.500,00		30,00	5.955.000,00	30,00	5.955.000,00	-	-	0,00	-	30,00	5.955.000,00
INP73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE A 220V A 240V PAT (INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC SCH 40 3/4" Y CABLE DE CU THHN 12 AWG). DISTANCIA PROMEDIO 15 METROS	UND		247.800,00		10,00	2.478.000,00	10,00	2.478.000,00	-	-	0,00	-	10,00	2.478.000,00
INP74	PARCIAL DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE EN 2#12 AWG+1#14 AWG N, PARA REDES ELECTRICAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTE EN TUBERIA PVC SCH 40 3/4" MANO D EOBRA Y ACCESORIOS	ML		21.718,59		600,00	13.031.154,94	600,00	13.031.154,94	-	-	0,00	-	600,00	13.031.154,94
INP75	PARCIAL DE ACOMETIDA EN CABLE DE CORRE SIETE HILOS EN 3N°10 + 1 N°10PAT PARA AIRES ACONDICIONADO	ML		25.751,51		110,00	2.832.666,14	110,00	2.832.666,14	-	-	0,00	-	110,00	2.832.666,14
INP76	PARCIAL DE ACOMETIDA EN CABLE 7 HILOS LIBRE DE HALOGENO EN N° 10 EN 2#10+1#10 N, PARA REDES ELECTRICAS TUBERIA PVC SCH 40 3/4" MANO D EOBRA Y ACCESORIOS	ML		29.800,85		220,00	6.556.185,97	220,00	6.556.185,97	-	-	0,00	-	220,00	6.556.185,97
INP77	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND		88.897,44		20,00	1.777.948,75	0,00	-		-	20,00	1.777.948,75	0,00	-
INP78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE	UND		104.171,15		12,00	1.250.053,83	0,00	-		-	12,00	1.250.053,83	0,00	-
INP79	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE	UND		125.948,46		15,00	1.889.226,91	0,00	-		-	15,00	1.889.226,91	0,00	-
INP80	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTABLE 2 VIAS	UND		156.672,98		10,00	1.566.729,82	0,00	-		-	10,00	1.566.729,82	0,00	-
INP81	SUMINISTRO SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LUMINARIA LED PANEL RD	UND		230.917,10		75,00	17.318.782,22	0,00	-		-	75,00	17.318.782,22	0,00	-
INP82	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LAMPARA DE EMERGECIA DOBLE 2.6 W CON BATERIA RECARGABLE DURACION 90 MINUTOS	UND		278.000,00		10,00	2.780.000,00	0,00	-	-	-	10,00	2.780.000,00	0,00	-
INP83	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE AVISOS INDICACION SALIDA DE EMERGENCIA	UND		379.716,22		6,00	2.278.297,33	0,00	-	-	-	6,00	2.278.297,33	0,00	-
INP84	ACOMETIDA EN CABLE DE CORRE TIPO THWN EN 1 NO. 1/0 +1No 0T-TUB. CONDUIT PVC DE 2" ADICIONALES AL EXISTENTE	ML		354.007,23		45,00	15.930.325,44	45,00	15.930.325,44	-	-	0,00	-	45,00	15.930.325,44
INP85	SUMINISTRO ADECUACION Y MONTAJE DE GABINETE TIPO PESADO CON BARRAJE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 18 CTOS 3F, 3+ N+ T, 250A CERTIFICADO CON PUERTA	UND		971.365,49		1,00	971.365,49	0,00	-	1,00	971.365,49	0,00	-	1,00	971.365,49
INP86	SUMINISTRO ADECUACION Y MONTAJE DE GABINETE TIPO PESADO CON BARRAJE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR 24 CTOS 3F, 3+ N+ T, 250A CERTIFICADO CON PUERTA	UND		1.252.702,56		1,00	1.252.702,56	0,00	-	1,00	1.252.702,56	0,00	-	1,00	1.252.702,56
INP87	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA ONLINE 10 KVA 220V 10 MINT AUTONOMIA	UND		12.055.724,36		1,00	12.055.724,36	0,00	-	1,00	12.055.724,36	0,00	-	1,00	12.055.724,36
	SUBTOTAL						**98.508.563,75**		**52.147.332,48**		**17.488.192,41**		**28.863.038,85**		**69.645.524,90**
							0								
	REDES DE VOZ Y DATO														
INP88	CABLE F/UTP CAT 6A LSZH 305MTRS POWEST	ML		4.850,00		1.400,00	6.790.000,00	850,00	4.122.500,00	550,00	2.667.500,00	0,00	-	1.400,00	6.790.000,00
INP89	JACK AZUL CAT 6A UTP POWEST	UND		28.000,00		32,00	896.000,00	0,00	-	25,00	700.000,00	7,00	196.000,00	25,00	700.000,00
INP90	SWITCH D-LINK 24 PUERTOS GBPS + 2 PUERTOS SFP 100/1000MBPS SMART MAN	UND		2.250.000,00		1,00	2.250.000,00	0,00	-	1,00	2.250.000,00	0,00	-	1,00	2.250.000,00
INP91	PATCH CORD UTP CAT 6A 3FT AZUL POWEST	UND		31.250,33		32,00	1.000.010,56	0,00	-	25,00	781.258,27	7,00	218.752,31	25,00	781.258,27
INP92	PATCH CORD UTP CAT 6A 7FT AZUL POWEST	UND		32.794,88		32,00	1.049.439,43	0,00	-	25,00	819.874,55	7,00	229.564,87	25,00	819.874,55
INP93	UPS ONLINE 3KVA MARCA ATLANTIC POWER - 3 MINUTOS DE AUTONOMÍA	UND		3.921.591,06		1,00	3.921.591,06	0,00	-	1,00	3.921.591,06	0,00	-	1,00	3.921.591,06
INP94	RECEPTOR	UND		1.052.299,13		1,00	1.052.299,13	0,00	-	1,00	1.052.299,13	0,00	-	1,00	1.052.299,13
INP95	LLAMADORES DE CAMILLA	UND		590.598,12		11,00	6.496.579,32	0,00	-	10,00	5.905.981,20	1,00	590.598,12	10,00	5.905.981,20
INP96	Servicio de INSTALACION FISICA, CONFIGURACION Y CAPACITACION de la solución DE LLAMADORES Y RECEPTOR	UND		2.700.000,00		1,00	2.700.000,00	0,00	-	1,00	2.700.000,00	0,00	-	1,00	2.700.000,00
INP97	GABINETE DE PISO 60X60X45U (AXPXAL)	UND		3.350.428,46		1,00	3.350.428,46	0,00	-	1,00	3.350.428,46	0,00	-	1,00	3.350.428,46
INP98	BANDEJA REJIBAND TIPO MALLA 60x300 C8 Tramo 3m	UND		187.750,01		2,00	375.500,02	0,00	-	2,00	375.500,02	0,00	-	2,00	375.500,02
INP99	SALIDA DE TUBO BANDEJA REJIBAND REJIBAND	UND		18.501,00		12,00	222.012,00	0,00	-	10,00	185.010,00	2,00	37.002,00	10,00	185.010,00
INP100	UNION CURVAS REJIBAND E7	UND		3.485,00		6,00	20.910,00	0,00	-	6,00	20.910,00	0,00	-	6,00	20.910,00
INP101	UNION REFORZADA EZ	UND		6.850,00		2,00	13.700,00	0,00	-	2,00	13.700,00	0,00	-	2,00	13.700,00
INP102	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8 X 3M	UND		54.450,00		1,00	54.450,00	0,00	-	1,00	54.450,00	0,00	-	1,00	54.450,00
INP103	PERNO MULTIPROPOSITO PARA VARILLA 3/8	UND		45.680,00		1,00	45.680,00	0,00	-	1,00	45.680,00	0,00	-	1,00	45.680,00
INP104	BORNA DE TIERRA - LATON PARA BANDEJA REJIBAND TIPO MALLA	UND		52.300,00		6,00	313.800,00	0,00	-	6,00	313.800,00	0,00	-	6,00	313.800,00
INP105	Tubo conduit PVC 3/4" x 3m	UND		8.900,00		90,00	801.000,00	0,00	-	90,00	801.000,00	0,00	-	90,00	801.000,00

VALLEDUPAR EN ORDEN	**ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA** **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"**	**INFORME N°2 AVANCE DE OBRA ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA**

INP106	PATCH PANEL PLANO 6A F/UTP 24 PUERTOS INCLUYE HERRAJE POWEST	UND		998.090,65		2,00	1.996.181,30	0,00	-	2,00	1.996.181,30	0,00	-	2,00	1.996.181,30
INP107	FACEPLATE DOBLE	UND		12.500,00		19,00	237.500,00	0,00	-	15,00	187.500,00	4,00	50.000,00	15,00	187.500,00
INP108	TAPA ESPACIO PARA FACE PLATE	UND		1.800,00		9,00	16.200,00	0,00	-	5,00	9.000,00	4,00	7.200,00	5,00	9.000,00
INP109	Tubo conduit PVC1" x3m	UND		14.800,00		140,00	2.072.000,00	140,00	2.072.000,00	-	-	0,00	-	140,00	2.072.000,00
INP110	Caja de Paso 40X40X20 cm C20	UND		198.414,00		1,00	198.414,00	1,00	198.414,00	-	-	0,00	-	1,00	198.414,00
INP111	CAJAS 4X4 DOBLE FONDO empotrar para fijación face plate	UND		7.800,00		19,00	148.200,00	19,00	148.200,00	-	-	0,00	-	19,00	148.200,00
INP112	NVR 8MP 4K, 16 CH IP, 16 PUERTOS POE, 2 BAHIAS DD, SWITCH POE 300MTRS, HDMI 4K, incluye disco duro de 4tb purple wd 24/7	UND		2.149.474,00		1,00	2.149.474,00	0,00	-	1,00	2.149.474,00	0,00	-	1,00	2.149.474,00
INP113	Cámara IP PRO Serie IPC 4MP Tipo DOMO 2.8mm Lente Fijo SMALL	UND		657.437,00		12,00	7.889.244,00	0,00	-	12,00	7.889.244,00	0,00	-	12,00	7.889.244,00
INP114	Conectores RJ-45 Cat 6 100% Cu	UND		6.900,00		13,00	89.700,00	0,00	-	-	-	13,00	89.700,00	0,00	-
INP115	Extender HDMI 30M para visual en TV STAFF ENFERMERIA, Incluye conectores y certificación continuidad	UND		324.500,00		1,00	324.500,00	0,00	-	-	-	1,00	324.500,00	0,00	-
INP116	Kit conectores, chazos, tornillería, termoencogible, borneras, clavijas, T-rapa	UND		287.900,00		1,00	287.900,00	0,00	-	-	-	1,00	287.900,00	0,00	-
INP117	CABLE UTP CAT 6 UNV Cu 100%	UND		4.850,00		290,00	1.406.500,00	290,00	1.406.500,00	-	-	0,00	-	290,00	1.406.500,00
INP118	Regleta Multitoma de 6p Supresor de Picos	UND		32.400,00		1,00	32.400,00	0,00	-	-	-	1,00	32.400,00	0,00	-
INP119	Patch Cords cat 6 (para DVR hasta router)	UND		36.500,00		1,00	36.500,00	0,00	-	-	-	1,00	36.500,00	0,00	-
INP120	Medición tramos cableado, Sondeo, orientaciones básicas en obra civil para distribución, trabajo en altura, organización acopio, parametrización y configuración en móviles. Tratamiento a 15 puntos	UND		1.200.000,00		1,00	1.200.000,00	0,00	-	1,00	1.200.000,00	0,00	-	1,00	1.200.000,00
							48.438.113,30		7.947.614,00		39.390.382,00				
	SUBTOTAL												2.160.117,31		47.337.998,00
	SUBTOTAL														

	COSTO DIRECTO	418.041.858,53		624.611.696,07		299.389.519,17		219.851.031,98		165.570.539,14		518.040.551,16			
24%	ADMINISTRACIÓN	100.330.046,29		149.906.561,82		71.853.484,60		52.764.247,68		25.336.929,39		124.569.732,28			
1%	IMPREVISTO	4.180.418,60		6.246.110,90		2.993.895,19		2.196.510,32		1.055.705,39		5.190.405,51			
5%	UTILIDAD	20.902.092,98		31.230.554,50		14.969.475,96		10.982.551,60		5.278.528,96		25.952.027,56			
	COSTO INDIRECTO	125.412.557,90		187.383.327,02		89.816.855,75		65.895.309,60		31.671.161,74		155.712.165,35			
	TOTAL NETO	543.454.417,39		811.994.417,39		388.206.374,92		285.546.341,59		137.241.700,88		674.752.716,51			

VALOR TOTAL DEL ACTANº2: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($285.546.341,59)

VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR 50% : DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILTRESCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.($208.422.320,36)

RESUMEN	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 543.454.417,39
VALOR ANTICIPO 50%	$ 271.727.208,69
VALOR ACTA Nº1	$ 389.206.374,92
VALOR PRESENTE ACTA N°2	$ 285.546.341,59
AMORTIZACION ACTA Nº1	$ 194.603.187,46
AMORTIZACION PRESENTE ACTA N°2	$ 77.124.021,23
TOTAL AMORTIZADO HASTA LA PRESENTE ACTA 2	$ 271.727.208,69
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA N°2 DESPUES DE AMORTIZAR	$ 208.422.320,36
VALOR DE LAS MODIFICACIONES	$ 268.540.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 811.994.417,39
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 674.752.716,51
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 137.241.700,88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



se dio inicio al contrato de obra N°112 – SOP – de 2022, el día 31 de agosto del año 2022, sin embargo, las instalaciones o sitio donde se desarrolla el contrato fue entregado al contratista el día 09 de septiembre del año 2022. Desde entonces se ha venido laborando los siete días de la semana con días de turnos dobles según la actividad a desarrollar, siempre dándole prioridad a la continuidad en la prestación del servicio a la comunidad por parte del Hospital EDUARDO ARREDONDO DAZA sede San Martin.


REGISTRO FOTOGRAFICO CAPITULO INTERVENIDOS. (PRELIMINARES)






(ENCHAPES)
MESÓN EN GRANITO NEGRO



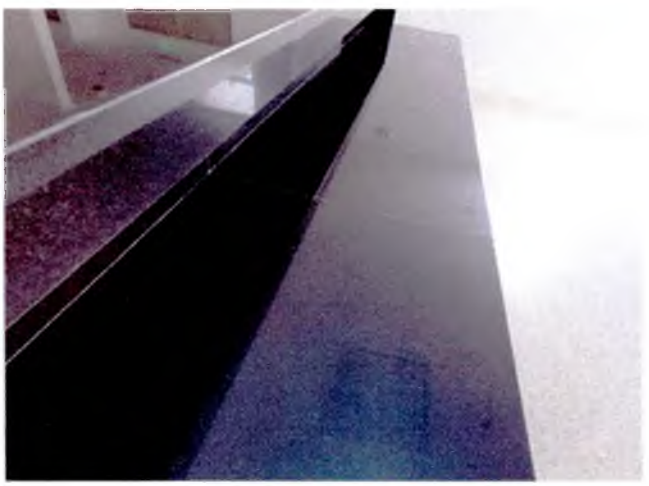

(ESTUCOS)



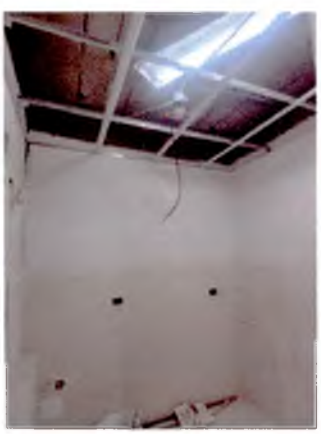





VALLEDUPAR EN ORDEN	ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"	INFORME N°2 AVANCE DE OBRA ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA













VALLEDUPAR EN ORDEN	ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"	INFORME N°2 AVANCE DE OBRA ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA















(PINTURAS)





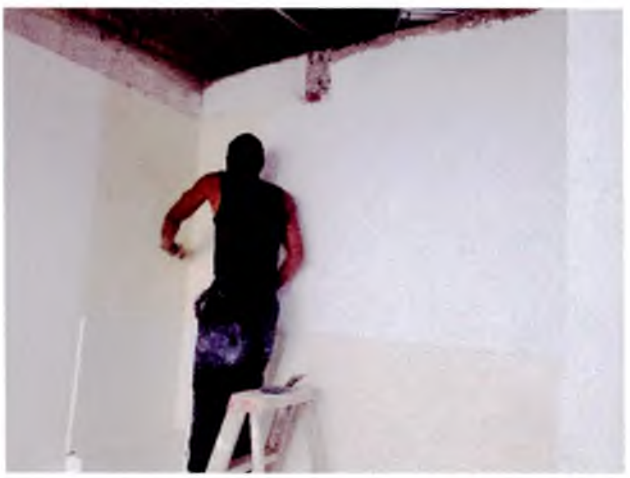

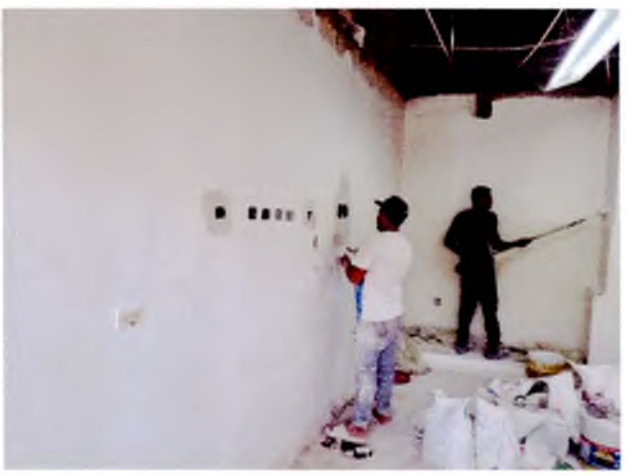





(CARPINTERIA METALICA)












(PISOS)




VALLEDUPAR EN ORDEN	ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR"	INFORME N°2 AVANCE DE OBRA ARQ. JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

















(ÍTEMS COMPLEMENTARIOS NO PREVISTOS)







