
Cronograma_obras_emergencia_24112022_.mpp


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Teórico	% Ejecutado
1	**OBRAS DE EMERGENCIA 2022**	**106 días**	**vie 19/08/22**	**vie 2/12/22**	**99%**	**79%**
2	**1. SITIO CRÍTICO PALOS VERDES (MANRIQUE)**	**57 días**	**vie 19/08/22**	**vie 14/10/22**	**100%**	**99%**
3	1.1. Recopilación y análisis de la información básica disponible	8 días	vie 19/08/22	vie 26/08/22	100%	100%
4	1.2 Recorridos detallados de campo por parte de grupo interdisciplinario	8 días	vie 19/08/22	vie 26/08/22	100%	100%
5	1.3. Elaboración de medidas de mitigación para ejecución inmediata	15 días	vie 19/08/22	vie 2/09/22	100%	100%
6	1.4. Ejecución de sondeos directos e indirectos	22 días	vie 26/08/22	vie 16/09/22	100%	100%
7	1.5. Ensayos de laboratorio	22 días	vie 2/09/22	vie 23/09/22	100%	100%
8	1.6. Levantamiento topográfico detallado con amarre	22 días	vie 2/09/22	vie 23/09/22	100%	100%
9	1.7 Análisis interdisciplinarios para diagnóstico y diseño de la solución	22 días	vie 16/09/22	vie 7/10/22	100%	100%
10	1.8. Elaboración de informe y planos con obras a construir	15 días	vie 30/09/22	vie 14/10/22	100%	99%
11	**2. SITIO CRÍTICO URBANIZACIÓN LA PALMERA (EL POBLADO)**	**92 días**	**vie 19/08/22**	**vie 18/11/22**	**100%**	**64%**
12	2.1. Recopilación y análisis de la información básica disponible	8 días	vie 19/08/22	vie 26/08/22	100%	100%
13	2.2. Recorridos detallados de campo por parte de grupo interdisciplinario	36 días	vie 19/08/22	vie 23/09/22	100%	100%
14	2.3. Elaboración de medidas de mitigación para ejecución inmediata	15 días	vie 19/08/22	vie 2/09/22	100%	100%
15	2.4. Ejecución de sondeos directos e indirectos	29 días	vie 16/09/22	vie 14/10/22	100%	100%
16	2.5. Ensayos de laboratorio	36 días	vie 23/09/22	vie 28/10/22	100%	10%
17	2.6. Levantamiento topográfico detallado con amarre	22 días	vie 30/09/22	vie 21/10/22	100%	90%
18	2.7 Análisis interdisciplinarios para diagnóstico y diseño de la solución	29 días	vie 7/10/22	vie 4/11/22	100%	15%
19	2.8. Elaboración de informe y planos con obras a construir	22 días	vie 28/10/22	vie 18/11/22	100%	0%
20	**4.1 FINCA LA MONTANA**	**85 días**	**vie 19/08/22**	**vie 11/11/22**	**100%**	**88%**
21	4.1.1. Recopilación y análisis de la información básica disponible	8 días	vie 19/08/22	vie 26/08/22	100%	100%
22	4.1.2. Recorridos detallados de campo por parte de grupo interdisciplinario	29 días	vie 19/08/22	vie 16/09/22	100%	100%
23	4.1.3. Elaboración de medidas de mitigación para ejecución inmediata	15 días	vie 19/08/22	vie 2/09/22	100%	100%
24	4.1.4. Ejecución de sondeos directos e indirectos	29 días	vie 26/08/22	vie 23/09/22	100%	100%
25	4.1.5. Ensayos de laboratorio	29 días	vie 2/09/22	vie 30/09/22	100%	100%
26	4.1.6. Levantamiento topográfico detallado con amarre	43 días	vie 9/09/22	vie 21/10/22	100%	90%
27	4.1.7 Análisis interdisciplinarios para diagnóstico y diseño de la solución	43 días	vie 16/09/22	vie 28/10/22	100%	100%
28	4.1.8. Elaboración de informe y planos con obras a construir	36 días	vie 7/10/22	vie 11/11/22	100%	15%
29	**4.2 TIERRA ALTA**	**92 días**	**vie 19/08/22**	**vie 18/11/22**	**100%**	**76%**
30	4.2.1. Recopilación y análisis de la información básica disponible	8 días	vie 19/08/22	vie 26/08/22	100%	100%
31	4.2.2. Recorridos detallados de campo por parte de grupo interdisciplinario	29 días	vie 19/08/22	vie 16/09/22	100%	100%
32	4.2.3. Elaboración de medidas de mitigación para ejecución inmediata	15 días	vie 19/08/22	vie 2/09/22	100%	100%
33	4.2.4. Ejecución de sondeos directos e indirectos	29 días	vie 16/09/22	vie 14/10/22	100%	100%
34	4.2.5. Ensayos de laboratorio	36 días	vie 16/09/22	vie 21/10/22	100%	60%
35	4.2.6. Levantamiento topográfico detallado con amarre	43 días	vie 16/09/22	vie 28/10/22	100%	90%

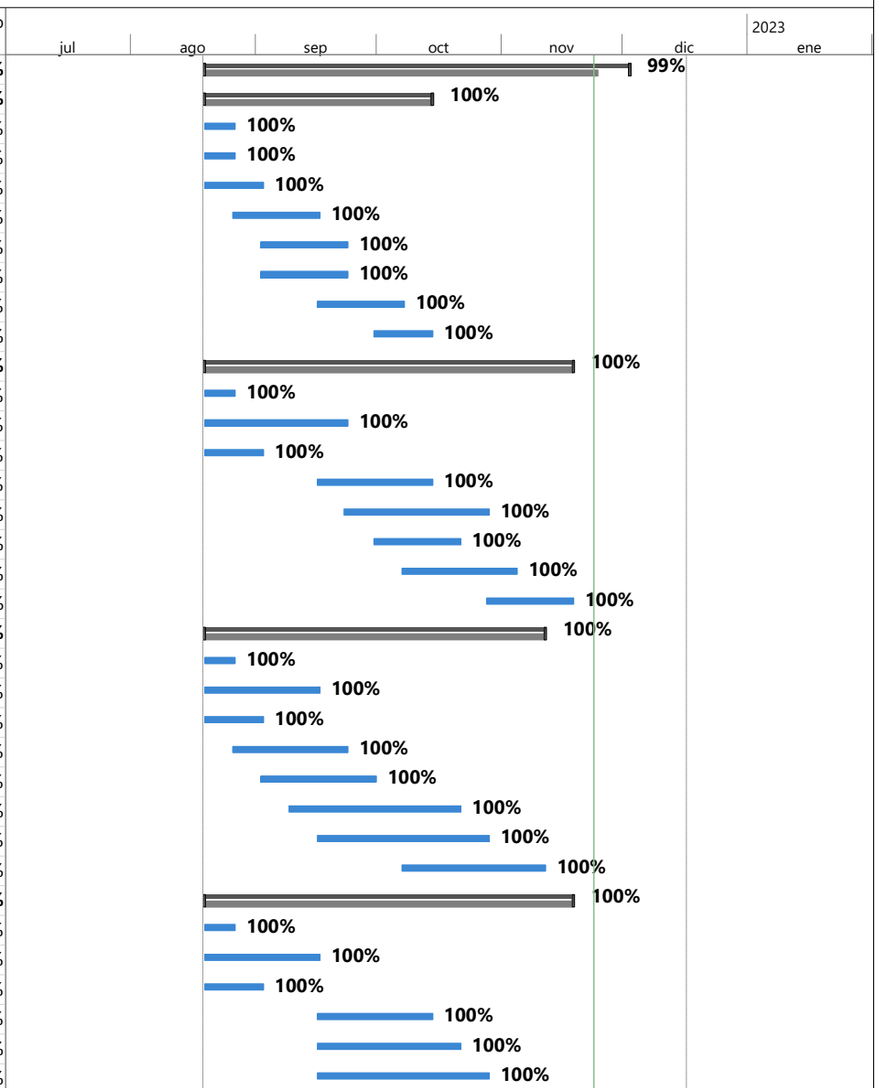

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Cronograma_obras_emergencia_24112022_.mpp

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Teórico	% Ejecutado
36	4.2.7 Análisis interdisciplinarios para diagnóstico y diseño de la solución	50 días	vie 16/09/22	vie 4/11/22	100%	60%
37	4.2.8. Elaboración de informe y planos con obras a construir	22 días	vie 28/10/22	vie 18/11/22	100%	0%
38	**4.3 POLLOS COA**	**106 días**	**vie 19/08/22**	**vie 2/12/22**	**93%**	**64%**
39	4.3.1. Recopilación y análisis de la información básica disponible	8 días	vie 19/08/22	vie 26/08/22	100%	100%
40	4.3.2. Recorridos detallados de campo por parte de grupo interdisciplinario	8 días	vie 19/08/22	vie 26/08/22	100%	100%
41	4.3.3. Ejecución de sondeos directos e indirectos	15 días	vie 9/09/22	vie 23/09/22	100%	95%
42	4.3.4. Ensayos de laboratorio	15 días	vie 16/09/22	vie 30/09/22	100%	80%
43	4.3.5. Levantamiento topográfico detallado con amarre	29 días	vie 16/09/22	vie 14/10/22	100%	70%
44	4.3.6 Análisis interdisciplinarios para diagnóstico y diseño de la solución	43 días	vie 14/10/22	vie 25/11/22	97%	5%
45	4.3.7. Elaboración de informe y planos con obras a construir	22 días	vie 11/11/22	vie 2/12/22	63%	0%
46						
47	HITO 1. POI físico y financiero del contrato	10 días	vie 19/08/22	dom 28/08/2	100%	100%
48						
49	HITO 2. Informe mensual de actividades SEPTIEMBRE	30 días	vie 19/08/22	sáb 17/09/22	100%	100%
50	HITO 2. Informe mensual de actividades OCTUBRE	30 días	dom 18/09/2	lun 17/10/22	100%	100%
51	HITO 2. Informe mensual de actividades NOVIEMBRE	30 días	mar 18/10/2	mié 16/11/22	100%	50%
52	HITO 2. Informe mensual de actividades DICIEMBRE	29 días	jue 17/11/22	jue 15/12/22	27%	0%
53						
54	HITO 3. Estudios geológicos	65 días	vie 19/08/22	sáb 22/10/22	100%	30%
55						
56	HITO 4. Estudios geotécnicos	80 días	vie 19/08/22	dom 6/11/22	100%	25%
57						
58	HITO 5. Estudios hidrológicos	85 días	vie 19/08/22	vie 11/11/22	100%	20%
59						
60	HITO 6. Análisis de alternativas	98 días	vie 19/08/22	jue 24/11/22	99%	40%
61						
62	HITO 7. Instalación de inclinometría y ejecución de lecturas base	100 días	vie 19/08/22	sáb 26/11/22	98%	60%
63						
64	HITO 8. Calculo y diseño	105 días	vie 19/08/22	jue 1/12/22	93%	20%
65						
66	HITO 9. Borrador de estudios	110 días	vie 19/08/22	mar 6/12/22	89%	20%
67						
68	HITO 10. Informes finales	120 días	vie 19/08/22	vie 16/12/22	81%	20%

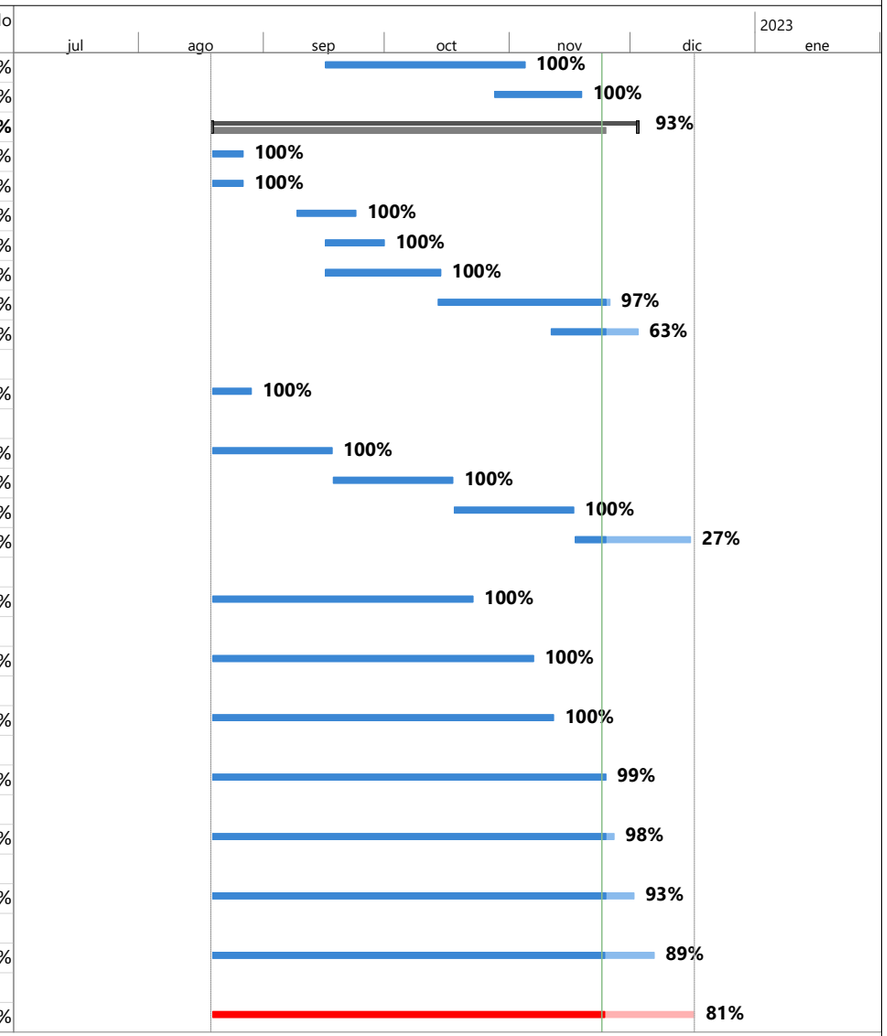

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
