ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 02

CONTRATO No. 397 - 2022

CONTRATANTE	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA - INDERBA
NIT	829000477-7
CONTRATISTA	CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
C.C O NIT	91.204.092-5
DOMICILIO	Calle 60 No 21-45 Barrio Parnaso
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL INDERBA EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
VALOR INICIAL	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000)
VALOR ADICIONAL	CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($5.133.333)
VALOR TOTAL	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($15.633.333)
PLAZO INICIAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL	VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES Y SIETE (07) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
ANTICIPO	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	22 – 00841
REGSITRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	22 - 00932
FECHA ACTA INICIO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA REINICIO	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MONICA KATERINE GOMEZ JIMENEZ

En la ciudad de Barrancabermeja, se reunieron el Señor (a) MONICA KATERINE GOMEZ JIMENEZ, en calidad de SUPERVISOR del presente contrato y el contratista Señor CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA para suscribir la presente acta e Informe de Supervisión Parcial, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. PLAN DE PAGOS

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	$ 7.700.000
02	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE	$ 7.000.000
	Saldo por Pagar	$ 933.333
	TOTAL, CONTRATO	$ 15.633.333

Valor de la presente acta: SIETE MILLONES DE PESOS COP ($7.000.000).

2. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el articulo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, así:

Fecha de pago:	21/11/2022
Periodo cotizado:	OCTUBRE DE 2022
Planilla No.	63411159
IBC	$2.800.000
Valor Total pago	$379.300

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ITEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	PROPONER A LA DIRECCIÓN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.Y RECREATIVOS DE ACUERDO CON LOS STANDARES ESTABLECIDOS PARA TAL FIN EN LA NORMALIDAD EXISTENTE	*Se apoya en la realización y entrega de presupuestos para la intervención de la infraestructura de polideportivas comunas 3 y 7	Se anexan evidencias de las actividades realizadas
2	ASESORAR AL ENTE TERRITORIAL EN LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	* Se apoyó en la atención e información relacionadas con las actividades y mantenimientos del proyecto de infraestructura. (Informe actividades del Patinodromo)	Se anexan evidencias de las actividades realizadas
3	HACER SEGUIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISION A LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	* En este periodo se realizaron actividades en las polideportivas que se están interviniendo	Se anexan evidencias de las actividades realizadas
4	DILIGENCIAR INDICADORES DE GESTION QUE PERMITAN MEDIR Y EVALUAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL AREA FORMATOS	* En este periodo no se realizaron actividades para lograr con el cumplimiento del Alcance No. 04	N.A.
5	REALIAZAR LAS DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO QUE SEAN ASIGNADAS POR EL DIRECTOR GENERAL Y/O SUPERVISOR	Se asistió a las reuniones y visitas convocada por la directora MONICA KATERINE GOMEZ JIMINEZ, a las polideportivas y asuntos administrativos	Se anexa evidencia

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA **ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL**	F: 31.PO.GJC Versión: 0.6 Fecha: 26.09.22

Se deja constancia que a la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato y se han verificado los documentos anexos a esta, así mismo, el contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.


Barrancabermeja, a los 06 DIC 2022

MONICA KATERINE GOMEZ JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL INDERBA
Supervisora

CARLOS ROBERTO PAJARDO PEÑA
C.C. No. 91.204.092 de Bucaramanga.
El Contratista

Comprobante

de pago en línea

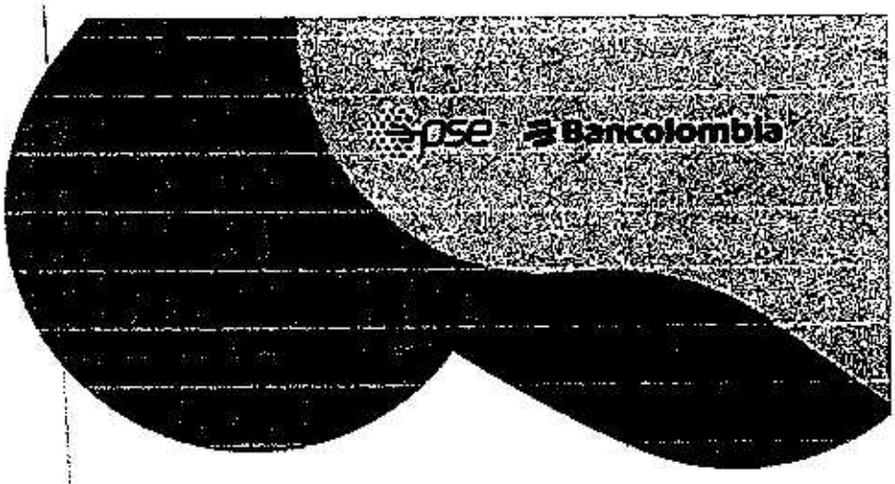

COMPENSAR-OI

Pago realizado por: CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA

Nro. de recibo: 63411159

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 190.143.67.194

Concepto: CC

Razón Social: 91204092

Fecha y hora de la transacción: Lunes 21 de Noviembre de 2022 11:48:43 AM

Nro. de comprobante: 0000044655

Valor pagado: $ 379,300.00

Cuenta: ******0663

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91204902	CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA		CALLE 60 # 21-45	6004476	carlosfp24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
Efectiva	1 - Independiente			SANTANDER	BARRANCABERMEJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO MANUAL (DAMESIAPO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMESIAPO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-10	2022-10	1	21/11/2022	83411158	TOTAL A PAGAR	
					379.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS000	Sanitas EPS	800251440-6	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	29.300				29.300	0	0	29.300			293	29.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	29.300	29.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	379.300	379.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91204052	CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA	CALLE 56 # 21-45	6004476	carlosfape24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NÚMERO SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 – Independiente			SANTANDER	BARRANCABERMEJA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	24/11/2022	85411159	$378.300	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN APORTANTE | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | |

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA CUENTA DE COBRO	F:07.PO.GF Versión: 0.5 Fecha: 26.09.22

INDERBA
NIT 829.000.477-7

DEBE A:

CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
CC. 91.204.092 expedida en Bucaramanga (Santander)

LA SUMA DE: (En números)	**$ 7.000.000**
Contrato No:	**397 - 2022**
Por concepto de: (Objeto del contrato)	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL INDERBA EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
Correspondiente al periodo: Del (día) de (mes) al (día) de (mes) del (año)	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cordialmente,

Firma contratista

NOTA 1: Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad realizada, parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTA2: Adjunto Planilla de pago de seguridad social No. 63411159 correspondiente al periodo objeto del contrato, bajo la gravedad del juramento manifiesto que para el periodo relacionado cancelé mis aportes a la seguridad social sobre el 40% de la **totalidad** de mis ingresos como prestador de servicios percibidos en la entidad territorial, **en los términos establecidos en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019.**

Cuenta Cuenta ahorros No 30629570663
Banco: BANCOLOMBIA

Teléfono: 3174242454 - 3208475872

Se expide en Barrancabermeja, a los 06 DIC 2022

ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 02

CONTRATO No. 397 - 2022

CONTRATANTE	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA - INDERBA
NIT	829000477-7
CONTRATISTA	CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
C.C O NIT	91.204.092-5
DOMICILIO	Calle 60 No 21-45 Barrio Parnaso
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL INDERBA EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
VALOR INICIAL	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000)
VALOR ADICIONAL	CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($5.133.333)
VALOR TOTAL	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($15.633.333)
PLAZO INICIAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL	VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES Y SIETE (07) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
ANTICIPO	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	22 – 00841
REGSITRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	22 - 00932
FECHA ACTA INICIO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA REINICIO	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MONICA KATERINE GOMEZ JIMENEZ

En la ciudad de Barrancabermeja, se reunieron el Señor (a) MONICA KATERINE GOMEZ JIMENEZ, en calidad de SUPERVISOR del presente contrato y el contratista Señor CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA para suscribir la presente acta e Informe de Supervisión Parcial, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. PLAN DE PAGOS

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	$ 7.700.000
02	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE	$ 7.000.000
	Saldo por Pagar	$ 933.333
	TOTAL, CONTRATO	$ 15.633.333

Valor de la presente acta: SIETE MILLONES DE PESOS COP ($7.000.000).

2. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, así:

Fecha de pago:	21/11/2022
Periodo cotizado:	OCTUBRE DE 2022
Planilla No.	83411159
IBC	$2.800.000
Valor Total pago	$379.300

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ITEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	PROPONER A LA DIRECCIÓN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ACUERDO CON LOS STANDARES ESTABLECIDOS PARA TAL FIN EN LA NORMALIDAD EXISTENTE	*Se apoya en la realización y entrega de presupuestos para la intervención de la infraestructura de polideportivas comunas 3 y 7	Se anexan evidencias de las actividades realizadas
2	ASESORAR AL ENTE TERRITORIAL EN LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	* Se apoyó en la atención e información relacionadas con las actividades y mantenimientos del proyecto de infraestructura. (Informe actividades del Patinodromo)	Se anexan evidencias de las actividades realizadas
3	HACER SEGUIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISION A LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	* En este periodo se realizaron actividades en las polideportivas que se están interviniendo	Se anexan evidencias de las actividades realizadas
4	DILIGENCIAR INDICADORES DE GESTION QUE PERMITAN MEDIR Y EVALUAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL AREA FORMATOS	* En este periodo no se realizaron actividades para lograr con el cumplimiento del Alcance No. 04	N.A.
5	REALIAZAR LAS DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO QUE SEAN ASIGNADAS POR EL DIRECTOR GENERAL Y/O SUPERVISOR	Se asistió a las reuniones y visitas convocada por la directora MONICA KATERINE GOMEZ JIMINEZ, a las polideportivas y asuntos administrativos	Se anexa evidencia

Se deja constancia que a la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato y se han verificado los documentos anexos a esta, así mismo, el contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Barrancabermeja, a los 06 DIC 2022.

MONICA KATERINE GOMEZ JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL INDERBA
Supervisora

CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
C.C. No. 91.204.092 de Bucaramanga.
El Contratista

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC Versión: 0.1 Fecha: 02.05.17

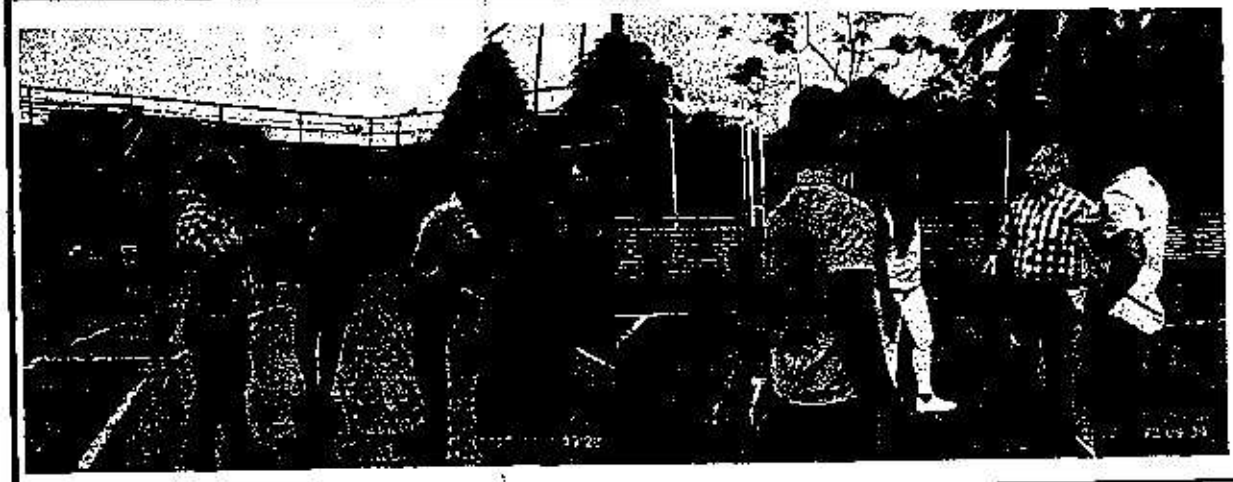

DESCRIPCION ACTIVIDAD. (ALCANCE No. 2) Visitas a las polideportivas del Barrio Chico y Las Torres

GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / GESTIÓN ESTRATÉGICA

CONTRATISTA: CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA

FECHA O PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022




DESCRIPCION ACTIVIDAD: (ALCANCE No. 2) Se realizan visitas a las polideportivas de la comuna 4, relacionadas a necesidades de adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos de su comuna.


GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / GESTIÓN ESTRATÉGICA

CONTRATISTA: CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA

FECHA O PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC Versión: 0.1 Fecha: 02.05.17

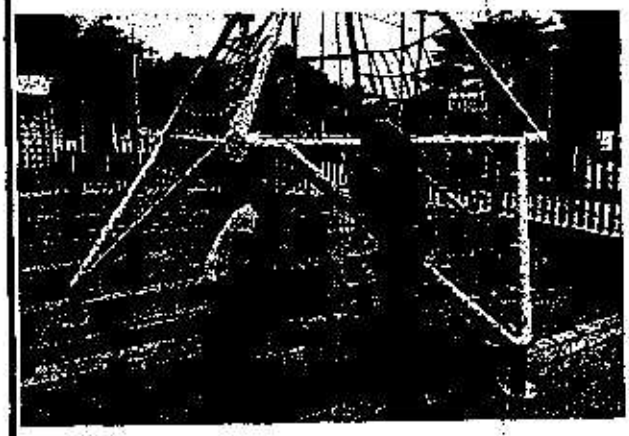

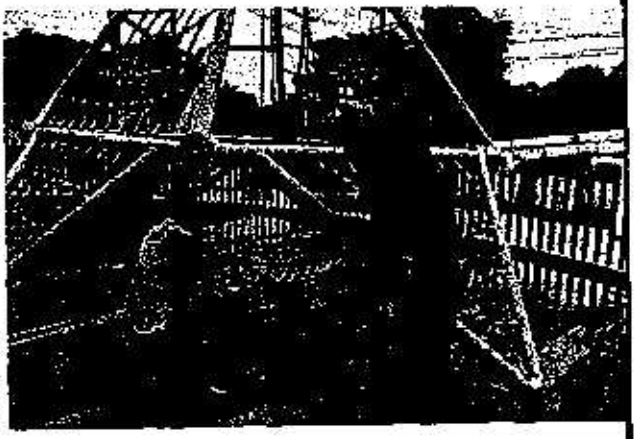


DESCRIPCION ACTIVIDAD: (ALCANCE No. 3) Se realizaron visitas técnicas a los escenarios deportivos en los que se van a realizar próximos eventos con el objetivo impartir lineamientos técnicos de la infraestructura del escenario y el uso adecuado del mismo para los eventos a realizar

GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / GESTIÓN ESTRATÉGICA

CONTRATISTA: CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA

FECHA O PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

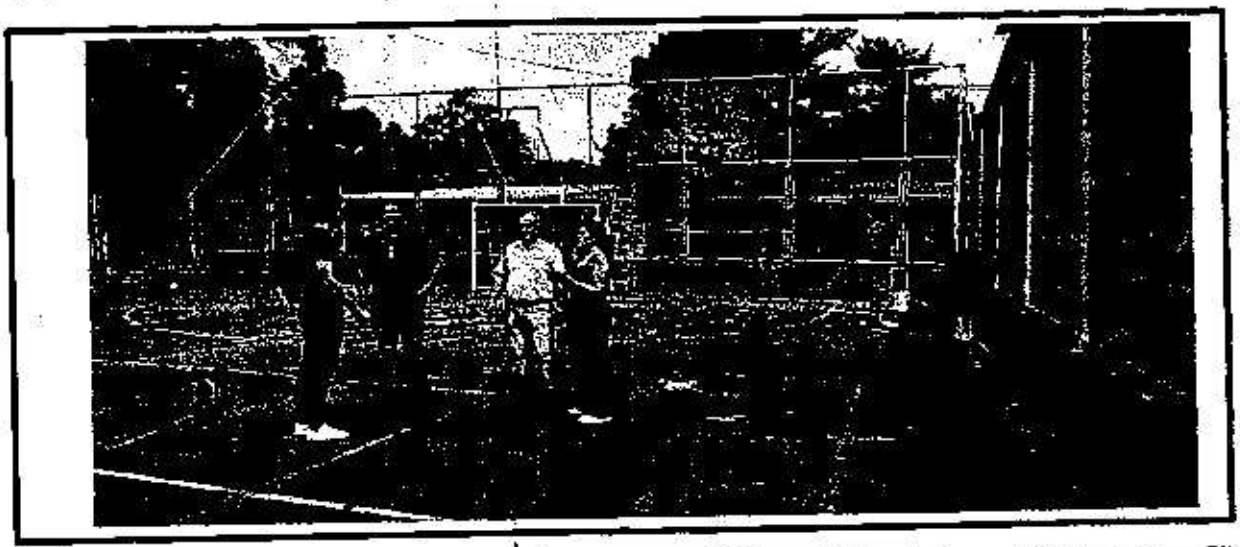

DESCRIPCION ACTIVIDAD: (ALCANCE No. 3) Se realizó visita de seguimiento a la polideportiva barrio Las Torres, para revisar las intervenciones con respecto a la infraestructura.

GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / GESTIÓN ESTRATÉGICA

CONTRATISTA: CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA

FECHA O PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC Versión: 0.1 Fecha: 02.05.17



DESCRIPCION ACTIVIDAD: (ALCANCE No. 3) Se realizó visita de seguimiento a la polideportiva barrio Las Torres, para revisar las intervenciones con respecto a la infraestructura.
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / GESTIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATISTA: CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
FECHA O PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC Versión: 0.1 Fecha: 02.05.17



DESCRIPCION ACTIVIDAD: (ALCANCE No. 8) Visitas con la comunidad del barrio la esperanza con el objetivo aclarar inquietudes con respecto al manejos y administración del escenario deportivo
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / GESTIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATISTA: CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
FECHA O PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ALCANCE No. 1


PROPONER A LA DIRECCIÓN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.Y RECREATIVOS DE ACUERDO CON LOS STANDARES ESTABLECIDOS PARA TAL FIN EN LA NORMALIDAD EXISTENTE

Inderba	INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023	17
	POLIDEPORTIVA BARRIO 20 DE ENERO I	

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	3
BARRIO	20 DE ENERO I
COORDENADAS	(7°04'49"N 73°51'12W)

RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA



2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES	LARGO (ml):	28,20	ANCHO (ml):	17,80	AREA (m²):	501,96

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN

Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio 20 de Enero dentro del área urbana del Distrito con un área de 501.96 m2 consistente en:

1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (Incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.


4. LISTADO DE MATERIALES

MATERIALES					
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$ 8.572,00	$ 17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	6	$ 94.300,00	$ 565.800,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$ 628.600,00	$ 1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	5	$ 628.600,00	$ 3.143.000,00
6	Pintura antideslizante pere canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$ 628.600,00	$ 1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	12	$ 131.500,00	$ 1.578.000,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$ 100.000,00	$ 200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0,5	$ 114.300,00	$ 57.150,00
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	10	$ 93.300,00	$ 933.000,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$ 587.200,00	$ 1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$ 10.000,00	$ 60.000,00
13	Thinner	galón	14	$ 40.000,00	$ 560.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	4	$ 120.000,00	$ 480.000,00
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivos 10,5 x 2 mts x 20 mts Cal. 16	rollo	6	$ 1.152.000,00	$ 6.912.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	40	$ 13.000,00	$ 520.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	15	$ 32.150,00	$ 482.250,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$ 269.000,00	$ -
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	2	$ 367.000,00	$ 734.000,00
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$ 455.500,00	$ -
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterías	und	0	$ 282.900,00	$ -
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterías	und	0	$ 282.900,00	$ -
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	60	$ 48.600,00	$ 2.916.000,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	10	$ 5.715,00	$ 57.150,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	10	$ 10.000,00	$ 100.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$ 5.715,00	$ 11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$ 10.000,00	$ 20.000,00
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	0	$ 25.700,00	$ -
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	2	$ 106.250,00	$ 212.500,00
30	Tablero material acrílico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	2	$ 798.000,00	$ 1.596.000,00
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	20	$ 4.300,00	$ 86.000,00
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	2	$ 259.200,00	$ 518.400,00
33	Tiza industrial	und	5	$ 5.430,00	$ 27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	0	$ 3.422,00	$ -
35	Cascajillo	bulto		$ 3.422,00	$ -
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto		$ 38.600,00	$ -
37	Malla electrosoldada	und		$ 89.611,00	$ -
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und		$ 4.800,00	$ -
39	Cimbra albañil	und		$ 12.800,00	$ -
40	Hoja de segueta	und		$ 9.800,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 26.755.974,00
				MANO DE OBRA 40%	$ 17.837.316,00
				TOTAL	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





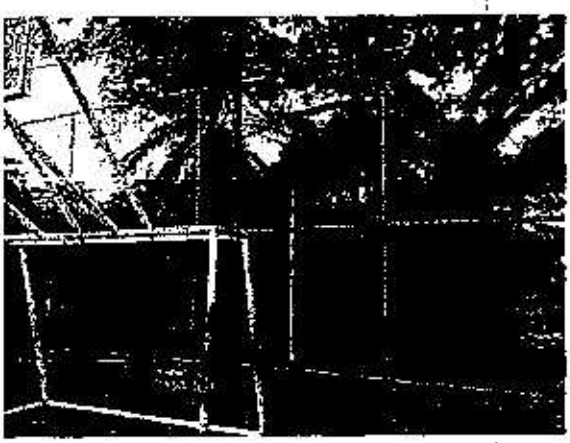



6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
1. MALLA EN MAL ESTADO
2. GRADERIA EN MAL ESTADO
3 PRESENTA PROBLEMA DESAGUE SUR- ORIENTAL

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS

REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Inderba

INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023


POLIDEPORTIVA BARRIO 20 DE ENERO II

18

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	3
BARRIO	20 DE ENERO II
COORDENADAS	(7°04'54"N 73°51'18"W)

RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA

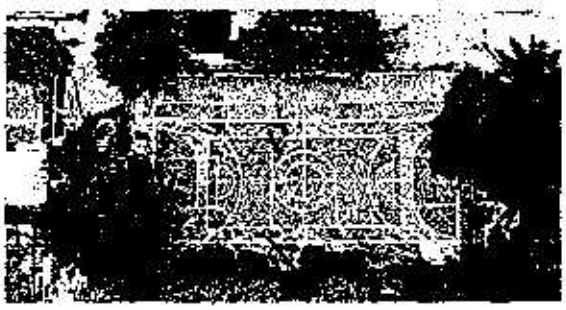

2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES LARGO (ml): 28,00 ANCHO (ml): 16,00 AREA (m²): 448,00

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN


Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio **20 de Enero II** dentro del área **urbana** del Distrito con un área de 448,00 m2 consistente en:


1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
6. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
8. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (Incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.

4. LISTADO DE MATERIALES


MATERIALES							
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$	8.572,00	$	17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$	11.500,00	$	23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	7	$	94.300,00	$	660.100,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	4	$	628.600,00	$	2.514.400,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	15	$	131.500,00	$	1.972.500,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$	100.000,00	$	200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0,5	$	114.300,00	$	57.150,00
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	10	$	93.300,00	$	933.000,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$	587.200,00	$	1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$	10.000,00	$	60.000,00
13	Thinner	galón	15	$	40.000,00	$	600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	6	$	120.000,00	$	720.000,00
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivas 10.5 x 2 mts x 20 mts Cal. 16	rollo	6	$	1.152.000,00	$	6.912.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	40	$	13.000,00	$	520.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	15	$	32.150,00	$	482.250,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	269.000,00	$	-
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	5	$	367.000,00	$	1.835.000,00
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	455.500,00	$	-
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	90	$	48.600,00	$	4.374.000,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	12	$	5.715,00	$	68.580,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	12	$	10.000,00	$	120.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	5.715,00	$	11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	10.000,00	$	20.000,00
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	8	$	25.700,00	$	205.600,00
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	14	$	106.250,00	$	1.487.500,00
30	Tablero material acrílico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$	798.000,00	$	-
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	40	$	4.300,00	$	172.000,00
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	2	$	259.200,00	$	518.400,00
33	Tiza industrial	und	5	$	5.430,00	$	27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	4	$	3.422,00	$	13.688,00
35	Cascajillo	bulto	6	$	3.422,00	$	20.532,00
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	2	$	38.600,00	$	77.200,00
37	Malla electrosoldada	und	0	$	89.611,00	$	-
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$	4.800,00	$	4.800,00
39	Cimbra alberil	und	0	$	12.800,00	$	-
40	Hoja de segueta	und	0	$	9.800,00	$	-
					SUBTOTAL	$	29.573.424,00
					MANO DE OBRA 40%	$	19.715.616,00
					TOTAL		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

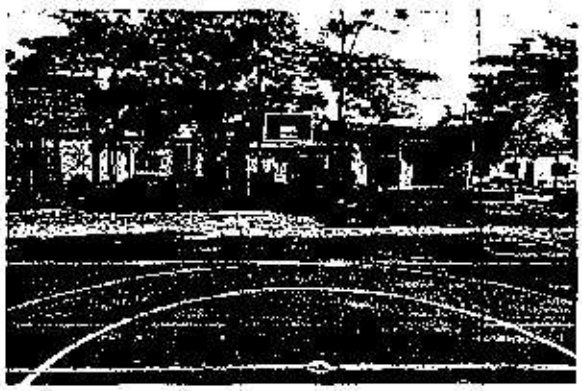

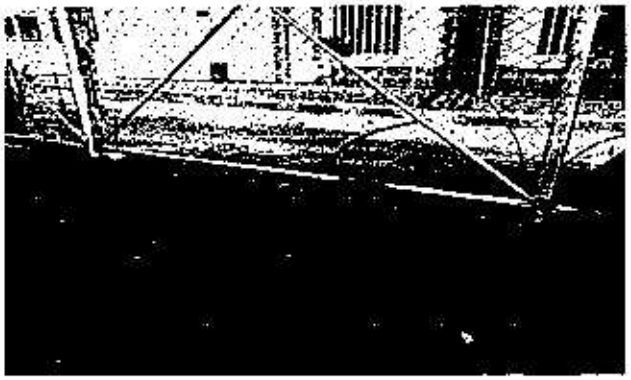



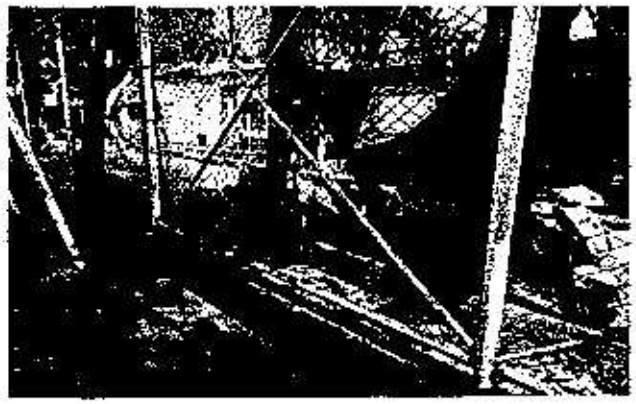

6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
1. TABLERO DE BALONCESTO
2. MALLA EN MAL ESTADO
3 SIN AROS DE BALONCESTO

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS

REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Inderba

INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023

POLIDEPORTIVA BARRIO LA PAZ

19

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	3
BARRIO	LA PAZ
COORDENADAS	(7°04'37"N 73°50'25"W)

RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA



2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES LARGO (ml): 26,00 ANCHO (ml): 16,00 AREA (m²): 416,00

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN


Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio La Paz dentro del área urbana del Distrito con un área de 416,00 m2 consistente en:

1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (Incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.

4. LISTADO DE MATERIALES


MATERIALES							
#	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$	8.572,00	$	17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$	11.500,00	$	23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	8	$	94.300,00	$	754.400,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	5	$	628.600,00	$	3.143.000,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	15	$	131.500,00	$	1.972.500,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$	100.000,00	$	200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0	$	114.300,00	$	-
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	8	$	93.300,00	$	746.400,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$	587.200,00	$	1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$	10.000,00	$	60.000,00
13	Thinner	galón	15	$	40.000,00	$	600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	6	$	120.000,00	$	720.000,00
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivos 10,5 x 2 mts x 10 mts Cal. 12	rollo	12	$	1.152.000,00	$	13.824.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	60	$	13.000,00	$	780.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	25	$	32.150,00	$	803.750,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	269.000,00	$	-
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	4	$	367.000,00	$	1.468.000,00
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	455.500,00	$	-
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterias	und	8	$	282.900,00	$	2.263.200,00
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterias	und	0	$	282.900,00	$	-
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	60	$	48.600,00	$	2.916.000,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	15	$	5.715,00	$	85.725,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	15	$	10.000,00	$	150.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	5.715,00	$	11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	10.000,00	$	20.000,00
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	0	$	25.700,00	$	-
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	0	$	106.250,00	$	-
30	Tablero material acrilico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$	798.000,00	$	-
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	0	$	4.300,00	$	-
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	0	$	259.200,00	$	-
33	Tiza Industrial	und	5	$	5.430,00	$	27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	3	$	3.422,00	$	10.266,00
35	Cascajillo	bulto	0	$	3.422,00	$	-
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	3	$	38.600,00	$	115.800,00
37	Malla electrosoldada	und	0	$	89.611,00	$	-
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$	4.800,00	$	4.800,00
39	Cimbra albañil	und	1	$	12.800,00	$	12.800,00
40	Hoja de segueta	und	0	$	9.800,00	$	-
					SUBTOTAL	$	35.675.366,00
					MANO DE OBRA 40%	$	23.783.576,67
					TOTAL		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

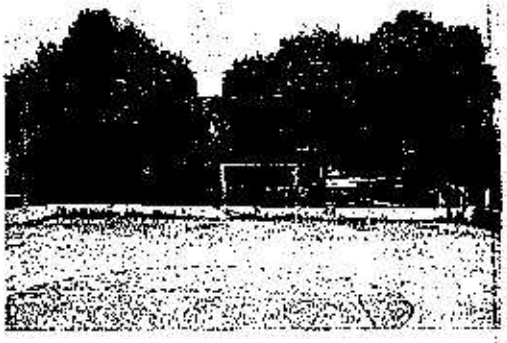





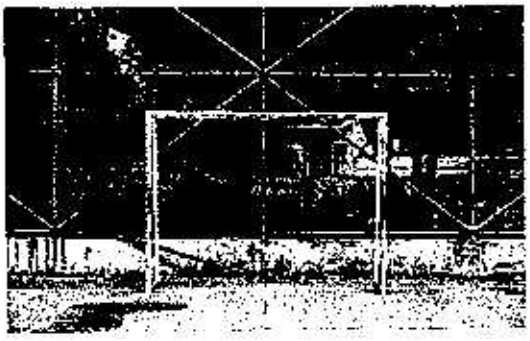

6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
NECESIDADES
1 MALLA EN ESTADO
2 TUBERIA EN MAL ESTADO
3 SOPORTE VOLEIBOL
4 PINTURA EN GENERAL
5 PORTON DE ENTRADA
6 MAL ESTADO GRADERIA

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS

REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LYDA

Inderba	INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023	21
	POLIDEPORTIVA BARRIO COVIBA II	

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	3
BARRIO	COVIBA II
COORDENADAS	(7°04'59"N 73°51'12"W)
RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA



2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES	LARGO (ml):	25,70	ANCHO (ml):	18,20	AREA (m²):	467,74

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN


Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio Coviba II dentro del área urbana del Distrito con un área de 467.74 m2 consistente en:


1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.

4. LISTADO DE MATERIALES


MATERIALES							
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$	8.572,00	$	17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$	11.500,00	$	23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	1	$	94.300,00	$	94.300,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	5	$	628.600,00	$	3.143.000,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	12	$	131.500,00	$	1.578.000,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$	100.000,00	$	200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0,5	$	114.300,00	$	57.150,00
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	10	$	93.300,00	$	933.000,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$	587.200,00	$	1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$	10.000,00	$	60.000,00
13	Thinner	galón	15	$	40.000,00	$	600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	0	$	120.000,00	$	-
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivas 10,0 x 2 mts x 20 mts Cal. 16	rollo	0	$	1.152.000,00	$	-
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	10	$	13.000,00	$	130.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	5	$	32.150,00	$	160.750,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	269.000,00	$	-
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	367.000,00	$	-
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	455.500,00	$	-
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterias	und	0	$	282.900,00	$	-
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterias	und	0	$	282.900,00	$	-
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	4	$	48.600,00	$	194.400,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	2	$	5.715,00	$	11.430,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	2	$	10.000,00	$	20.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	0	$	5.715,00	$	-
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	0	$	10.000,00	$	-
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	0	$	25.700,00	$	-
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	3	$	106.250,00	$	318.750,00
30	Tablero material acrílico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$	798.000,00	$	-
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	8	$	4.300,00	$	34.400,00
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	0	$	259.200,00	$	-
33	Tiza industrial	und	5	$	5.430,00	$	27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	0	$	3.422,00	$	-
35	Cascajillo	bulto	0	$	3.422,00	$	-
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	0	$	38.600,00	$	-
37	Malla electrosoldada	und	0	$	89.611,00	$	-
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$	4.800,00	$	4.800,00
39	Cimbra alibafil	und	0	$	12.600,00	$	-
40	Hoja de segueta	und	0	$	9.800,00	$	-
					SUBTOTAL	$	12.563.274,00
					MANO DE OBRA 40%	$	8.368.849,33
					TOTAL		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

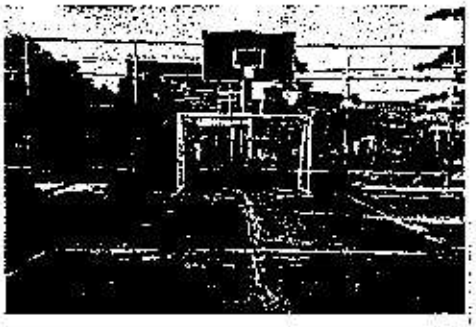

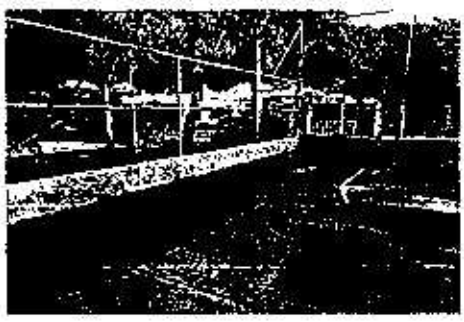



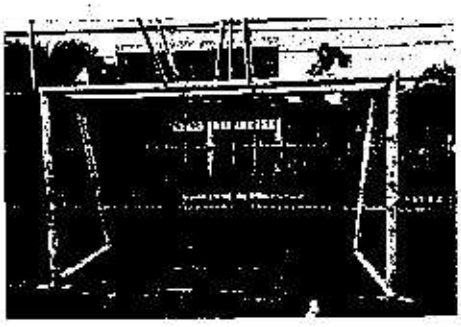

6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
NECESIDADES
1 CONCRETO EN ESTADO
2 PINTURA Y DEMARCACION
3 TABLERO DE BALONCESTO ARREGLO
4 ENCERRAMIENTO


CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS

REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Inderba	INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023	22
	POLIDEPORTIVA BARRIO SANTA ISABEL	

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	3
BARRIO	SANTA ISABEL
COORDENADAS	(7°05'05"N 73°51'02"W)
RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA

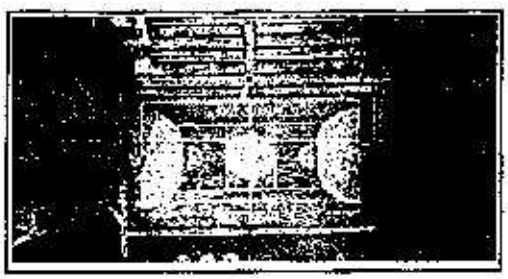

2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES	LARGO (ml):	26,90	ANCHO (ml):	15,10	AREA (m²):	406,19

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

SALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN


Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio Santa Isabel dentro del área urbana del Distrito con un área de 406,19 m2 consistente en:

1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.


4. LISTADO DE MATERIALES

MATERIALES							
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$	8.572,00	$	17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$	11.500,00	$	23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	6	$	94.300,00	$	565.800,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	5	$	628.600,00	$	3.143.000,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	10	$	131.500,00	$	1.315.000,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$	100.000,00	$	200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0,5	$	114.300,00	$	57.150,00
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	20	$	93.300,00	$	1.866.000,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$	587.200,00	$	1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$	10.000,00	$	60.000,00
13	Thinner	galón	15	$	40.000,00	$	600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	6	$	120.000,00	$	720.000,00
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivas 10,0 x 2 mts x 30 mts Cal. 15	rollo	7	$	1.152.000,00	$	8.064.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	40	$	13.000,00	$	520.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	20	$	32.150,00	$	643.000,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	269.000,00	$	-
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	4	$	367.000,00	$	1.468.000,00
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	456.500,00	$	-
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	60	$	48.600,00	$	2.916.000,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	12	$	5.715,00	$	68.580,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	12	$	10.000,00	$	120.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	5.715,00	$	11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	10.000,00	$	20.000,00
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	0	$	25.700,00	$	-
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	12	$	106.250,00	$	1.275.000,00
30	Tablero material acrílico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$	796.000,00	$	-
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	40	$	4.300,00	$	172.000,00
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	2	$	259.200,00	$	518.400,00
33	Tiza industrial	und	5	$	5.430,00	$	27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	0	$	3.422,00	$	-
35	Cascajillo	bulto	0	$	3.422,00	$	-
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	0	$	38.600,00	$	-
37	Malla electrosoldada	und	0	$	89.611,00	$	-
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$	4.800,00	$	4.800,00
39	Cimbra albañil	und	0	$	12.800,00	$	-
40	Hoja de segueta	und	0	$	9.800,00	$	-
					SUBTOTAL	$	29.341.454,00
					MANO DE OBRA 40%	$	19.560.969,33
					TOTAL		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

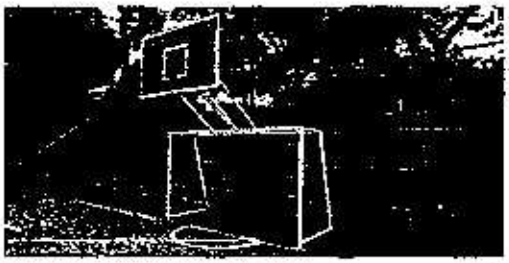



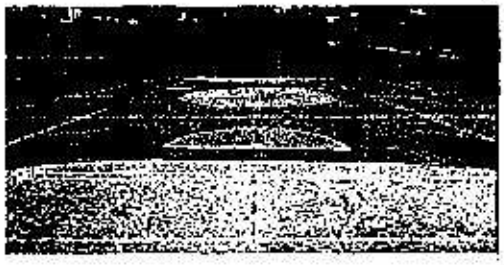



6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
NECESIDADES
1 MALLA EN MAL ESTADO
2 GRADERIA EN MAL ESTADO
3 SOLDAR VARILLAS
4 PINTURA

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS

REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Inderba	INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023	23
	POLIDEPORTIVA BARRIO JERUSALEM II	

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	3
BARRIO	JERUSALEM II
COORDENADAS	(7°04'45"N 73°50'41"W)

RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA



2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES	LARGO (ml):	24,00	ANCHO (ml):	20,00	AREA (m²):	480,00

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN

Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio Jerusalem II dentro del área urbana del Distrito con un área de 480,00 m2 consistente en:


1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.

4. LISTADO DE MATERIALES


MATERIALES							
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$	8.572,00	$	17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$	11.500,00	$	23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	8	$	94.300,00	$	754.400,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	4	$	628.600,00	$	2.514.400,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	12	$	131.500,00	$	1.578.000,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$	100.000,00	$	200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0,5	$	114.300,00	$	57.150,00
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	12	$	93.300,00	$	1.119.600,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$	587.200,00	$	1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$	10.000,00	$	60.000,00
13	Thinner	galón	15	$	40.000,00	$	600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	2	$	120.000,00	$	240.000,00
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivas 10 x 2 mts x 30 mts Cal. 16	rollo	8	$	1.152.000,00	$	9.216.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	45	$	13.000,00	$	585.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	20	$	32.150,00	$	643.000,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	269.000,00	$	-
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	20	$	367.000,00	$	7.340.000,00
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	455.500,00	$	-
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterias	und	0	$	282.900,00	$	-
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterias	und	0	$	282.900,00	$	-
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	60	$	48.600,00	$	2.916.000,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	15	$	5.715,00	$	85.725,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	15	$	10.000,00	$	150.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	5.715,00	$	11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	10.000,00	$	20.000,00
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	0	$	25.700,00	$	-
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	0	$	106.250,00	$	-
30	Tablero material acrilico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$	798.000,00	$	-
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	0	$	4.300,00	$	-
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	0	$	259.200,00	$	-
33	Tiza industrial	und	5	$	5.430,00	$	27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	3	$	3.422,00	$	10.266,00
35	Cascajillo	bulto	1	$	3.422,00	$	3.422,00
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	10	$	38.600,00	$	386.000,00
37	Malla electrosoldada	und	0	$	89.611,00	$	-
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$	4.800,00	$	4.800,00
39	Cimbra albañil	und	0	$	12.800,00	$	-
40	Hoja de segueta	und	0	$	9.800,00	$	-
					SUBTOTAL	$	33.508.487,00
					MANO DE OBRA 40%	$	22.338.991,33
					TOTAL		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



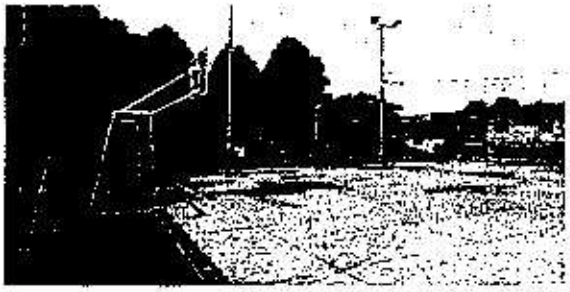



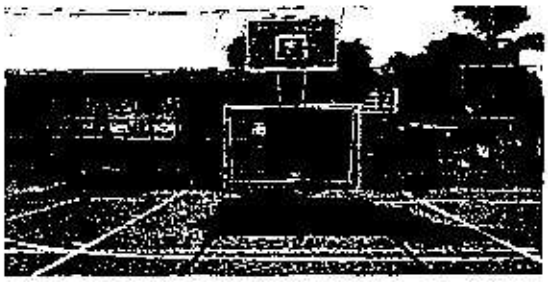

6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES	
NECESIDADES	
1	PINTURA EN GENERAL
2	CERRAMIENTO TOTAL
3	PLACA EN MAL ESTADO
4	GRADERIA EN MAL ESTADO
5	SE INUNDA
6	SUBIR MALLA

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS


REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Inderba	INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023	24
	POLIDEPORTIVA BARRIO LA FLORESTA	

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	3
BARRIO	LA FLORESTA
COORDENADAS	(7°04'27"N 73°60'56")

RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA

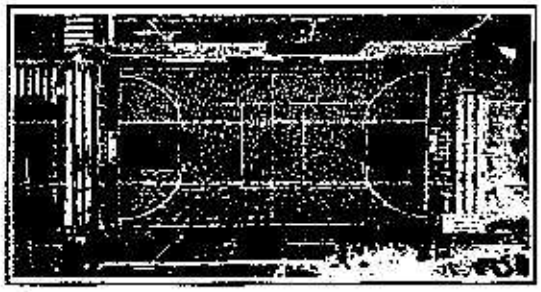

2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES	LARGO (ml):	25,15	ANCHO (ml):	15,10	AREA (m²):	379,77

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN


Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio **La Floresta** dentro del área urbana del Distrito con un área de 379,77 m2 consistente en:


1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.


4. LISTADO DE MATERIALES

MATERIALES							
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$	8.572,00	$	17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$	11.500,00	$	23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	5	$	94.300,00	$	471.500,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	5	$	628.600,00	$	3.143.000,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	7	$	131.500,00	$	920.500,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$	100.000,00	$	200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0,5	$	114.300,00	$	57.150,00
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	5	$	93.300,00	$	466.500,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$	587.200,00	$	1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$	10.000,00	$	60.000,00
13	Thinner	galón	15	$	40.000,00	$	600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	0	$	120.000,00	$	-
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivos 10.5 x 2 mts x 20 mts Cal. 16	rollo	10	$	1,152.000,00	$	11.520.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	60	$	13.000,00	$	780.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	15	$	32.150,00	$	482.250,00
18	Tubo carramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	269.000,00	$	-
19	Tubo carramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	367.000,00	$	-
20	Tubo carramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	455.500,00	$	-
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	0	$	48.600,00	$	-
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	10	$	5.715,00	$	57.150,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	10	$	10.000,00	$	100.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	5.715,00	$	11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	10.000,00	$	20.000,00
28	Ustón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	0	$	25.700,00	$	-
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	12	$	106.250,00	$	1.275.000,00
30	Tablero material acrílico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$	798.000,00	$	-
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	60	$	4.300,00	$	258.000,00
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	2	$	259.200,00	$	518.400,00
33	Tiza industrial	und	5	$	5.430,00	$	27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	0	$	3.422,00	$	-
35	Cascajillo	bulto	0	$	3.422,00	$	-
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	0	$	38.600,00	$	-
37	Malla electrosoldada	und	0	$	89.611,00	$	-
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$	4.800,00	$	4.800,00
39	Cimbra albañil	und	0	$	12.800,00	$	-
40	Hoja de segueta	und	0	$	9.800,00	$	-
					SUBTOTAL	$	25.958.974,00
					MANO DE OBRA 40%	$	17.305.982,67
					TOTAL		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

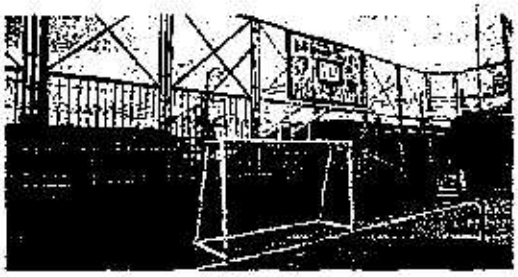

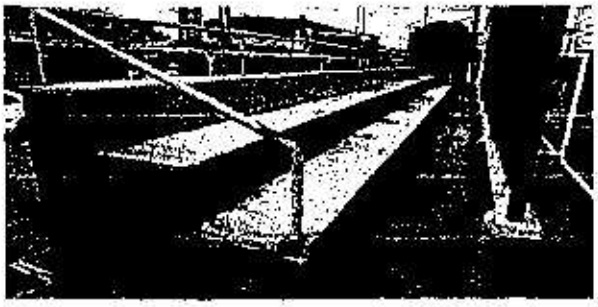

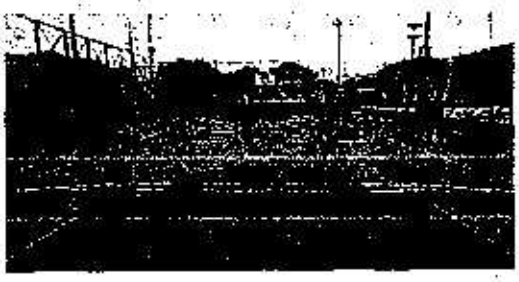



6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
1. TABLERO DE BALONCESTO (ARREGLO)
2. AROS DE BALONCESTO (COLOCAR)
3 PINTURA Y GRADERIA

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS

REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Inderba	INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023	52
	POLIDEPORTIVA BARRIO MINAS DEL PARAISO	

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	7
BARRIO	MINAS DEL PARAISO
COORDENADAS	(7°02'50"N 73°49'53"W)

RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA



2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES LARGO (ml): 26,22 ANCHO (ml): 16,25 AREA (m²): 426,08

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN


Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio **Minas del Paraiso** dentro del área urbana del Distrito con un área de 426,08 m2 consistente en:


1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.

4. LISTADO DE MATERIALES


MATERIALES							
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$	8.572,00	$	17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$	11.500,00	$	23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	15	$	94.300,00	$	1.414.500,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	4	$	628.600,00	$	2.514.400,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	15	$	131.500,00	$	1.972.500,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$	100.000,00	$	200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0,5	$	114.300,00	$	57.150,00
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	2	$	93.300,00	$	186.600,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$	587.200,00	$	1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$	10.000,00	$	60.000,00
13	Thinner	galón	15	$	40.000,00	$	600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	6	$	120.000,00	$	720.000,00
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivos 10.5 x 2 mts x 20 mts Cal. 16	rollo	8	$	1.152.000,00	$	9.216.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	40	$	13.000,00	$	520.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	25	$	32.150,00	$	803.750,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	15	$	269.000,00	$	4.035.000,00
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	25	$	367.000,00	$	9.175.000,00
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	7	$	455.500,00	$	3.188.500,00
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	60	$	48.600,00	$	2.916.000,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	15	$	5.715,00	$	85.725,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	15	$	10.000,00	$	150.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	5.715,00	$	11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	10.000,00	$	20.000,00
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	0	$	25.700,00	$	-
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	12	$	106.250,00	$	1.275.000,00
30	Tablero material acrílico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$	798.000,00	$	-
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	45	$	4.300,00	$	193.500,00
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	2	$	259.200,00	$	518.400,00
33	Tiza industrial	und	5	$	5.430,00	$	27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	0	$	3.422,00	$	-
35	Cascajillo	bulto	0	$	3.422,00	$	-
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	0	$	38.600,00	$	-
37	Malla electrosoldada	und	0	$	89.611,00	$	-
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$	4.800,00	$	4.800,00
39	Cimbra albañil	und	0	$	12.800,00	$	-
40	Hoja de segueta	und	0	$	9.800,00	$	-
					SUBTOTAL	$	44.851.549,00
					MANO DE OBRA 40%	$	29.901.032,67
					TOTAL		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

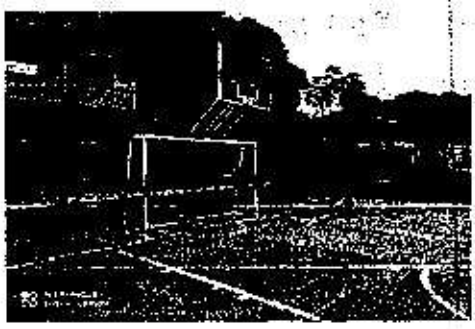

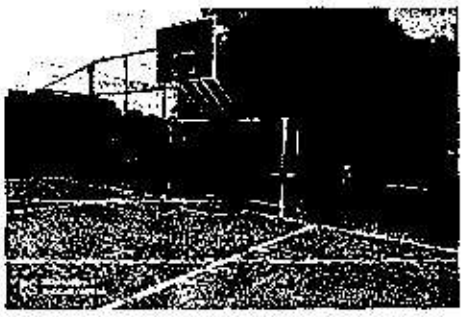



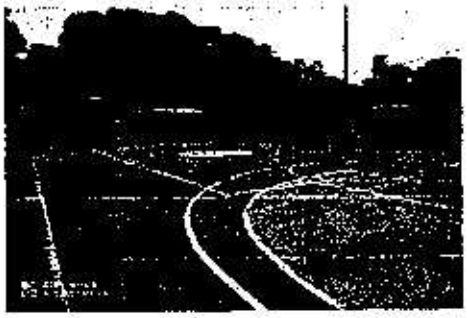

6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
1. PINTURA EN GENERAL
2. ARCOS EN MAL ESTADO
3 TABLEROS EN MAL ESTADO
4 MALLA EN MAL ESTADO
5 COLOCAR ARO

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS

REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Inderba	INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023	53
	POLIDEPORTIVA BARRIO MARIA EUGENIA	

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	7
BARRIO	MARIA EUGENIA
COORDENADAS	(7°02'58"N 73°49'46"W)

RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA



2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES	LARGO (ml):	28,02	ANCHO (ml):	17,49	AREA (m²):	490,07

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN


Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio **Maria Eugenia** dentro del área urbana del Distrito con un área de 490,07 m2 consistente en:

1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.


4. LISTADO DE MATERIALES


MATERIALES							
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$	8.572,00	$	17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$	11.500,00	$	23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	6	$	94.300,00	$	565.800,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	4	$	628.600,00	$	2.514.400,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	12	$	131.500,00	$	1.578.000,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$	100.000,00	$	200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0	$	114.300,00	$	-
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	10	$	93.300,00	$	933.000,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$	587.200,00	$	1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$	10.000,00	$	60.000,00
13	Thinner	galón	15	$	40.000,00	$	600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	8	$	120.000,00	$	960.000,00
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivas 10.0 x 2 mts x 30 mts Cal. 16	rollo	2	$	1.152.000,00	$	2.304.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	30	$	13.000,00	$	390.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	15	$	32.150,00	$	482.250,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	269.000,00	$	-
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	367.000,00	$	-
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	455.500,00	$	-
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	70	$	48.600,00	$	3.402.000,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	15	$	5.715,00	$	85.725,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	15	$	10.000,00	$	150.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	5.715,00	$	11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	10.000,00	$	20.000,00
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	0	$	25.700,00	$	-
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	0	$	106.250,00	$	-
30	Tablero material acrílico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$	796.000,00	$	-
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	0	$	4.300,00	$	-
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	0	$	259.200,00	$	-
33	Tiza Industrial	und	5	$	5.430,00	$	27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	3	$	3.422,00	$	10.266,00
35	Cascajillo	bulto	4	$	3.422,00	$	13.688,00
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	2	$	38.600,00	$	77.200,00
37	Malla electrosoldada	und	0	$	89.611,00	$	-
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$	4.800,00	$	4.800,00
39	Cimbra albañil	und	1	$	12.800,00	$	12.800,00
40	Hoja de segueta	und	0	$	9.800,00	$	-
					SUBTOTAL	$	19.388.653,00
					MANO DE OBRA 40%	$	12.925.768,67
					TOTAL		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

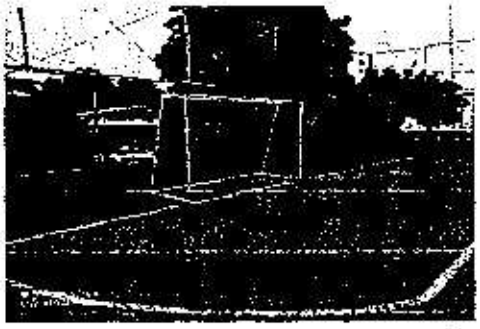



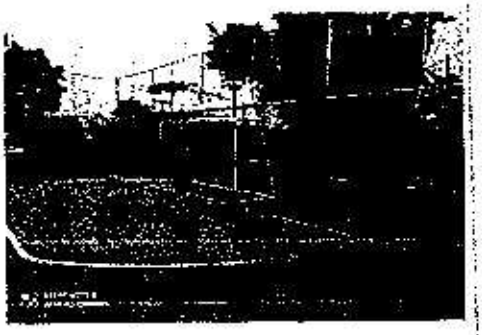

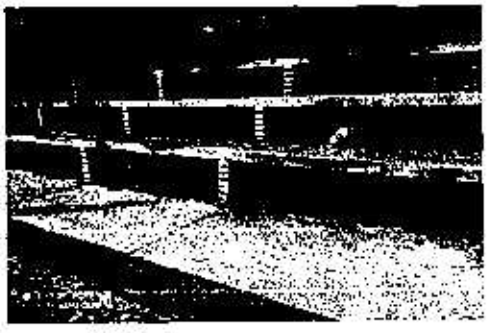

6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
1. MALLA EN MAL ESTADO
2. SOLDADURA DE VARILLAS
3 PINTURA EN GENERAL

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS


REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Inderba	INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023	54
	POLIDEPORTIVA BARRIO NUEVE DE ABRIL	

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	7
BARRIO	NUEVE DE ABRIL
COORDENADAS	(7°02'58"N 73°49'45"W)

RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA

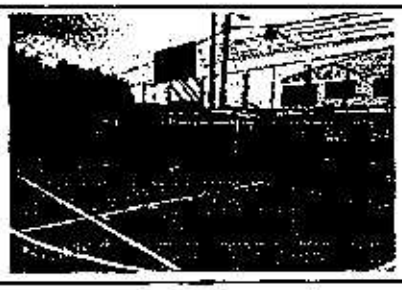

2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES	LARGO (ml):	27,12	ANCHO (ml):	15,00	AREA (m²):	406,80

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN


Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio **Nueve de Abril** dentro del área urbana del Distrito con un área de 406,80 m2 consistente en:


1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (Incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.

4. LISTADO DE MATERIALES

MATERIALES							
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$	8.572,00	$	17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$	11.500,00	$	23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	3	$	94.300,00	$	282.900,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
5	Pintura antidesfizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	4	$	628.600,00	$	2.514.400,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	6	$	131.500,00	$	789.000,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$	100.000,00	$	200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0,5	$	114.300,00	$	57.150,00
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	6	$	93.300,00	$	559.800,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$	587.200,00	$	1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$	10.000,00	$	60.000,00
13	Thinner	galón	15	$	40.000,00	$	600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	2	$	120.000,00	$	240.000,00
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivas 10.0 x 2 mts x 20 mts Cal. 16	rollo	4	$	1.152.000,00	$	4.608.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	30	$	13.000,00	$	390.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	12	$	32.150,00	$	385.800,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	269.000,00	$	-
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	367.000,00	$	-
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	455.500,00	$	-
21	Tubo tipo pesado 2¾" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	10	$	48.600,00	$	486.000,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	10	$	5.715,00	$	57.150,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	10	$	10.000,00	$	100.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	5.715,00	$	11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	10.000,00	$	20.000,00
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	0	$	25.700,00	$	-
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	12	$	106.250,00	$	1.275.000,00
30	Tablero material acrílico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$	798.000,00	$	-
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	45	$	4.300,00	$	193.500,00
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	2	$	259.200,00	$	518.400,00
33	Tiza Industrial	und	5	$	5.430,00	$	27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	0	$	3.422,00	$	-
35	Cascajillo	bulto	0	$	3.422,00	$	-
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	0	$	38.600,00	$	-
37	Malla electrosoldada	und	0	$	89.611,00	$	-
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$	4.800,00	$	4.800,00
39	Cimbra albañil	und	0	$	12.800,00	$	-
40	Hoja de segueta	und	0	$	9.600,00	$	-
					SUBTOTAL	$	18.368.624,00
					MANO DE OBRA 40%	$	12.244.416,00
					TOTAL		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

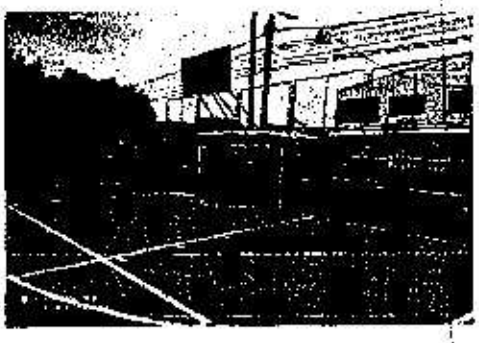

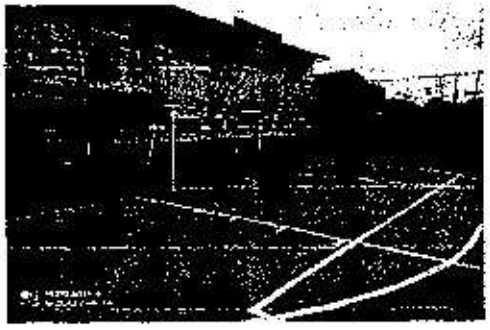



6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
1. SOLO SOLDADURA DE REFUERZO DE PORTON
2.

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS

REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Inderba	INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023	55
	POLIDEPORTIVA BARRIO VILARELYS II	

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	7
BARRIO	VILLARELYS II
COORDENADAS	(7°03'29"N 73°49'31"W)

RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA



2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES	LARGO (ml):	25,28	ANCHO (ml):	14,22	AREA (m²):	373,42

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN

Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio VILLARELYS II dentro del área urbana del Distrito con un área de 373,42 m2 consistente en:

1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.


4. LISTADO DE MATERIALES

MATERIALES					
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$ 8.572,00	$ 17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	12	$ 94.300,00	$ 1.131.600,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$ 628.600,00	$ 1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	5	$ 628.600,00	$ 3.143.000,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$ 628.600,00	$ 1.885.800,00
7	Pictura esmalte aluminio para mallas	galón	15	$ 131.500,00	$ 1.972.500,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$ 100.000,00	$ 200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0,5	$ 114.300,00	$ 57.150,00
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	12	$ 93.300,00	$ 1.119.600,00
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$ 587.200,00	$ 1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 9"	und	6	$ 10.000,00	$ 60.000,00
13	Thinner	galón	15	$ 40.000,00	$ 600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	8	$ 120.000,00	$ 720.000,00
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivas 10,5" x 2 mts x 30 mts Cal. 16	rollo	8	$ 1.152.000,00	$ 9.216.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	50	$ 13.000,00	$ 650.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	25	$ 32.150,00	$ 803.750,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$ 269.000,00	$ -
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	0	$ 367.000,00	$ -
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$ 455.500,00	$ -
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterías	und	0	$ 282.900,00	$ -
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterías	und	0	$ 282.900,00	$ -
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	40	$ 48.600,00	$ 1.944.000,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	15	$ 5.715,00	$ 85.725,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	15	$ 10.000,00	$ 150.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$ 5.715,00	$ 11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$ 10.000,00	$ 20.000,00
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	8	$ 25.700,00	$ 205.600,00
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts inmunizada	und	12	$ 106.250,00	$ 1.275.000,00
30	Tablero material acrílico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$ 798.000,00	$ -
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	40	$ 4.300,00	$ 172.000,00
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	2	$ 259.200,00	$ 518.400,00
33	Tiza industrial	und	5	$ 5.430,00	$ 27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	4	$ 3.422,00	$ 13.688,00
35	Cascajillo	bulto	2	$ 3.422,00	$ 6.844,00
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	8	$ 38.600,00	$ 308.800,00
37	Malla electrosoldada	und	0,5	$ 89.611,00	$ 44.805,50
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$ 4.800,00	$ 4.800,00
39	Cimbra albañil	und	0	$ 12.800,00	$ -
40	Hoja de segueta	und	0	$ 9.800,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 29.447.988,50
				MANO DE OBRA 40%	$ 19.631.991,00
				TOTAL	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





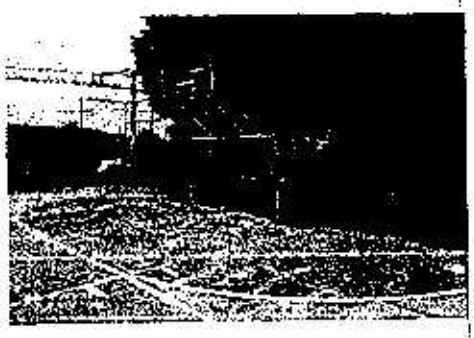

6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
1. PINTURA EN GENERAL
2. MALLAS EN MAL ESTADO
3 TABLERO EN MAL ESTADO
4 REQUIERE SUBIR MALLAS LATERALES

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS


REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

Inderba	INFORME DE POLIDEPORTIVAS INTERVENCION 2023	56
	POLIDEPORTIVA BARRIO PABLO ACUÑA	

1. LOCALIZACIÓN

URBANO	
COMUNA	7
BARRIO	PABLO ACUÑA
COORDENADAS	(7°03'29"N 73°49'19"W)

RURAL	
CORREGIMIENTO	NA
VEREDA	NA
COORDENADAS	NA

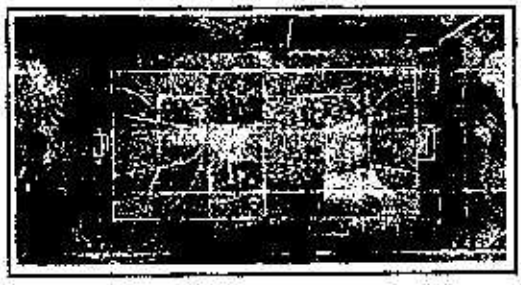

2. CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES LARGO (ml): 28,23 ANCHO (ml): 14,24 AREA (m²): 373,52

POLIDEPORTIVA EN CONCRETO DEMARCADA PARA LA PRACTICA DE LOS SIGUIENTES DEPORTES:

BALONCESTO [X] VOLEIBOL [X] MICROFUTBOL [X] FUTBOL DE SALON [ ] TENIS [ ]

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN

Adecuación y mejoramiento de la polideportiva existente del barrio **PABLO ACUÑA** dentro del área urbana del Distrito con un área de 373,52 m2 consistente en:


1. Desmonte y retiro de tramos de tubería, varilla y malla de cerramiento existente en mal estado.
2. Desmonte y retiro de tableros en madera de baloncesto.
3. Soldadura de varillas nuevas y/o existentes en buen estado en costados norte y sur detrás de porterías.
4. Soldadura y empalme de tramos de tubería reemplazados.
5. Soldadura de malla de cerramiento nueva en tramos necesarios.
6. Estiramiento y punteo de malla existente en tramos necesarios.
7. Fabricación e instalación de puerta de acceso a la polideportiva costado oriental.
8. Fabricación e instalación de tableros en madera para baloncesto (Incluye pintura total con esmalte y reparación e instalación de aros existentes).
9. Desmonte de tramos verticales de portería y reemplazo en tubería de perforación de 3".
10. Aplicación de capa anticorrosiva y pintura general con esmalte aluminio de la totalidad de la estructura de tubería y malla de cerramiento.
11. Pintura total de porterías de microfutbol y estructura de soporte de tableros de baloncesto.
12. Resane de muros perimetrales de cerramiento en tramos necesarios (H = 0,60 mts).
13. Pintura total de superficie para la práctica deportiva (Microfutbol, baloncesto y voleibol) y muros perimetrales.
14. Demarcación de superficie para la práctica deportiva de microfutbol, baloncesto y voleibol.
15. Limpieza general de cunetas perimetrales.
16. Retiro de sobrantes sobre área alrededor a la polideportiva.

4. LISTADO DE MATERIALES


MATERIALES							
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO		VR TOTAL	
1	Brocha 2" mango madera	und	2	$	8.572,00	$	17.144,00
2	Brocha 3" mango madera	und	2	$	11.500,00	$	23.000,00
3	Pintura anticorrosiva gris	galón	5	$	94.300,00	$	471.500,00
4	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde primaveral	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
5	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color verde fresco	cuñete	4	$	628.600,00	$	2.514.400,00
6	Pintura antideslizante para canchas x 5 gl color azul	cuñete	3	$	628.600,00	$	1.885.800,00
7	Pintura esmalte aluminio para mallas	galón	15	$	131.500,00	$	1.972.500,00
8	Pintura esmalte con acabado brillante blanco	galón	2	$	100.000,00	$	200.000,00
9	Pintura esmalte con acabado mate verde (Tablero baloncesto)	galón	0,5	$	114.300,00	$	57.150,00
10	Pintura vinilo con acabado mate tipo 1 (Colores por definir)	galón	0	$	93.300,00	$	-
11	Pintura vinilo tipo Koraza acabado mate tipo 1	cuñete	2	$	587.200,00	$	1.174.400,00
12	Rodillo de felpa de 5"	und	6	$	10.000,00	$	60.000,00
13	Thinner	galón	15	$	40.000,00	$	600.000,00
14	Angulos 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6 mts	und	8	$	120.000,00	$	960.000,00
15	Malla eslabonada para cerramiento de polideportivos (2.5 x 2 mts x 20 mts Cal. 12	rollo	10	$	1.152.000,00	$	11.520.000,00
16	Platina de 1/2" x 1/8" x 6 mts	und	60	$	13.000,00	$	780.000,00
17	Soldadura 6013 x 3/32"	kg	25	$	32.150,00	$	803.750,00
18	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 1 ½" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	269.000,00	$	-
19	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 2" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	367.000,00	$	-
20	Tubo cerramiento galvanizado tipo pesado 3" x 6 mts Cal. 12	und	0	$	455.500,00	$	-
21	Tubo tipo pesado 2½" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
22	Tubo tipo pesado 3" x 6 mts para porterías	und	0	$	282.900,00	$	-
23	Varilla lisa 1/2" x 6 mts	und	60	$	48.600,00	$	2.916.000,00
24	Disco para corte metal 4" x 1/16" x 7/8"	und	15	$	5.715,00	$	85.725,00
25	Disco para corte metal 7" x 1/16" 7/8"	und	15	$	10.000,00	$	150.000,00
26	Disco para pulir metal 4" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	5.715,00	$	11.430,00
27	Disco para pulir metal 7" x 1/8" x 7/8"	und	2	$	10.000,00	$	20.000,00
28	Listón madera zapán 1 1/2" x 2 1/2" x 1.14 mts inmunizado	und	0	$	25.700,00	$	-
29	Tabla zapán 18 cms x 1" x 1.80 mts Inmunizada	und	12	$	106.250,00	$	1.275.000,00
30	Tablero material acrilico para baloncesto 1,20 x 1,80 mts	und	0	$	798.000,00	$	-
31	Tornillo carruaje con tuerca y arandela toda rosca 5/16" x 3 1/2"	und	45	$	4.300,00	$	193.500,00
32	Aro metálico para tablero baloncesto reglamentario	und	2	$	259.200,00	$	518.400,00
33	Tiza industrial	und	5	$	5.430,00	$	27.150,00
34	Arena fina para revoque	bulto	0	$	3.422,00	$	-
35	Cascajillo	bulto	1	$	3.422,00	$	3.422,00
36	Cemento gris x 50 Kg	bulto	2	$	38.600,00	$	77.200,00
37	Malla electrosoldada	und	0,5	$	89.611,00	$	44.805,50
38	Cinta para enmascarar 3/4"	und	1	$	4.800,00	$	4.800,00
39	Cimbra elabal'il	und	0	$	12.800,00	$	-
40	Hoja de segueta	und	0	$	9.800,00	$	-
					SUBTOTAL	$	30.252.676,50
					MANO DE OBRA 40%	$	20.168.584,33
					TOTAL		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



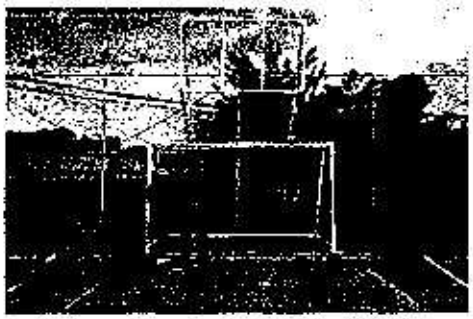



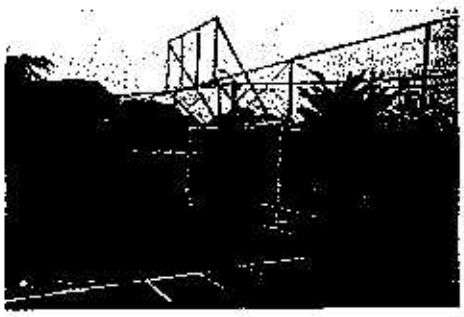

6. INFORMACION ADICIONAL

CONTACTO
NOMBRE
CARGO
TELEFONO

OBSERVACIONES GENERALES
1. CAMBIO DE TABLERO
2. PINTURA EN GENERAL
3. PLACA EN MAL ESTADO

CARLOS R FAJARDO PEÑA
ARQUITECTO CPS

REINALDO GAMARRA VELASQUEZ
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA


ALCANCE No. 2

ASESORAR AL ENTE TERRITORIAL EN LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATINÓDROMO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA (RAÚL MENESES MONSALVE).

INFORME ACTIVIDADES

NOVIEMBRE 2022

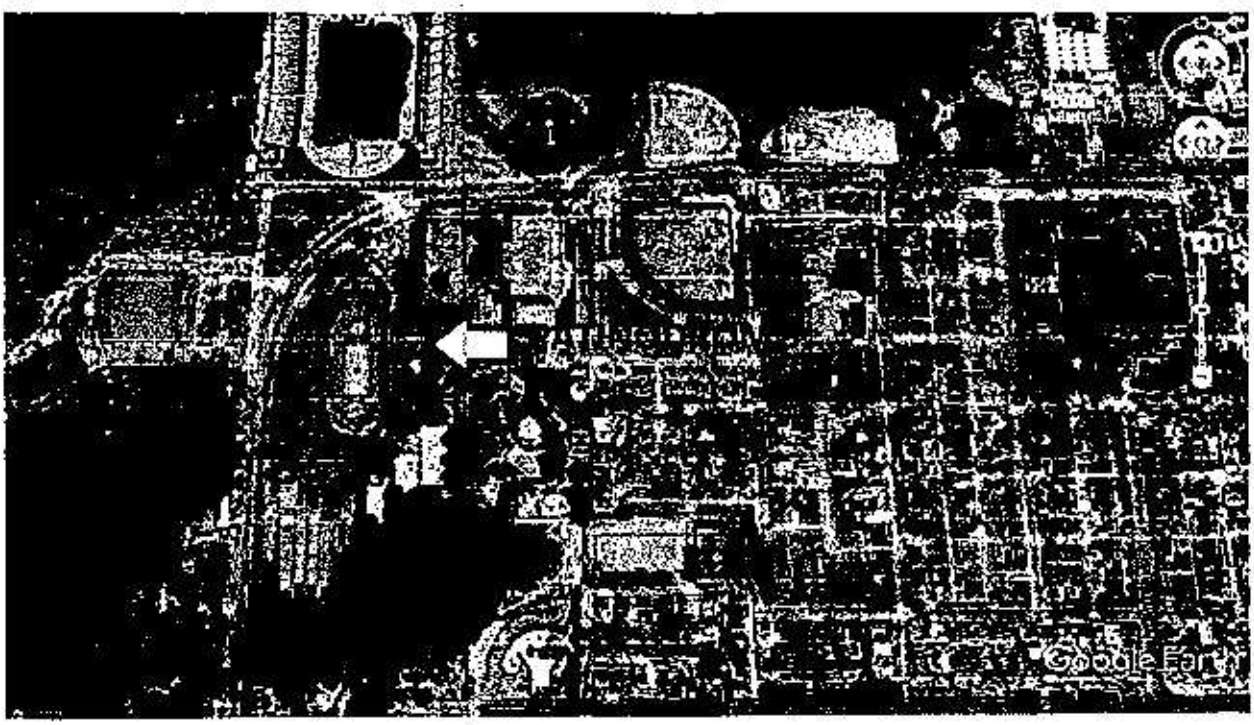

En este Presupuesto se han priorizado aspectos fundamentales para el bienestar de los jóvenes deportistas, como mejora de la accesibilidad al escenario, adecuación de los volúmenes de acceso las taquillas, las baterías de baños, los desagües hacia el exterior de la zona colindante con el parque recreacional, mantenimiento a la pista de ruta, demolición de zona verde alrededor de la pista de velocidad que permita una conexión con la zona de espera interior, mantenimiento al cerramiento de las pistas y pintura general, contemplando las siguientes actividades

DECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATINÓDROMO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA (RAÚL MENESES MONSALVE)		
ITEM	**DETALLE**	**UNID.**
1	**Excavaciones y rellenos**	
1.1	Descapote de zonas verdes	m2
1.2	Excavación manual para red sanitaria	m3
1.3	Corte con disco de pulidora	ML
1.4	Demolición de pavimento flexible E=0,05m (incluye cargue y retiro de escombros)	M2
1.5	Demolición de sardinel	m3
1.6	Demolición de revoque externos de muros de acceso y baños	m2
2	**Redes PVC para desagues**	
2.1	Tubería sanitaria PVC 6" para desague de cunetas	ml
2.2	Caja de inspección de aguas lluvias (0.60*0.60) en mampostería (incluye placa de piso de 10cm, revoque interno, marco en hierro fundido y tapa en concreto con refuerzo en 3/8")	und
3	**Aparatos sanitarios**	
3.1	Suministro e instalación de sanitario institucional color blanco	und
3.2	Suministro e instalación de lavamanos institucional color blanco	und
4	**Pista de patinaje**	
4.1	Imprimacion con emulsion asfaltica tipo CRL 1	m2
4.2	Suministro, extendido, nivelación y compactación de mezcla densa en caliente, degradación continua-capa de rodadura	m3
4.3	Concreto 2500 PSI en sitio para anden E=0,07m	m3
4.4	Instalación de Dilatación para pista de patinaje	ml
5	**Pinturas**	
5.1	Pintura para graderías tipo koraza	m2
5.2	Pintura con anticorrosivo para barandas	ml
6	**Mamposteria**	
6.1	Revoque impermeabilizado 1:4 en caras externas de muros	m2
7	**Postes**	
7.1	Pintura para tablas en madera plástica	ml
8	**Cubiertas**	
8.1	Mantenimiento de placa cubierta de área de taquilla y baños con tela poliester y syka-fil 12	m2
8.2	Reparación de estructura metálica de luminarias	und
9	**Escombros**	
9.1	Retiro de escombros a sitio determinado y certificado	m3

1. EXCAVACIONES Y RELLENOS
   1.1. Descapote de zonas verdes
   Este ítem se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente sobre un terreno, es parte importante de su habilitación para el desplante de una estructura y en la realización de una excavación; puede ejecutarse a mano o a máquina; el material sobrante debe llevarse a escombreras aprobadas por la administración municipal.
   1.2. Excavación manual para red sanitaria
   Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados tanques de agua, secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de proyecto
   1.3. Corte con disco de pulidora
   Consiste en realizar con pulidora y disco diamantado de 7", realizar dilataciones en el concreto existente
   1.4. Demolición de pavimento flexible E=0,05m (incluye cargue y retiro de escombros)
   Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de pavimento flexible que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto reforzado
   1.5. Demolición de sardinel
   Se realizará la demolición de sardinel perimetral de manera manual, para realizar su posterior reparación
   1.6. Demolición de revoque externos de muros de acceso y baños
   Se realizará la demolición de revoque en muros existentes de acceso principal y baterías sanitarias, para realizar su posterior reparación

2. REDES PVC PARA DESAGUES
   2.1. Tubería sanitaria PVC 6" para desagüe de cunetas
   Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de diámetro 6" para la correspondiente salida de aguas lluvias, incluye accesorios, zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría
   2.2. Caja de inspección de aguas lluvias (0.80*0.80) en mampostería (incluye placa de piso de 10cm, revoque interno, marco en hierro fundido y tapa en concreto con refuerzo en 3/8")
   Se refiere a la realización de caja de inspección indicada en los planos para la correspondiente llegada de aguas, incluye materiales, excavación y relleno conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
3. APARATOS SANITARIOS
   3.1. Suministro e instalación de sanitario institucional color blanco
   Este ítem se refiere a la instalación de aparato sanitario incluyendo accesorios, tanques de agua, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de sanitarios se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2".
   3.2. Suministro e instalación de lavamanos institucional color blanco

Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavamanos incluyendo accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se hará de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de lavamanos se harán con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2"..

4. PISTA DE PATINAJE

4.1. Imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL 1

4.2. Suministro, extendido, nivelación y compactación de mezcla densa en caliente, degradación continua-capa de rodadura

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica de gradación continua, preparada y colocada en caliente (concreto asfáltico), de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o determinados por el Interventor. La Tabla 450 - 1 relaciona tres tipos de mezclas asfálticas de gradación continua, en función del tipo de granulometría; se incluyen también las mezclas de alto módulo, cuyo módulo resiliente, medido por medio de la norma de ensayo INV E-749 a la temperatura y frecuencia definidas para el proyecto, debe ser igual o superior a 10,000 MPa

4.3. Concreto 2500 PSI en sitio para anden E=0,07m

Este ítem se refiere a la construcción de un andén en concreto de 2500 PSI, para comunicación peatonal Este Ítem se refiere a la aplicación de concreto in situ, que se utiliza sobre los pisos para su nivelación y evitar o reparar filtraciones de agua que permitan el desarrollo de humedades que puedan afectar a la estructura, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría

4.4. Instalación de Dilatación para pista de patinaje

El concreto (hormigón) se expande y contrae con las variaciones de humedad y temperatura. La tendencia de contraerse causa agrietamiento. La junta de dilatación de concreto tiene como función debilitar el pavimento en un punto determinado, creando el punto de retracción y fisura o grieta correspondiente, mejorando la vida útil y estética de la instalación. El producto es un perfil fabricado a partir de PVC, destinado al uso como guía para la nivelación del hormigón en pavimentos y a su vez a la absorción de los movimientos estructurales de dilatación y contracción. Este material permite lograr un peso liviano, lo cual facilita su instalación. Además, debido a que el perfil permanece embutido en el hormigón, no sufre degradación con el tiempo ni es visible en el pavimento. El diseño de pestañas en sus paredes laterales permiten mejor agarre a la superficie donde es instalada e incluye huecos para cableado. Además el extremo superior es rígido para que se pueda utilizar como guía cuando se pasa la regla vibradora.

5. PINTURAS

5.1. Pintura para graderías tipo koraza

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura sobre el pañete, para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes, que se requieren para la ejecución de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

5.2. Pintura con anticorrosivo para barandas

se refiere a la aplicación de un anticorrosivo sobre barandas, para dar una mejor protección, que se requieren para la ejecución de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

6. MAMPOSTERIA

6.1. Revoque impermeabilizado 1:4 en caras externas de muros

Se refiere a la aplicación del acabado liso impermeabilizado sobre las superficies de mampostería con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

7. POSTES

7.1. Pintura para tablas en madera plástica

Se refiere a la aplicación de un acabado en pintura esmalte sobre maderas, para dar una mejor terminación y apariencia a estas que se requieren para la ejecución de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

8. CUBIERTAS

8.1. Mantenimiento de placa cubierta de área de taquilla y baños con tela poliester y syka-fil 12

Este ítem se refiere al suministro e instalación de impermeabilización cubierta plana para evitar filtraciones de agua a través de está, las instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas y en manejo de sopletes, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas

8.2. Reparación de estructura metálica de luminarias

Estas especificaciones formulan reglas para la fabricación y montaje de las estructuras de acero al carbono a utilizarse en la presente obra

9. ESCOMBROS

9.1. Retiro de escombros a sitio determinado y certificado

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la recolección, cargue, transporte y desecho de materiales sobrantes, de acuerdo a lo autorizado por la Interventoría.

ALCANCE No. 3

HACER SEGUIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISION A LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SUSCRITOS POR LA ENTIDAD

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA DE VISITA	F:08.PO.GCE Versión: 0.8 Fecha: 19.03.19

FECHA: Noviembre 21 - 2022.

CLASE DE VISITA: Tecnica.

SEGUIMIENTO	X	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA		AUDITORIA		SOLICITUD DE INFORMACIÓN	

PROCESO: Seguimiento.

GESTIÓN ESTRATEGICA ☐ GESTIÓN CALIDAD ☐ GESTIÓN RECREATIVA Y DEPORTIVA ☐ GESTIÓN TALENTO HUMANO ☐

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ☒ GESTION FINANCIERA ☐ GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL ☐

GESTIÓN SISTEMAS Y COMUNICACIONES ☐ GESTION DOCUMENTAL ☐ CONTROL Y EVALUACIÓN ☐

OBJETIVO DE LA VISITA:
Realizar Seguimiento al mantenimiento Polideportiva los torres comuna 5

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LA VISITA: Harry Herrera Gomez
Leonardo Morales. Jairemir Jaraba. Arnoldo Pajaro.

DESARROLLO DE LA VISITA

- Realizar Seguimiento e Inspeccion del mantenimiento a la polideportiva los torres comuna 5, a los trabajadores de la Emp Americana
- Pintada de Malla
- Instalación de barrillas (Soldadura).
- Arreglo de Malla. y Cambio
- Inspeccion de implementos de seguridad EPP.
- Empamillado.
- Cambio de tuberia galvanizada de 2"
- Instalacion de tableros de baloncesto.

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA DE VISITA	F:08.PO.GCE Versión: 0.6 Fecha: 19.03.19

CONCLUSIONES O COMPROMISOS

- Realizar en el menor tiempo posible el arreglo y mantenimiento de la polideportiva los Fierros
- Cumplir con los compromisos pactados con los líderes de la JAC.

OBSERVACIONES

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA DE VISITA	F:08.PO.GCE Versión: 0.6 Fecha: 19.03.19

FIRMA DE LOS ASISTENTES:

NOMBRE COMPLETO	FIRMA
Harry Herrera Soto	
Yasmin Mesa G.	
Cristian Ortiz G.	
Diego Suarez	
Carlos Barajas	
Alma Garcia Ortiz	Alma Garcia O
Jazmin Jaraba Salazar	
Jefferson Montero	
[illegible]	
[illegible]	
Rosa Maria Pasca B	

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA DE VISITA	F:08.PO.GCE Versión: 0.6 Fecha: 19.03.19

FECHA:

CLASE DE VISITA:

SEGUIMIENTO	X	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA		AUDITORIA		SOLICITUD DE INFORMACIÓN	

PROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA ☐ GESTIÓN CALIDAD ☐ GESTIÓN RECREATIVA Y DEPORTIVA ☐ GESTIÓN TALENTO HUMANO ☐

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ☒ GESTION FINANCIERA ☐ GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL ☐

GESTIÓN SISTEMAS Y COMUNICACIONES ☐ GESTION DOCUMENTAL ☐ CONTROL Y EVALUACIÓN ☐

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar Seguimiento al mantenimiento de la Polide Portivo Isla del Zapato Comuna 1

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LA VISITA: Harry Herrera Gomez Leonardo Morales, Jairemir Jaraba.

DESARROLLO DE LA VISITA

Se Realizo Inspeccion y Seguimiento al mantenimiento de la Polideportiva del barrio Isla del Zapato (comuna 1). a los trabajadores de la Emp Americanos.

- Desmonte de Placa de la Polideportiva
- Encerrado de alrededor de la Polideportiva para la prevencion de algun peligro.
- fundicion de Placas
- Desinstalacion de Malla
- Emparillado
- Pintura de Malla.
- Soldadura de Malla.

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA DE VISITA	F:08.PO.GCE Versión: 0.6 Fecha: 19.03.19

CONCLUSIONES O COMPROMISOS

- Verificación a los trabajadores q' cumplan con las actividades asignadas
- Correcto Utilización de los EPP.

OBSERVACIONES

- Se dejo Cinta de Seguridad para prevenir accidentes por la Comunidad. la misma comunidad hace falta para poder Ingresar

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA DE VISITA	F.08.PO.GCE Versión: 0.6 Fecha: 19.03.19


FIRMA DE LOS ASISTENTES:

NOMBRE COMPLETO	FIRMA
Jimmy Alonso Gomez	
Jimmy R Bulloz	
Berta Justina Arevalo R	Berta Arevalo
Brayan Zarate Suarez	Brayan Zarate
Faiver Bonilla	
[illegible]	[illegible]
Kevin Andres Hoyos	Kevin H.
Edinson Ruiz Cruz	
Jaimmi Jaramillo	Jaimmi
Leonardo Mendez	
Carlos R Figueroa P	
Rosa Maria Prada Bravo	

ALCANCE No. 5

REALIAZAR LAS DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO QUE SEAN ASIGNADAS POR EL DIRECTOR GENERAL Y/O SUPERVISOR

MALECÓN-CRISTO PETROLERO

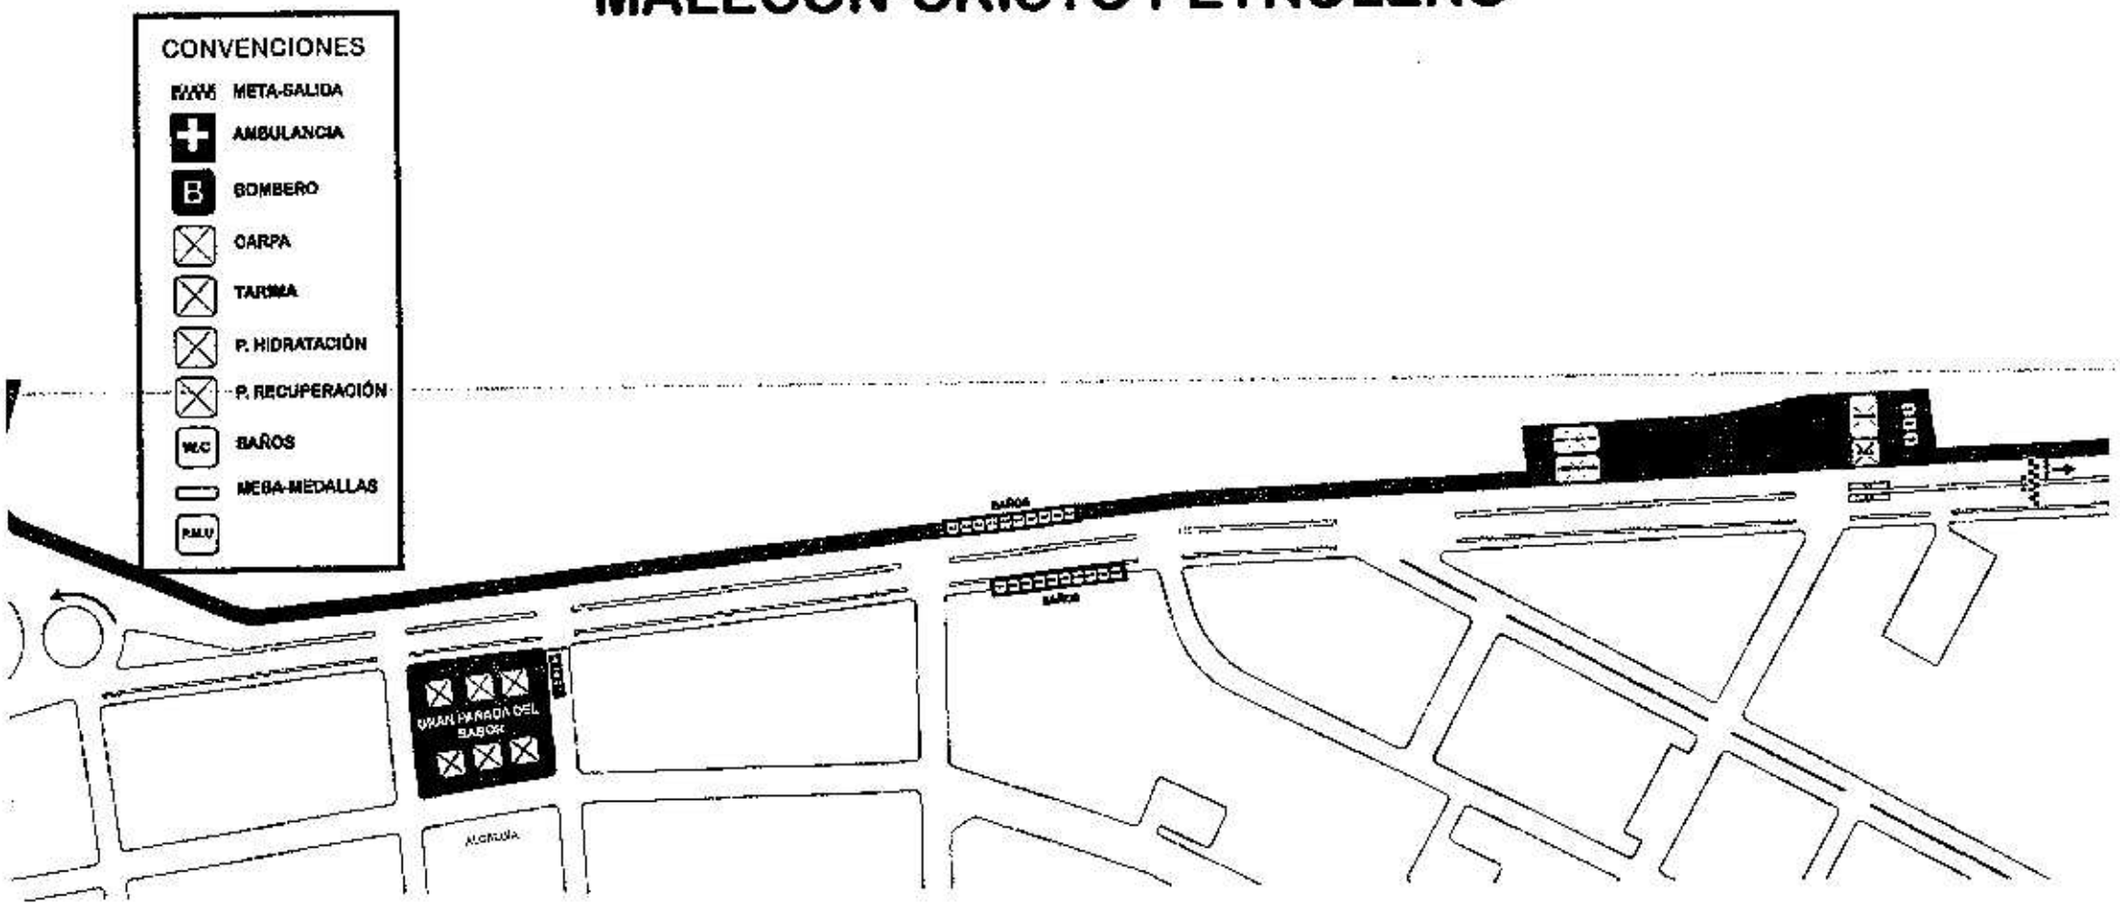


	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA	F.28.PO.GD
		Versión: 0.2
	REGISTRO DE REUNIONES	Fecha: 03.06.22
	Fecha: 30/11/2022	Hora Inicio:
		Hora final:

Mesa Mujer Con: Personal

NOMBRE	ENTIDAD, DEPENDENCIA, COMUNIDAD	FIRMA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
			310 888 2141	
			318 700 3392	
			320 842 5872	
			324 516 5727	
			314 598 954	

Comprobante

de pago en línea

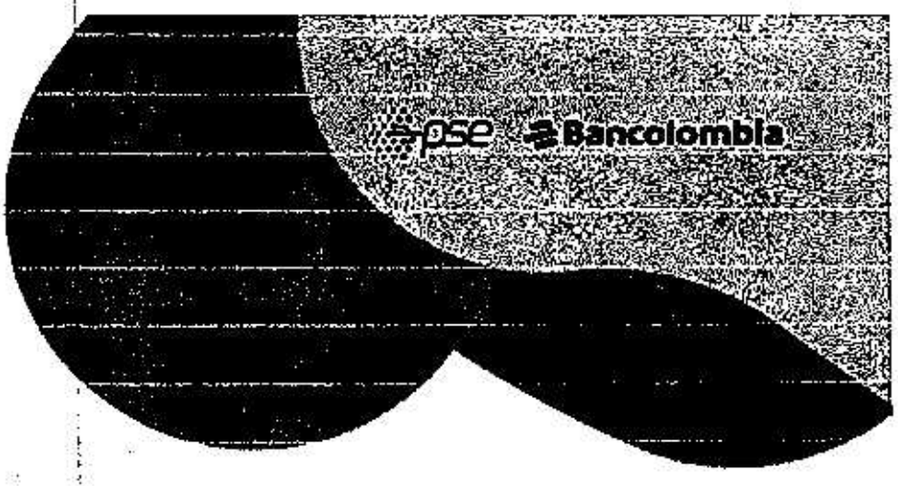

COMPENSAR-OI

Pago realizado por: CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA

Nro. de recibo: 63411159

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 190.143.67.194

Concepto: CC

Razón Social: 91204092

Fecha y hora de la transacción: Lunes 21 de Noviembre de 2022 11:48:43 AM

Nro. de comprobante: 0000044655

Valor pagado: $ 379,300.00

Cuenta: *******0663

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 9400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91204082	CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA		CALLE 60 # 21-45	6004475	cfajardop24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			SANTANDER	BARRANCABERMEJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-10	2022-10	1	21/11/2022	83411159	TOTAL A PAGAR	
					$379.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Sanitas EPS	800251440-6	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011183-6	29.300				29.300	0	0	29.300			293	29.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administrador	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGS, LMA, FSP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	29.300	29.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	379.300	379.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91204062	CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA		CALLE 60 # 21-45	6004478	carofapa24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BARRANCABERMEJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ANTICIPADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	E	21/11/2022	83491169	$379.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ingreso	Retiro	Traslado	Sanción	Licencia	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Suspensión	Cód. Ayte	IBC APO	Cotización	Tarifa Aportes	Tarifa Aportes	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Mora	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91204062	FAJARDO PEÑA CARLOS ROBERTO	X															0	0	0	0	0	0	EPS016	2.400.000	380.800	14-03	2.400.000	2	38.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA CUENTA DE COBRO	F:07.PO.GF Versión: 0.5 Fecha: 26.09.22

INDERBA
NIT 829.000.477-7

DEBE A:

CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
CC. 91.204.092 expedida en Bucaramanga (Santander)

LA SUMA DE: (En números)	**$ 7.000.000**
Contrato No:	**397 - 2022**
Por concepto de: (Objeto del contrato)	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL INDERBA EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
Correspondiente al periodo: Del (día) de (mes) al (día) de (mes) del (año)	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cordialmente,

Firma contratista

NOTA 1: Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad realizada, parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTA2: Adjunto Planilla de pago de seguridad social No. 63411159 correspondiente al periodo objeto del contrato, bajo la gravedad del juramento manifiesto que para el periodo relacionado cancelé mis aportes a la seguridad social sobre el 40% de la totalidad de mis ingresos como prestador de servicios percibidos en la entidad territorial, en los términos establecidos en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019.

Cuenta Cuenta ahorros No 30629570663
Banco: BANCOLOMBIA

Teléfono: 3174242454 - 3208475872

Se expide en Barrancabermeja, a los 06 DIC 2022
