Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

LISTA DE CHEQUEO PARA ACTA PARCIAL INTERVENTORIA

No.	Nombre del Documento	Expediente	Tesorería
1	Copia del Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP)	Original	Copia
2	Copia de Certificado Registro Presupuestal (CRP)	Original	Copia
3	Copia Certificación Bancaria	Copia	Copia
4	Certificado de egresos de pagos anteriores	Original	Copia
5	Factura Original o Cuenta de Cobro	Copia	Original
6	Declaración Juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. Firmada por el Representante	Original	Copia
7	Relación de personal de la propuesta, salario y porcentaje dedicación (Según Formato)	Original	N.A.
8	Pagos mensuales Seguridad Social y Parafiscales o afiliaciones del mes	Original	Copia
9	Certificado de Cumplimiento para pago	Original	Copia
10	Informe de Interventoría mensual	Original	N.A.
11	Acta Parcial Literal	Original	Copia
12	Acta Parcial Numérica	Original	Copia
13	Copia de Acta de Inicio	Original	Copia
14	Copia de Póliza del contrato, Aprobación de Póliza, Recibo pago de Pólizas	Original	Copia
15	Copia resolución de aprobación de póliza	Original	Copia
16	Copia Contrato y/o modificaciones	Original	Copia
17	Copia RUT (actualizado)	Copia	Copia
18	Copia de Constitución del consorcio (si aplica)	Copia	Copia

Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

Copia del Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP)

Gobierno de la GENTE

MONTERÍA

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	22001050
CDP No.	22000825
martes 22 febrero 2022	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2022 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Valor C.D.P.	Valor Disponbile.
2.3.2.02.02.005-24.7	Servicios de la construcción (Recursos Crédito FINDETER)	64 - OTROS COFIN. SALDOS DISP. VIGENCIA ANTERIOR	$ 215.493.459,00	$ 16.751.180.046,00
		Totales...	$ 215.493.459,00	$ 16.751.180.046,00

Total CDP en letras: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y NUEVE Pesos

El certificado No. 22000825 se emite en Monteria el dia martes 22 de febrero de 2022 como requisito previo a INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Marcedia Padron

Jefe de Presupuesto

ALCALDIA DE MONTERIA OFICINA DE PRESUPUESTO

Solicito : HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 191.108.138.59

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE
Calle 27 # 3-16, Edificio Antonio de la Torre y Miranda
www.monteria.gov.co
Monteria, Córdoba

Copia de Certificado Registro Presupuestal (CRP)

Alcaldía de MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 22001573

RP No.	22001573
jueves 14 julio 2022	

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 901254479 - ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S **NIT:** 901254479

No. del Certificado de disponibilidad 22000825 **Contrato No:** CMA-SPM-007--2022

Tiempo de Ejecucion: 4 MESES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Valor R.P.
2.3.2.02.02.005-24.7	Servicios de la construcción (Recursos Crédito FINDETER)	64 - OTROS COFIN. SALDOS DISP. VIGENCIA ANTERIOR	$ 215.493.346,00
		Total Reserva..	$ 215.493.346,00

Total reserva en letras: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA y SEIS Pesos

Objeto

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

ALCALDIA DE MONTERIA OFICINA DE PRESUPUESTO

Dairo Hoyos Bedoya
Jefe de Presupuesto

Solicito: HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 191.108.174.106

Copia Certificación Bancaria

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 01/11/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGE NIERIA SAS** con **NIT 901.254.479-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 047870026425

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

Factura Original o Cuenta de Cobro

Gobierno de la GENTE

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
901.254.479-2
TV 154 NUM 17 20 CASA 10
(607) 6569803
Floridablanca - Colombia
elsamariaruedasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. E-1

Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734-1
Teléfono: (604) 7924545
Dirección: CL 27 CR 3 ESQ
Ciudad: Montería - Colombia
Correo: tesoreria@monteria.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	29/11/2022, 16:05
Expedición	29/11/2022, 16:11
Vencimiento	07/12/2022
Vendedor	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE PAGO PARCIAL NÚMERO 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-007-2022 PERIODO: DEL 09 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIAS.A.S - 100% NIT No.901.254.479-2	1.00	53,326,799.00
2	IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	3,584,994.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones novecientos once mil setecientos noventa y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-07 por $ 56,911,793.00

Total Bruto	48,397,430.13
IVA 19%	8,514,362.87
Total a Pagar	56,911,793.00

Observaciones:
SUPERVISOR: Mario Alejandro Torres Pérez
e-mail: matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co
tesoreria@monteria.gov.co

CUENTA DE AHORROS ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS - DAVIVIENDA No. 047870026425

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764028889064 aprobado en 20220513 prefijo E desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 629f8798c4f3bbacdc5d226852ac3b4ea98c483f1d54325ba37a6c06ac917b94b95f6c3fef333dd921a56911039eb892

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. NIt: 830.048.145-8

Declaración Juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. Firmada por el Representante

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

DECLARACION JURAMENTADA

Montería, noviembre 04 de 2022

Señores
Alcaldía de Montería
Montería

Asunto: Declaración juramentada del pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales.

Yo, ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, en representación de ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, Nit: 901254479-2, declaro bajo la gravedad de juramento que he cumplido y me encuentro al día con mis obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje; A la fecha todo el personal propuesto, se encuentra afiliado como se detalla a continuación:

Planilla No.	Periodo cotizado	Valor de la Planilla	Cargo	Salud	Pensión	ARL	CCF, Sena, ICBF
61347128	ago-22	$ 358.600	DIRECTORA	SURA	PORVENIR	SURA	COMFACOR
61520868	ago-22	2.209.700	ESPECIALISTA	EPS SURA NUEVA EPS	PENSIONADO	SURA	COMFAMA
61520932	ago-22	$ 2.856.000	RESIDENTE COORDINADOR SST ABOGADO CONTADOR TOPOGRAFO CADENERO CONDUCTOR	SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS EPS-S MUTUAL SER	PROTECCION PORVENIR COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
61520853	ago-22	$ 760.700	SECRETARIA	SANITAS EPS	PROTECCION	SURA	COMFENALCO
62103365	sep-22	$ 361.900	DIRECTORA	SURA	PORVENIR	SURA	COMFACOR
62412794	sep-22	$ 149.600	ESPECIALISTA	EPS SURA	PENSIONADO	SURA	COMFAMA
62930679	sep-22	$ 3.437.900	RESIDENTE COORDINADOR SST ABOGADO CONTADOR TOPOGRAFO CADENERO CONDUCTOR	SALUD TOTAL EPS SANITAS EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS EPS-S MUTUAL SER	PROTECCION PORVENIR COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
62147247	sep-22	$ 772.000	SECRETARIA CONDUCTOR	SANITAS EPS EPS SURA	PROTECCION	SURA	COMFENALCO

Se adjunta soporte de pago.

Atentamente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
C.C. N° 37.934.541

Relación de personal de la propuesta, salario y porcentaje dedicación (Según Formato)

RELACION DE PERSONAL

CONTRATO No:	CMA-SPM-007-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S, representado por ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($215.493.346,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	9/08/2022
FECHA FINAL:	9/12/2022
PERIODO	DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 Al 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2022

PARAFISCALES MES DE AGOSTO (PERIODO 9/08/2022 AL 31/08/2022)

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesta	* FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARP	CCF
Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	$6.000.000		30%	$1.800.000,00	37.934.541	EPS SURA	PORVENIR	SURA	COMFACOR
Ingeniero Residente	ELKIN ROJAS ANAYA	$3.300.000		100%	$3.300.000,00	11.039.041	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
Especialista en vías	VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR	$3.800.000		20%	$1.000.000,00	10.524.225	EPS SURA	----	SURA	COMFAMA
Coordinador SG-SST	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	$2.800.00		30%	$1.000.000,00	37.934.541	EPS SURA	PORVENIR	SURA	COMFACOR
Contador	SANDRA MILENA GARNICA CARDENAS	$2.800.000		10%	$1.000.000,00	63.501.152	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
Abogado	YANETH PATRICIA RUEDA	$2.800.000		10%	$1.000.000,00	51.935.750	SANITAS EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
Topógrafo	DANIEL SANCHEZ AHIMELEC	$2.200.000		100%	$2.200.000	1.042.350.367	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
Secretaria	JANITH SULAY JAIMES PABON	$1.150.000		100%	$1.150.000	1.102.359.339	SANITAS EPS	PROTECCIÓN (ING + PROTECCIÓN)	SURA	COMFENALCO

Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACION DE PERSONAL
Contrato N°: CMA-SPM-007-2022
Fecha: 4/11/2022

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesta	* FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARP	CCF
Conductor	GUSTAVO DAVID POLO SOTO	$1.150.000		100%	$1.150.000	10.778.969	EPS-S MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
Cadenero	MARCOS DAVID RICARDO CASTRILLON	$1.100.000		100%	$1.100.000	1.233.346.220	NUEVA EPS	PROTECCIÓN (ING + PROTECCIÓN)	SURA	COMFACOR

PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE (PERIODO 1/09/2022 AL 30/09/2022)

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesta	* FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARP	CCF
Director de Obra	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	$6.000.000		30%	$1.800.000	37.934.541	EPS SURA	PORVENIR	SURA	COMFACOR
Ingeniero Residente	ELKIN ROJAS ANAYA	$3.300.000		100%	$3.300.000	11.039.041	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
Especialista en vías	VICTOR DANIEL CASTRO SALAZAR	$3.800.000		20%	$1.000.000	10.524.225	EPS SURA	----	SURA	COMFAMA
Coordinador SG-SST	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	$2.800.000		30%	$1.000.000	37.934.541	EPS SURA	PORVENIR	SURA	COMFACOR
Contador	SANDRA MILENA GARNICA CARDENAS	$2.800.000		10%	$1.000.000	63.501.152	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
Abogado	YANETH PATRICIA RUEDA	$2.800.000		10%	$1.000.000	51.935.750	SANITAS EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
Topógrafo	DANIEL SANCHEZ AHIMELEC	$2.200.000		100%	$2.200.000	1.042.350.367	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
Secretaria	JANITH SULAY JAIMES PABON	$1.150.000		100%	$1.150.000	1.102.359.339	SANITAS EPS	PROTECCIÓN (ING + PROTECCIÓN)	SURA	COMFENALCO
Conductor	GUSTAVO DAVID POLO SOTO	$1.150.000		100%	$1.150.000	10.778.969	EPS-S MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
Conductor	JUAN CARLOS CORTES PRADILLA	$1.150.000		100%	$1.150.000	91.205.817	EPS SURA	----	SURA	COMFENALCO
Cadenero	MARCOS DAVID RICARDO CASTRILLON	$1.100.000		100%	$1.100.000	1.233.346.220	NUEVA EPS	PROTECCIÓN (ING + PROTECCIÓN)	SURA	COMFACOR

MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTOR

Elaboró: Ing. Mario Torres – Apoyo a la Supervisión

Pagos mensuales Seguridad Social y Parafiscales o afiliaciones del mes

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
MES DE AGOSTO DE 2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	37934541	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	TRANSVERSAL 154 No. 17-20 Casa 10	6076569803	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	FLORIDABLANCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	22/09/2022	61347128	$358.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	12	1.400	0	126.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	12	1.800	0	161.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	69.600				69.600	12	800	70.400			696	70.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	126.400
Pensión	1	160.000	161.800
Riesgos Laborales	1	69.600	70.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	358.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	37934541	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ		TRANSVERSAL 154 No. 17-20 Casa 10	6076569803	emruedalandinez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	FLORIDABLANCA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	22/09/2022	61347128	$358.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	37934541	RUEDA LANDINEZ ELSA MARIA	59	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ALC MEDELLIN	CRMEDELLIN	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	19/09/2022	61520868	$2.209.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	30.700	0		0		0	0	0	0	30.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	262.200	0		0		0	0	0	0	262.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.048.700	0	0	32.800	32.800	0	0		1.114.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	509.600				509.600	0	0	509.600			5.096	509.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	292.900	0	0	292.900	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	292.900	292.900
Pensión	1	1.114.300	1.114.300
Riesgos Laborales	1	509.600	509.600
CCF	1	292.900	292.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	2.209.700	2.209.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS		Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ALC MEDELLIN	CRMEDELLIN	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	19/09/2022	61520868	$2.209.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10524225	CASTRO SALAZAR VICTOR DANIEL	1	3			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS010	766.667	30.700	14-11	766.667	5	53.400	CCF04	766.667	30.700	0	0	0	0	0
2	CC	5653444	PINZON QUIROGA JORGE HUMBERTO	1	0			S	X	X															25-14	6.553.889	1.048.700	0	0	32.800	32.800	EPS037	6.553.889	262.200	14-11	6.553.889	5	456.200	CCF04	6.553.889	262.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ALCALDIA MONTE	ESASMONTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 7 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E	19/09/2022	61520932	$2.856.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	64.600	0		0		0	0	0	0	64.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	30.700	0		0		0	0	0	0	30.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	55.200	0		0		0	0	0	0	55.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	30.700	0		0		0	0	0	0	30.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	29.400	0		0		0	0	0	0	29.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	123.200	0		0		0	0	0	0	123.200	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	35.300	0		0		0	0	0	0	35.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	117.400	0	0	0	0	0	0		117.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	620.100	0	0	0	0	0	0		620.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	738.200	0	0	0	0	0	0		738.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	642.100				642.100	0	0	642.100			6.421	642.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	369.100	0	0	369.100	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS		Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ALCALDIA MONTE	ESASMONTE	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	19/09/2022	61520932	$2.856.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	369.100	369.100
Pensión	3	1.475.700	1.475.700
Riesgos Laborales	1	642.100	642.100
CCF	1	369.100	369.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	2.856.000	2.856.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS		Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ALCALDIA MONTE	ESASMONTE	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 7 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E	19/09/2022	61520932	$2.856.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042350367	GONZALEZ SANCHEZ AHIMELEC DANIEL	1	0			S	x																230301	1.613.334	258.200	0	0	0	0	EPS002	1.613.334	64.600	14-11	1.613.334	5	112.300	CCF16	1.613.334	64.600	0	0	0	0	0
2	CC	10778969	POLO SOTO GUSTAVO DAVID	1	0			S	x																230301	881.667	141.100	0	0	0	0	ESSC07	881.667	35.300	14-11	881.667	5	61.400	CCF16	881.667	35.300	0	0	0	0	0
3	CC	11039041	ROJAS ANAYA ELKIN	1	0			S	x																25-14	3.080.000	492.800	0	0	0	0	EPS041	3.080.000	123.200	14-11	3.080.000	5	214.400	CCF16	3.080.000	123.200	0	0	0	0	0
4	CC	1233346220	RICARDO CASTRILLON MARCOS DAVID	1	0			S	x																230201	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS037	733.334	29.400	14-11	733.334	5	51.100	CCF16	733.334	29.400	0	0	0	0	0
5	CC	37934541	RUEDA LANDINEZ ELSA MARIA	1	0			S	x																230301	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS010	1.380.000	55.200	14-11	1.380.000	5	96.100	CCF16	1.380.000	55.200	0	0	0	0	0
6	CC	51935750	RUEDA LANDINEZ YANETH PATRICIA	1	0			S	x																25-14	766.667	122.700	0	0	0	0	EPS005	766.667	30.700	14-11	766.667	5	53.400	CCF16	766.667	30.700	0	0	0	0	0
7	CC	63501152	GARNICA CARDENAS SANDRA MILENA	1	0			S	x																25-14	766.667	122.700	0	0	0	0	EPS017	766.667	30.700	14-11	766.667	5	53.400	CCF16	766.667	30.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OFICINA / OFICINA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	19/09/2022	61520853	$760.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	34.700	0		0		0	0	0	0	34.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	19.300				19.300	0	0	19.300			193	19.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	146.700	0	0	146.700	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	146.700	146.700
Pensión	2	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	19.300	19.300
CCF	1	146.700	146.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	760.700	760.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OFICINA	OFICINA	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E	19/09/2022	61520853	$760.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1102359339	JAIMES PABON JANITH SULAY	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	49664633	SANCHEZ ORTEGA DIANA MILENA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF40	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	91205817	CORTES PRADILLA JUAN CARLOS	1	3			S	x																	0	0	0	0	0	0	EPS010	866.667	34.700	14-11	866.667	1	4.600	CCF40	866.667	34.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCELS
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	37934541	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ		TRANSVERSAL 154 No. 17-20 Casa 10	6076569803	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	FLORIDABLANCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	01/11/2022	62103365	$361.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	21	2.600	0	127.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	21	3.300	0	163.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	69.600				69.600	21	1.400	71.000			696	71.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	127.600
Pensión	1	160.000	163.300
Riesgos Laborales	1	69.600	71.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	361.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	37934541	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ		TRANSVERSAL 154 No. 17-20 Casa 10	6076569803	emruedalandinez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	FLORIDABLANCA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	01/11/2022	62103365	$361.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	37934541	RUEDA LANDINEZ ELSA MARIA	59	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ALC MEDELLIN / CRMEDELLIN	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	07/10/2022	62412794	$149.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.600				69.600	0	0	69.600			696	69.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40.000	40.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	69.600	69.600
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	149.600	149.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ALC MEDELLIN	CRMEDELLIN	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	07/10/2022	62412794	$149.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10524225	CASTRO SALAZAR VICTOR DANIEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF04	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS		Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ALCALDIA MONTE	ESASMONTE	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	01/11/2022	62930679	$3.437.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	88.000	0		0		0	12	1.100	0	89.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	12	500	0	40.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	12	900	0	72.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.000	0		0		0	12	500	0	40.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	44.000	0		0		0	12	600	0	44.600	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	132.000	0		0		0	12	1.600	0	133.600	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	23.000	0		0		0	12	300	0	23.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	176.000	0	0	0	0	12	2.100	0	178.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	732.000	0	0	0	0	12	8.500	0	740.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	848.000	0	0	0	0	12	9.800	0	857.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	764.100				764.100	12	8.800	772.900			7.641	772.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	439.000	12	5.100	444.100	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ALCALDIA MONTE	ESASMONTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	01/11/2022	62930679	$3.437.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	439.000	444.500
Pensión	3	1.756.000	1.776.400
Riesgos Laborales	1	764.100	772.900
CCF	1	439.000	444.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	3.398.100	3.437.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS		Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ALCALDIA MONTE	ESASMONTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	01/11/2022	62930679	$3.437.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042350367	GONZALEZ SANCHEZ AHIMELEC DANIEL	1	0			S	x																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF16	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
2	CC	10778969	POLO SOTO GUSTAVO DAVID	1	0			S	x																230301	575.000	92.000	0	0	0	0	ESSC07	575.000	23.000	14-11	575.000	5	40.100	CCF16	575.000	23.000	0	0	0	0	0
3	CC	11039041	ROJAS ANAYA ELKIN	1	0			S																	25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS041	3.300.000	132.000	14-11	3.300.000	5	229.700	CCF16	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
4	CC	1233346220	RICARDO CASTRILLON MARCOS DAVID	1	0			S																	230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS037	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	5	76.600	CCF16	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
5	CC	37934541	RUEDA LANDINEZ ELSA MARIA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF16	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
6	CC	51935750	RUEDA LANDINES YANETH PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	63501152	GARNICA CARDENAS SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS		Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OFICINA	OFICINA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	07/10/2022	62147247	$772.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	20.000				20.000	0	0	20.000			200	20.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	152.000	0	0	152.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	152.000	152.000
Pensión	2	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	20.000	20.000
CCF	1	152.000	152.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	772.000	772.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254479-2	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Calle 44 No. 29A - 41 Of 204	3176425740	emruedalandinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OFICINA / OFICINA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	07/10/2022	62147247	$772.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1102359339	JAIMES PABON JANITH SULAY	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	49664633	SANCHEZ ORTEGA DIANA MILENA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF40	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	91205817	CORTES PRADILLA JUAN CARLOS	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

Certificado de Cumplimiento para pago

Gobierno de la GENTE

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No:	CMA-SPM-007-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S, representado por ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($215.493.346,00) M/CTE.
SUPERVISOR:	**MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	9/08/2022
FECHA FINAL:	9/12/2022
PERIODO A COBRAR	DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 Al 31 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR A COBRAR:	$56.911.793,00
FECHA PRESENTE ACTA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2022

La Secretaria de Infraestructura Municipal **MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ**, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia, certifica que el contratista de interventoría **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S**, entregó el informe mensual de interventoría **No.1 Y No.2**, comprendido en el periodo DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 Al 31 DE OCTUBRE DE 2022

1. **Avance del contrato de interventoría:** El avance del periodo corresponde al 26,41%, para un acumulado a la fecha del 26,41%.

2. **Avance del contrato de obra No. LP-SPM-008-2022.** El avance ejecutado durante el periodo en mención es de 26,41%, para un acumulado a la fecha del 26,41%.

3. **Balance financiero del contrato de** Interventoría:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor del Contrato	$215.493.346,00	
Valor Acta Parcial No. 01		$56.911.793,00
Saldo por Ejecutar		$ 158.581.553,00
Balance	$215.493.346,00	$ 215.493.346,00

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Contrato N°: CMA-SPM-007-2022
Fecha: 4/11/2022

Se realizó la respectiva revisión del informe mensual verificando el cumpliendo con el objeto contractual de la referencia y los parámetros exigidos por esta oficina.

Según declaración juramentada, el contratista de interventoría ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios y seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 04 días del mes de noviembre de 2022

MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Ing. Mario Torres – Apoyo a la Supervisión
Reviso: Ana Díaz – Contratista SIM
Reviso: Edwin Paternina – Contratista SIM

Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

Informe de Interventoría mensual

Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 12 Del: 24/10/2022 Al: 30/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 83

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	7,35%	9,64%	Obra Ejecutada Acumulada %	27,12%	71,19%	-44,07%
Valor de la Obra programada:	$ 192.145.231	$ 251.909.849,62	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 708.889.575	$ 1.860.963.930	$ (1.152.074.355,00)
[redacted] e interventoria	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 143.662.230,67	Ejecución física a la fecha presenta desfase en - 44,07%	66,67%
			Ejecución física programada	66,67%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	8/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 312D	0
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	2
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 5 TON	1
MINICARGADOR BOBCAR S185	1
VOLQUETAS	3
	7


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	2	SG-SST	1
		AYUDANTES	11	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	5	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	26	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4	$ 21.530.383	$ 370.757.265
SEMANA 5	$ 45.760.459	$ 609.410.643
SEMANA 6	$ 81.686.611	$ 792.838.687
SEMANA 7	$ 145.648.625	$ 933.931.819
SEMANA 8	$ 187.173.170	$ 1.101.595.189
SEMANA 9	$ 278.610.233	$ 1.293.947.804
SEMANA 10	$ 378.816.716	$ 1.484.188.507
SEMANA 11	$ 456.979.726	$ 1.668.818.699
SEMANA 12	$ 708.889.575	$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

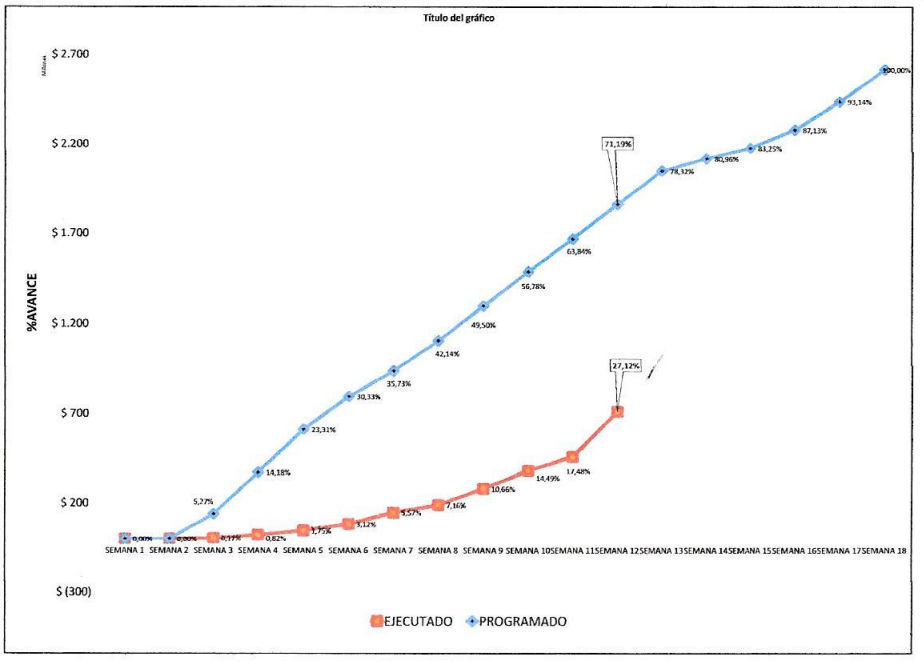

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se instala concreto MR 38 kg/cm2 Costado izquierdo del PR0+729 al PR0+700, PR0+130 AL PR0+180
2. Se instala subbase granular en PR0+120 al PR0+180
3. Finaliza la Excavación e instalación de geotextil, rajón y material granular en PR0+650 al PR0+690
4. Continua Excavación e instalación de geotextil, Rajón y material granular entre PR0+600 al PR0+650
5. Continua la instalación de Bordillo prefabricado sobre la carrera 8E Sur y espacio publico sobre Calle 2 Sur y entre Calle 9 SurY PR0+800, se solicito a la firma contratista presentar ensayos y certificado de calidad de los materiales a utilizar e indicar su procedencia
6. Se evidencia atraso en el cronograma de obra y plan de contingencia

ACTIVIDADES ATRASADAS Y EJECUTADAS A LA FECHA:	PROGRAMADO	EJECUTADO
PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA	100%	38%

MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ALCALDIA DE MONTERIA** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 12 Del: 24/10/2022 Al: 30/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 83

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798.90

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	100%	29%
CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	100%	42%
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	100%	5%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	100%	10%
[redacted]VACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	100%	46%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	100%	39%
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	100%	0%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	100%	12%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	100%	0%
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	100%	0%
SUBRASANTE Y SUBBASE	100%	34%
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	100%	38%
SUBBASE GRANULAR CLASE C	100%	36%
GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	100%	0%
PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES	69%	39%
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	90%	22%
ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	100%	29%
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0%	46%
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	100%	0%
SEÑALIZACION	65%	0%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	0%
[redacted]AL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	0%
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	0%	0%
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	0%	0%
REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	0%	0%
CUNETAS Y SUMIDEROS	1%	0%
EXCAVACION MANUAL	5%	0%
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0%	0%
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	0%	0%
RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	0%	0%
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0%	0%
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0%	0%
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN PLATINA 3 " X 1/4 " Y MARCO EN PLATINA DE 3 " 3/8 " , SEGÚN DISEÑO	0%	0%
ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	0%	3%
S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUN	0%	3%
FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20 cm X 10 cm X 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓ	0%	0%
CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	0%	2%
RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	0%	0%
RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUA	0%	0%
S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	0%	0%
OTRAS ACTIVIDADES	88%	0%
S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4 " . INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	43%	24%
REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	96%	0%
REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA	100%	0%
RED DE MEDIA TENSION (13.200) V	100%	0%

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 12 Del: 24/10/2022 Al: 30/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 83

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	100%	0%
SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	100%	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	100%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	100%	0%
[redacted]ISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	100%	0%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	100%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	100%	0%
INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	100%	0%
RED DE BAJA TENSION (240/120) V	18%	0%
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	100%	0%
SUMINISTRO. INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	17%	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	17%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 V.	17%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUENTE DE RED TRENSADA	17%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 M.	17%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 V., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	17%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 V.	17%	0%
SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) V	100%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) V.,INCLUYE: INSTALACIÓN PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	100%	0%
ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240-120)V	0%	0%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	0%	0%
[redacted]NISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) V.	0%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	0%	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



INSTALACIÓN DE RAJON PR0+690 AL PR0+640



INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR PR0+600 AL PR0+640



PAVIMENTO PR0+130 AL PR0+180



PAVIMENTO PR0+044 AL PR0+113



PAVIMENTO PR0+000 AL PR0+036



PAVIMENTO PR0+700 AL PR0+799

Observaciones:

1. A la fecha se realizan actividades de excavación, colocación de geotextil, rajón y subbase en la vía a construir desde PR0+000 al PR0+036, del PR0+044 al PR0+180, del PR0+700 AL PR0+799, del PR0+600 AL PR0+710
2. Se ha instalado concreto desde PR0+000 AL PR0+036, desde PR0+044 AL PR0+115, desde PR0+700 AL PR0+798, PR130 AL PR0+180
3. Continua la instalación de bordillos prefabricados desde PR0+000 AL PR0+036, PR0+044 AL PR0+115 Y PR0+700 AL PR0+799
4. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 44,07%, equivalente a $1´152.074.355,00
5. La firma contratista presenta plan de contingencia para superar atraso en obra.
6. Se solicito a la entidad contratante desde fecha 19 de septiembre la visita a campo del diseñador del pavimento para solucionar inquietudes de la firma contratista e interventoría
7. La visita realizada por la firma consultora diseñadora del pavimento de la vía en construcción se realizo el día 5 de octubre del 2022, se realizaron observaciones al diseño y a la fecha se esta esperando respuesta del diseñador por las observaciones realizadas al diseño del pavimento en cuanto al tema de manejo de aguas de escorrentías.
8. Seguimiento al plan de contingencia:
   - Instalación de bordillos y andes: del PR0+000 AL PR0+036, PR0+044 AL PR0+120, PR0+120 AL PR0+190, PR0+190 AL PR0+270, PR0+270 AL PR0+350 No cumple con la cantidad programada
   - Instalación de pavimento del
   PR0+000 AL PR0+036: A la fecha debería estar el tramo construido al 100%, falta finalizar espacio publico, No cumple con lo programado.
   PR0+044 AL PR0+120: A la fecha debería estar el tramo construido al 100%, falta finalizar espacio publico, No cumple con lo programado.
   PR0+120 AL PR0+190: la fecha debería estar el tramo construido al 100%, falta finalizar espacio publico, No cumple con lo programado.
   PR0+190 AL PR0+270: A la fecha debería estar el tramo construido en Excavación, rajón, subbase y pavimento al 100%, iniciando espacio publico, No se ha realizado ninguna intervención en este tramo. No cumple con lo programado.
   PR0+270 AL PR0+350, : A la fecha debería estar el tramo construido en Excavación, rajón, subbase y pavimento al 100%, iniciando espacio publico, No se ha realizado ninguna intervención en este tramo. No cumple con lo programado.
   PR0+350 AL PR0+440, : A la fecha debería estar el tramo construido en Excavación, rajón, subbase y pavimento al 100%, iniciando espacio publico, No se ha realizado ninguna intervención en este tramo. No cumple con lo programado.
   PR0+799 AL PR0+700: la fecha debería estar el tramo construido al 100%, falta finalizar espacio publico, No cumple con lo programado.
   PR0+700 AL PR0+600: la fecha debería estar el tramo construido al 90%, faltaría finalizar espacio publico según programado, No cumple con lo programado.
   PR0+600 AL PR0+530: la fecha debería estar el tramo construido al 90%, faltaría finalizar espacio publico según programado. A lafecha no se ha realizado intervención. No cumple con lo programado.
9. La firma contralista No presenta informes mensuales a tiempo, se debe presentar los primeros días de cada mes.

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 24 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 11 Del: 17/10/2022 Al: 23/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 76

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	7,06%	2,99%	Obra Ejecutada Acumulada %	17,48%	63,84%	-46,36%
Valor de la Obra programada:	$ 184.630.192	$ 78.163.010,01	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 456.979.726	$ 1.668.818.699	$ (1.211.838.973,00)
[redacted] de interventoría	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 131.690.378,11	Ejecución física a la fecha presenta desfase en - 46,36%	61,11%
			Ejecución física programada	61,11%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 312D	0
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	2
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 5 TON	1
MINICARGADOR BOBCAR S185	1
VOLQUETAS	3
	7


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	2	SG-SST	1
		AYUDANTES	11	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	7	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	28	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4	$ 21.530.383	$ 370.757.265
SEMANA 5	$ 45.760.459	$ 609.410.643
SEMANA 6	$ 81.686.611	$ 792.838.687
SEMANA 7	$ 145.648.625	$ 933.931.819
SEMANA 8	$ 187.173.170	$ 1.101.595.189
SEMANA 9	$ 278.610.233	$ 1.293.947.804
SEMANA 10	$ 378.816.716	$ 1.484.188.507
SEMANA 11	$ 456.979.726	$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

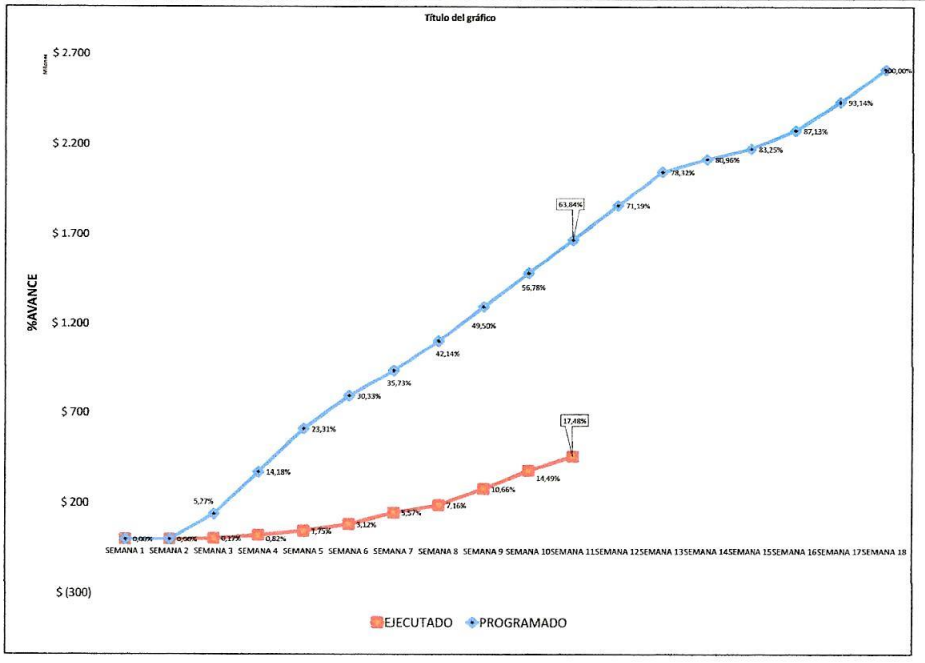

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se instala concreto MR 38 kg/cm2 Costado izquierdo del PR0+798 al PR0+729.
3. Se instala subbase granular frente de obra en PR0+120 al PR0+170
4. Se realiza Excavación e instalación de geotextil, rajón y material granular en PR0+650 al PR0+690 y Excavación e instalación de Rajón entre PR0+610 al PR0+645
5. Continua la instalación de Bordillo prefabricado sobre la carrera 8E Sur y espacio publico sobre Calle 2 Sur, se solicito a la firma contratista presentar ensayos y certificado de calidad de los materiales a utilizar e indicar su procedencia
6. Se Realiza demolición sobre la calle 2 Sur y carrera 8E sur costado Izquierdo
7. Se evidencia atraso en el cronograma de obra y plan de contingencia

ACTIVIDADES ATRASADAS Y EJECUTADAS A LA FECHA:	PROGRAMADO	EJECUTADO
Nombre de tarea		
PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA	100%	100%
DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	100%	38%
CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	100%	18%

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 24 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 11 Del: 17/10/2022 Al: 23/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 76

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	100%	42%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	100%	5%
EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	100%	32%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	100%	46%
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	100%	26%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	100%	0%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	100%	12%
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	100%	0%
[redacted]SANTE Y SUBBASE	100%	0%
[redacted]RAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	100%	27%
SUBBASE GRANULAR CLASE C	100%	25%
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	100%	36%
PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES	63%	0%
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	71%	21%
ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	100%	22%
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0%	11%
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	100%	25%
SEÑALIZACION	65%	0%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	0%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	0%
ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS	0%	0%
S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUN	0%	3%
FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20 cm X 10 cm X 6 cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H =4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓ	0%	3%
CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	0%	0%
RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	0%	2%
OTRAS ACTIVIDADES	78%	0%
S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4 ". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	17%	0%
REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	87%	0%
REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	100%	0%
RED DE MEDIA TENSION (13.200) V	100%	0%
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	100%	0%
SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	100%	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	100%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	100%	0%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	100%	0%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	100%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	100%	0%
INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	100%	0%
RED DE BAJA TENSION (240/120) V	1%	0%
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	100%	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



INSTALACIÓN DE SUBBASE PR0+120 AL PR0+170



DEMOLICION DE ANDENES PR0+000 AL PR0+036



CONCRETO MR 38 PR0+729 AL PR0+798, COSTADO IZQUIERDO



INSTALACIÓN DE BORDILLOS PR0+044 AL PR0+115

Observaciones:

1. A la fecha se realizan actividades de excavación, colocación de geotextil, rajón y subbase en la vía a construir desde PR0+000 al PR0+036, del PR0+044 al PR0+180, del PR0+700 AL PR0+798, del PR0+600 AL PR0+710
2. Se ha instalado concreto desde PR0+000 AL PR0+036, desde PR0+044 AL PR0+115 y desde PR0+729 AL PR0+798, costado derecho e izquierdo
3. Continua la instalación de bordillos prefabricados desde PR0+000 AL PR0+036 Y PR0+044 AL PR0+115
4. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles
5. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 46,365%, equivalente a $1'211.838.973,00
6. La firma contratista presenta plan de contingencia para superar atraso en obra.
7. Se solicito a la entidad contratante desde fecha 19 de septiembre la visita a campo del diseñador del pavimento para solucionar inquietudes de la firma contratista e interventoría
8. La visita realizada por la firma consultora diseñadora del pavimento de la vía en construcción se realizo el día 5 de octubre del 2022, se realizaron observaciones al diseño y a la fecha se esta esperando respuesta del diseñador por las observaciones realizadas al diseño del pavimento en cuanto al tema de manejo de aguas de escorrentías.
9. Seguimiento al plan de contingencia:
- Instalación de bordillos y andes del PR0+000 AL PR0+036, En construcción, No cumple con la cantidad programada
- Instalación de pavimento del PR0+044 AL PR0+120, se instala concreto 38 MR gr/cm2 del PR0+044 AL PR0+115, No cumple con la cantidad programada
- Excavación, Rajón, Subbase y Pavimento desde el PR0+120 AL PR0+190, actividades paralizadas, No cumple
- Excavación, Rajón y Subbase desde el PR0+120 AL PR0+190, alnstalacion de subbase, No cumple con las actividades programadas
- Excavación, Rajón, Subbase y pavimento desde el PR0+190 AL PR0+270, No hay actividades, No cumple
- Excavación, Rajón, Subbase desde el PR0+270 AL PR0+350, No hay actividades, No cumple
- Instalación de pavimento desde el PR0+700 AL PR0+798, En construcción, No cumple con la ejecución programada
- Construcción de espacio publico desde el PR0+700 AL PR0+798, No cumple
- Excavación, Rajón, Subbase desde el PR0+600 AL PR0+710, Continuan actividades de excavación, geotextil y rajón, No cumple con la ejecución programada
- Excavación, Rajón, Subbase desde el PR0+600 AL PR0+530, No hay actividades, No cumple
- Excavación, Rajón, Subbase desde el PR0+530 AL PR0+440, No hay actividades, No cumple
- Excavación, Rajón, Subbase desde el PR0+350 AL PR0+440, No hay actividades, No cumple

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 10 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 10 Del: 10/10/2022 Al: 16/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 69

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	7,28%	3,83%	Obra Ejecutada Acumulada %	14,49%	56,78%	-42,29%
Valor de la Obra programada:	$ 190.240.702	$ 100.206.482,52	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 378.816.716	$ 1.484.188.507	$ (1.105.371.791,00)
de interventoría	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 119.718.525,56	Ejecución física a la fecha presenta desfase en - 42,29%	55,56%
			Ejecución física programada	55,56%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 312D	0
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	2
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 5 TON	1
MINICARGADOR BOBCAR S185	1
VOLQUETAS	3
	7


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	1	SG-SST	1
		AYUDANTES	5	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	17	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4	$ 21.530.383	$ 370.757.265
SEMANA 5	$ 45.760.459	$ 609.410.643
SEMANA 6	$ 81.686.611	$ 792.838.687
SEMANA 7	$ 145.648.625	$ 933.931.819
SEMANA 8	$ 187.173.170	$ 1.101.595.189
SEMANA 9	$ 278.610.233	$ 1.293.947.804
SEMANA 10	$ 378.816.716	$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

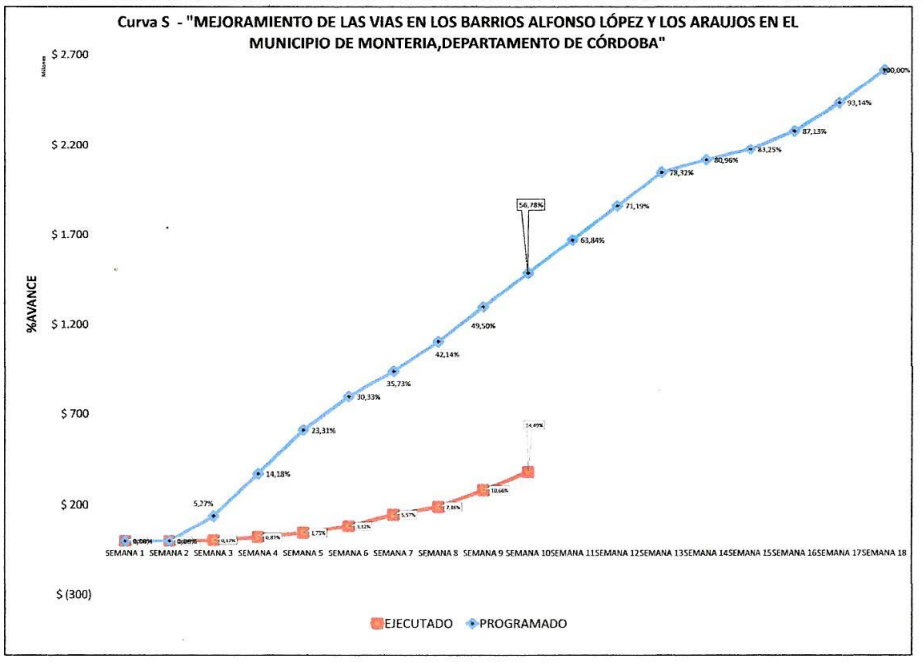

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se Instala concreto MR 38 kg/cm2 en tramo PR0+080 al PR0+115 Costado izquierdo
2. Se instala concreto MR 38 kg/cm2 Costado derecho del PR0+798 al PR0+729.
3. Se realiza excavación en segundo frente de obra en PR0+720 al PR0+700
4. Se realiza instalación de geotextil, rajón y material granular en PR0+740 al PR0+700
5. Continua la instalación de Bordillo prefabricado sobre la calle 2 Sur, se solicito a la firma contratista presentar ensayos y certificado de calidad de los materiales a utilizar e indicar su procedencia
6. Se evidencia atraso en el cronograma de obra y plan de contingencia

ACTIVIDADES ATRASADAS Y EJECUTADAS A LA FECHA:	PROGRAMADO	EJECUTADO
Nombre de tarea		
PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA	100%	100%
DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	100%	21%
CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	100%	9%

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 10 (Día) | 10 (Mes) | 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 10 Del: 10/10/2022 Al: 16/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 69

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	100%	21%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	100%	5%
EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	100%	0%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	100%	32%
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	100%	20%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	100%	0%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	100%	12%
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	100%	0%
SUBRASANTE Y SUBBASE		
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	100%	22%
SUBBASE GRANULAR CLASE C	100%	20%
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	100%	29%
PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	51%	19%
ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	100%	0%
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0%	6%
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	100%	38%
SEÑALIZACION		
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	0%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	0%
OTRAS ACTIVIDADES		
REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	77%	0%
REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	100%	0%
RED DE MEDIA TENSION (13.200) V		
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	100%	0%
SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	94%	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	94%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	94%	0%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	94%	0%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	94%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	94%	0%
INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	94%	0%
RED DE BAJA TENSION (240/120) V		
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	100%	0%
SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) V		
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) V.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	100%	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



EXCAVACIONES INUNDADAS PR0+700 AL PR0+750, POR LLUVIAS



COLOCACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS PR0+000 AL PR0+036



CONCRETO MR 38 PR0+729 AL PR0+798, COSTADO DERECHO



CONCRETO MR 38 PR0+729 AL PR0+798, COSTADO DERECHO

Observaciones:

1. A la fecha se realizan actividades de excavación, colocación de geotextil, rajón y subbase en la via a construir desde PR0+000 al PR0+036, del PR0+044 al PR0+180, del PR0+700 AL PR0+798 y del PR0+600 AL PR0+710
2. Se ha instalado concreto desde PR0+000 AL PR0+036, desde PR0+044 AL PR0+115 y desde PR0+729 AL PR0+798
3. Se Inicia instalación de bordillos prefabricados desde PR0+000 AL PR0+036
4. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles
5. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 42,29%, equivalente a $1´105.371.791,00
6. La firma contratista presenta plan de contingencia para superar atraso en obra.
7. Seguimiento al plan de contingencia:
- Instalación de bordillos y andes del PR0+000 AL PR0+036, En construcción, No cumple con la cantidad programada
- Instalación de pavimento del PR0+044 AL PR0+120, se instala concreto 38 MR gr/cm2 del PR0+044 AL PR0+0115, No cumple con la cantidad programada
- Excavación, Rajón, Subbase y Pavimento desde el PR0+120 AL PR0+190, actividades paralizadas, No cumple
- Excavación, Rajón y Subbase desde el PR0+120 AL PR0+190, actividades paralizadas, No cumple
- Excavación, Rajón, Subbase y pavimento desde el PR0+190 AL PR0+270, No hay actividades, No cumple
- Excavación, Rajón, Subbase desde el PR0+270 AL PR0+350, No hay actividades, No cumple
- Instalación de pavimento desde el PR0+700 AL PR0+798, En construcción, No cumple con la ejecución programada
- Construcción de espacio publico desde el PR0+700 AL PR0+798, No cumple
- Excavación, Rajón, Subbase desde el PR0+600 AL PR0+710, Se inician actividades de excavación, geotextil y rajón, No cumple con la ejecución programada
- Excavación, Rajón, Subbase desde el PR0+600 AL PR0+530, No hay actividades, No cumple

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 10 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 9 Del: 3/10/2022 Al: 9/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 62

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	7,36%	3,50%	Obra Ejecutada Acumulada %	10,66%	49,50%	-38,84%
Valor de la Obra programada:	$ 192.352.616	$ 91.437.062,79	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 278.610.233	$ 1.293.947.804	$ (1.015.337.571,00)
de interventoría	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 107.746.673,00	Ejecución física a la fecha presenta desfase en - 38,84%	50,00%
			Ejecución física programada	50,00%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 312D	0
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	2
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 5 TON	1
MINICARGADOR BOBCAR S185	1
VOLQUETAS	3
	7


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	1	SG-SST	1
		AYUDANTES	5	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	17	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4	$ 21.530.383	$ 370.757.265
SEMANA 5	$ 45.760.459	$ 609.410.643
SEMANA 6	$ 81.686.611	$ 792.838.687
SEMANA 7	$ 145.648.625	$ 933.931.819
SEMANA 8	$ 187.173.170	$ 1.101.595.189
SEMANA 9	$ 278.610.233	$ 1.293.947.804
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

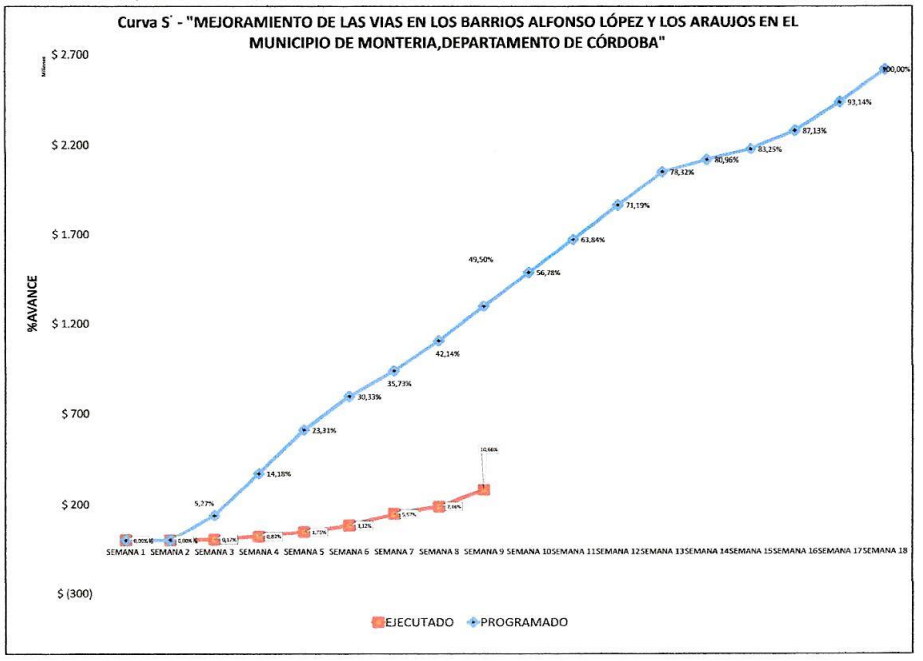

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se instala concreto MR 38 kg/cm2 en tramo PR0+044 al PR0+80 Costado izquierdo
2. Se instala concreto MR 38 kg/cm2 Costado derecho del PR0+798 al PR0+788.
3. Se instala concreto MR 38 kg/cm2 Costado izquierdo del PR0+798 al PR0+783.
3. Se realiza excavación en segundo frente de obra en PR0+798 al PR0+740
4. Se realiza instalación de geotextil, rajón y material granular en PR0+798 al PR0+740
5. Se inicia la instalación de Bordillo prefabricado sobre la calle 2 Sur, se solicito a la firma contratista presentar ensayos y certificado de calidad de los materiales a utilizar e indicar su procedencia
6. Se evidencia atraso en el cronograma de obra y plan de contingencia

ACTIVIDADES ATRASADAS Y EJECUTADAS A LA FECHA:	PROGRAMADO	EJECUTADO
PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA	100%	100%
DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	100%	21%
CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	100%	
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	100%	

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 10 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 9 Del: 3/10/2022 Al: 9/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 62

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	100%	5%
EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	100%	
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	100%	27%
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	100%	17%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAÍZ)	100%	
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	100%	
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	100%	
SUBRASANTE Y SUBBASE		
[redacted]ORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	100%	19%
[redacted]SE GRANULAR CLASE C	100%	17%
[redacted]EOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	100%	25%
PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	32%	13%
ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	100%	
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0%	3%
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	100%	30%
SEÑALIZACIÓN		
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	
OTRAS ACTIVIDADES		
REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	68%	
REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	100%	
RED DE MEDIA TENSION (13.200) V		
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	100%	
SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	81%	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	81%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	81%	
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	81%	
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	81%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	81%	
INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	81%	
RED DE BAJA TENSION (240/120) V		
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	100%	
SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) V		
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) V.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	100%	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



CONCRETO PR0+750 AL PR0+798, COSTADO IZQUIERDO



CONCRETO PR0+780 AL PR0+756



SARDINELES PREFABRICADO PR0+036, CALLE 2 SUR



CONCRETO MR 38 PR0+044 AL PR0+080, COSTADO IZQUIERDO

Observaciones:

1. A la fecha se realizan actividades de excavación, colocación de geotextil y rajón en la vía a construir desde PR0+000 al PR0+036, DEL PR0+044 al PR0+180 y DEL PR0+740 AL PR0+798
2. Se ha instalado concreto desde PR0+000 AL PR0+036, desde PR0+044 AL PR0+080 y desde PR0+756 AL PR0+798
3. Se Inicia instalación de bordillos prefabricados desde PR0+000 AL PR0+036
4. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles
5. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 38,84%, equivalente a $1´015.337.571,00
6. La firma contratista presenta plan de contingencia para superar atraso en obra.
7. Seguimiento al plan de contingencia:
- Instalacion de bordillos y andes del PR0+000 AL PR0+036, Se inicia actividad pero No cumple con la cantidad programada
- Instalacion de pavimento del PR0+044 AL PR0+120, se instala concreto 32 MR gr/cm2 del PR0+044 AL PR0+080 Costado Izquierdo, No cumple con la cantidad programada
- Excavación, Rajón y Subbase desde el PR0+120 AL PR0+190, actividades paralizadas, No cumple
- Excavación, Rajón y Subbase desde el PR0+710 AL PR0+600, No hay actividades, No cumple
- Excavación, Rajón y Subbase desde el PR0+700 AL PR0+798, Se desarrollan actividades, pero No cumplen con la ejecución programada
- Instalacion de pavimento desde el PR0+700 AL PR0+798, Se inicia instalación de concreto, No cumple con la ejecución programada
- Construcción de espacio publico desde el PR0+700 AL PR0+798, No cumple

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA 3 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 8 Del: 26/09/2022 Al: 2/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 55

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	6,41%	1,59%	Obra Ejecutada Acumulada %	7,16%	42,14%	-34,98%
Valor de la Obra programada:	$ 167.663.369	$ 41.524.545,38	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 187.173.170	$ 1.101.595.189	$ (914.422.018,00)
de interventoría	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 95.774.820,44	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -	44,44%
			Ejecución física programada	44,44%	34,98%	0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Via Existente En Terreno Natural

Actividad:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 312D	0
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	2
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 5 TON	1
MINICARGADOR BOBCAR S185	1
VOLQUETAS	3
	7


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	1	SG-SST	1
		AYUDANTES	5	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	17	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4	$ 21.530.383	$ 370.757.265
SEMANA 5	$ 45.760.459	$ 609.410.643
SEMANA 6	$ 81.686.611	$ 792.838.687
SEMANA 7	$ 145.648.625	$ 933.931.819
SEMANA 8	$ 187.173.170	$ 1.101.595.189
SEMANA 9		$ 1.293.947.804
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

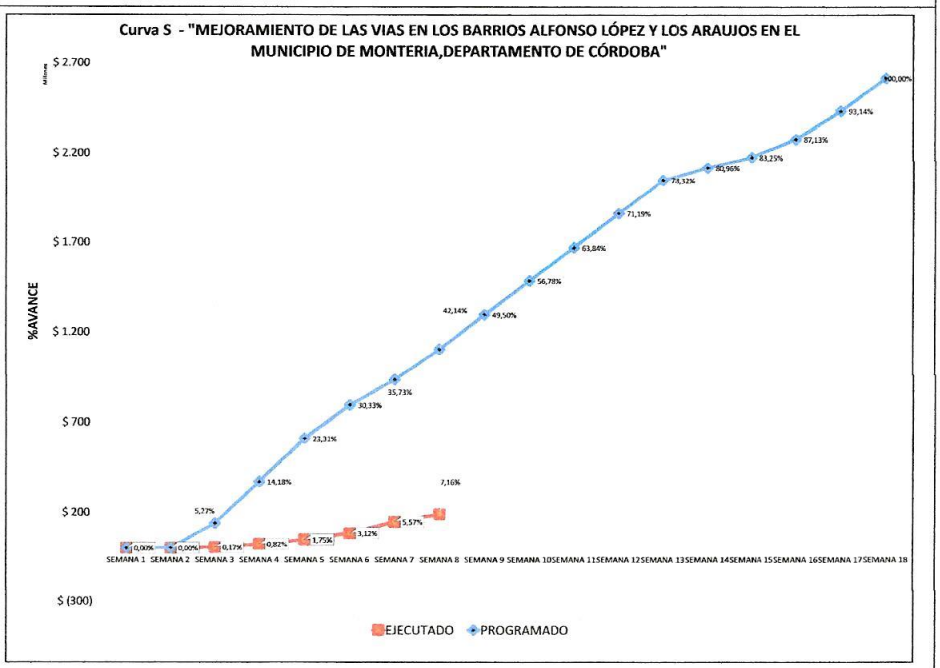

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se solicita a la firma contratista no instalar concreto en tramo PR0+044 al PR0+120, hasta tanto no se solucionen problemas de filtraciones de agua evidenciadas en campo sobre el costado derecho de la via a intervenir
2. Se instala concreto MR 38 kg/cm2 Costado derecho del PR0+044 al PR0+080, sin autorización de la firma interventora.
3. Se realiza excavación en segundo frente de obra en PR0+798 al PR0+780
4. Se realiza instalación de geotextil, rajón y material granular en PR0+798 al PR0+780
5. Se evidencia atraso en el cronograma de obra y plan de contingencia
6. Equipos (Pajaritas) de la firma contratista averiados desde el dia viernes 29 de septiembre del 2022, actividades paralizadas

ACTIVIDADES ATRASADAS Y EJECUTADAS A LA FECHA:	PROGRAMADO	EJECUTADO
PRELIMINARES		
CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	100%	21%
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	100%	0%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	100%	0%
EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	100%	5%

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 3 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 8 Del: 26/09/2022 Al: 2/10/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 55

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	100%	0%
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	100%	24%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	100%	0%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	100%	0%
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	100%	0%
SUBRASANTE Y SUBBASE	100%	0%
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)		
SUBBASE GRANULAR CLASE C	100%	17%
TEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	100%	14%
NTO, BORDILLOS Y ANDENES	100%	22%
VIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	13%	7%
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	100%	0%
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	100%	10%
SEÑALIZACION		
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	0%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	0%
OTRAS ACTIVIDADES		0%
REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	58%	0%
REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	92%	0%
RED DE MEDIA TENSION (13.200) V		
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	67%	0%
SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	67%	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	67%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	67%	0%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	67%	0%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	67%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	67%	0%
INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	67%	0%
RED DE BAJA TENSION (240/120) V		0%
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	100%	0%
SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) V		0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) V.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	100%	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



EXCAVACIÓN PR0+770 AL PR0+798



RAJON PR0+780 AL PR0+798



MATERIAL GRANULAR PR0+780 AL PR0+798



CONCRETO MR 38 PR0+044 AL PR0+080

Observaciones:

1. A la fecha se realizan actividades de excavación, colocación de geotextil y rajón en la vía a construir desde PR0+000 AL PR0+036 Y DEL PR0+044 AL PR0+180
2. Se abre otro frente de obra, solo se avanza del PR0+798 AL PR0+770, en excavación, rajón y subbase
3. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles
4. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 34,98%, equivalente a $914.422.018,00
5. La firma contratista presenta plan de contingencia para superar atraso en obra.
6. Seguimiento al plan de contingencia:
 - Instalacion de bordillos y andes del PR0+000 AL PR0+036, No cumple
 - Instalacion de pavimento del PR0+044 AL PR0+120, se instala concreto 32 MR gr/cm2 del PR0+044 AL PR0+080 Costado derecho, actividades paralizadas por filtraciones de agua en costado derecho, No cumple
 - Excavación, Rajón y Subbase desde el PR0+120 AL PR0+190, actividades paralizadas, No cumple
 - Excavación, Rajón y Subbase desde el PR0+700 AL PR0+798, se inicia pero No cumple con la ejecución de todo el tramo

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA 26 (Día) 9 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 7 Del: 19/09/2022 Al: 25/09/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	5,40%	2,45%	Obra Ejecutada Acumulada %	5,57%	35,73%	-30,16%
Valor de la Obra programada:	$ 141.093.132	$ 63.962.014,18	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 145.648.625	$ 933.931.819	$ (788.283.194,00)
de interventoria	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 83.802.967,89	Ejecución física a la fecha presenta desfase en - 30,16%	38,89%
			Ejecución física programada	38,89%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 312D	0
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	2
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 5 TON	1
MINICARGADOR BOBCAR S185	1
VOLQUETAS	3
	7


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	1	SG-SST	1
		AYUDANTES	5	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	17	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4	$ 21.530.383	$ 370.757.265
SEMANA 5	$ 45.760.459	$ 609.410.643
SEMANA 6	$ 81.686.611	$ 792.838.687
SEMANA 7	$ 145.648.625	$ 933.931.819
SEMANA 8		$ 1.101.595.189
SEMANA 9		$ 1.293.947.804
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

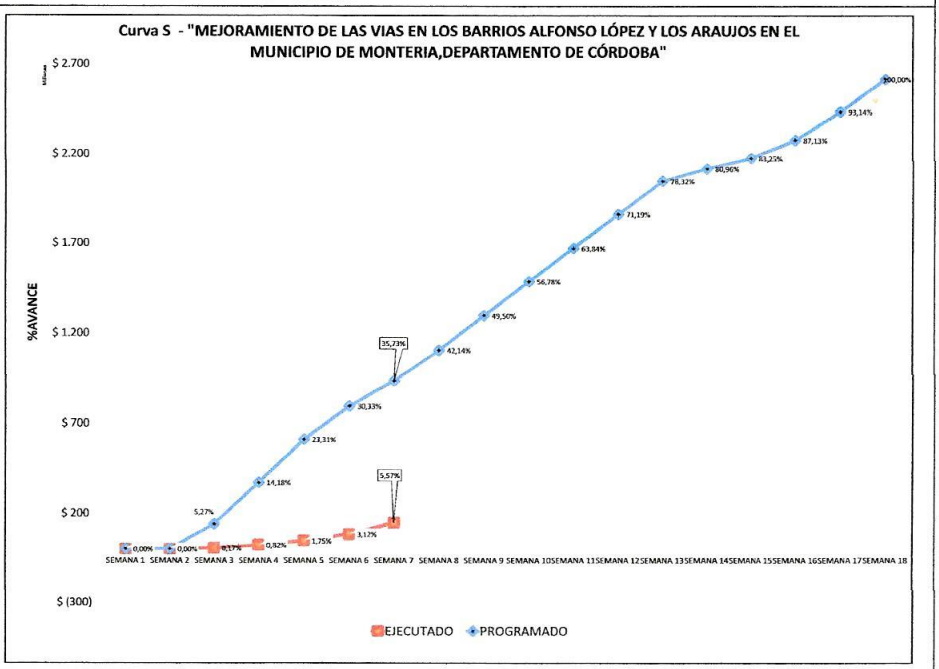

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se instala capa de material granular del PR0+000 AL PR0+120
2. Se realiza excavación PR0+120 al PR0+180
3. Se realiza instalación de geotextil y rajón en PR0+120 al PR0+180
4. Figuración e instalación de acero PR0+00 AL PR0+036, costado derecho
5. Se Instala concreto de MR 38 kg/cm2 del PR0+00 AL PR0+036, costado derecho
6. La firma contratista presenta plan de contingencia para subsanar atraso presentado a la fecha, este fue aprobado y remitido a la entidad contratante.
7. Se evidencia atraso en el cronograma de obra
8. Se presentan filtraciones de agua en costado derecho desde el PR0+044 AL PR0+120

ACTIVIDADES ATRASADAS Y EJECUTADAS A LA FECHA:	PROGRAMADO	EJECUTADO
PRELIMINARES		
DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	100%	5%
CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0,10M/0.15M CON CORTADORA	100%	0%
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	100%	0%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	100%	5%

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 26 (Día) 9 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 7 Del: 19/09/2022 Al: 25/09/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	100%	0%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	100%	21%
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	100%	13%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ)	100%	0%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	100%	12%
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	67%	0%
SUBRASANTE Y SUBBASE		
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	100%	14%
UBBASE GRANULAR CLASE C	86%	11%
OTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	100%	19%
VIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	0%	4%
ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	100%	0%
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	100%	10%
SEÑALIZACION		
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	0%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	100%	0%
OTRAS ACTIVIDADES		
REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	48%	0%
REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	77%	0%
RED DE MEDIA TENSION (13.200) V		
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	100%	0%
SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	54%	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	54%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	54%	0%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	54%	0%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	54%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	54%	0%
INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	54%	0%
RED DE BAJA TENSION (240/120) V		
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	100%	0%


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA




MATERIAL GRANULAR PR0+044 AL PR0+120



CONCRETO MR 38 PR0+000 AL PR0+036

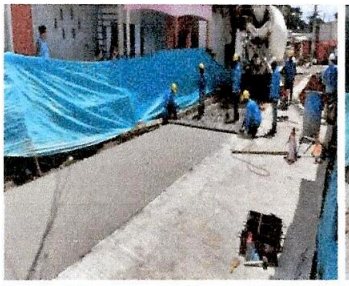

CONCRETO MR 38 PR0+000 AL PR0+036

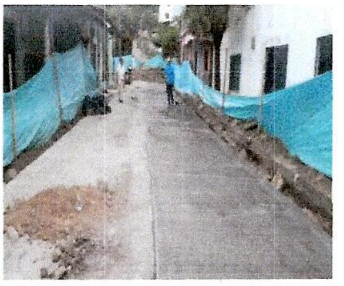

CONCRETO MR 38 PR0+000 AL PR0+036



INFILTRACIÓN DE AGUA PR0+080 AL PR0+120



INFILTRACIÓN DE AGUA PR0+080 AL PR0+120

Observaciones:

1. A la fecha se realizan actividades de excavación, colocación de geotextil y rajón en la via a construir desde PR0+000 AL PR0+036 Y DEL PR0+044 AL PR0+180
2. Se está adelantando revisión topografia por parte de la firma contratista e interventora de acuerdo con el diseño entregado por la entidad contratante para revisar tema de espacio público
3. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles
4. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 30,16%, equivalente a $788.283.194,00
5.La firma contratista presenta plan de contingencia para superar atraso en obra, el cual consta de tres frentes de obra a partir del 26 de septiembre del 2022

DIRECTOR INTERVENTORIA

BEGA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 19 (Día) 9 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 6 Del: 12/09/2022 Al: 18/09/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 41

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	7,02%	1,20%	Obra Ejecutada Acumulada %	2,95%	30,33%	-27,38%
Valor de la Obra programada:	$ 183.428.044	$ 31.470.489,10	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 77.230.948	$ 792.838.687	$ (715.607.739,00)
[redacted] de interventoria	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 71.831.115,33	Ejecución física a la fecha presenta desfase en - 27,38%	33,33%
			Ejecución física programada	33,33%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Via Existente En Terreno Natural

Actividad:


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 312D	0
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	2
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 5 TON	1
MINICARGADOR BOBCAR S185	1
VOLQUETAS	3
	7

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	1	SG-SST	1
		AYUDANTES	3	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	15	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4	$ 21.530.383	$ 370.757.265
SEMANA 5	$ 45.760.459	$ 609.410.643
SEMANA 6	$ 77.230.948	$ 792.838.687
SEMANA 7		$ 933.931.819
SEMANA 8		$ 1.101.595.189
SEMANA 9		$ 1.293.947.804
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

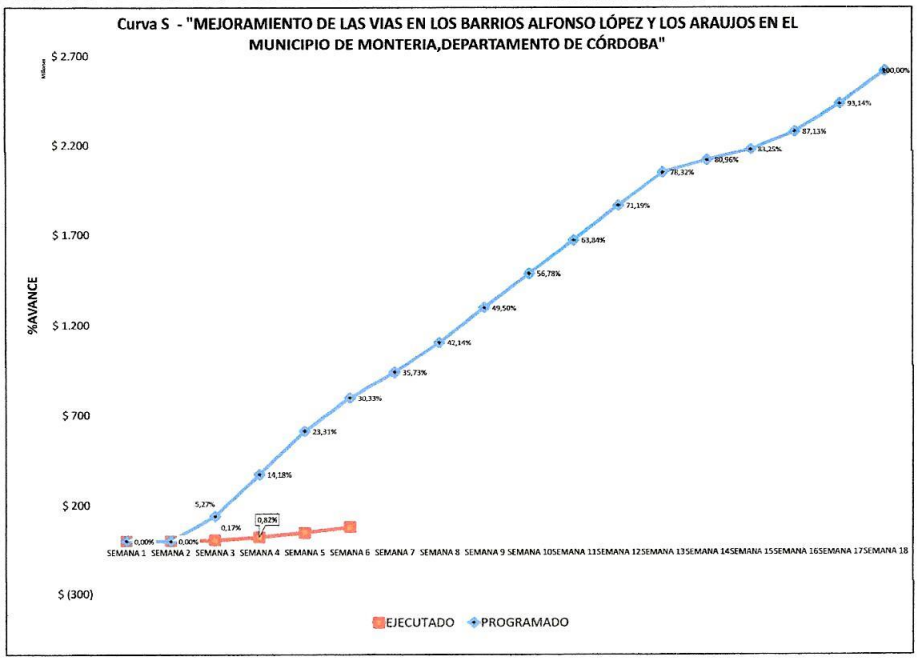

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se instala material granular del PR0+000 AL PR0+036
2. Figuración e instalación de acero
3. Se Instala concreto de 38 MR del PR0+00 AL PR0+036
4. Se realiza comité de obra entre contratista, interventoría y la entidad contratante para definir las acciones a tomar por la firma contratista de obra por el atraso presentado en desarrollo del contrato de obra
5. La firma contratista debió haber presentado plan de contingencia el día 17 de septiembre del 2022, a la fecha no se ha presentado.
6. Se evidencia atraso en el cronograma de obra

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 19 (Día) 9 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 6 Del: 12/09/2022 Al: 18/09/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 41

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

ACTIVIDADES ATRASADAS A LA FECHA:


PRELIMINARES :91%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA:100%
DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO: 100%
CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA: 100%
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO: 100%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS: 100%
EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO: 100%
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES: 100%
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE: 92%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ): 100%
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ): 100%
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO: 25%
RASANTE Y SUBBASE:76%
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR):100%
SUBBASE GRANULAR CLASE C: 44%
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES: 85%
PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES: 30%

ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI: 45%
ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa: 84%
SEÑALIZACION: 65%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM: 100%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM: 100%
OTRAS ACTIVIDADES: 39%
REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO ,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN : 39%
REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA:61%
RED DE MEDIA TENSION (13.200) V: 41%
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.:100%
SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF) :40%
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF):40%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE :40%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG :40%
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG :40%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m: 40%
INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.: 40%

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



MATERIAL GRANULAR PR0+000 AL PR0+036

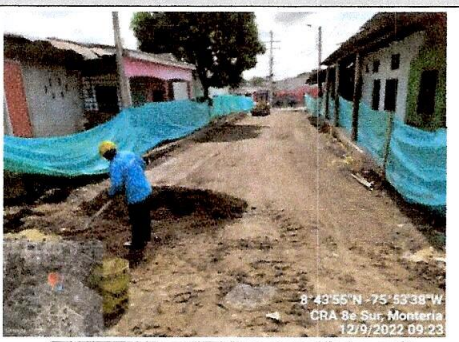


MATERIAL GRANULAR PR0+000 AL PR0+036



EXTENSION Y COMPACTACIÓN MATERIAL GRANULAR



ENSAYO COMPACTACION EN CAMPO

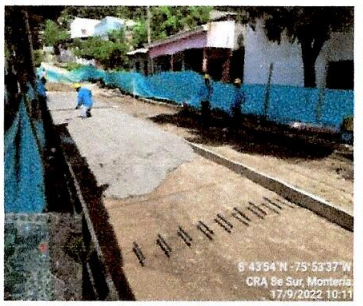

COLOCACION DE CONCRETO CALLE 2



COLOCACION DE CONCRETO

Observaciones:

1. A la fecha se realizan actividades de excavación, colocación de geotextil y rajón en la vía a construir desde PR0+000 AL PR0+120
2. Se están adelantando revisión de topografía por parte de la firma contratista e interventora de acuerdo al diseño entregado por la entidad contratante
3. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles
4. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 27,38%
5.La firma contratista no presenta plan de contingencia para superar atraso en obra

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 12 (Dia) 9 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 5 Del: 5/09/2022 Al: 11/09/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 34

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA	
	PROGRAMADA	EJECUTADA
Obra Financiera %	9,13%	0,93%
Valor de la Obra programada:	$ 238.653.378	$ 24.230.075,44
Valor de interventoría	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56

VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Ejecutada Acumulada %	1,75%	23,31%	-21,56%
Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 45.760.459	$ 609.410.643	$ (563.650.184,00)
Valor interventoría.	$ 59.859.262,78	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -	27,78%
Ejecución física programada	27,78%	21,56%	0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 312D	1
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 5 TON	1
MINICARGADOR BOBCAR S185	1
VOLQUETAS	3
	7


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	1	SG-SST	1
		AYUDANTES	3	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	15	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4	$ 21.530.383	$ 370.757.265
SEMANA 5	$ 45.760.459	$ 609.410.643
SEMANA 6		$ 792.838.687
SEMANA 7		$ 933.931.819
SEMANA 8		$ 1.101.595.189
SEMANA 9		$ 1.293.947.804
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

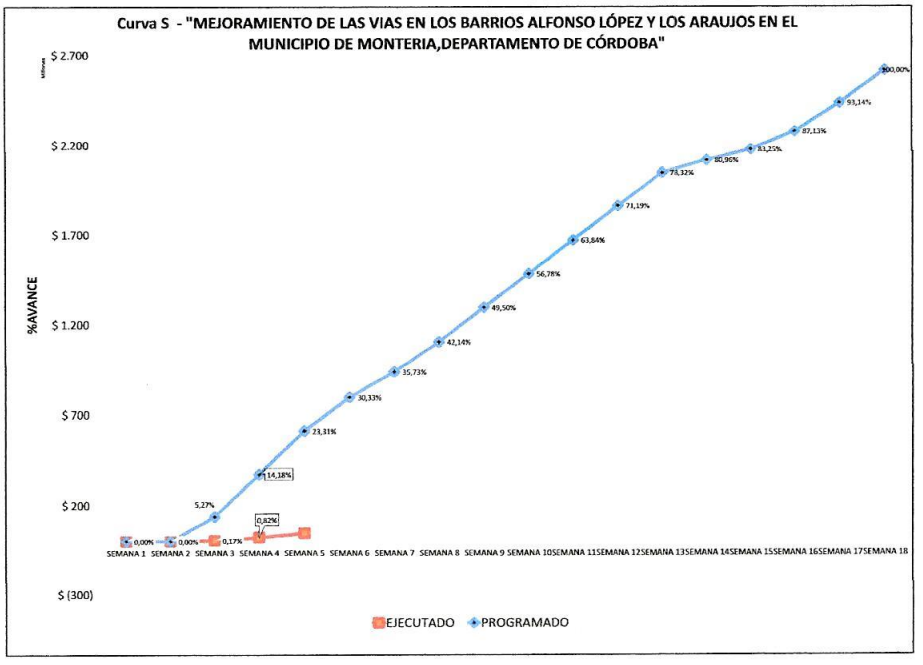

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Continua Instalación de Rajon desde el PR00+040 al PR00+120
2. Se continua con la instalación del material de piedra rajon desde el PR00+120 hasta PR00+044
3. Acopio de material de Rajón
4. Cerramiento y Señalización de área de descargue y cargue del Material Rajón
5. A la fecha se solicita a la firma contratista llevar a obra material de subbsabe granular
6. Se realiza excavación, instlacion de geotextil y rajon en PR0+120 Boca calle derecha

	ALCALDIA DE MONTERIA	Código:	
MONTERÍA Gobierno de la GENTE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Versión:	1
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 12 (Día) 9 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 5 Del: 5/09/2022 Al: 11/09/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 34


Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

ACTIVIDADES ATRASADAS A LA FECHA:
*DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO: 100%
*CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA: 100%
*DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO: 100%
*DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS: 100%
*EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM, NO INCLUYE RETIRO: 100%
*EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES: 92%
*CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE: 65%
*REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ): 66%
*REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ): 75%
*MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR): 100%
*BASE GRANULAR CLASE C: 2%
*GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES: 33%
*ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa: 63%
*SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM: 100%

*SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM: 100%
*REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN: 29%
*REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA: 46%
*LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION: 100%
*SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF): 27%
*SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF): 27%
*SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE: 27%
*SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG: 27%
*SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG: 27%
*SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m: 27%
*INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV: 27%

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

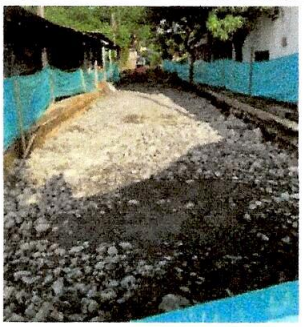


DESAGUE PR0+040 AL PR0+120



EXPLANEACIÓN PR0+040 AL PR0+120



VERIFICACIÓN EJES PR0+040 AL PR0+120

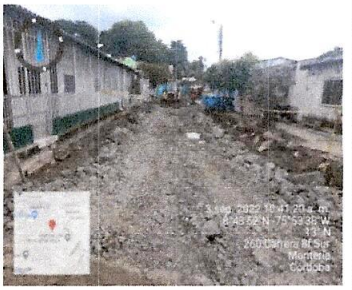

NIVELACIÓN PR0+040 AL PR0+120



EXCAVACIÓN PR0+120 BOCA CALLE DERECHA



BOTIQUIN Y CAMILLA EN OBRA

INFORMACION SST

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se solicita entrega de documentación faltante de afiliaciones del personal que va a laborar en obra
2.Se solicita documentos de equipo mínimo según pliegos
3.Se solicita colocar señalización en obra de acuerdo a PMT aprobado
4.Se solicita colocar cerramiento tipo 3 en área a intervenir y colocar senderos peatonales a las viviendas afectadas por la excavación
5.Se solicita implementar PGIO en obra

Observaciones:

1. A la fecha se realizan actividades de excavación, colocación de geotextil y rajón en la vía a construir desde PR0+000 AL PR0+120
2. Se están adelantando revisión de topografía por parte de la firma contratista e interventora de acuerdo al diseño entregado por la entidad contratante
3. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles
4. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 23,31%
5.La firma contratista no mantiene suministro constante en obra de subbase granular y rajón para realización de estructura de pavimento

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 29 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 4 Del: 29/08/2022 Al: 4/09/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 27

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	8,92%	0,65%	Obra Ejecutada Acumulada %	0,82%	14,18%	-13,36%
Valor de la Obra programada:	$ 233.106.537	$ 17.083.714,50	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 21.530.383	$ 370.757.265	$ (349.226.882,00)
de interventoría	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 47.887.410,22	Ejecución física a la fecha presenta desfase en - 13,36%	22,22%
			Ejecución física programada	22,22%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:


MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 312D	1
EXCAVADORA DE LLANTAS CATERPILLAR	1
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC 5 TON	1
MINICARGADOR BOBCAR S185	1
VOLQUETAS	3
	7

PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	1	SG-SST	1
		AYUDANTES	3	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	3	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	15	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION		
SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4	$ 21.530.383	$ 370.757.265
SEMANA 5		$ 609.410.643
SEMANA 6		$ 792.838.687
SEMANA 7		$ 933.931.819
SEMANA 8		$ 1.101.595.189
SEMANA 9		$ 1.293.947.804
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

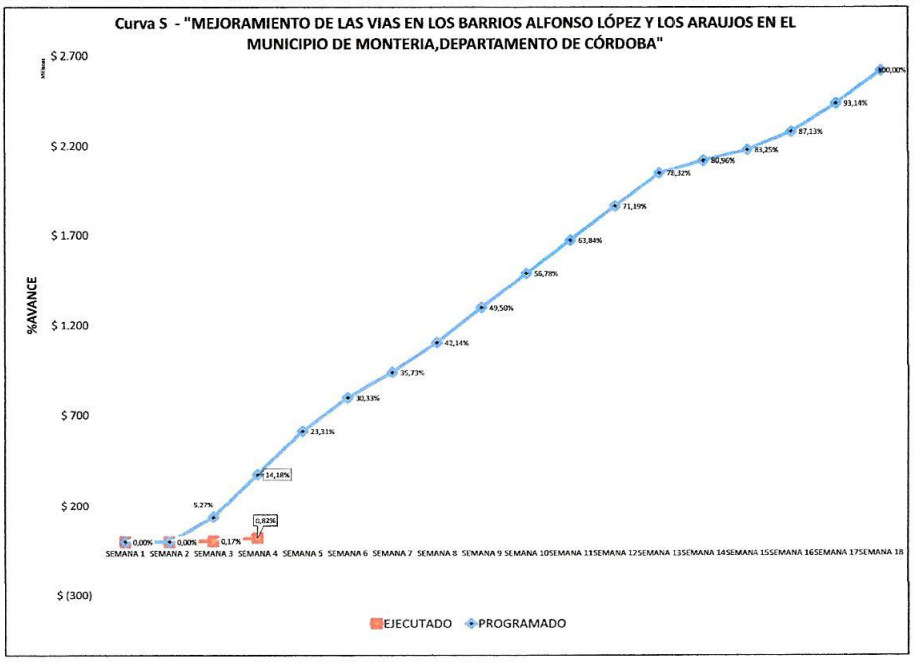

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se solicita a la firma contratista entregar documentación de personal y equipos a ingresar a obra
2. Demolición de anden en concreto PR0+000 AL PR0+120
3. Se instala geotextil sobre excavación realizada desde el PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+120 AL PR0+060
4. Se instala rajón desde el PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+120 AL PR0+060
5. Se inicia actividades de excavación desde el PR0+040 AL PR0+120
6. Continúan las actividades de control de obra con topografía sobre la vía, por parte de la firma contratista e interventoría
7. Se solicita a la firma contratista contar con el equipo mínimo requerido en campo, solo se cuenta con retrocargador y tres volquetas
8. Se solicita a la firma contratista cambio de material de subbase toda vez que el colocada en campo No cumple con las especificaciones técnicas del articulo 320 de Invías 2013

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 29 (Día) | 8 (Mes) | 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 4 Del: 29/08/2022 Al: 4/09/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 27

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,99

ACTIVIDADES ATRASADAS A LA FECHA:

*DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO: 100%
*CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA: 100%
*DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO: 65%
*DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS: 55%
*EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO: 59%
*EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES: 61%
*CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE: 38%
*REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE ESTRACCIÓN DE RAIZ): 26%
*REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ): 14%
*MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR): 62%
*ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa: 42%
*SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM: 100%
*SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM: 100%
*REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN: 19%

*REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.:31%
*LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.:100%
*SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).:13%
*SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).:13%
*SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.:13%
*SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.:13%
*SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.:13%
*SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m!13%
*INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.:13%

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA




EXCAVACIÓN PR0+040 AL PR0+120



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PR0+000 AL PR0+036

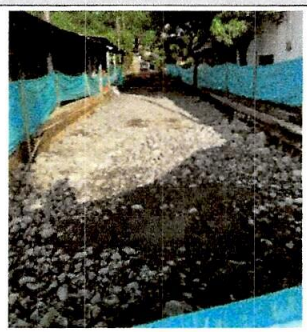

INSTALACIÓN DE RAJÓN PR0+000 AL PR0+036



EXCAVACIÓN PR0+040 AL PR0+120





LLUVIAS PR0+000 AL PR0+036



SEÑALIZACIÓN VIA

INFORMACION SST

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se solicita entrega de afiliaciones del personal que va a laborar en obra
2.Se solicita entrega de dotación al personal en obra
3.Se solicita documentos de equipo mínimo según pliegos
4.Se solicita colocar señalización en obra de acuerdo a PMT aprobado
5.Se solicita colocar cerramiento tipo 3 en área a intervenir y colocar senderos peatonales a las viviendas afectadas por la excavación
6.Se realiza excavación





Observaciones:

1. A la fecha se realizan actividades de excavación, colocación de geotextil y rajón en la via a construir desde PR0+000 AL PR0+120
2. Se están adelantando revisión de topografia por parte de la firma contratista e interventora de acuerdo al diseño entregado por la comunidad
3. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles, diseño de espacio publico a construir Y diseño eléctrico a implementar
4. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 13,36%
5.La firma contratista no mantiene suministro constante en obra de subbase granular y rajón para realización de estructura de pavimento

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 29 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 3 Del: 22/08/2022 Al: 28/08/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 20

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	5,27%	0,17%	Obra Ejecutada Acumulada %	0,17%	5,27%	-5,10%
Valor de la Obra programada:	$ 137.650.727	$ 4.446.668,80	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 4.446.669	$ 137.650.728	$ (133.204.059,00)
de interventoria	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 35.915.557,67	Ejecución física a la fecha presenta desfase en -	16,67%
			Ejecución física programada	16,67%	5,1%	0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
EXCAVADORA DE ORUGAS CATERPILLAR 312D	1
	1


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PROFESIONALES APROBADOS	7	AUXILIARES Y OFICINA	5	DIRECTOR	1
		MAESTRO	1	RESIDENTE	1
		OFICIOS VARIOS	1	SG-SST	1
		AYUDANTES	6	COMISION TOPOGRAFICA	2
		COMISION TOPOGRAFICA	2	OFICINA	2
		OPERADOR DE MAQUINARIA	1	ESPECIALISTA	1
PERSONAL DE LA ZONA	7	LABORANDO	16	TOTAL INTERVENTORIA	8

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3	$ 4.446.669	$ 137.650.728
SEMANA 4		$ 370.757.265
SEMANA 5		$ 609.410.643
SEMANA 6		$ 792.838.687
SEMANA 7		$ 933.931.819
SEMANA 8		$ 1.101.595.189
SEMANA 9		$ 1.293.947.804
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

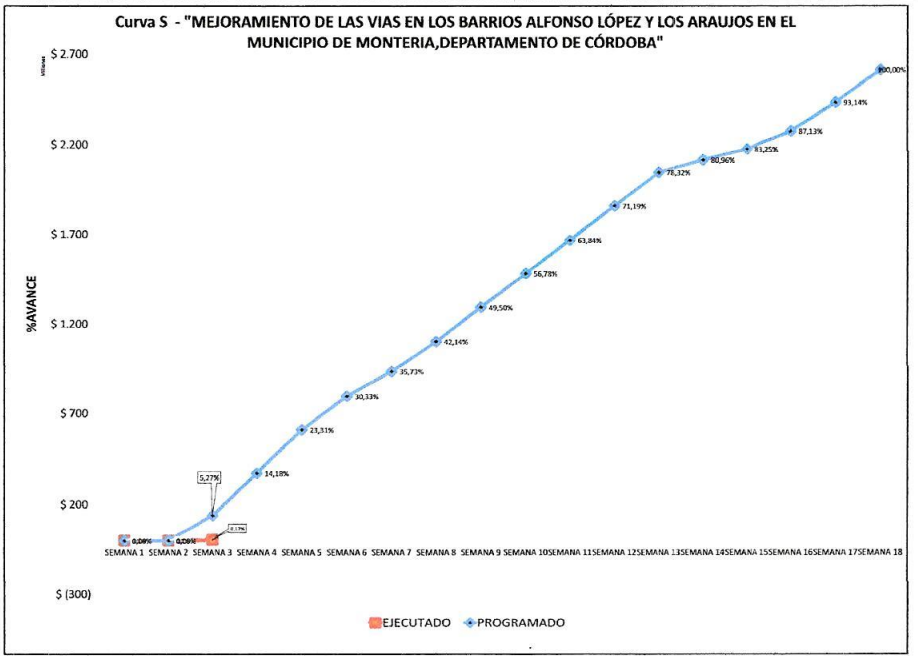

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se entregan documentos para inicio de obra por parte de la firma contratista y firma interventora a entidad contratante
2. Se solicita a la firma contratista entregar documentación de personal y equipos a ingresar a obra
3. Se solicita a la firma contratista entrega de programación de obra y flujo de caja impresas y firmadas
4. Se inicia actividades de excavacion desde el PR0+000 AL PR0+036 y del PR0+040 AL PR0+095
5. Continúan las actividades de control de obra con topografía sobre la via, por parte de la firma contratista e interventoría
6. Se solicita a la firma contratista contar con el equipo minimo requerido en campo, solo se cuenta con retrocargador y tres volquetas
7. Se entrega por parte de la entidad contratante los planos del diseño de espacio publico a construir
8. Se solicita a la entidad contratante entregar los planos del diseño de las redes eléctricas a intervenir
9. Se solicita a la entidad contratante entrega de permiso de corte de arboles
10. La firma contratista realiza excavación desde el PR0+040 AL PR0+095 sin contar con el equipo minimo requerido y sin contar con materiales como son rajon, y subbsae granular para que puedan ir excavando y protegiendo la subrasante y evitar asi que se produzcan fallos en estas por causa de lluvias, se le deja claro a la firma contratista que de presentarse fallos en la subrasante por esta causa debe subsanar estos sin costo alguno para el proyecto.

	ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código:	
		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 29 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 3 Del: 22/08/2022 Al: 28/08/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 20

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



EXCAVACIÓN PR0+000 AL PR0+036



LLUVIAS PR0+000 AL PR0+036



SEÑALIZACIÓN VIA

INFORMACION SST

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se solicita entrega de afiliaciones del personal que va a laborar en obra
2.Se solicita entrega de dotación al personal en obra
3.Se solicita documentos de equipo mínimo según pliegos
4.Se solicita colocar señalizacion en obra deacuerdo a PMT aprobado
5.Se solicita colocar cerramiento tipo 3 en area a intervenir y colocar senderos peatonales a las viviendas afectadas por la excavación



Fotografía 1: Se solicita colocar cerramiento tipo 3 en area a intervenir



Fotografía 2: Se solicita entrega de dotación al personal en obra

Observaciones:

1. A la fecha se inician actividades de excavación en la vía a construir PR0+000 AL PR0+095
2. Se están adelantando revisión de topografía por parte de la firma contratista e interventora de acuerdo al diseño entregado por la comunidad
3. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles, diseño de espacio publico a construir Y diseño electrico a implementar
4. A la fecha se presenta atraso al programa de obra del 5,10%
5.La firma contratista no acata las solicitudes de realizadas por la firma interventora en cuento a lo relacionado con tener en campo equipo mínimo y realizar intervención por tramos

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022 **OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 22 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 2 Del: 15/08/2022 Al: 21/08/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 13

Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

EJECUCIÓN DE OBRA

Los valores se remiten al costo incluido AIU DEL 33%

OBRA PROGRAMADA	EJECUTADO EN LA SEMANA		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LA FECHA		
	PROGRAMADA	EJECUTADA		EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA (+ o -)
Obra Financiera %	0,00%	0,00%	Obra Ejecutada Acumulada %	0,00%	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ -	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ -	$ 0	$ -
de interventoría	$ 11.971.852,56	$ 11.971.852,56	Valor interventoría.	$ 23.943.705,11	Ejecución física a la fecha presenta desfase en 0%	11,11%
			Ejecución física programada	11,11%		0,00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	Interventor:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
Contrato N°:	LP – SPM – 008-2022	Contrato N°:	CMA-SPM-007-2022
Valor total:	$2.680.932.314,00	Valor total:	$215.493.346,00
Plazo total :	4 MESES	Plazo total :	4 MESES
Fecha de Inicio	9/08/2022	Fecha de Inicio:	9/08/2022
Fecha de terminación:	9/12/2022	Fecha de terminación	9/12/2022

NOMBRE DE LA VÍA:	VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)		
LONGITUD DEL CORREDOR: (m)	798,90	DESCRIPCION	Vía Existente En Terreno Natural

Actividad:

ESTADO	
	BUENO
	REGULAR
	MALO

PROGRAMADO	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
	0


PERSONAL OBRA		PERSONAL NO CALIFICADO DE LA VIA		PERSONAL INTERVENTORIA	
PERSONAL DE LA ZONA	0	LABORANDO	0	TOTAL INTERVENTORIA	0

INFORMACION TECNICA

REPRESENTACION GRAFICA INVERSION SEMANAL

CURVA DE INVERSION

SEMANA	EJECUTADO	PROGRAMADO
SEMANA 1	$ -	$ -
SEMANA 2	$ -	$ -
SEMANA 3		$ 137.650.728
SEMANA 4		$ 370.757.265
SEMANA 5		$ 609.410.643
SEMANA 6		$ 792.838.687
SEMANA 7		$ 933.931.819
SEMANA 8		$ 1.101.595.189
SEMANA 9		$ 1.293.947.804
SEMANA 10		$ 1.484.188.507
SEMANA 11		$ 1.668.818.699
SEMANA 12		$ 1.860.963.930
SEMANA 13		$ 2.047.177.459
SEMANA 14		$ 2.116.368.423
SEMANA 15		$ 2.176.078.739
SEMANA 16		$ 2.277.675.862
SEMANA 17		$ 2.434.547.533
SEMANA 18		$ 2.613.987.559

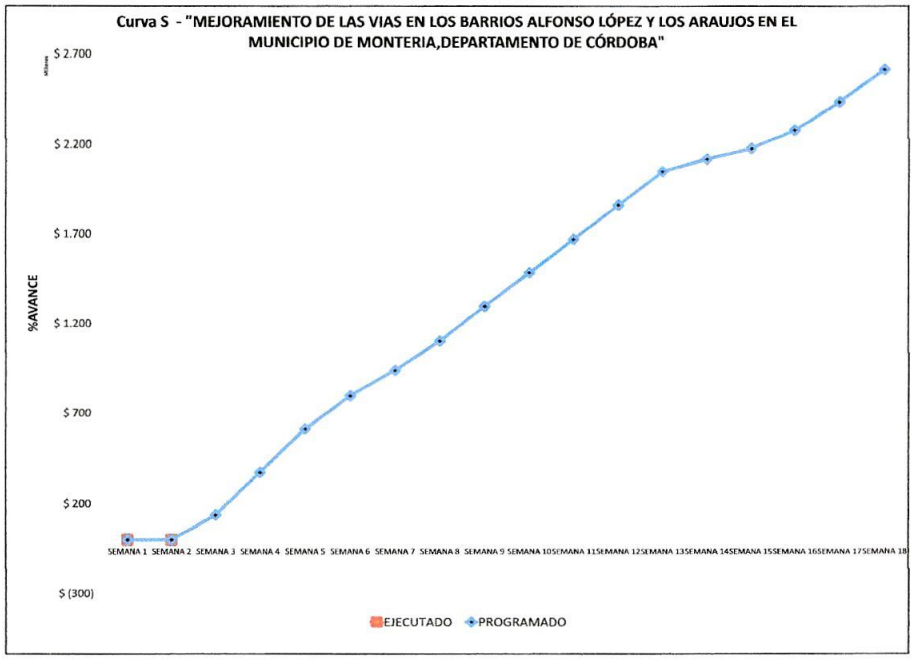

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

1. Se entregan documentos para inicio de obra por parte de la firma contratista y firma interventora a entidad contratante
2. Se solicita a la firma contratista entregar documentación de personal y equipos a ingresar a obra
3. Se solicita a la firma contratista entrega de programación de obra y flujo de caja impresas y firmadas
4. Se instala valla informativa de obra, se solicita a la firma contratista cambiar de lugar de esta teniendo en cuenta que donde actualmente se instalo no es muy visible a la comunidad
5. continúan las actividades de topografía sobre la vía, por parte de la firma contratista e interventoría
6. Se inicia el reconocimiento en campo de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato de obra
7. Se solicita a la firma contratista la entrega de los ensayos de los materiales a utilizar en campo
8. Se Solicita a la entidad contratante entregar los planos del diseño de espacio publico a construir
9. Se solicita a la entidad contratante entregar los planos del diseño de las redes eléctricas a intervenir
10. Se realizar recorrido entre contratista, interventoría y control urbano para visitar las viviendas que se encuentran ubicadas dentro del diseño del espacio publico para la vía a construir

ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Código:	
Versión:	1
Fecha de aprobación:	9/08/2022

CONTRATO No: CMA-SPM-007-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 22 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Semana: 2 Del: 15/08/2022 Al: 21/08/2022

Plazo transcurrido desde la iniciación del contrato: 13


Nombre de los Supervisores: GERMAN QUINTERO MENDOZA

VÍA A INTERVENIR CON EL CONTRATO	LONGITUD (M)
VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (CARRERA 8E ENTRE CALLES 2 Y 9)	798,90

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA



RECORRIDO CON CONTROL URBANO

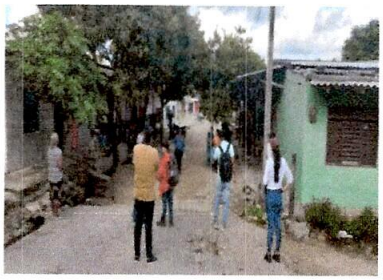

RECORRIDO CON CONTROL URBANO



RECORRIDO CON CONTROL URBANO



TOPOGRAFIA



TOPOGRAFIA

INFORMACION SOCIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

-Se realizar visita recorrido entre contratista e interventoría a las viviendas que se encuentran ubicadas dentro del diseño del espacio publico para la vía a construir



Fotografía 1:



Fotografía 2:

INFORMACION SST

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se solicita entrega de afiliaciones del personal que va a laborar en obra
2.Se solicita entrega de dotación al personal en obra
3.Se solicita documentos de retroexcavadora y equipos a utilizar

Fotografía 1:

Fotografía 2:

Observaciones:

1. A la fecha no se han iniciado actividades de intervención en la vía a construir
2. Se están adelantando revisión de topografía por parte de la firma contratista e interventora de acuerdo al diseño entregado por la comunidad
3. Se solicita a entidad contratante entrega de permiso para tala de arboles y diseño de espacio publico a construir
4. A la fecha No se presenta atraso al programa de obra

DIRECTOR INTERVENTORIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	ACTA DE INICIO CMA-SPM-007-2022 INTER.pdf	ACTA DE INICIO CMA-SPM-007-2022 INTER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CRP 22001573 CONTRATO CMA-SPM-007-2022 INTERVENTORIA BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS (1).pdf	CRP 22001573 CONTRATO CMA-SPM-007-2022 INTERVENTORIA BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP-INTERVENTORIA.PDF	CDP-INTERVENTORIA.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1 PARTE 1_c.pdf	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1 PARTE 1_c.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1 PARTE 2_c.pdf	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1 PARTE 2_c.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.2 - PARTE 1.pdf	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.2 - PARTE 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.2 - PARTE 2.pdf	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.2 - PARTE 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Acta Parcial Literal

ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO No:	CMA-SPM-007-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, representado por ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($215.493.346,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2022
FECHA FINAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO	DEL 09 DE AGOSTO DE 2022 Al 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR PRESENTE ACTA:	$56.911.793,00

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los CUATRO (04) días del mes de Noviembre del año 2022, y estando vigente el Contrato de Interventoría identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal **MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ**, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia y el Interventor de la Obra **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS,** Representado por **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ,** con el propósito de suscribir la presente Acta y dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual.

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA 8. El valor del contrato resultante de este proceso, se cancelará mediante pagos parciales, en la misma proporción de la ejecución de la obra objeto de vigilancia, para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Los porcentajes de pagos mensuales no podrán ser superiores a los porcentajes de los avances físicos de la obra. PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte del Municipio de MONTERÍA, el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de interventoría. En este último pago deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica y acta de liquidación del contrato.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Balance financiero del contrato de Interventoría:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor del Contrato	$215.493.346,00	
Valor Acta Parcial No. 01		$56.911.793,00
Saldo por Ejecutar		$158.581.553,00
Balance	$215.493.346,00	$215.493.346,00

Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta parcial por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($56.911.793,00) M/CTE

Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS.

El Interventor manifiesta que realizó los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 04 del mes de noviembre de 2022

MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ
Secretaria de Infraestructura

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INTERVENTOR

Elaboró: Elkin Rojas – Residente de interventoría
Reviso: Mario Torres – Apoyo a la Supervisión
Reviso: Ana Díaz – Contratista SIM
Reviso: Edwin Paternina – Contratista SIM

Acta Parcial Numérica

Alcaldía de MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL N° 01

CONTRATO N° CMA-SPM-007-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

FECHA DE INICIACION: 09 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO: CUATRO (04) MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

VALOR INICIAL: **$215.493.346,00**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $56.911.793,00

% INTERVETORIA EJECUTADA 26,41%

ACTA PARCIAL N° 01

VALOR PRESENTE ACTA:

$56.911.793,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA:
04 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS		ACTA N° 1		ACUMULADO	
CANT. (1)	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	PARTIC (h-mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)	CANT	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR	CANT	VALOR
	PERSONAL PROFESIONAL												
1	Director de interventoría	$6.000.000,00		1,20	$7.200.000,00	1	$7.200.000,00	26,40%		26,41%	$1.901.520,00	1	$1.901.520,00
1	Ing. Con postgrado en vias	$3.800.000,00		0,80	$3.040.000,00	1	$3.040.000,00	26,40%		26,41%	$802.864,00	1	$802.864,00
1	profesional Residente Interventoría	$3.300.000,00		4,00	$13.200.000,00	1	$13.200.000,00	26,40%		26,41%	$3.486.120,00	1	$3.486.120,00
1	Cordinador SG-SST	$2.800.000,00		1,20	$3.360.000,00	1	$3.360.000,00	26,40%		26,41%	$887.376,00	1	$887.376,00
1	Contador	$2.800.000,00		0,40	$1.120.000,00	1	$1.120.000,00	26,40%		26,41%	$295.792,00	1	$295.792,00
1	Abogado	$2.800.000,00		0,40	$1.120.000,00	1	$1.120.000,00	26,40%		26,41%	$295.792,00	1	$295.792,00
	PERSONAL TÉCNICO												
1	Topógrafo	$2.200.000,00		4,00	$8.800.000,00	1	$8.800.000,00	26,40%		26,41%	$2.324.080,00	1	$2.324.080,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO												
1	Secretaria	$1.150.000,00		4,00	$4.600.000,00	1	$4.600.000,00	26,40%		26,41%	$1.214.860,00	1	$1.214.860,00
1	Conductor	$1.150.000,00		4,00	$4.600.000,00	1	$4.600.000,00	26,40%		26,41%	$1.214.860,00	1	$1.214.860,00
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
1	Cadenero	$1.100.000,00		4,00	$4.400.000,00	1	$4.400.000,00	26,40%		26,41%	$1.162.040,00	1	$1.162.040,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**$51.440.000,00**		**$51.440.000,00**				**$13.585.304,00**		**$13.585.304,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,14**		**2,14**				**2,14**		**2,14**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$110.081.600,00**		**$110.081.600,00**				**$29.072.551,00**		**$29.072.551,00**
	VIÁTICOS												
CANT. (8)	CONCEPTO	UN	COSTO ($) (9)	UTILIZACION (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10) = (11)	CANT	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR		
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 a 2015	Mes	$5.390.000,00	4,00	$21.560.000,00	1	$21.560.000,00	26,40%		26,41%	$5.693.996,00	1	$5.693.996,00
1	Equipo completo de topografía	Según comprobante por mes	$3.500.000,00	4,00	$14.000.000,00	1	$14.000.000,00	26,40%		26,41%	$3.697.400,00	1	$3.697.400,00
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	Según comprobante por mes	$1.500.000,00	4,00	$6.000.000,00	1	$6.000.000,00	26,40%		26,41%	$1.584.600,00	1	$1.584.600,00
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Según comprobante por mes	$2.900.000,00	4,00	$11.600.000,00	1	$11.600.000,00	26,40%		26,41%	$3.063.560,00	1	$3.063.560,00

Alcaldía de MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL N° 01

CONTRATO N° CMA-SPM-007-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

FECHA DE INICIACION: 09 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO: CUATRO (04) MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

VALOR INICIAL: **$215.493.346,00**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $56.911.793,00

% INTERVETORIA EJECUTADA 26,41%

ACTA PARCIAL N° 01

VALOR PRESENTE ACTA:

$56.911.793,00

FECHA DEL PRESENTE ACTA:
04 DE NOVIEMBRE DE 2022

	OTROS COSTOS													
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$374.550,00	4,00	$1.498.200,00	1	$1.498.200,00	26,40%		26,41%	$395.675,00	1	$395.675,00
1	Edición de informes, Videos, reproducción de documentos, planos, fotografías,etc	Según comprobante por mes	$450.000,00	4,00	$1.800.000,00	1	$1.800.000,00	26,40%		26,41%	$475.380,00	1	$475.380,00
1	Elementos e Insumos Implementación Protocolo de Bioseguridad	MES	$785.000,00	4,00	$3.140.000,00	1	$3.140.000,00	26,40%		26,41%	$829.274,00	1	$829.274,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)				**$59.598.200,00**		**$59.598.200,00**				**$15.739.885,00**		**$15.739.885,00**
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$169.679.800,00**		**$169.679.800,00**				**$44.812.436,00**		**$44.812.436,00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES = (D)												
	(1) SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				**$169.679.800,00**		**$169.679.800,00**				**$44.812.436,00**		**$44.812.436,00**
	(2) IVA = 19% * (E) = (F)				$32.239.162,00		$32.239.162,00				$8.514.363,00		$8.514.363,00
	SUBTOTAL 1: (E + F)				**$201.918.962,00**		**$201.918.962,00**				**$53.326.799,00**		**$53.326.799,00**
	(3) IMPUESTOS MUNICIPALES				$13.574.384,00		$13.574.384,00				$3.584.994,00		$3.584.994,00
	Impuestos INDUCOM 1%				$1.696.798,00		$1.696.798,00				$448.124,00		$448.124,00
	Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%				$3.393.596,00		$3.393.596,00				$896.249,00		$896.249,00
	Impuestos PROCULTURA 1%				$1.696.798,00		$1.696.798,00				$448.124,00		$448.124,00
	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3%				$5.090.394,00		$5.090.394,00				$1.344.373,00		$1.344.373,00
	Impuestos PRODEPORTE 1%				$1.696.798,00		$1.696.798,00				$448.124,00		$448.124,00
	COSTO TOTAL BASICO DEL CONTRATO: (1) + (2) + (3)				**$215.493.346,00**		**$215.493.346,00**				**$56.911.793,00**		**$56.911.793,00**
	NETO A PAGAR PRESENTE ACTA				**$56.911.793,00**						**$56.911.793,00**		**$56.911.793,00**

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, a los 04 días del mes de Noviembre del año 2022

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 56.911.793,00**

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Gobierno de la GENTE

MÓNICA MARÍA SEVERICHE NUÑEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

Copia de Acta de Inicio

ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No:	CMA-SPM-007-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS, representado por ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($215.493.346,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2022
FECHA FINAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	09 DE AGOSTO DE 2022

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los NUEVE (09) días del mes de agosto del año 2022, y estando vigente el Contrato de Interventoría Identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia y el Interventor de la Obra **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS** Representado por **ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ,** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de Interventoría CMA-SPM-007-2022, tal como se presenta a continuación:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio a las actividades contempladas y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que por mutuo acuerdo se establece que las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato será enviada a través de los canales de comunicación que se relacionan en el siguiente cuadro, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para la ejecución de este proyecto.

Nombre Completo	Cargo	Correo	Celular
Elsa María Rueda Landinez	Representante Legal Interventoría	Interventoriamonteria007@Gmail.Com	317 6425740
German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura	s.infraestructura@monteria.gov.co	3112382031

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 09 días del mes de agosto de 2022

GE RMAN QUINTEIRO MENDOZA
Secretario de Infraestructura

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTOR

Elaboró: MATP– Prof. Univ. SIM
