FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1	DIA	29	MES	9	AÑO	2022

SEMANA N°	13	DEL	22 de septiembre de 2022	AL	28 de septiembre de 2022
FECHA INICIO :	1 de julio de 2022	FECHA TERMINO :	31 de diciembre de 2022		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3.249.514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
PRELIMINARES	2,105%	1,809%	LOCALIZACION Y REPLANTEO, LOCALIZACION Y REPLANTETO DE REDES HIDROSANITARIAS, EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL HETEREOGENEO RELLENO EN MATERIAL DEL SITIO	SE CONTINUA CON EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION DE PUESTOS DE COMBATE
CIMIENTOS	0,10%	0,10%		
PISOS-BASES-RELLENOS	0,20%	0,15%		
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	1,02%	1,02%	TOMA DE PUNTOS DESDE TANQUES 2 Y 3	
INSTALACIONES ELECTRICAS		0,05%	TRAMITES ANTE ENTIDAD DE ELECTRICIDAD DE POPAYAN	
OBRAS EXTERIORES	4,00%	2,10%	PUESTOS DE COMBATE, LOCALIZACION, EXCAVACION E INICIO DE EXCAVACION PARA CIMENTACION, EXCAVACION DE CUNETAS	EL ATRASO SE DEBE AL SISTEMA PARA TRANSPORTAR MATERIAL A LA PARTE ALTA DE LA MONTAÑA
BM-26 BASES MILITARES	14,50%	12,10%	FABRICACION EN TALLER DE ESTRUCTURA METALICA PARA MODULARES	
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRANSPORTE		**2,00%**	SE INICIO CON EL TRASIEGO DE MATERIALES	
TOTALES	21,92%	19,32%	Semana Anterior	16,52%

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	3.374.409.018,55	652.070.798,74	**2.722.338.219,81**		2,81%	19,32%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	-	INSPECTOR	-
INGENIEROS	1,0	OBREROS	3,0
TOPÓGRAFO	-	AYUDANTES	8,0
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO


PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1	DIA	29	MES	9	AÑO	2022

SEMANA N°	13	DEL	22 de septiembre de 2022	AL	28 de septiembre de 2022

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

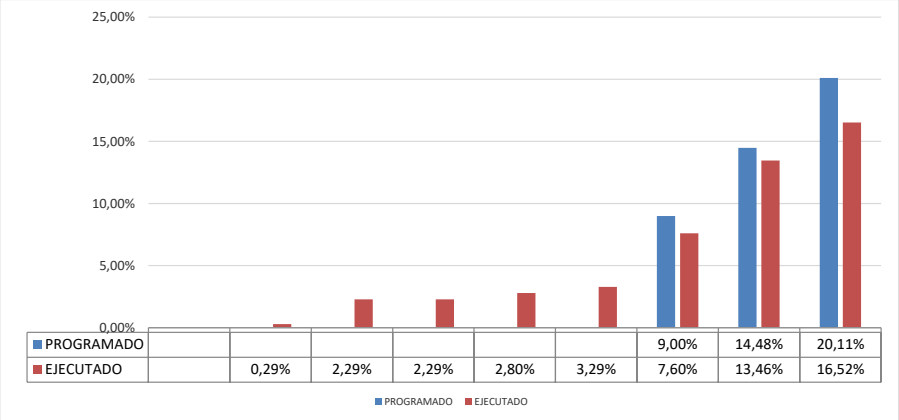

PROGRAMADO							9,00%	14,48%	20,11%
EJECUTADO		0,29%	2,29%	2,29%	2,80%	3,29%	7,60%	13,46%	16,52%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El contratista CONTINUA con movimientos de tierra en puestos de combate excavando zona de muros de conexión

El contratista TERMINA con excavaciones de modulares y puestos de combate

EL contratista inicia con el Trasiego de Materiales desde el Pueblo hasta la parte alta de la Montaña, se arregla entrada en predio, se hacen sitios de almacenamiento de materiales parte alta y parte Baja

El contratista Inicia con la construccion de Zapatas en suelo cemento

El contratista Inicia allega Acero figurado a Parte alta de la Montaña e inicia con la figuracion de refuerzos de dados de Modulares

Se realizaron durante la Semana Reunion SST, Manejo Ambiental de desechos, Movimientos de Personal Militar dentro de la Base para intervencion de Obra

El Contratista Continua con fabricacion en Taller de Estructura Metralica para Modulares

El Contratista en conjunto con la interventoria continua al pendiente de la **RESPUESTA** al apoyo Aereo para el ingreso de Maquinaria (tipo Minicargador) para la parte alta de la Montaña, esto con el fin de ejecutar la gran cantidad de movimientos de tierra que existen dentro del proyecto que son bastantes, y este por su peso y por la topografia de la Montaña es casi imposible subirlo por tierra; por otro lado el movimiento privado seria con un costo de 180 millones lo que genera la necesidad de el apoyo del Contratante para realizar el movimiento. AUN NO SE TIENE CERTEZA DE ESTE MOVIMIENTO

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJÉRCITO NACIONAL**				**INFORME SEMANAL**			
Código:		**Versión:**		**Fecha de Emisión: 21/09/2022**		**Página:**	
SEMANA N°	13	**DEL**	22 de septiembre de 2022		**AL**	28 de septiembre de 2022	
FECHA INICIO :		**FECHA TERMINO :**					

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO	**DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN**				
INTERVENTOR	**NESTOR ROJAS TORREZ**	**NIT O C.C.**	**3249514**	**CONTRATO N°**	**No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022**
CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS ARGELIA**	**NIT O C.C.**	**901.585.221-1**	**CONTRATO N°**	**163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 1

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Arreglo entrada a Predio para descarga de Materiales casco urbano




Fotografia 2

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Excavacion para Muros de Conexión

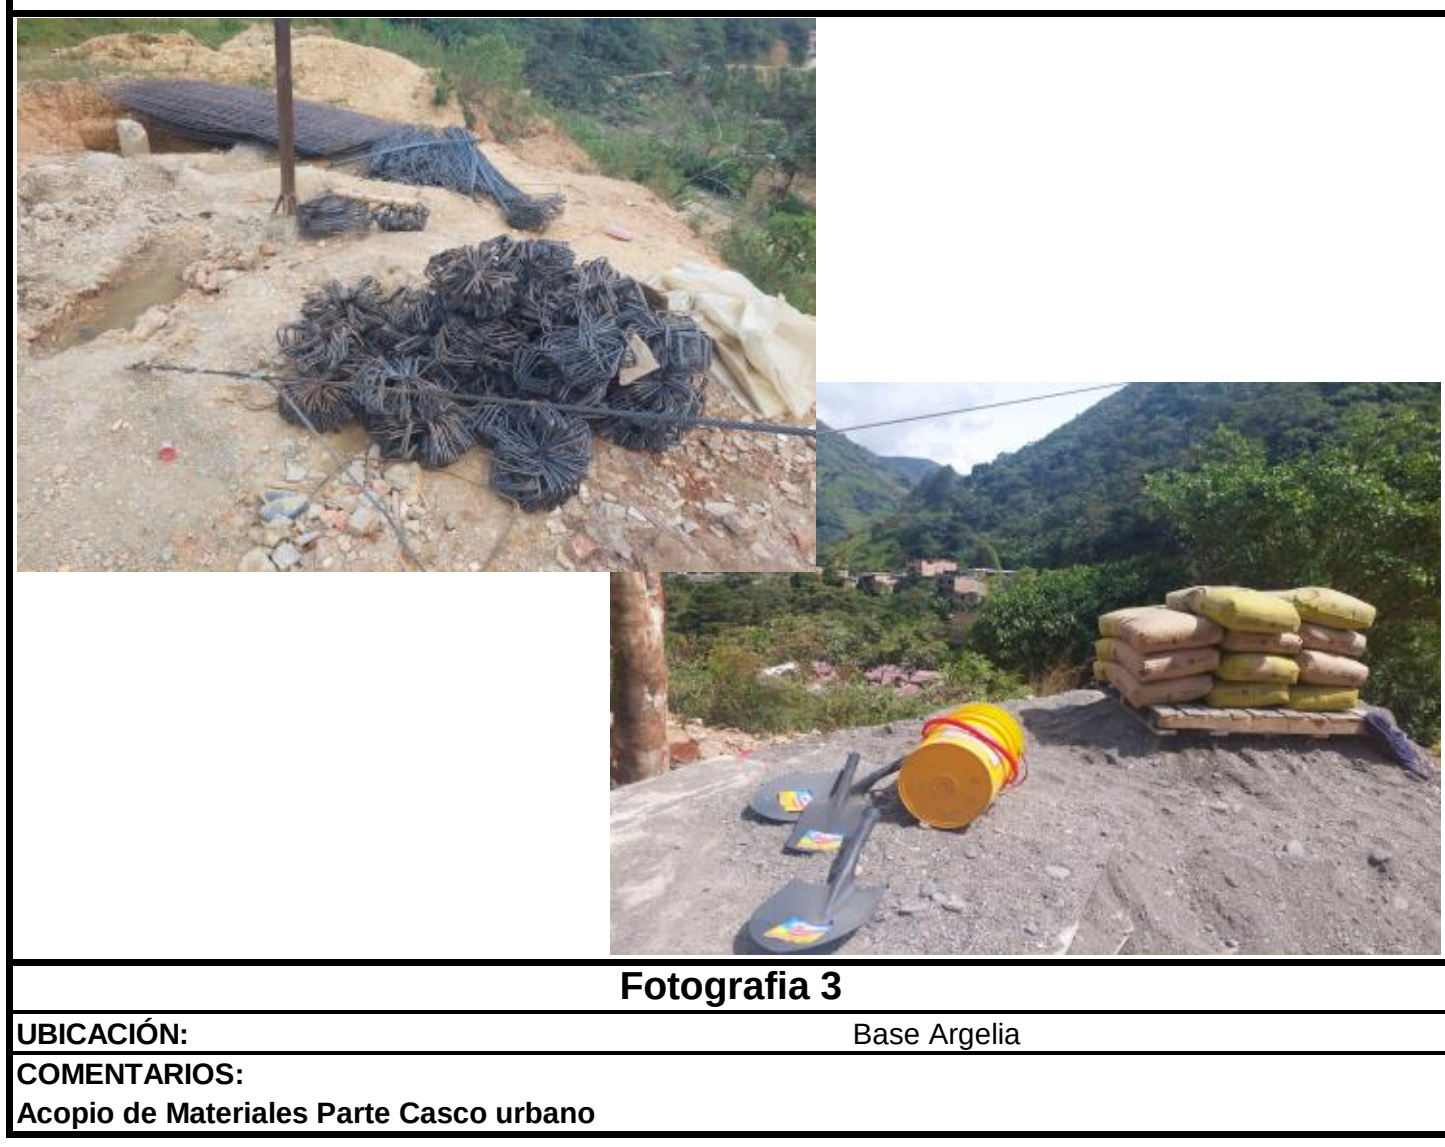

Fotografia 3

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Acopio de Materiales Parte Casco urbano



Fotografia 4

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Trasiego de Materiales por Sistema Mecanico

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:	Versión:	Fecha de Emisión: 21/09/2022	Página:

SEMANA N°	13	DEL	22 de septiembre de 2022	AL	28 de septiembre de 2022
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3249514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 5

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Acopio de Materiales Parte alta	



Fotografia 6

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Materiales para mezcla Suelo cemento	



Fotografia 7

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Zapatas en Suelo Cemento	



Fotografia 8

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Pisones para suelo cemento (cada 20cm)	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL			
Código:		**Versión:**		**Fecha de Emisión: 21/09/2022**		**Página:**	
SEMANA N°	13	**DEL**	22 de septiembre de 2022		**AL**	28 de septiembre de 2022	
FECHA INICIO :		**FECHA TERMINO :**					

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN**				
INTERVENTOR	**NESTOR ROJAS TORREZ**	**NIT O C.C.**	**3249514**	**CONTRATO N°**	**No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022**
CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS ARGELIA**	**NIT O C.C.**	**901.585.221-1**	**CONTRATO N°**	**163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 9

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Acero Figurado para Dados



Fotografia 10

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Acero Figurado para Dados
