FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1	DIA	19	MES	10	AÑO	2022

SEMANA N°	16	DEL	13 de octubre de 2022	AL	19 de octubre de 2022
FECHA INICIO :	1 de julio de 2022	FECHA TERMINO :	31 de diciembre de 2022		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3.249.514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
PRELIMINARES	3,440%	3,440%	LOCALIZACION Y REPLANTEO, LOCALIZACION Y REPLANTETO DE REDES HIDROSANITARIAS, EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL HETEREOGENEO RELLENO EN MATERIAL DEL SITIO	
CIMIENTOS	0,17%	0,18%	SE HACEN COMCRETO POBRE Y DADOS EN CONCRETO FALTAN RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA Y PLACAS PARA PATAR Y PTAP	
PISOS-BASES-RELLENOS	0,17%	0,17%	SE HACEN RECEBO CEMENTO EN LA MAYORIA FALTAN RANCHO DE TROPA Y ENFERMERIA, PLACAS DE PATAP Y PTAR	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,07%	0,13%	SE TERMINAN DADOS EN CONCRETO 30X30	EL AVANCE SE TIENE POR QUE SE ESTAN TRABAJANDO MALLAS ELECTROSOLDADAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS		0,98%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,05%	0,05%	TRAMITES ANTE ENTIDAD DE ELECTRICIDAD DE POPAYAN	
OBRAS EXTERIORES	10,74%	9,39%	PUESTOS DE COMBATE EN SU TOTALIDAD	EL ATRASO SE DEBE AL SISTEMA PARA TRANSPORTAR MATERIAL A LA PARTE ALTA DE LA MONTAÑA
BM-26 BASES MILITARES	18,26%	15,60%	FABRICACION EN TALLER DE ESTRUCTURA METALICA PARA MODULARES	SUMINISTRO EN SITIO DE ESTRUCTURA, EL ATRASO DE SE DEBE AL TRANSPORTE AL MUNICIPIO DE ARGELIA POR PROBLEMAS EN LA VIA PARA EL INGRESO
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	1,70%	1,70%	SE CONTINUA CON TRASIEGO DE MATERIALES	
TOTALES	**34,61%**	**31,63%**	Semana Anterior	27,09%

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	3.374.409.018,55	1.067.436.752,42	**2.306.972.266,13**		4,55%	31,63%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	-	INSPECTOR	-
INGENIEROS	1,0	OBREROS	4,0
TOPÓGRAFO	-	AYUDANTES	9,0

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI [X] NO [ ]


VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1	DIA	19	MES	10	AÑO	2022

SEMANA N°	16	DEL	13 de octubre de 2022	AL	19 de octubre de 2022

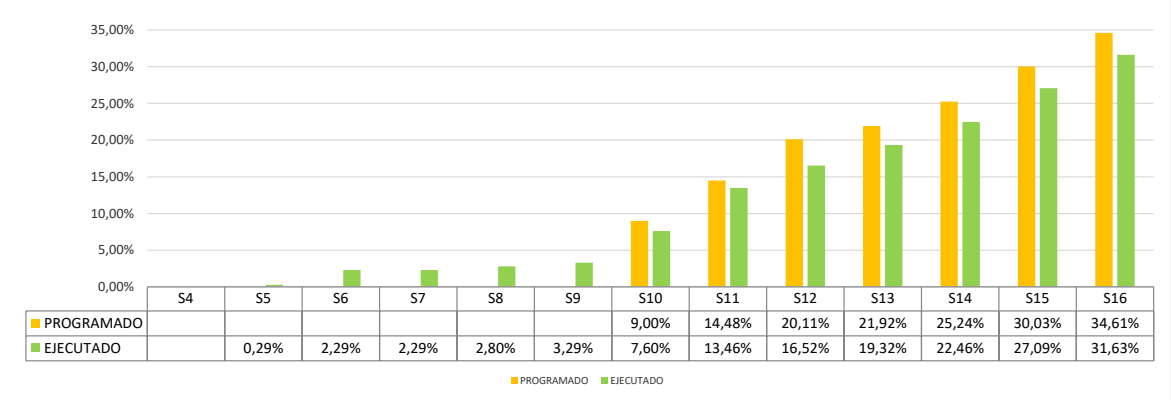

	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
PROGRAMADO							9,00%	14,48%	20,11%	21,92%	25,24%	30,03%	34,61%
EJECUTADO		0,29%	2,29%	2,29%	2,80%	3,29%	7,60%	13,46%	16,52%	19,32%	22,46%	27,09%	31,63%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El contratista Continua con relleno en suelo cemento compactado cada 20cm para modulares, la Zona del Rancho de Tropa que estaba ocupada por Tropa

El contratista ejecuta con concreto pobre para modulares en el Rancho de Tropa que estaba Ocupado por Tropa

EL contratista continua con el Trasiego de Materiales desde el Pueblo hasta la parte alta de la Montaña, se moviliza acero, agregados, cemento,

El contratista Suministra Estructura Metalica para Modulares e inicia con trasiego a la Parte alta de la Montaña con sistema Mecanico

El contratista Termina con Acero Figurado de Columnas e inicia con Acero figurado de Vigas Aereas; Hace pocisionamiento en sitio del mismo

El contratista finaliza con columnas en concreto de puestos de combate e inicia con testero y armado de vigas Aereas de puestos de conbate; Se hace Fundicion de Vigas Aereas de 2 Puestos de Combate

El contratista continua con Dados en Concreto para Bases de Modulares

Se realizaron durante la Semana Reunion SST, Manejo Ambiental de desechos, Movimientos de Personal Militar dentro de la Base para intervencion de Obra

El Contratista Continua con fabricacion en Taller de Mallas para Muros de conexión

Se realizo comité de seguridad con el coronel tapias coronel de badra 12, mayor escobar ejecutivo badra, interventoria y contratista; donde se hace ver que por combates en la zona con grupos al margen de la ley se deben tomar medidas de seguridad por parte del personal y el transporte de vehiculos de carga al municipio se debe coordinar por que no se pueden ingresar vehiculos por que los grupos al margen de la ley hacen precencia en la via que comunica al estrecho con argelia cauca. esto genera restraso en el suministro de materiales especiales de taller que vienen desde el taller de fabricacion.

Se encuentra pendiente la posibilidad de apoyo aéreo

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL			
Código:		**Versión:**		**Fecha de Emisión: 019/10/2022**		**Página:**	
SEMANA N°	16	**DEL**	13 de octubre de 2022		**AL**	19 de octubre de 2022	
FECHA INICIO :	**1/07/2022**	**FECHA TERMINO :**	**31/12/2022**				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN**				
INTERVENTOR	**NESTOR ROJAS TORREZ**	**NIT O C.C.**	**3249514**	**CONTRATO N°**	**No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022**
CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS ARGELIA**	**NIT O C.C.**	**901.585.221-1**	**CONTRATO N°**	**163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 1

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Recebo Cemento compactado Rancho de Tropa



Fotografia 2

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Solado en concreto Rancho de Tropa



Fotografia 3

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Dados en Concreto



Fotografia 4

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Armado de Acero Vigas Aereas

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							
				INFORME SEMANAL			
Código:			**Versión:**	**Fecha de Emisión: 019/10/2022**		**Página:**	
SEMANA N°	16	**DEL**	13 de octubre de 2022		**AL**	19 de octubre de 2022	
FECHA INICIO :	**1/07/2022**		**FECHA TERMINO :**	**31/12/2022**			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN**				
INTERVENTOR	**NESTOR ROJAS TORREZ**	**NIT O C.C.**	**3249514**	**CONTRATO N°**	**No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022**
CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS ARGELIA**	**NIT O C.C.**	**901.585.221-1**	**CONTRATO N°**	**163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 5

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Vigas Aereas	



Fotografia 6

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Vigas Aereas	



Fotografia 7

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Vigas Aereas	



Fotografia 8

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Suministro de Estructura Metalica para Modulares	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL			
Código:		**Versión:**		**Fecha de Emisión: 019/10/2022**		**Página:**	
SEMANA N°	16	**DEL**	13 de octubre de 2022	**AL**	19 de octubre de 2022		
FECHA INICIO :	1/07/2022	**FECHA TERMINO :**	31/12/2022				
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN						
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	**NIT O C.C.**	3249514	**CONTRATO N°**	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	**NIT O C.C.**	901.585.221-1	**CONTRATO N°**	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022		

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 9

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Acopio de Materiales en Parte baja (Estructura Metalica)



Fotografia 10

UBICACIÓN: Base Argelia

COMENTARIOS:

Transporte de Materiales a Parte Alta de la Montaña (Est. Metalica)
