FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1	DIA	3	MES	11	AÑO	2022

SEMANA N°	19	DEL	3 de noviembre de 2022	AL	9 de noviembre de 2022
FECHA INICIO :	1 de julio de 2022	FECHA TERMINO :	31 de diciembre de 2022		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3.249.514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
PRELIMINARES	3,440%	3,440%	LOCALIZACION Y REPLANTEO, LOCALIZACION Y REPLANTETO DE REDES HIDROSANITARIAS, EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL HETEREOGENEO RELLENO EN MATERIAL DEL SITIO	
CIMIENTOS	0,19%	0,19%	SE TERMINAN DADOS EN CONCRETO Y CONCRETO POBRE	
PISOS-BASES-RELLENOS	0,18%	0,32%	SE HACEN RECEBO CEMENTO, Y SUBBASE GRANULAR PARA PLACA DE PLANTA ELECTRICA Y PLACA PTAP	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,64%	0,64%	SE CONSTRUYEN PLACAS EN CONCRETO DE PTAP Y PLANTA ELECTRICA	
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	1,17%	1,17%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,05%	0,05%	TRAMITES ANTE ENTIDAD DE ELECTRICIDAD DE POPAYAN	
OBRAS EXTERIORES	16,14%	16,02%	PUESTOS DE COMBATE EN SU TOTALIDAD FALTA PLACA AEREA Y MUROS DE CONEXIÓN	NO SE HAN PODIDO INGRESAR MALLAR AL PROYECTO POR DERRUMBES A LA ALTURA DEL FILO CAUCA
BM-26 BASES MILITARES	19,86%	18,12%	FABRICACION EN TALLER DE ESTRUCTURA METALICA PARA MODULARES	SUMINISTRO EN SITIO DE ESTRUCTURA, NO SE HA PODIDO INGRESAR VEHICULOS DE CARGA POR PROBLEMAS EN LA VIA POR OLA INVERNAL
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	2,07%	2,07%	SE CONTINUA CON TRASIEGO DE MATERIALES	ESTA SEMANA SE PRESENTARON PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIUALES GRANULARES Y VIENTOS FUERTES POR LO QUE NO SE TRANSPORTO MATERIAL TODA LA SEMANA
TOTALES	43,74%	42,03%	Semana Anterior	36,56%

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	3.374.409.018,55	1.418.176.744,90	**1.956.232.273,65**		5,47%	42,03%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	-	INSPECTOR	-
INGENIEROS	1,0	OBREROS	4,0
TOPÓGRAFO	-	AYUDANTES	7,0

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO


PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI [X] NO [ ]

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1	DIA	3	MES	11	AÑO	2022

SEMANA N°	19	DEL	3 de noviembre de 2022	AL	9 de noviembre de 2022

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

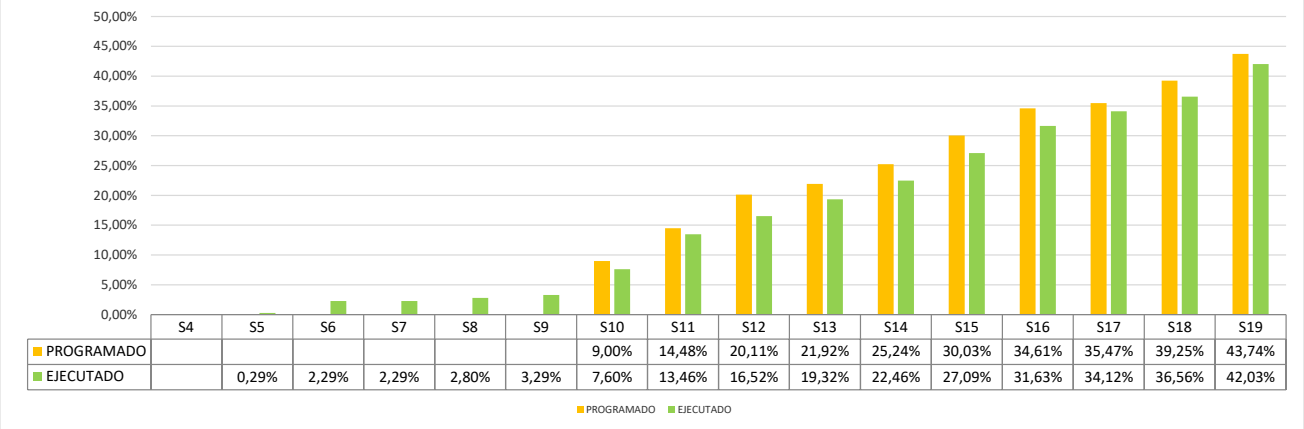

	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19
PROGRAMADO							9,00%	14,48%	20,11%	21,92%	25,24%	30,03%	34,61%	35,47%	39,25%	43,74%
EJECUTADO		0,29%	2,29%	2,29%	2,80%	3,29%	7,60%	13,46%	16,52%	19,32%	22,46%	27,09%	31,63%	34,12%	36,56%	42,03%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Esta Semana se presentaron lluvias fuertes toda la semana, lo que genero que continuen Derrumbes en la parte del Filo Cauca en la via que conecta Balboa Cauca con Argelia Cauca, solo estan ingresando vehiculos pequeños y de carga pequeños con dificultades
El camion con Mallas para muros de conexión y laminas de metaleeck no ha podido ingresar por problemas de derrumbes en la via
EL contratista continua con el Trasiego de Materiales desde el Pueblo hasta la parte alta de la Montaña, se moviliza agregados y cemento. No se pudo transportar agregados para concreto por problemas de derrumbes en la via y por problemas de crecida del rio en la planta en el Bordo Cauca
Se presentaron problemas en el freno del Sistema de Transporte por fuertes lluvias y vientos fuertes
Pro problemas de ola invernal la obra no tuvo un avance normal esta semana, por que la Mayoria de obras son exteriores y por demas no se pudo suministrar agregado normalmente
El contratista Continua con excavacion de Andenes e Inicia con Fundicion de Andenes en concreto
El contratista suministra y construye subbase granular para Placa de Planta Electrica y Placa de Planta de Tratamiento de Agua Potable
El contratista construye Placas de Planta Electrica y Placa de Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Se realizaron durante la Semana Reunion SST, Manejo Ambiental de desechos, Movimientos de Personal Militar dentro de la Base para intervencion de Obra
El Contratista Continua con fabricacion en Taller de Mallas para Muros de conexión
Se encuentra pendiente la posibilidad de apoyo aéreo, esto puede generar atrasos por el rendiemiento de Movimientos de Tierra para muros de conexión

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:		**Versión:**		**Fecha de Emisión: 09/11/2022**		**Página:**	
SEMANA N°	19	**DEL**	3 de noviembre de 2022	**AL**	9 de noviembre de 2022		
FECHA INICIO :	1/07/2022	**FECHA TERMINO :**	31/12/2022				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	**NIT O C.C.**	3249514	**CONTRATO N°**	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	**NIT O C.C.**	901.585.221-1	**CONTRATO N°**	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 1

UBICACIÓN: Base Argelia
COMENTARIOS:
Placa Planta Eelectrica PTAP



Fotografia 2

UBICACIÓN: Base Argelia
COMENTARIOS:
Placa Planta Eelectrica PTAP



Fotografia 3

UBICACIÓN: Base Argelia
COMENTARIOS:
Movimienrto de Tierra para Andenes y Recebo para Andenes



Fotografia 4

UBICACIÓN: Base Argelia
COMENTARIOS:
Andenes en Concreto y Refuerzo

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL									
INFORME SEMANAL									
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión: 09/11/2022**			**Página:**	
SEMANA N°	19	**DEL**	3 de noviembre de 2022			**AL**	9 de noviembre de 2022		
FECHA INICIO :	**1/07/2022**		**FECHA TERMINO :**	**31/12/2022**					
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA									
OBJETO DEL CONTRATO	**DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN**								
INTERVENTOR	**NESTOR ROJAS TORREZ**				**NIT O C.C.**	**3249514**	**CONTRATO N°**	**No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS ARGELIA**				**NIT O C.C.**	**901.585.221-1**	**CONTRATO N°**	**163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022**	

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 5

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Andenes en Concreto	



Fotografia 6

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Terminacion de Andenes en Concret0	



Fotografia 7

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Andenes en Concreto	



Fotografia 8

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Estado del Rio en Planta de Agregados	
