FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1	DIA	30	MES	11	AÑO	2022
SEMANA N°	22	DEL	24 de noviembre de 2022	AL	30 de noviembre de 2022	
FECHA INICIO :	1 de julio de 2022	FECHA TERMINO :	31 de diciembre de 2022			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	NIT O C.C.	3.249.514	CONTRATO N°	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	NIT O C.C.	901.585.221-1	CONTRATO N°	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
PRELIMINARES	3,510%	3,510%	EXCAVACIONES REDES HIDROSANITARIAS CON Y SIN RETIRO	
CIMIENTOS	0,19%	0,19%		
PISOS-BASES-RELLENOS	0,19%	0,32%		
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,42%	0,54%		
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	1,98%	2,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,05%	0,05%		
OBRAS EXTERIORES	22,30%	20,46%	CONTINUAN CON PLACAS AEREAS DE PUESTOS DE COMBATE, CONTINUAN CON MUROS DE CONEXIÓN, ANDENES Y CUNETAS	
BM-26 BASES MILITARES	26,25%	23,97%	SE INICIAN CON TRABAJOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURA	
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	3,20%	3,20%	SE CONTINUA CON TRASIEGO DE MATERIALES	
TOTALES	58,09%	54,25%	Semana Anterior	48,99%

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	3.525.659.318,55	1.912.766.643,91	1.612.892.674,64		5,26%	54,25%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	-	INSPECTOR	-
INGENIEROS	1,0	OBREROS	5,0
TOPÓGRAFO	-	AYUDANTES	11,0
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO


	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)				SI NO x

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Página: 1 de 1	DIA	30	MES	11	AÑO	2022

SEMANA N°	22	DEL	24 de noviembre de 2022	AL	30 de noviembre de 2022

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

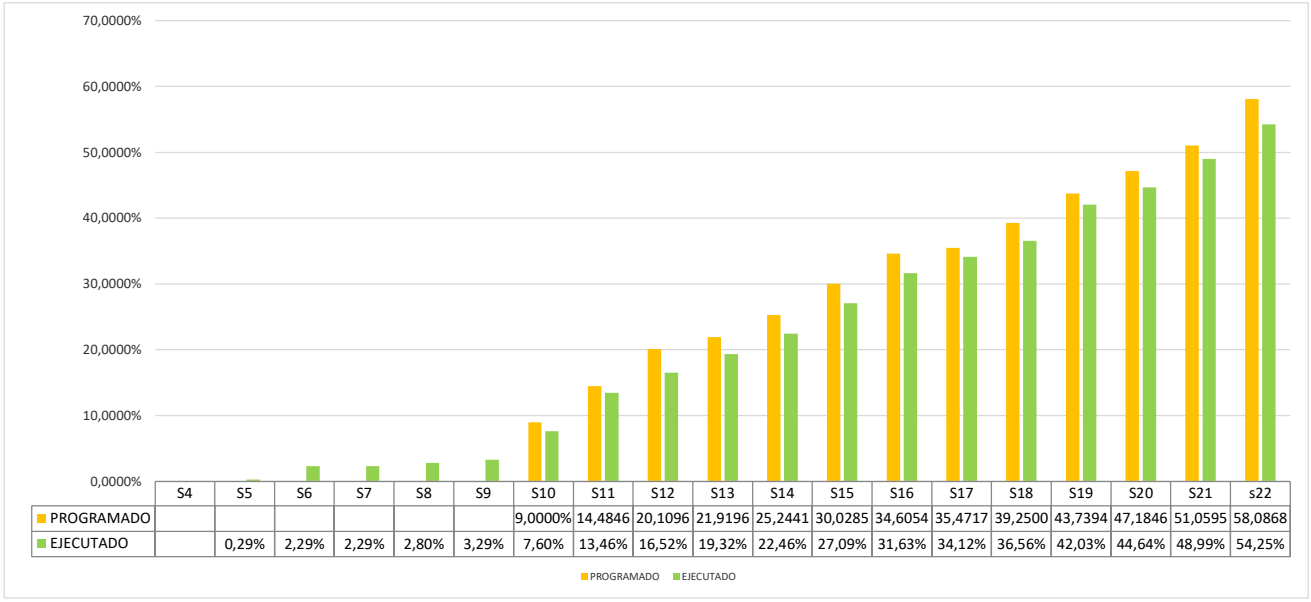

	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	s22
PROGRAMADO							9,0000%	14,4846	20,1096	21,9196	25,2441	30,0285	34,6054	35,4717	39,2500	43,7394	47,1846	51,0595	58,0868
EJECUTADO		0,29%	2,29%	2,29%	2,80%	3,29%	7,60%	13,46%	16,52%	19,32%	22,46%	27,09%	31,63%	34,12%	36,56%	42,03%	44,64%	48,99%	54,25%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Esta Semana ingreso vehiculo de carga con materiales para los modulares, cubiertas de Modulares, Mallas para muro de conexión y Equipos de Ornamentacion para inicio de instalacion de Modulares
EL contratista continua con el Trasiego de Materiales a la parte alta de la Montaña.
Ingreso Personal para instalacion de Modulares, con equipos de Ornamentacion y Herramientas de Taller
El contratista Continua con Fundicion de Andenes en concreto
El contratista Continua con cierre de Puestos de combate en Muros de Tierra Armada y Fundicion de Placas Aereas en Metaldeck
El contratista Continua con Muros de conexión en sitio, **REALIZANDO DE MANERA MANUAL MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA ESTE MURO, puede ocasionar problemas de avance mas adelante esta Actividad genera gran despliegue de mano de obra en campo por falta de equipo Mecanico**
Se realizaron durante la Semana Reunion SST, Manejo Ambiental de desechos, Movimientos de Personal Militar dentro de la Base para intervencion de Obra
El Contratista continua con trabajo de taller de Muros de Modulares

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL									
INFORME SEMANAL									
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión: 29/11/2022**			**Página:**	
SEMANA N°	22	**DEL**	24 de noviembre de 2022			**AL**	30 de noviembre de 2022		
FECHA INICIO :	**1/07/2022**		**FECHA TERMINO :**	**31/12/2022**					

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN**				
INTERVENTOR	**NESTOR ROJAS TORREZ**	**NIT O C.C.**	**3249514**	**CONTRATO N°**	**No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022**
CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS ARGELIA**	**NIT O C.C.**	**901.585.221-1**	**CONTRATO N°**	**163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 1

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Andenes en Concreto	




Fotografia 2

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Andenes en Concreto	



Fotografia 3

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Andenes en Concreto	

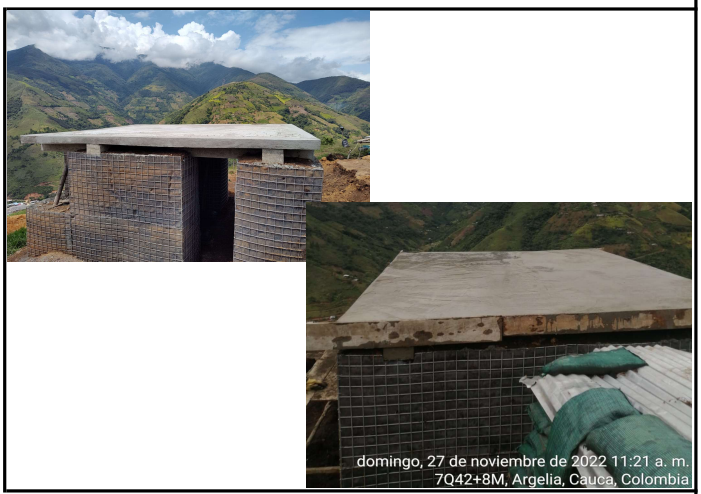

Fotografia 4

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Placas Aereas Puestos de Combate	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL									
								INFORME SEMANAL	
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión: 29/11/2022**			**Página:**	
SEMANA N°	22	**DEL**	24 de noviembre de 2022			**AL**	30 de noviembre de 2022		
FECHA INICIO :	1/07/2022		**FECHA TERMINO :**	31/12/2022					

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCION BASE MILITAR ARGELIA CON INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN SISTEMA MODULAR (ALOJAMIENTOS, BATERIAS DE BAÑO, COMANDO Y COMUNICACIONES, RANCHO DE TROPA, ENFERMERIA, DEPOSITOS DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO), FORTIFICADA CON MUROS DE CONEXIÓN, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y REDES HIDROSANITARIAS A TRAVES DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PTAP Y PTAR, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y FORTIFICACION PERIMETRAL QUE CONSTA DE POSICIONES DE COMBATE CONECTADAS ENTRE SI POR MUROS DE CONEXIÓN				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORREZ	**NIT O C.C.**	3249514	**CONTRATO N°**	No 164-COADE-DICRE CENACINGENIEROS-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARGELIA	**NIT O C.C.**	901.585.221-1	**CONTRATO N°**	163-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 5

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Muros en Malla y Agregado Compactado	



Fotografia 6

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Muros en Malla y Agregado Compactado	



Fotografia 7

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Muros en Malla y Agregado Compactado	



Fotografia 8

UBICACIÓN:	Base Argelia
COMENTARIOS:	
Muros en Malla y Agregado Compactado	
