Buenaventura, Valle del Cauca – 13 de octubre del 2022


Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL "BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
ATT. Capitán de Fragata CARLOS ALBERTO DEL RÍO SANDOVAL
Comandante base naval ARC "Málaga"
E.S.D.

ASUNTO: Días de atraso en la ejecución del **CONTRATO No. 074-ARC-CBNL02-2022:** Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la armada nacional lote 1 y lote 3 en la fuerza naval del pacifico a precios unitarios fijos y sin formula de reajuste, de conformidad con las cantidades y características técnicas descritas en el contrato y la oferta del contratista.

Me permito informar que al día 29 de septiembre de 2022, el contratista CONSORCIO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 2022, llevaba un atraso del **31,31%,** y a hoy, 13 de octubre de 2022, subsanó un **4.23%** de las actividades que llevaba atrasadas a fecha de corte 29 de septiembre de 2022. Este porcentaje de subsanación pertenece a las actividades realizadas hasta día 13 de octubre a las 08:00 am: preliminares de punta soldado **0,16%,** actividades en el BFIM 24 **0.59%,** actividades de la cocina del piñal ejecutadas **1.36%** y descontando el monto lo que no se ejecuta del piñal ($45.376.892,87) que equivaldrían a un **2,12%,** dando así el porcentaje del **4.23%** antes mencionado.

Siendo así, al atraso del 31.31% de fecha 29 de septiembre de 2022, se le descuenta el porcentaje subsanado a fecha 13 de octubre de 2022 del **4.23%**, quedando un porcentaje de atraso del **27,08%, que equivale a $579.858.582,83 sobre el valor total del contrato y nueve (9) días de atraso.**

FECHAS	Porcentaje Acumulado Ejecutado	Porcentaje Acumulado Programado
5/09/2022	0,26%	0,14%
6/09/2022	0,52%	0,29%
7/09/2022	0,79%	0,43%
8/09/2022	1,05%	0,58%
9/09/2022	1,31%	0,72%
10/09/2022	1,57%	0,87%
11/09/2022	1,83%	1,01%
12/09/2022	2,61%	2,05%
13/09/2022	3,39%	3,08%
14/09/2022	4,17%	4,12%
15/09/2022	4,95%	5,15%
16/09/2022	5,73%	6,19%
17/09/2022	6,51%	7,22%
18/09/2022	7,29%	8,25%
19/09/2022	11,29%	11,29%
20/09/2022	11,52%	14,33%
21/09/2022		17,37%
22/09/2022		20,41%
23/09/2022		23,44%
24/09/2022		26,48%
25/09/2022		29,52%
26/09/2022		30,82%
27/09/2022		32,12%
28/09/2022		33,41%
29/09/2022		34,71%

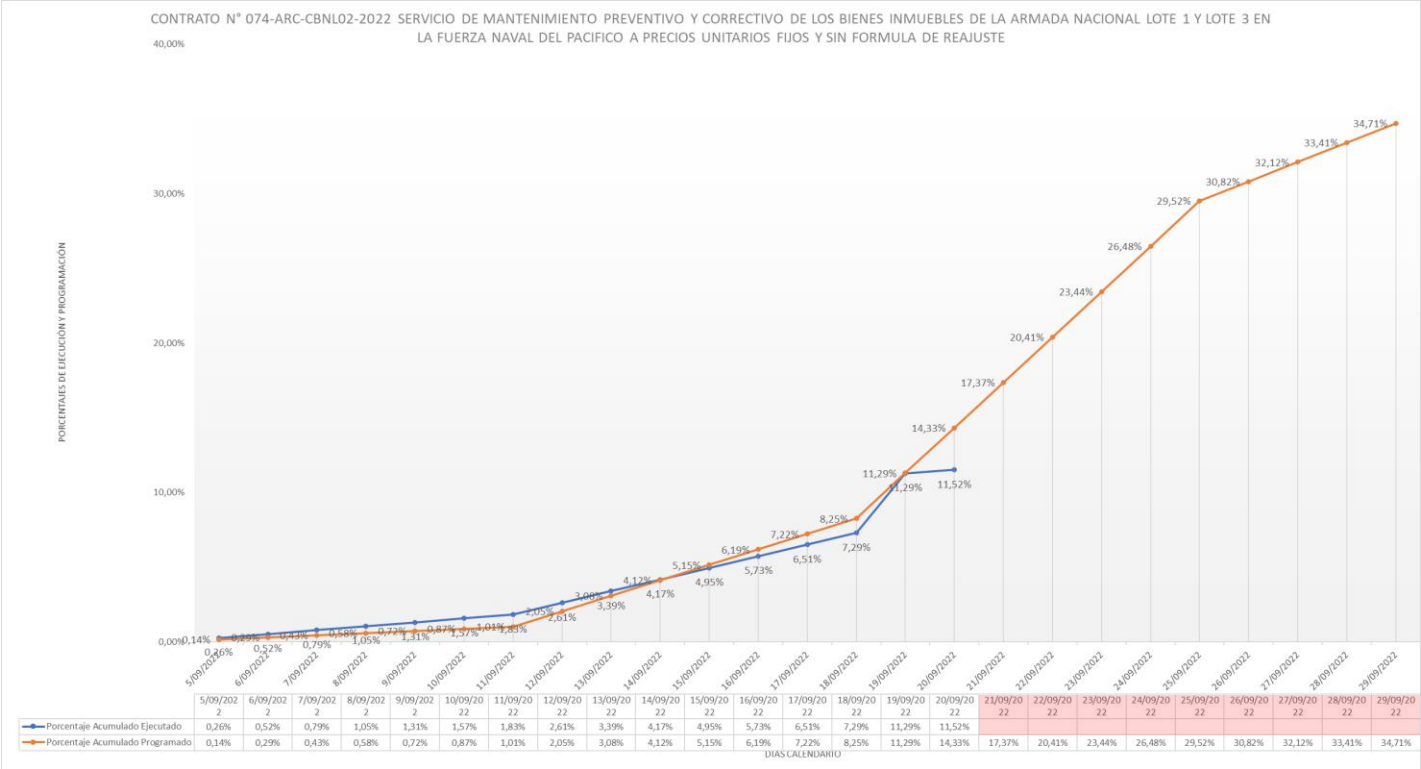

	5/09/2022	6/09/2022	7/09/2022	8/09/2022	9/09/2022	10/09/2022	11/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	17/09/2022	18/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	24/09/2022	25/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
Porcentaje Acumulado Ejecutado	0,26%	0,52%	0,79%	1,05%	1,31%	1,57%	1,83%	2,61%	3,39%	4,17%	4,95%	5,73%	6,51%	7,29%	11,29%	11,52%									
Porcentaje Acumulado Programado	0,14%	0,29%	0,43%	0,58%	0,72%	0,87%	1,01%	2,05%	3,08%	4,12%	5,15%	6,19%	7,22%	8,25%	11,29%	14,33%	17,37%	20,41%	23,44%	26,48%	29,52%	30,82%	32,12%	33,41%	34,71%

Atentamente;

ENDER LEAL RODRIGUEZ
INTERVENTORÍA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 INTERVENTORÍA

C.C MY Pedro Espitia Gómez
C.C TK Henry Remberto Escobar Blanco
C.C MY Harold Moreno Valderrama
