LOTE 1 - 2022											Total general
Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	
$ -	$ -	$ -		$ 304.639.574,22	$ 123.400.636,56	$ 70.335.824,70	$ 119.598.346,52	$ 197.967.202,53	$ 80.561.772,79	$ 1.765.224,47	$ 898.268.581,79
$ -	$ -	$ -	$ -	33,91%	13,74%	7,83%	13,31%	22,04%	8,97%	0,20%	100%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 304.639.574,22	$ 428.040.210,78	$ 498.376.035,48	$ 617.974.382,00	$ 815.941.584,53	$ 896.503.357,32	$ 898.268.581,79	$ 898.268.581,79
$ -	$ -	$ -	$ -	33,91%	47,65%	55,48%	68,80%	90,83%	99,80%	100,00%	100%

LOTE 3 - 2022											Total general
Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	
$ 16.961.249,07	$ 121.507.210,61	$ 356.718.614,28	$ 152.322.365,25	$ 36.768.106,75	$ 94.862.130,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 779.139.676,30
2%	16%	46%	20%	5%	12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
$ 16.961.249,07	$ 138.468.459,68	$ 495.187.073,96	$ 647.509.439,21	$ 684.277.545,96	$ 779.139.676,30	$ 779.139.676,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 779.139.676,30
2%	18%	64%	83%	88%	100%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%


LOTE 1 Y LOTE 3 - 2022											Total general
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
$ 16.961.249,07	$ 121.507.211	$ 356.718.614	$ 152.322.365	$ 341.407.681	$ 218.262.767	$ 70.335.825	$ 119.598.347	$ 197.967.203	$ 80.561.773	$ 1.765.224	$ 1.677.408.258
$ 16.961.249,07	$ 138.468.460	$ 495.187.074	$ 647.509.439	$ 988.917.120	$ 1.207.179.887	$ 1.277.515.712	$ 617.974.382	$ 815.941.585	$ 896.503.357	$ 898.268.582	$ 1.677.408.258

LOTE 1			
FRENTE	INICIO/FIN	C. Directos lote 1	C. Total lote 1
GRUPA	03/10/22 AL 12/11/22	$ 158.327.073,49	$ 202.579.490,53
GIM. Y AGUA POTABLE	03/10/22 AL 10/11/22	$ 147.920.936,32	$ 189.264.838,03
C. RECLUSION MILITAR	03/10/22 AL 01/11/22	$ 60.815.440,53	$ 78.218.792,43
BIM 21- CÍA SEGURIDAD	03/10/22 AL 12/11/22	$ 187.899.089,56	$ 240.416.885,09
COMEDOR BIM 23	17/10/22 AL 15/11/22	$ 302.628.098,44	$ 387.212.651,95
BACAI 2- EDIF. LA PROA	03/10/22 AL 14/11/22	$ 40.677.943,37	$ 52.047.428,54
		$ 898.268.581,71	**$ 1.149.740.086,57**

LOTE 3			
FRENTE	INICIO/FIN	C. Directos lote 3	C. Total lote 3
PAIM P. SOLDADO	26/09/22 AL 15/10/22	$ 64.906.761,00	$ 83.048.200,69
ALOJ. BFIM 24	12/09/22 AL 15/10/22	$ 607.860.424,72	$ 771.678.809,18
ECOCINA EL PIÑAL	05/09/22 AL 26/09/22	$ 106.372.490,51	$ 136.812.751,54
		$ 779.139.676,23	**$ 991.539.761,41**

C. Directos	C. Total
$ 1.677.408.257,94	$ 2.141.279.847,98

TIEMPO	PROGRAMADO				EJECUCION				DIFERENCIA	DIFERENCIA
	SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO			
Semana	PESOS	PORCENTUAL	PESOS	PORCENTUAL	PESOS	PORCENTUAL	ACUMULADA	PORCENTUAL	PESOS	PORCENTAJE
1- 05/09 al 11/09- 2022	$ 16.961.249,07	1,01%	$ 16.961.249,07	1,01%	$ 30.754.289,59	1,83%	$ 30.754.289,59	1,83%	-$ 13.793.040,52	-0,82%
2- 12/09 al 18/09- 2022	$ 121.507.210,61	7,24%	$ 138.468.459,68	8,25%	$ 52.756.333,15	3,15%	$ 83.510.622,74	4,98%	$ 54.957.836,94	3,28%
3- 19 al 25 de Sep 2022	$ 356.718.614,28	21,27%	$ 495.187.073,96	29,52%	$ 13.863.455,00	0,83%	$ 97.374.077,74	5,81%	$ 397.812.996,22	23,72%
4- 26/09 al 02/10- 2022	$ 152.322.365,25	9,08%	$ 647.509.439,21	38,60%	$ 24.967.140,44	1,49%	$ 122.341.218,18	7,29%	$ 525.168.221,03	31,31%
5- 03/10 al 09/10- 2022	$ 341.407.680,97	20,35%	$ 988.917.120,18	58,96%	$ 32.991.564,68	1,97%	$ 155.332.782,86	9,26%	$ 833.584.337,32	49,69%
6- 10/10 al 16/10- 2022	$ 218.262.766,90	13,01%	$ 1.207.179.887,08	71,97%	$ 15.171.856,27	0,90%	$ 170.504.639,13	10,16%	$ 1.036.675.247,95	61,80%
7- 17/10 al 23/10- 2022	$ 70.335.824,70	4,19%	$ 1.277.515.711,78	76,16%	$ 1.749.002,88	0,10%	$ 172.253.642,01	10,27%	$ 1.105.262.069,77	65,89%
8- 24/10 al 30/10- 2022	$ 119.598.346,52	7,13%	$ 1.397.114.058,30	83,29%	$ 414.776,74	0,02%	$ 172.668.418,75	10,29%	$ 1.224.445.639,55	**73,00%**
9- 31/10 al 06/11- 2022	$ 197.967.202,53	11,80%	$ 1.595.081.260,83	95,09%		0,00%		0,00%		
10- 07/10 al 13/11- 2022	$ 80.561.772,79	4,80%	$ 1.675.643.033,62	99,89%		0,00%		0,00%		
11- 14/11 al 15/11- 2022	$ 1.765.224,47	0,11%	$ 1.677.408.258,09	100,00%		0,00%		0,00%		

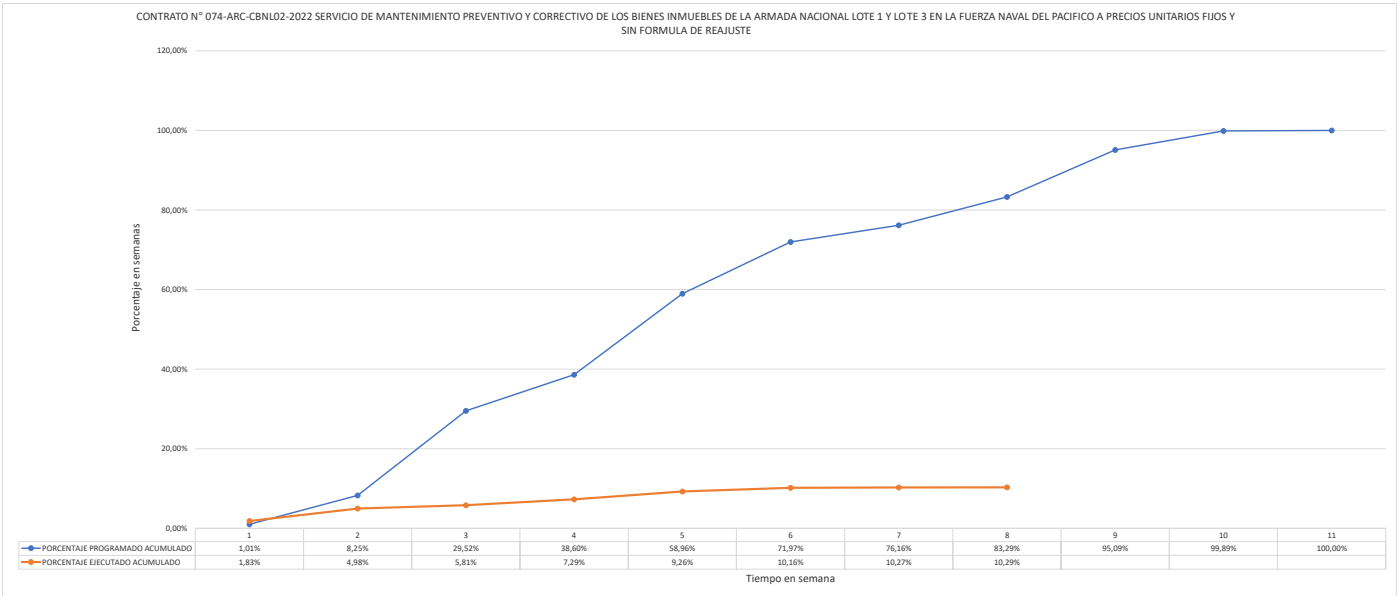

FRENTE	CUANTIA EN COSTOS TOTALES	% EQUIVALENTE SOBRE TOTAL	% DE EJECUCIÓN SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	COSTOS ACUMULADOS EN EJECUCIÓN
LOTE 1				
ALOJAMIENTO GRUPA	$ 202.579.490,53	9,46%	0,43%	$ 9.278.412,75
GIM. Y AGUA POTABLE	$ 189.264.838,03	8,84%	0,00%	$ -
C. RECLUSION MILITAR	$ 78.218.792,43	3,65%	0,00%	$ -
BIM 21- CÍA SEGURIDAD	$ 240.416.885,09	11,23%	0,04%	$ 795.934,05
COMEDOR BIM 23	$ 387.212.651,95	18,08%	0,00%	$ -
BACAI 2- EDIF. LA PROA	$ 52.047.428,54	2,43%	0,00%	$ -
LOTE 3				
COCINA PUNTA SOLDADO	$ 83.048.200,69	3,88%	0,33%	$ 6.985.285,64
ALOJAMIENTO BFIM 24	$ 771.678.809,18	36,04%	5,27%	$ 112.765.346,08
COCINA EL PIÑAL	$ 136.812.751,54	6,39%	4,24%	$ 90.686.056,07
TOTALES	**$ 2.141.279.847,98**	**100%**	**10,30%**	**$ 220.511.034,59**
