FAC-S-2022-007285-CP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 14 de noviembre de 2022
CONTRATO N°	013-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/05/2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM-6.
FORMA DE PAGO	

No. DE PAGOS	VIGENCIA	VALOR	PAC
1	2022	SEGÚN FACTURACION	PAC DEL TERCER BIMESTRE DE 2022
2		SEGÚN FACTURACION	PAC DEL CUARTO BIMESTRE DE 2022
3		SEGÚN FACTURACION	PAC DEL SEXTO BIMESTRE DE 2022

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

La forma de pago establecida no será obstáculo, para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegara a existir disponibilidad de recursos en el PAC del MINISTERIO y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia del año 2022.

CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. LAURA PEREZ BENJUMEA -SUPERVISOR PRINCIPAL TP. JUAN CARLOS HERNANDEZ BURGOS -SUPERVISOR SUPLENTE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	685.299.217,43
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de octubre 2022
FECHA DE INICIO	15 de junio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de octubre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM-6.
MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente el anexo al clausulado; clausula 4 "obligaciones particulares del contratista", ítem 4.19 factor técnico ponderable – documentos del contrato publicados en la plataforma SECOP II. - El ítem de mejora quedará estipulado de la siguiente manera:

DESCRIPCION ITEM ADICIONAL	MEJORA
La Entidad asignará un puntaje hasta por treinta (30) puntos al mejoramiento del CAPITULO 14,0 CARPINTERIA EN ALUMINIO que incluye instalación y suministro de ventaneria y puertas en aluminio.	Suministrar e instalar puertas y ventanas en aluminio color bronce doble hoja para los frentes VIVIENDA DE SUBOFICALES, VIVIENDA DE CIVILES, BARRACA DE SUBOFICIALES Y BARRACA DE OFICIALES.
La Entidad asignará un puntaje hasta por quince (15) puntos al mejoramiento del item 12,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES.	Suministrar e instalar closet en madera con bisagra parche cierre lento clip-on y brazo Bonuit Air en frentes VIVIENDA DE SUBOFICALES, VIVIENDA DE CIVILES, BARRACA DE SUBOFICIALES Y BARRACA DE OFICIALES

PLAZO DE ENTREGA	31 de octubre de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$685.299.217,43

En Tres Esquinas-Caquetá, el día 14 del mes de noviembre de 2022, se reunieron el

señor Teniente Coronel Juan Manuel Navia López en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, la señorita Subteniente Laura Pérez Benjumea calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Camilo Eduardo Marsiglia Niño en su calidad de Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

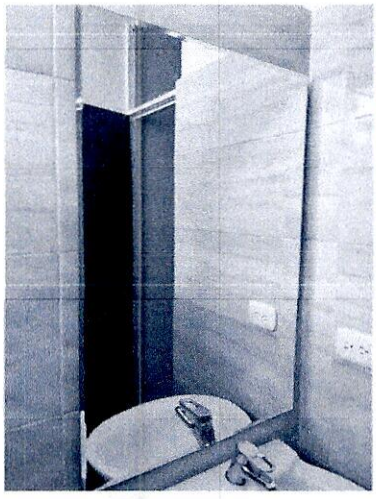
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

Al presente documento se anexa el corte de obra y sus respectivos formatos de memorias corte de obra para el frente vivienda de civiles, barraca de suboficiales y alojamiento radar.

A continuación, se evidencias las actividades más presentativas:

ACTIVIDADES VIVIENDAS SUBOFICIALES



Instalación de espejos



División de baño en acrílico

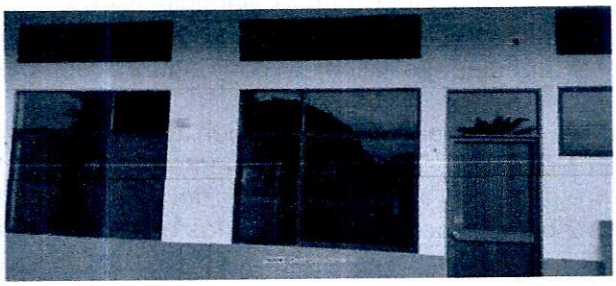


Instalación de puertas

BARRACA DE SUBOFICIALES



Aplicación de estuco y pintura



Mantenimiento de ventanas corredizas

BARRACA DE OFICIALES

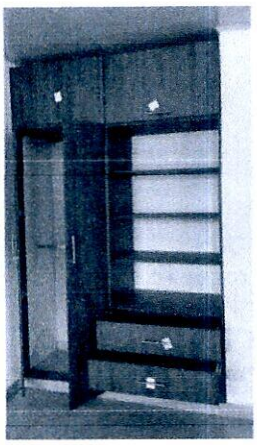




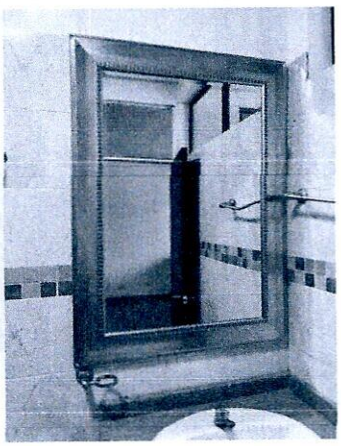
Aplicación de estuco y pintura interior y exterior



Instalación de puertas para baño



Instalación de closet



Instalación de espejos

VIVIENDA DE CIVILES



Instalación de espejos

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Carlos Eduardo Botero	DIRECTOR DE OBRA	25202-41734

Jiménez		
Milton Andrés Orobio Mosquera	RESIDENTE DE OBRA	A43632019-1111767276
Carlos Eduardo Marciglia Fernández	SISO	25- 0856 de 2021
Marroquin Ducara Anderson	AYUDANTE	N/A
Lopez Marulanda Jorge Ricardo	MAESTRO DE OBRA	N/A
Ramirez Silva Serafin	MAESTRO DE OBRA	N/A
Luis Salazar	MAESTRO DE OBRA	N/A
Melenje Pizo Humberto	AYUDANTE	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El aumento de la vida útil de los bienes inmuebles según las actividades realizadas hasta la fecha se relaciona a continuación:

NOMBRE DEL INMUEBLE	VALOR
BI-57) CASA FISCAL SUBOFICIALES CACOM6	$ 2.230.061,88
ALOJAMIENTO OFICIALES SOLTEROS NO/4	$ 46.785.167,35
ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS NO/2	$ 874.570,41
(BI-145) CASA FISCAL PERSONAL CIVIL CACOM6	$ 1.427.330,16

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 685.299.217,43	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 685.299.217,43	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 197.936.950.70	FACTURA No. 291
SEGUNDO	$ 376.451.227,91	FACTURA No. 295

PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE		
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	$109.015.751,29	FACTURA No. 302
TOTAL SALDO SIN EJECUTAR	$1.895.287,53	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA.

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No 302	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Camilo Marsiglia Niño
CAMILO EDUARDO MARSIGLIA NIÑO
CONTRATISTA

ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
SUPERVISOR

TC. JUAN MANUEL NAVIA LOPEZ
ORDENADOR DEL GASTO ENCARGADO

TECMON CONSTRUCCIONES SAS

TECMON CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.197.184-0
Kr 13 #27 - 58
Tel: (+57) 3194783416
Bogotá - Colombia
servicioaldiente@tecmon.com.co
http://www.tecmon.com.co/

Factura
No. 302

Señores	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6		
NIT	800.141.638-5	**Teléfono**	(000) 00000
Dirección	Tres esquinas - Caquetá	**Ciudad**	Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 09:45
Expedición	11/11/2022, 09:45
Vencimiento	11/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COSTOS DIRECTOS CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 013-00-I-CACOM- 6-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 Y TECMON CONSTRUCCIONES SAS. VIVIENDA SUBOFICIALES - RUBRO 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16 - CORTE 3	1.00	3,108,057.00	3,108,057.00	0 %	0.00	3,108,057.00
2	COSTOS DIRECTOS CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 013-00-I-CACOM- 6-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 Y TECMON CONSTRUCCIONES SAS. VIVIENDA SUBOFICIALES - RUBRO 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16 - CORTE 3	1.00	1,657,176.10	1,657,176.10	0 %	0.00	1,657,176.10
3	COSTOS DIRECTOS CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 013-00-I-CACOM- 6-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 Y TECMON CONSTRUCCIONES SAS. BARRACA 10 SUBOFICIALES RUBRO: 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16- CORTE 3	1.00	18,002,281.18	18,002,281.18	0 %	0.00	18,002,281.18
4	COSTOS DIRECTOS CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 013-00-I-CACOM- 6-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 Y TECMON CONSTRUCCIONES SAS. BARRACA 10 SUBOFICIALES - RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16 - CORTE 3	1.00	649,899.99	649,899.99	0 %	0.00	649,899.99
5	COSTOS DIRECTOS CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 013-00-I-CACOM- 6-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 Y TECMON CONSTRUCCIONES SAS. BARRACA 4 DE OFICIALES RUBRO: 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16 - CORTE 3	1.00	21,610,695.64	21,610,695.64	0 %	0.00	21,610,695.64
6	COSTOS DIRECTOS CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 013-00-I-CACOM- 6-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 Y TECMON CONSTRUCCIONES SAS. BARRACA 4 DE OFICIALES RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16 - RECURSO 16 - CORTE 3	1.00	32,057,753.00	32,057,753.00	0 %	0.00	32,057,753.00
7	COSTOS DIRECTOS CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 013-00-I-CACOM- 6-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 Y TECMON CONSTRUCCIONES SAS. VIVIENDA CIVILES RUBRO: 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16 - CORTE 3	1.00	155,254.72	155,254.72	0 %	0.00	155,254.72
8	COSTOS DIRECTOS CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 013-00-I-CACOM- 6-GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 Y TECMON CONSTRUCCIONES SAS. VIVIENDA CIVILES RUBRO 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16 - CORTE 3	1.00	1,060,660.00	1,060,660.00	0 %	0.00	1,060,660.00
	COSTOS DIRECTOS CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 013-00-I-CACOM- 6-						

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Ítem	CONSTRUCCIONES SAS. BARRACA 4 OFICIALES RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 10 - PORTE 3 Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
10	ADMINISTRACION (27%)	1.00	21,872,819.24	21,872,819.24	0 %	0.00	21,872,819.24
11	IMPREVISTOS (4%)	1.00	3,240,417.66	3,240,417.66	0 %	0.00	3,240,417.66
12	UTILIDAD (3%)	1.00	2,430,313.24	2,430,313.24	19 %	461,759.52	2,892,072.76

Total items: 12

Total Bruto	108,553,991.77
IVA 19%	461,759.52
Total a Pagar	**109,015,751.29**

Valor en Letras:
Ciento nueve millones quince mil setecientos cincuenta y un pesos m/cte con veintinueve cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 109,015,751.29

Observaciones:
#$15-01-05-008;ContratoNo.013-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022;laura.perezb@fac.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764033123621 aprobado en 20220809 prefijo desde el número 292 al 400 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6,9

CUFE 32dc0938b63d58710286c076a36a4c03f2c63b014c04b0f96cfbbc7c4467fb6f367ef3a9e34de872e058f5372490b371

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 TRES ESQUINAS-CAQUETA
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
Ordenador del Gasto (encargado)	TC. JUAN MANUEL NAVIA LOPEZ
No. Contrato	013-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022
Objeto del contrato	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6
Valor del contrato	$ 685.299.217,43
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 685.299.217,43

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
											TOTAL VIGENCIA 2018		$ 0,00
											TOTAL VIGENCIA 2019		$ 0,00
											TOTAL VIGENCIA 2020		$ 0,00
											TOTAL VIGENCIA 2021		
											TOTAL VIGENCIA 2022		$ 0,00
02	01	01	001	001	07				10		ADA-Servicios generales de construccion de edificaciones residenciales	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 20.589.282,15
02	01	01	001	001	07				16		ADA-Servicios generales de construccion de edificaciones residenciales	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 367.899.293,14
02	02	02	005	004	01	1			16		ADA-Servicios generales de construccion de edificaciones residenciales	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 232.218.295,89
02	02	02	005	004	01	1			10		ADA-Servicios generales de construccion de edificaciones residenciales	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS RADAR	$ 64.592.346,25
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 685.299.217,43
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO		1ER CORTE PARCIAL PAC AGOSTO	02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 197.936.950,70	$ 67.902.304,20	$ 154.315.991,69
				02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6		$ 130.034.646,50	$ 237.864.646,64
TOTALES						$ 197.936.950,70	$ 197.936.950,70	$ 487.362.266,73
2	OCTUBRE		2DO CORTE PARCIAL PAC OCTUBRE	02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 376.451.227,91	$ 105.142.477,64	$ 59.173.514,050
				02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6		$ 190.192.565,97	$ 47.672.080,67
				02 01 01 001 001 07 - RECURSO 10	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6		$ 16.523.838,05	$ 4.065.444,10
				02 02 02 005 004 01 1 - RECURSO 10	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS RADAR		$ 64.592.346,25	$ 0,00
TOTALES						$ 376.451.227,91	$ 376.451.227,91	$ 110.911.038,82
3	NOVIEMBRE		3ER CORTE TOTAL PAC NOVIEMBRE	02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 110.490.643,87	$ 57.698.621,47	$ 1.474.892,58
				02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6		$ 47.672.080,67	$ 0,00
				02 01 01 001 001 07 - RECURSO 10	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6		$ 3.645.049,14	$ 420.394,96
				02 02 02 005 004 01 1 - RECURSO 10	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS RADAR		$ 0,00	$ 0,00
TOTALES						$ 110.490.643,87	$ 109.015.751,28	$ 1.895.287,54

FIRMA (Supervisor del Contrato)	JPB
POSTFIRMA	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
FECHA	14/11/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	JPB
POSTFIRMA	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
FECHA	14/11/2022

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 TRES ESQUINAS-CAQUETA
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
Ordenador del Gasto (encargado)	TC. JUAN MANUEL NAVIA LOPEZ
No. Contrato	013-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022
Objeto del contrato	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6
Valor del contrato	$ 685.299.217,43
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 685.299.217,43

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 0,00
02	01	01	001	001	07				10		ADA-Servicios generales de construccion de edificaciones residenciales	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 20.589.282,15
02	01	01	001	001	07				16		ADA-Servicios generales de construccion de edificaciones residenciales	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 367.899.293,14
02	02	02	005	004	01	1			16		ADA-Servicios generales de construccion de edificaciones residenciales	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 232.218.295,89
02	02	02	005	004	01	1			10		ADA-Servicios generales de construccion de edificaciones residenciales	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS RADAR	$ 64.592.346,25
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 685.299.217,43
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO		1ER CORTE PARCIAL PAC AGOSTO	02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 197.936.950,70	$ 67.902.304,20	$ 164.315.991,69
				02 01 01 001 001 07 RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6		$ 130.034.646,50	$ 237.864.646,64
TOTALES						$ 197.936.950,70	$ 197.936.950,70	$ 487.362.266,73
2	OCTUBRE		2DO CORTE PARCIAL PAC OCTUBRE	02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 376.451.227,91	$ 105.142.477,64	$ 59.173.514,050
				02 01 01 001 001 07 RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6		$ 190.192.565,97	$ 47.672.080,67
				02 01 01 001 001 07 RECURSO 10	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6		$ 16.523.838,05	$ 4.065.444,10
				02 02 02 005 004 01 1 - RECURSO 10	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS RADAR		$ 64.592.346,25	$ 0,00
TOTALES						$ 376.451.227,91	$ 376.451.227,91	$ 110.911.038,82
3	NOVIEMBRE		3ER CORTE TOTAL PAC NOVIEMBRE	02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6	$ 109.015.751,29	$ 57.698.621,48	$ 1.474.892,57
				02 01 01 001 001 07 RECURSO 16	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6		$ 47.672.080,67	$ 0,00
				02 01 01 001 001 07 RECURSO 10	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRACAS DEL CACOM 6		$ 3.645.049,14	$ 420.394,96
				02 02 02 005 004 01 1 - RECURSO 10	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS RADAR		$ 0,00	$ 0,00
TOTALES						$ 109.015.751,29	$ 109.015.751,29	$ 1.895.287,53

FIRMA (Supervisor del Contrato)	JPB
POSTFIRMA	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
FECHA	14/11/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	JPB
POSTFIRMA	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
FECHA	14/11/2022

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA		3
			6/08/2022

CONTRATO No.	013 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA
FECHA DE CORTE	31 de octubre de 2022
CORTE DE OBRA No.	3

OBRA:MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL Y BARRACAS

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL CASA FISCAL SUBOF, BI-57 RECURSO 16 RUBRO: 02 02 02 065 054 01 1- RECURSO 16						OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
						BALANCE			CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1,0	**PRELIMINARES**				$ 10.635.118			$ 10.771.179		$ 10.771.179,16			$ -			$ -			$ -	
1,1	REMOCIÓN (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M2	148,00	$ 7.932,00	$ 1.094.480,00	22,29	162,29	$ 1.271.055	162,29	$ 1.271.055,28	116%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,2	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UND	6,00	28.326,00	$ 169.956,00	-	6,00	$ 169.956	6,00	$ 169.956,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,3	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	220,00	$ 11.010,00	$ 2.312.100,00	10,00	220,00	$ 2.422.200	220,60	$ 2.422.200,00	105%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,4	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA	M2	215,00	$ 24.843,00	$ 5.341.245,00	3,16	218,16	$ 5.419.748	218,15	$ 5.419.748,88	101%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,5	DESMONTE DE FUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UND	2,00	$ 16.268,00	$ 32.536,00		2,00	$ 32.536	2,00	$ 32.536,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,6	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL.	M2	8,00	$ 21.148,00	$ 169.232,00	(1,00)	8,00	$ 169.184	5,00	$ 169.184,00	89%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,7	DESMONTE DE CLOSETS METALICOS O DE MADERA.	UND	3,00	$ 62.953,00	$ 188.859,00	2,00	5,00	$ 314.765	5,00	$ 314.765,00	167%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,8	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS.	UND	6,00	$ 14.977,00	$ 119.816,00		8,00	$ 119.816	6,00	$ 119.816,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,9	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA	ML	10,00	$ 15.228,00	$ 152.280,00	(2,00)	8,00	$ 121.824	5,00	$ 121.824,00	80%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,10	DESMONTE TUBERÍA HIDRAULICA	ML	33,00	$ 15.031,00	$ 497.343,00	(20,00)	13,00	$ 195.403	13,00	$ 195.403,00	39%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,11	DEMOLICION DE PLACAS MACIZAS 0,15	M2	11,00	$ 48.561,00	$ 534.171,00		11,00	$ 534.171	11,00	$ 534.171,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
2,0	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																			
3,0	**CIMENTACIÓN**																			
4,0	**ESTRUCTURAS**				$ 5.290.435			$ 5.161.400		$ 5.161.400			$ -			$ -		-	$ -	
4,3	REFORZAMIENTO DE CERCHAS DE CUBIERTA, MEDIANTE PLATINA DE 1 PULGADA 1/2 x 1/8 CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y SOLDADURA	ML	205,00	$ 25.807	$ 5.290.435	(5,00)	200,00	$ 5.161.400	200,00	$ 5.161.400,00	98%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
5,0	**MAMPOSTERÍA**				1.118.512			223.112		$ 81.400,00			$ 141.712,00			$ -		-	$ -	
5,1	PASA MUROS PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE DEMOLICION Y ACCESORIOS	UND	4,00	35.428	141.712	-	4,00	$ 141.712	-	$ -	0%	4,00	$ 141.712,00	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
5,2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	120,00	8.140	976.800	(110,00)	10,00	81.400	10,00	$ 81.400,00	8%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,0	**REDES HIDROSANITARIAS**				678.530			$ 678.530,00		$ 678.530,00			$ -			$ -		-	$ -	
6,1	REGISTRO DE AGUA (INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	UND	3,00	45.692	137.076		3,00	$ 137.076	3,00	$ 137.076,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,2	VALVULA DE CHEQUE Ø 1"	UND	1,00	83.579	83.579		1,00	$ 83.579	1,00	$ 83.579,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UND	9,00	50.875	457.875	-	9,00	$ 457.875	9,00	$ 457.875,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
7,0	**INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA**				3.783.318			$ 3.783.318,00		$ 3.783.318,00			$ -			$ -		-	$ -	
7,4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UND	18,00	$ 191.951	$ 3.455.118		18,00	$ 3.455.118	18,00	$ 3.455.118,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
7,7	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA LUMINARIA DECORATIVA TIPO LED TORTUGA 12W NW BULKHEAD DE SYLVANIA O SIMILAR QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TEMPERATURA DE COLOR BLANCO NEUTRO 4000K, 720LM, 15W, IP54. (INCLUYE LUMINARIA)	UND	4,00	$ 82.050	$ 328.200		4,00	$ 328.200	4,00	$ 328.200,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%

8,0	**PAÑETES**				**$ 1.816.250**		**-**	**$ 726.500**		**$ 726.500,00**			**$ -**			**$ -**		**-**	**$ -**	
8,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CANTERAS Y DILATACIONES"	M2	50,00	$ 36.325	$ 1.816.250	(30,00)	20,00	$ 726.500	20,00	$ 726.500,00	40%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
9,0	**CIELO RASO**																			
10,0	**BASES, PISOS Y ENCHAPES**			**$ -**	**$ 5.760.097,00**		**-**	**$ 4.590.754,00**		**$ 4.590.754,00**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
10,1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0,04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	133,00	$ 43.309,00	$ 5.760.097,00	(27,00)	106,00	$ 4.590.754	106,00	$ 4.590.754,00	80%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
11,0	**PINTURA**				**$ 10.962.630,50**		**-**	**$ 10.962.630**		**$ 10.962.630,50**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
11,1	ESTUCO Y VINILO ANTIHUMEDAD TIPO-1 A 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	213,38	$ 34.934,00	$ 7.454.260,50	-	213,38	$ 7.454.260	213,38	$ 7.454.260,50	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
11,2	PINTURA EXTERIOR A DOS MANOS TIPO KORAZA DOBLE VOA DE PINTUCO O SIMILAR ADICIONADA CON PLASTIFICANTE EN PROPORCIÓN 4,2 DNZAS POR GALÓN, CON APLICACIÓN PREVIA SOBRE FACHADA DE UNA MANO DE TEXACRYL DE PINTUCO O SIMILAR EN PROPORCIÓN 50% DE PRODUCTO CON 50% DE AGUA.	M2	110,00	$ 32.075,00	$ 3.528.250,00	-	110,00	$ 3.528.250	110,00	$ 3.528.250,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
12,0	**CARPINTERÍA DE MADERA**				**$ 16.455.186,00**			**$ 16.991.901**		**$ -**			**$ 16.072.968,00**			**$ 2.888.533,00**			**$ -**	
12,1	CONSTRUCCIÓN COCINA MUEBLE INFERIOR EN MADERA DE 2.2Vil, INCLUYE MESÓN EN GRANITO, ESTUFA DE 4 PUESTOS, LAVAPLATOS, GRIFERÍA, PUERTAS Y CAJONES, EN MARCO EN PINO QUINTUPLES ENCHAPADA EN HDF, DEMOLICION DE MUEBLE EN MADERA EXISTENTE	UND	1,00	$ 3.443.873,00	$ 3.443.873,00		1,00	$ 3.443.873	-	$ -	0%	1,00	$ 3.443.873,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
12,2	CONSTRUCCIÓN COCINA MUEBLE SUPERIOR EN MADERA MARCO EN PINO QUINTUPLES ENCHAPADA EN HDF INCLUYE CAMPANA RECIRCULADORA DE OLORES Y DEMOLICION DE MUEBLE EN MADERA EXISTENTE	UND	1,00	$ 1.910.797,00	$ 1.910.797,00		1,00	$ 1.910.797	-	$ -	0%	1,00	$ 1.910.797,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
12,3	PUERTA ENTAMBORADA, CON BASTIDORES EN PINO, CARAS EN HDF, MARCO PUERTA EN PINO L3CMX10CMX2,5MX2,9M APROXIMADAMENTE (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS, TOPES Y CERRADURA DE POMO); MEDIDAS APROXIMADAS (0,70 A 0,80X 2,0 A 2,10). ACCESO A LOS BAÑOS Y HABITACIONES.	UND	0,00	$ 501.263,00	$ -	5,00	5,00	$ 2.506.315	-	$ -	-	5,00	$ 2.506.315,00			$ -		-	$ -	
12,4	PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA, CON BASTIDORES EN PINO, CARAS EN HDF, MARCO DE MEDIDAS APROXIMADAS EN PINO L3CMX10CMX2,0MX0,9M (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES. MEDIDAS APROXIMADAS (0,80X2,0) ACCESO A COCINA	UND	1,00	$ 382.218,00	$ 382.218,00	-	1,00	$ 382.218	-	$ -	0%	1,00	$ 382.218,00			$ -		-	$ -	0%
12,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS SEGUN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES.	M2	18,00	$ 595.461,00	$ 10.718.298,00	-	18,00	$ 10.718.298	-	$ -	0%	18,00	$ 10.718.298,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
13,00	**CARPINTERÍA METÁLICA**																			
14,00	**CARPINTERÍA ALUMINIO**																			
15,0	**CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE**																			
16,0	**CUBIERTAS**																			
17,0	**APARATOS Y ACCESORIOS**				**$ 1.677.238,00**			**$ 1.677.238**		**$ 1.677.238,00**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
17,1	COMBO AQUA PRO REDONDO CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN).	UND	2,00	$ 739.716,00	$ 1.479.432,00		2,00	$ 1.479.432	2,00	$ 1.479.432,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
17,2	DUCHA SENCILLA NOGAL REF. CORONA O SIMILAR	UND	2,00	98.903,00	$ 197.806,00		2,00	$ 197.806	2,00	$ 197.806,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
18,00	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 219.524,00**		**-**	**$ 219.524,00**		**$ -**			**$ -**			**$ 219.524,00**		**-**	**$ -**	
18,19	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	2,00	$ 109.762,00	$ 219.524,00		2,00	$ 219.524	-	$ -	0%		$ -	0%	2,00	$ 219.524,00	100%	-	$ -	0%
19,00	**CERRADURAS**																			
20,0	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				**$ 1.369.338,00**		**-**	**$ 1.067.160**		**$ 1.067.160,00**			**$ -**			**$ -**		**-**	**$ -**	
20,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	160,00	$ 8.875,00	$ 1.237.500,00	(30,00)	100,00	$ 1.031.250	100,00	$ 1.031.250,00	80%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
20,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	2,00	$ 65.919,00	$ 131.838,00	(1,00)	1,00	$ 65.919	1,00	$ 65.919,00	50%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
TOTAL COSTO DIRECTO COSTO DE OBRA VIVIENDA SUBOFICIALES - RUBRO: 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 10					**$ 59.786.076,50**			**$ 58.872.755,86**		**$ 39.550.018,66**			**$ 16.214.680,00**			**$ 3.106.057,00**			**$ -**	
ADMINISTRACIÓN			27%		**$ 16.142.240,65**		27%	$ 15.895.644,03	27%	$ 10.678.505,04			$ 4.377.963,60		27%	$ 839.175,39		27%	$ -	
IMPREVISTOS			4%		**$ 2.391.443,06**		4%	$ 2.354.910,23	4%	$ 1.582.000,75			$ 648.587,20		4%	$ 124.322,28		4%	$ -	
UTILIDADES			3%		**$ 1.793.582,29**		3%	$ 1.766.182,67	3%	$ 1.186.500,56			$ 486.440,40		3%	$ 93.241,71		3%	$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		**$ 340.780,64**		19%	$ 335.574,71	19%	$ 225.435,11			$ 92.423,68		19%	$ 17.715,82		19%	$ -	
TOTAL OBRA CONTRACTUAL					**$ 80.454.123,14**		**SUBTOTAL 1**	**$ 79.225.067,29**	**SUBTOTAL 2**	**$ 53.222.460,11**	151%	**SUBTOTAL 3**	**$ 21.820.094,88**	369%	**SUBTOTAL 4**	**$ 4.182.912,30**	5%	**SUBTOTAL 5**	**$ -**	0%
							SALDO	**$ 1.229.055,85**												

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL CASA FISCAL SUBOF, BI-57 RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 15						OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE			CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
						MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1,0	PRELIMINARES																			
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
3,0	CIMENTACIÓN																			
4,0	ESTRUCTURAS				$ 2.053.788			$ 5.422.000,32		$ 5.421.699			$ -			$ 301		$ -	$ -	
4,2	CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000PSI E=0,10M, INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLAELECTROSOLDADA	M2	11,00	$ 186.708	$ 2.053.788	18,04	29,04	$ 5.422.000	29,04	$ 5.421.699,02	264%		$ -	0%	0,00	$ 301,30	0%	-	$ -	0%
5,0	MAMPOSTERÍA																			
6,0	REDES HIDROSANITARIAS				3.721.549			$ 3.012.700,00		$ 3.012.700,00			$ -			$ -		$ -	$ -	
6,3	SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" PLÁSTICA	UNO	4,00	44.618	178.472	(2,00)	2,00	$ 89.236	2,00	$ 89.236,00	50%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,4	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	UNO	2,00	51.963	103.926	1,00	3,00	$ 155.889	3,00	$ 155.889,00	150%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,6	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"	ML	9,00	21.507	193.563	-	9,00	$ 193.563	9,00	$ 193.563,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,7	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	ML	13,00	39.041	507.533	-	13,00	$ 507.533	13,00	$ 507.533,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,8	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ML	20,00	55.968	1.119.360	(12,00)	8,00	$ 447.744	8,00	$ 447.744,00	40%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,9	PUNTO SANITARIO Ø 2"	UNO	8,00	50.880	407.040	-	8,00	$ 407.040	8,00	$ 407.040,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,10	PUNTO SANITARIO Ø 4"	UNO	2,00	74.886	149.772		2,00	$ 149.772	2,00	$ 149.772,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,11	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 MTS.	UNO	1,00	629.009	629.009		1,00	$ 629.009	1,00	$ 629.009,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,12	TUBERÍA PVC PRESIÓN, RDE 21 Ø 1-1/2"	ML	2,50	28.022	70.055		2,50	$ 70.055	2,50	$ 70.055,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,13	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1"	ML	3,00	19.127	57.381		3,00	$ 57.381	3,00	$ 57.381,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
6,14	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13,5 Ø 1/2"	ML	10,00	15.971	305.478		10,00	$ 305.478	10,00	$ 305.478,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
7,0	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA				8.598.440			$ 8.598.440,00		$ 8.598.440,00			$ -			$ -		$ -	$ -	
7,1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (RE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	6,00	$ 125.220	$ 751.320		6,00	$ 751.320	6,00	$ 751.320,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
7,2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (RE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	14,00	$ 126.226	$ 1.767.164		14,00	$ 1.767.164	14,00	$ 1.767.164,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
7,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A120V (L-N+H+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (RE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS), RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	12,00	$ 255.668	$ 3.068.016		12,00	$ 3.068.016	12,00	$ 3.068.016,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
7,5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 180P, 70W/120V (RED NORMAL) INCLUYE DUCTO TIPO FLEXIBLE CORAZA METÁLICA 1"X30" Y REJILLA, SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO (RE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS), RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), DUCTERÍA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	2,00	$ 451.444	$ 902.888		2,00	$ 902.888	2,00	$ 902.888,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
7,6	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO A 220V	UND	4,00	$ 72.109	$ 288.436		4,00	$ 288.436	4,00	$ 288.436,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
7,8	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO, ENCHAPABLE DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 931.868	$ 931.868		1,00	$ 931.868	1,00	$ 931.868,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
7,9	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI 15A120V (L-N+H+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (RE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS), RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	4,00	$ 222.187	$ 888.748		4,00	$ 888.748	4,00	$ 888.748,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
8,0	PAÑETES																			
9,0	CIELO RASO				$ 18.962.295		-	$ 18.962.295		$ 18.962.295,00			$ -			$ -		$ -	$ -	
9,1	CIELO RASO PVC INM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN)	M2	205,00	$ 92.499	$ 18.962.295		205,00	$ 18.962.295	205,00	$ 18.962.295,00	100%		$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%

10,0	BASES, PISOS Y ENCHAPES			$ -	$ 17.356.591,00		-	$ 16.711.946,62		$ 16.680.390,82			$ -			$ 31.546,80			$ -	
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA TIPO DEVA CAFÉ CORONA O SIMILAR 33,4X33,8 EN BAÑOS	M2	7,00	$ 80.639,00	$ 564.473,00	1,20	8,20	$ 661.239,80	8,20	$ 661.239,80	117%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBINACIÓN EN PARED CENEFUEGOS BEIGE Y CENEFUEGOS TAUPE PARA BAÑOS H=2.30 TIPO CORONA O SIMILAR.	ML	14,00	$ 94.657,00	$ 1.325.198,00	15,40	29,40	$ 2.782.915,80	29,40	$ 2.782.915,80	210%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO URBAN GRIS TIPO CORONA O SIMILAR DE 60X60	M2	12,00	$ 104.525,00	$ 1.254.300,00	(1,00)	11,00	$ 1.149.775,00	11,00	$ 1.149.775,00	92%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED ALPINO BLANCO PARA COCINA TIPO CORONA O SIMILAR.	ML	13,00	$ 85.884,00	$ 1.116.492,00	(0,62)	12,38	$ 1.063.243,92	12,38	$ 1.063.243,92	95%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
10,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED BASE DECORADO BROKLING PARA COCINA TIPO CORONA O SIMILAR.	ML	6,00	$ 93.676,00	$ 562.056,00	(2,50)	3,50	$ 327.866,00	3,50	$ 327.866,00	58%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
10,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MINDI RECTIFICADO CAFÉ TIPO CORONA O SIMILAR FORMATO 20X60	M2	43,00	$ 112.092,00	$ 4.819.956,00	(9,30)	33,70	$ 3.777.500,40	33,70	$ 3.777.500,40	78%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
10,8	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA TIPO MINDI RECTIFICADO CAFÉ CORONA O SIMILAR H=8CM	ML	36,00	$ 26.289,00	$ 920.115,00	(1,30)	30,70	$ 865.939,30	32,80	$ 864.392,80	93%		$ -	0%	1,20	$ 31.546,80	3%		-	$ -	0%
10,9	INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN FORMATO 60X60 SELLADO COLOR GRIS, KAZTELO O SIMILAR	M2	32,00	$ 86.303,00	$ 2.761.696,00	1,10	33,10	$ 2.856.629,30	33,10	$ 2.856.629,30	103%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
10,10	GUARDAESCOBA COLOR BEIGE KAZTELO O SIMILAR H=8CM	ML	38,00	$ 23.161,00	$ 880.118,00	13,00	51,00	$ 1.181.211,00	51,00	$ 1.181.211,00	134%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
10,11	PISO EXTERIOR SALTILLO CORONA O SIMILAR EN ZONAS EXTERIORES	M2	30,00	$ 79.323,00	$ 2.379.690,00	(8,30)	21,70	$ 1.721.309,10	21,70	$ 1.721.309,10	72%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
10,12	GUARDAESCOBA PISO EXTERIOR SALTILLO CORONA O SIMILAR EN ZONAS EXTERIORES	ML	33,00	$ 23.409,00	$ 772.497,00	(20,00)	13,00	$ 304.317,00	13,00	$ 304.317,00	39%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
11,0	PINTURA																				
12,0	CARPINTERÍA DE MADERA																				
13,00	CARPINTERÍA METÁLICA																				
14,00	CARPINTERÍA ALUMINIO				$ 12.172.124,00			$ 12.172.124		$ -			$ 10.546.796,00			$ 1.625.328,00			$ -	
14,1	VENTANERIA ALUMINIO	M2	20,00	$ 414.055,00	$ 8.281.100,00		20,00	$ 8.281.100	-	$ -	0%	20,00	$ 8.281.100,00	100%		$ -	0%		-	$ -	0%
14,3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	6,00	$ 377.616,00	$ 2.265.696,00		6,00	$ 2.265.696	-	$ -	0%	6,00	$ 2.265.696,00	100%		$ -	0%		-	$ -	0%
14,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES CON MARCO EN ALUMINIO Y LAMINAS EN ACRILICO PARA BAÑOS.	M2	6,00	$ 270.888,00	$ 1.625.328,00		6,00	$ 1.625.328	-	$ -	0%		$ -	0%	6,00	$ 1.625.328,00	100%		-	$ -	0%
15,0	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE																				
16,0	CUBIERTAS				$ 22.804.190,00			$ 23.139.359		$ 23.139.358,56			$ -			$ -			-	$ -	
16,1	TEJA ARQUITECTONICA ACESCO 0,73 X 3,66 MTS COLOR A DEFINIR	M2	215,00	$ 106.066,00	$ 22.804.190,00	3,16	218,16	$ 23.139.359	218,16	$ 23.139.358,56	101%		$ -	0%		$ -	0%		-	$ -	0%
17,0	APARATOS Y ACCESORIOS																				
18,00	VIDRIOS Y ESPEJOS																				
19,00	CERRADURAS																				
20,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																				
	TOTAL COSTO DIRECTO VIVIENDA SUBOFICIALES RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 15				$ 85.869.017,00			$ 86.010.864,50		$ 75.814.892,40			$ 10.546.796,00			$ 1.657.176,16			$ -	
	ADMINISTRACIÓN		27%	$ 23.130.634,59			27%	$ 23.763.093,42	27%	$ 20.470.020,95			$ 2.847.634,92		27%	$ 447.437,55		27%	$ -	
	IMPREVISTOS		4%	$ 3.426.760,68			4%	$ 3.520.754,58	4%	$ 3.032.595,70			$ 421.871,84		4%	$ 66.287,04		4%	$ -	
	UTILIDADES		3%	$ 2.570.070,51			3%	$ 2.640.565,94	3%	$ 2.274.446,77			$ 316.403,88		3%	$ 49.715,28		3%	$ -	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 488.313,40			19%	$ 501.707,53	19%	$ 432.144,85			$ 60.116,74		19%	$ 9.445,90		19%	$ -	
	TOTAL OBRA CONTRACTUAL				$ 115.284.796,18		SUBTOTAL 1	$ 118.446.985,96	SUBTOTAL 2	$ 102.024.100,70	113%	SUBTOTAL 3	$ 14.192.823,38	812%	SUBTOTAL 4	$ 2.230.061,88	2%	SUBTOTAL 5	$ -	0%
							SALDO	$ 3.162.189,78													
	TOTAL COSTO DIRECTO VIVIENDA SUBOFICIALES BI-57				$ 146.456.093,50			$ 146.891.520,16		$ 115.364.911,06			$ 26.781.476,00			$ 4.765.233,10			$ -	
	ADMINISTRACIÓN		27%	$ 39.272.875,24			27%	$ 39.666.737,44	27%	$ 31.148.525,90			$ 7.225.598,52		27%	$ 1.286.612,94		27%	$ -	
	IMPREVISTOS		4%	$ 5.818.203,74			4%	$ 5.875.664,81	4%	$ 4.614.596,44			$ 1.070.459,04		4%	$ 190.609,32		4%	$ -	
	UTILIDADES		3%	$ 4.363.652,80			3%	$ 4.406.748,60	3%	$ 3.460.947,33			$ 802.844,28		3%	$ 142.956,99		3%	$ -	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 829.094,03			19%	$ 837.282,23	19%	$ 657.579,99			$ 152.540,41		19%	$ 27.161,83		19%	$ -	
	TOTAL OBRA CONTRACTUAL				$ 195.738.913,32		SUBTOTAL 1	$ 197.672.053,25	SUBTOTAL 2	$ 155.246.560,81	126%	SUBTOTAL 3	$ 36.012.916,25	544%	SUBTOTAL 4	$ 6.412.574,18	3%	SUBTOTAL 5	$ -	0%
							SALDO	$ 1.933.133,93													

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL BARRACA 18 SUBOFICIALES RUBRO: 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 18			BALANCE			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
									CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT.	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1,0	PRELIMINARES				$ 3.285.728			$ 3.285.728,00					3.285.728,00			-		-	-	
1,3	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	225,00	$ 11.010,00	$ 2.477.250,00		225,00	$ 2.477.250,00		-	-	225,00	$ 2.477.250,00	100%		-	0%	-	-	0%
1,5	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UNO	11,00	$ 16.268,00	$ 178.948,00		11,00	$ 178.948,00		-	-	11,00	$ 178.948,00	100%		-	0%	-	-	0%
1,7	DESMONTE DE CLOSETS METALICOS O DE MADERA.	UNO	10,00	$ 62.953,00	$ 629.530,00		10,00	$ 629.530,00		-	-	10,00	$ 629.530,00	100%		-	0%	-	-	0%
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS									-			-			-		-	-	
3,0	CIMENTACION									-			-			-		-	-	
4,0	ESTRUCTURAS									-			-			-		-	-	
5,0	MAMPOSTERÍA									-			-			-		-	-	
6,0	REDES HIDROSANITARIAS									-			-			-		-	-	
7,0	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, DUCTERIA, TABLEROS, SALIDAS Y AFINES				$ 6.414.930,00			$ 6.579.030,00		-			$ 6.579.030,00			$ -		-	-	
7,4	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE	UNO	30	$ 191.951,00	$ 5.758.530,00		30,00	$ 5.758.530,00		-	-	30,00	$ 5.758.530,00	100%		-	0%	-	-	0%
7,7	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA LUMINARIA DECORATIVA TIPO LED TORTUGA 15W MV BULKHEAD DE SYLVANIA O SIMILAR QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA DE COLOR BLANCO NEUTRO 4000K, 720LM, 10W, IP54. (INCLUYE LUMINARIA)	UNO	8	$ 82.050,00	$ 656.400,00	2,00	10,00	$ 820.500,00		-	-	10,00	$ 820.500,00	125%		-	0%	-	-	0%
8,0	PAÑETES									-			-			-				
9,0	CIELO RASO																			
10,0	BASES, PISOS Y ENCHAPES															-				
11,0	PINTURA				$ 15.796.171,34			$ 22.049.357,34		-			$ 15.796.171,34			$ 6.253.186,00		-	-	
11,1	ESTUCO Y VINILO ANTIHUMEDAD TIPO I A 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	290	$ 34.934,00	$ 10.130.860,00	176,00	466,00	$ 16.384.046,00		-	-	290,00	$ 10.130.860,00	100%	176,00	6.253.186,00	62%	-	-	0%
11,2	PINTURA EXTERIOR A DOS MANOS TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O SIMILAR ADICIONADA CON PLASTIFICANTE EN PROPORCION 4:2 ONZAS POR GALÓN, CON APLICACION PREVIA SOBRE FACHADA DE UNA MANO DE TEXACRYL, DE PINTUCO O SIMILAR EN PROPORCIÓN 50% DE PRODUCTO CON 50% DE AGUA.	M2	176,6210969	$ 32.075,00	$ 5.665.311,34		176,63	$ 5.665.311,34		-	-	176,63	$ 5.665.311,34	100%		-	0%	-	-	0%
12,0	CARPINTERÍA DE MADERA																			
13,0	CARPINTERÍA METÁLICA															-				
14,0	CARPINTERÍA ALUMINIO				$ 7.751.055,00			$ 11.749.095,18					-			11.749.095,18		-	-	
14,6	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO INCLUYE CAMBIOS DE CERROJOS, LUBRICACION DE RIELES, RESPLADO DE VIDRIOS ROTOS Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	65	$ 119.247,00	$ 7.751.055,00	33,53	98,53	$ 11.749.095,18		-	-		$ -	0%	98,53	11.749.095,18	152%	-	-	0%
15,0	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE															-				
16,0	CUBIERTAS				$ 12.121.620,00			$ 12.121.620,00					12.121.620,00			-		-	-	
16,2	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTA	M2	380	$ 31.899,00	$ 12.121.620,00		380	$ 12.121.620,00		-	-	380,00	$ 12.121.620,00	100%		-	0%	-	-	0%
17,0	APARATOS Y ACCESORIOS																			
18,0	VIDRIOS Y ESPEJOS																			
19,0	CERRADURAS																			
20,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				$ 131.838,00			$ 131.838,00					131.838,00							
20,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	2	65919	$ 131.838,00		2	$ 131.838,00		-	-	2,00	$ 131.838,00	1,00		-	0%	-	-	0%

TOTAL COSTO DIRECTO BARRACA 18 SUBOFICIALES RUBRO: 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16			$ 46.501.342,34			$ 55.916.668,52		$ -			$ 37.914.387,34			$ 18.002.281,18			$ -		
ADMINISTRACIÓN		27%	$ 12.295.362,42		27%	$ 15.097.500,50	27%	$ -			$ 10.236.884,92		27%	$ 4.860.615,92		27%	$ -		
IMPREVISTOS		4%	$ 1.820.053,65		4%	$ 2.236.666,74	4%	$ -			$ 1.516.575,40		4%	$ 720.091,21		4%	$ -		
UTILIDADES		3%	$ 1.365.040,23		3%	$ 1.677.500,06	3%	$ -			$ 1.137.431,55		3%	$ 540.068,41		3%	$ -		
IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 259.357,62		19%	$ 318.725,01	19%	$ -			$ 216.112,03		19%	$ 102.613,04		19%	$ -		
TOTAL OBRA CONTRACTUAL			$ 61.231.156,39		SUBTOTAL	$ 75.247.060,83	SUBTOTAL 2	$ -		SUBTOTAL 3	$ 51.021.391,85	120%	SUBTOTAL	$ 24.225.669,78	32,19%	SUBTOTAL 5	$ -	0,0%	
					SALDO	-$ 14.015.904,44													

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL BARRACA 18 SUBOFICIALES RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16						OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE			CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
						MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1,0	PRELIMINARES																			
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS									-			-			-		-	-	
3,0	CIMENTACIÓN									-			-			-		-	-	
4,0	ESTRUCTURAS									-			-			-		-	-	
5,0	MAMPOSTERÍA									-			-			-		-	-	
6,0	REDES HIDROSANITARIAS									-			-			-		-	-	
7,0	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, DUCTERIA, TABLEROS, BALDAS Y AFINES				$ 721.090,00			$ 721.090,00		-			$ 721.090,00			$ -		-	-	
7,6	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO A 220V	UNO	10	$ 72.109,00	$ 721.090,00		10,00	$ 721.090,00	-	-		10,00	$ 721.090,00	100%		-	0%	-	-	0%
8,0	PAÑETES									-			-			-				
9,0	CIELO RASO				$ 20.812.275,00			$ 20.812.275,00		-			$ 20.812.275,00			$ -		-		
9,1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M2	225	$ 92.499,00	$ 20.812.275,00		225,00	$ 20.812.275,00	-	-		225,00	$ 20.812.275,00	100%		-	0%	-	-	0%
10,0	BASES, PISOS Y ENCHAPES															-				
11,0	PINTURA																			
12,0	CARPINTERÍA DE MADERA				$ 51.458.568,00			$ 52.251.702,75		-			52.251.702,75			-		-	-	
12,3	PUERTA ENTAMBORADA, CON BASTIDORES EN PINO, CARAS EN HDF, MARCO PUERTA EN PINO L:0,9MX1,0CMX2MX0,7M APROXIMADAMENTE (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS, TUPES Y CERRADURA DE POMO). MEDIDAS APROXIMADAS (0,70 A 0,80 X 2,0 A 2,10). ACCESO A LOS BAÑOS Y HABITACIONES.	UNO	10	$ 501.263,00	$ 5.012.630,00	(10,00)	0,00	$ -	-	-		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
12,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS SEGUN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES.	M2	78	$ 595.681,00	$ 46.445.958,00	9,75	87,75	$ 52.251.702,75	-	-		87,75	$ 52.251.702,75	113%		-	0%	-	-	0%
13,0	CARPINTERÍA METÁLICA															-				
14,0	CARPINTERÍA ALUMINIO				$ 9.440.400,00			$ 9.440.400,00					$ 9.440.400,00			-		-		
14,3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	25	$ 377.616,00	$ 9.440.400,00		25	$ 9.440.400,00	-	-		25,00	$ 9.440.400,00	100%		-	0%	-	-	0%
15,0	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE															-				
16,0	CUBIERTAS																			
17,0	APARATOS Y ACCESORIOS															-				
18,0	VIDRIOS Y ESPEJOS				$ -			$ 649.899,99					-			649.899,99				
18,1	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	0	$ 109.782,00	$ -	5,92	5,92	$ 649.899,99		-		-	$ -		5,92	649.899,99		-	-	
20,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																			

TOTAL COSTO DIRECTO BARRACA 16 SUBOFICIALES - RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16			$ 82.432.353,00			$ 93.875.367,74		$ -			$ 63.225.467,75			$ 648.899,99			$ -						
ADMINISTRACIÓN		27%	$ 22.256.735,31		27%	$ 22.646.349,29	27%	$ -			$ 22.470.876,29		27%	$ 175.473,00		27%	$ -						
IMPREVISTOS		4%	$ 3.297.294,12		4%	$ 3.355.014,71	4%	$ -			$ 3.329.015,71		4%	$ 25.999,00		4%	$ -						
UTILIDADES		3%	$ 2.472.970,59		3%	$ 2.516.261,03	3%	$ -			$ 2.496.764,03		3%	$ 19.497,00		3%	$ -						
IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 469.864,41		19%	$ 478.089,60	19%	$ -			$ 474.365,17		19%	$ 3.704,43		19%	$ -						
TOTAL OBRA CONTRACTUAL			$ 110.929.217,43		SUBTOTAL	$ 112.871.082,37	SUBTOTAL 2	$ -		SUBTOTAL 3	$ 111.996.511,95	99%	SUBTOTAL	$ 874.570,41	0,77%	SUBTOTAL 5	$ -	0,0%					
					SALDO	-$ 1.941.864,93																	
TOTAL COSTOS DIRECTOS BARRACA 16 SUBOFICIALES			$ 127.933.695,34			$ 139.782.036,26		$ -			$ 121.139.855,09			$ 18.652.181,16			$ -						
ADMINISTRACIÓN		27%	$ 34.542.097,74		27%	$ 37.743.849,79	27%	$ -			$ 32.707.760,88		27%	$ 5.036.088,91		27%	$ -						
IMPREVISTOS		4%	$ 5.117.347,81		4%	$ 5.591.681,45	4%	$ -			$ 4.845.594,20		4%	$ 746.087,25		4%	$ -						
UTILIDADES		3%	$ 3.838.010,86		3%	$ 4.193.761,08	3%	$ -			$ 3.634.195,65		3%	$ 559.565,43		3%	$ -						
IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 728.222,06		19%	$ 796.314,61	19%	$ -			$ 690.497,17		19%	$ 106.317,43		19%	$ -						
TOTAL OBRA CONTRACTUAL			$ 172.160.373,82		SUBTOTAL	$ 188.116.143,19	SUBTOTAL 2	$ -		SUBTOTAL 3	$ 163.017.903,00	100%	SUBTOTAL	$ 25.100.240,19	13,34%	SUBTOTAL 5	$ -	0,0%					
					SALDO	-$ 15.957.769,37																	

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL BARRACA 4 DE OFICIALES RUBRO: 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 15						OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE			CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
						MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1,0	PRELIMINARES				$ 3.917.356,00			$ 3.917.356,00					$ 3.917.356,00			$ -			$ -	
1,3	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	190,00	$ 11.010,00	$ 2.091.900,00		190	$ 2.091.900,00				190,00	$ 2.091.900,00	100%		-	0%	-	-	0%
1,5	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UND	16,00	$ 16.268,00	$ 260.288,00		16	$ 260.288,00				16,00	$ 260.288,00	100%		-	0%	-	-	0%
1,6	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL.	M2	2,00	$ 21.148,00	$ 42.296,00		2	$ 42.296,00				2,00	$ 42.296,00	100%		-	0%	-	-	0%
1,7	DESMONTE DE CLOSETS METALICOS O DE MADERA.	UND	8,00	$ 62.953,00	$ 503.624,00		8	$ 503.624,00				8,00	$ 503.624,00	100%		-	0%	-	-	0%
1,12	DESINSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO	UND	8,00	$ 14.906,00	$ 119.248,00		8	$ 119.248,00				8,00	$ 119.248,00	100%		-	0%	-	-	0%
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS							$ -								-		-	-	
3,0	CIMENTACIÓN							$ -								-		-	-	
4,0	ESTRUCTURAS							$ -								-		-	-	
5,0	MAMPOSTERÍA							$ -								-		-	-	
6,0	REDES HIDROSANITARIAS							$ -								-		-	-	
7,0	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, DUCTERIA, TABLEROS, SALIDAS Y AFINES				$ 5.263.224,00			$ 4.167.220,00					-			4.167.220,00		-	-	
7,4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W. INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UND	24,00	$ 191.951,00	$ 4.606.824,00	(4,00)	29	$ 3.839.020,00					$ -	0%	29,00	3.839.020,00	83%	-	-	0%
7,7	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA LUMINARIA DECORATIVA TIPO LED TORTUGA 10W N/W BULKHEAD DE SYLVANIA O SIMILAR QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TEMPERATURA DE COLOR BLANCO NEUTRO 4000K, 720LM, 10W, IP54. (INCLUYE LUMINARIA)	UND	8,00	$ 82.050,00	$ 656.400,00	(4,00)	4	$ 328.200,00					$ -	0%	4,00	328.200,00	50%	-	-	0%
8,0	PAÑETES																			
9,0	CIELO RASO																			
10,0	BASES, PISOS Y ENCHAPES							$ -								-		-	-	
11,0	PINTURA				$ 17.311.637,64			$ 17.311.637,64					-			17.311.637,64		-	-	
11,1	ESTUCO Y VINILO ANTIHUMEDAD TIPO 1A 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	300,00	$ 34.854,00	$ 10.460.200,00		300	$ 10.460.200,00					$ -	0%	300,00	10.460.200,00	100%	-	-	0%
11,2	PINTURA EXTERIOR A DOS MANOS TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O SIMILAR ADICIONADA CON PLASTIFICANTE EN PROPORCIÓN 4:2 DNZAS	M2	212,96	32.075,00	6.831.437,64		213	6.831.437,64					$ -	0%	212,96	6.831.437,64	100%	-	-	0%
12,0	CARPINTERÍA DE MADERA																			
13,0	CARPINTERÍA METÁLICA							$ -								-		-	-	
14,0	CARPINTERÍA ALUMINIO																			
15,0	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE							-								-		-	-	
16,0	CUBIERTAS							-								-		-	-	
17,0	APARATOS Y ACCESORIOS							-								-		-	-	
18,0	VIDRIOS Y ESPEJOS							-								-		-	-	

19,0	CERRADURAS									-								-					
20,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				$ 131.838,00			$ 131.838,00										131.838			-	$	-
20,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	2,00	$ 65.919,00	$ 131.838,00		2	$ 131.838,00						$ -	0%	2,00	131.838,00	100%	-		$ -	0%
TOTAL COSTO DIRECTO BARRACA 4 DE OFICIALES RUBRO: 02 02 02 008 004 01 1- RECURSO 16					$ 25.724.055,64			$ 24.628.851,84		$ -				$ 3.017.356,00			$ 21.810.895,84			$ -		
ADMINISTRACIÓN		27%			$ 6.945.495,02		27%	$ 6.649.673,94	27%	$ -				$ 814.686,12		27%	$ 5.834.887,82		27%	$ -		
IMPREVISTOS		4%			$ 1.028.962,23		4%	$ 985.122,07	4%	$ -				$ 120.694,24		4%	$ 864.427,83		4%	$ -		
UTILIDADES		3%			$ 771.721,67		3%	$ 738.841,55	3%	$ -				$ 90.520,68		3%	$ 648.320,87		3%	$ -		
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			$ 146.627,12		19%	$ 140.379,85	19%	$ -				$ 17.198,93		19%	$ 123.180,97		19%	$ -		
TOTAL OBRA CONTRACTUAL					$ 34.616.861,67		SUBTOTAL	$ 33.141.369,09	SUBTOTAL 2	$ -			SUBTOTAL 3	$ 4.060.455,97	853%	SUBTOTAL	$ 29.861.513,12	119%	SUBTOTAL 5	$ -		0%
							SALDO	$ 1.474.892,58															

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL BARRACA 4 DE OFICIALES RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16					OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE		CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
						MAYORES(+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT.	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1,0	PRELIMINARES																			
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS							$ -									-		-	
3,0	CIMENTACIÓN							$ -									-		-	
4,0	ESTRUCTURAS							$ -									-		-	
5,0	MAMPOSTERÍA							$ -									-		-	
6,0	REDES HIDROSANITARIAS							$ -									-		-	
7,0	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, DUCTERIA, TABLEROS, SALIDAS Y AFINES				$ 576.872,00			$ 576.872,00						-			576.872,00		-	
7,6	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO A 220V	UNO	8,00	$ 72.109,00	$ 576.872,00		8	$ 576.872,00						$ -	0%	8,00	576.872,00	100%	-	-	0%
8,0	PAÑETES			$ -	-			$ -									-		-	
9,0	CIELO RASO			$ -	$ 17.574.810,00			$ 17.574.810,00						$ 17.574.810,00			$ -		-	$ -
9,1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M2	100	$ 92.499,00	$ 17.574.810,00		100	$ 17.574.810,00						$ 17.574.810,00	100%		-	0%	-	-	0%
10,0	BASES, PISOS Y ENCHAPES							$ -									-		-	
11,0	PINTURA																			
12,0	CARPINTERÍA DE MADERA				$ 25.448.700,00			$ 29.614.327,00						-			29.614.927,00		-	
12,3	PUERTA ENTAMBORADA, CON BASTIDORES EN PINO, CARAS EN, HDF, MARCO PUERTA EN PINO LOCAL/COMERCIO 7M APROXIMADAMENTE (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS, TOPES Y CERRADURA DE POMO). MEDIDAS APROXIMADAS (0.70 A 0,8)X (2,0 A 2.10). ACCESO A LOS BAÑOS Y HABITACIONES.	UNO	8	$ 501.263,00	$ 4.010.104,00		8	$ 4.010.104,00						$ -	0%	8,00	4.010.104,00	100%	-	-	0%
12,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET'S SEGUN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES.	M2	36	$ 595.461,00	$ 21.436.596,00	7,00	43	$ 25.604.823,00						$ -	0%	43,00	25.604.823,00	119%	-	-	0%
13,0	CARPINTERÍA METÁLICA							$ -									-		-	
14,0	CARPINTERÍA ALUMINIO				$ 20.911.397,00			$ 20.911.397,00						20.911.397,00			-		-	
14,1	VENTANERIA ALUMINIO	M2	35	$ 414.055,00	$ 14.491.925,00		35	$ 14.491.925,00						$ 14.491.925,00	100%		-	0%	-	-	0%
14,3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	17	$ 377.616,00	$ 6.419.472,00		17	$ 6.419.472,00						$ 6.419.472,00	100%		-	0%	-	-	0%
15,0	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE							-									-		-	
16,0	CUBIERTAS							-									-		-	
17,0	APARATOS Y ACCESORIOS							-									-		-	
18,0	VIDRIOS Y ESPEJOS				$ -			$ 1.865.954,00									1.865.954,00		-	
18,1	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	0	$ 109.762,00	$ -	17,00	17,00	$ 1.865.954,00		-		-		$ -		17,00	1.865.954,00		-	-	
19,0	CERRADURAS							-									-		-	
20,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																			
TOTAL COSTO DIRECTO BARRACA 4 DE OFICIALES RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16					$ 64.509.779,00			$ 70.543.966,00		$ -				$ 38.486.207,00			$ 32.057.753,00			$ -		
ADMINISTRACIÓN			27%		$ 17.417.640,33		27%	$ 19.046.869,20	27%	$ -				$ 10.391.275,89		27%	$ 8.655.593,31		27%	$ -		
IMPREVISTOS			4%		$ 2.580.391,16		4%	$ 2.821.758,40	4%	$ -				$ 1.539.448,28		4%	$ 1.282.310,12		4%	$ -		
UTILIDADES			3%		$ 1.935.293,37		3%	$ 2.116.318,80	3%	$ -				$ 1.154.586,21		3%	$ 961.732,59		3%	$ -		
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		$ 367.705,74		19%	$ 402.100,57	19%	$ -				$ 219.371,38		19%	$ 182.729,19		19%	$ -		

TOTAL OBRA CONTRACTUAL			$ 86.810.809,60		SUBTOTAL	$ 94.931.006,97		SUBTOTAL 2	$ -		SUBTOTAL 3	$ 51.790.888,76	168%	SUBTOTAL	$ 43.140.118,21	201%	SUBTOTAL 5	$ -	0%					
					SALDO	-$ 8.120.197,37																		
TOTAL COSTOS DIRECTOS BARRACA 4 DE OFICIALES			$ 90.233.834,64			$ 95.172.511,64		$ -			$ 41.503.963,00			$ 53.668.448,64			$ -						
ADMINISTRACIÓN	27%		$ 24.363.135,35		27%	$ 25.696.443,14	27%	$ -			$ 11.205.962,01		27%	$ 14.490.481,13		27%	$ -						
IMPREVISTOS	4%		$ 3.609.353,39		4%	$ 3.806.880,47	4%	$ -			$ 1.660.142,52		4%	$ 2.146.737,95		4%	$ -						
UTILIDADES	3%		$ 2.707.015,04		3%	$ 2.855.160,35	3%	$ -			$ 1.245.106,89		3%	$ 1.610.053,46		3%	$ -						
IVA SOBRE UTILIDAD	19%		$ 514.332,86		19%	$ 542.480,47	19%	$ -			$ 236.570,31		19%	$ 305.910,16		19%	$ -						
TOTAL OBRA CONTRACTUAL			$ 121.427.671,27		SUBTOTAL	$ 128.073.976,06	SUBTOTAL 2	$ -		SUBTOTAL 3	$ 55.851.744,73	217%	SUBTOTAL	$ 72.221.631,33	168%	SUBTOTAL 5	$ -	0%					
					SALDO	-$ 6.645.304,79																		

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL VIVIENDA DE CIVILES RUBRO: 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16						OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE			CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
						MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1,0	PRELIMINARES				$ 3.758.776,00			$ 3.812.242,00		$ 3.812.242,00			$ -			$ -			$ -	
1,1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	M2	40,00	$ 7.332,00	$ 313.280,00	10,00	50,00	$ 391.600,00	50,00	391.600,00	125%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
1,2	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UND	3,00	28.326,00	$ 84.978,00	(2,00)	1,00	$ 28.326,00	1,00	28.326,00	33%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
1,3	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	50,00	$ 11.010,00	$ 550.500,00	-	50,00	$ 550.500,00	50,00	550.500,00	100%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
1,4	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA	M2	100,00	$ 24.843,00	$ 2.484.300,00	-	100,00	$ 2.484.300,00	100,00	2.484.300,00	100%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
1,5	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UND	6,00	$ 16.268,00	$ 97.608,00	-	6,00	$ 97.608,00	6,00	97.608,00	100%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
1,6	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL.	M2	2,00	$ 21.148,00	$ 42.296,00	(2,00)	0,00	$ -	-	-	0%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
1,7	DESMONTE DE CLOSETS METALICOS O DE MADERA.	UND	2,00	$ 62.953,00	$ 125.906,00	(2,00)	0,00	$ -	-	-	0%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
1,8	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS.	UND	4,00	$ 14.977,00	$ 59.908,00	-	4,00	$ 59.908,00	4,00	59.908,00	100%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
3,0	CIMENTACIÓN																			
4,0	ESTRUCTURAS																			
5,0	MAMPOSTERÍA				$ 1.063.484,00			$ 757.484,00		651.200,00			106.284,00			-			-	
5,1	PASA MUROS PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE DEMOLICION Y ACCESORIOS	UND	3,00	$ 35.428,00	$ 106.284,00		3,00	$ 106.284,00		-	0%	3,00	$ 106.284,00	100%		-	0%	-	-	0%
5,2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	120,00	$ 8.140,00	$ 976.800,00	(42,00)	80,00	$ 651.200,00	80,00	651.200,00	67%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
6,0	REDES HIDROSANITARIAS				$ -			$ 817.318,00					$ 817.318,00			$ -			$ -	
6,1	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	UND	0,00	$ 45.692,00	$ -	3,00	3,00	$ 137.076,00		-	-	3,00	$ 137.076,00	100%		-	0%	-	-	100%
6,3	SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" PLASTICA	UND	0,00	$ 44.618,00	$ -	1,00	1,00	$ 44.618,00		-	-	1,00	$ 44.618,00	100%		-	0%	-	-	100%
6,4	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	UND	0,00	$ 51.963,00	$ -	1,00	1,00	$ 51.963,00		-	-	1,00	$ 51.963,00	100%		-	0%	-	-	100%
6,5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UND	0,00	$ 50.875,00	$ -	5,00	5,00	$ 254.375,00		-	-	5,00	$ 254.375,00	100%		-	0%	-	-	100%
6,9	PUNTO SANITARIO Ø 2"	UND	0,00	$ 50.880,00	$ -	5,00	5,00	$ 254.400,00		-		5,00	$ 254.400,00	100%		-	0%	-	-	100%
6,10	PUNTO SANITARIO Ø 4"	UND	0,00	$ 74.886,00	$ -	1,00	1,00	$ 74.886,00		-		1,00	$ 74.886,00	100%		-	0%	-	-	100%
7,0	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, DUCTERÍA, TABLEROS, SALIDAS Y AFINES				$ -			$ 1.919.510,00		-			$ 1.919.510,00			$ -			$ -	
7,4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LE, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UND	0,00	$ 191.951,00	$ -	10,00	10,00	$ 1.919.510,00		-	-	10,00	$ 1.919.510,00	100%		$ -	0%	-	$ -	100%
7,7	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA LUMINARIA DECORATIVA TIPO LED TORTUGA 10W NW BUILHHEAD DE SYLVANIA O SIMILAR QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA DE COLOR BLANCO NEUTRO 4000K, 720LM, 10W, IP54. (INCLUYE LUMINARIA)	UND	0,00	$ 62.650,00	$ -		0,00	$ -		-	-		$ -			$ -		-	$ -	100%
8,0	PAÑETES				$ -			$ 1.743.600,00		-			$ 1.743.600,00			$ -		-	$ -	

9,1	PARETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2		0,00	$ 38.325,00	$ -	49,60	49,60	$ 1.743.600,00		$ -		48,00	$ 1.743.600,00	100%		$ -	0%		$ -	$ -	
9,0	**CIELO RASO**																								
10,0	**BASES, PISOS Y ENCHAPES**					$ 3.101.567,00			$ 3.897.810,00		$ 3.897.810,00														
10,1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2		75,00	$ 43.309,00	$ 3.101.567,00	17,00	92,00	$ 3.897.810,00	90,00	$ 3.897.810,00	123%		$ -	0%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
11,0	**PINTURA**					$ 2.681.395,02			$ 3.919.748,73		$ 2.681.533,84			$ 1.138.214,89			$ -			$ -	$ -	
11,1	ESTUCO Y VINILO ANTIHUMEDAD TIPO 1 A 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		76,76	$ 34.934,00	$ 2.681.395,02		76,76	$ 2.681.395,02	76,76	$ 2.681.533,84	100%	(0,00)	$ -138,82	0%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
11,2	PINTURA EXTERIOR A DOS MANOS TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O SIMILAR ADICIONADA CON PLASTIFICANTE EN PROPORCIÓN 4,2 CAZAS POR GALÓN, CON APLICACIÓN PREVIA SOBRE FACHADA DE UNA MANO DE TEXACRYL, DE PINTUCO O SIMILAR EN PROPORCIÓN 50% DE PRODUCTO CON 50% DE AGUA.	M2		0,00	$ 32.075,00	$ -	35,49	35,49	$ 1.138.353,71				35,49	$ 1.138.353,71	100%		$ -	0%		$ -	$ -	
12,0	**CARPINTERÍA DE MADERA**					$ 15.194.913,00			$ 15.194.913,00		$ -			$ 15.194.913,00			$ -			$ -	$ -	
12,1	CONSTRUCCIÓN COCINA MUEBLE INFERIOR EN MADERA DE 2.2ML INCLUYE MESÓN EN GRANITO, ESTUFA DE 4 PUESTOS, LAVAPLATOS, GRIFERÍA, PUERTAS Y CAJONES, EN MARCO EN PINO QUINTUPLES ENCHAPADA EN HDF, DEMOLICION DE MUEBLE EN MADERA EXISTENTE	UNO		1,00	$ 3.443.873,00	$ 3.443.873,00		1,00	$ 3.443.872,00		$ -	0%	1,00	$ 3.443.873,00	100%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
12,2	CONSTRUCCION COCINA MUEBLE SUPERIOR EN MADERA MARCO EN PINO QUINTUPLES ENCHAPADA EN HDF INCLUYE DEMOLICION DE MUEBLE EN MADERA EXISTENTE Y CAMPANA RECIRCULADORA DE OLORES. DEMOLICION DE MUEBLE EN MADERA EXISTENTE	UNO		1,00	$ 1.910.797,00	$ 1.910.797,00		1,00	$ 1.910.797,00		$ -	0%	1,00	$ 1.910.797,00	100%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
12,3	PUERTA ENTAMBORADA, CON BASTIDORES EN PINO, CARAS EN HDF, MARCO PUERTA EN PINO L3CM(L1CM(C)M2)X8.5M APROXIMADAMENTE (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS, TOPES Y CERRADURA DE POMO). MEDIDAS APROXIMADAS: (0.70 A 0.80)X (2.0 A 2.10). ACCESO A LOS BAÑOS Y HABITACIONES.	UNO		3,00	$ 501.262,00	$ 1.503.789,00		3,00	$ 1.503.789,00		$ -	0%	3,00	$ 1.503.789,00	100%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
12,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES.	M2		14,00	$ 595.461,00	$ 8.336.454,00		14,00	$ 8.336.454,00		$ -	0%	14,00	$ 8.336.454,00	100%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
13,0	**CARPINTERÍA METÁLICA**								$ -		$ -			$ -			$ -			$ -	$ -	
14,0	**CARPINTERÍA ALUMINIO**					$ 14.540.262,00			$ -		$ -			$ -			$ -			$ -	$ -	
14,1	VENTANERIA ALUMINIO	M2		0,00	$ 414.058,00	$ 3.312.442,00	(8,00)	0,00	$ -		$ -	-		$ -	0%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
14,2	MARCO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA COLOCACIÓN DE ANGEO PLÁSTICO Y MALLA EXPANDIDA EN ALUMINIO INT-16	M2		26,00	$ 311.912,00	$ 8.109.712,00	(26,00)	0,00	$ -		$ -	-		$ -	0%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
14,3	PUERTA EN ALUMINIO	M2		5,00	$ 377.618,00	$ 1.888.089,00	(5,00)	0,00	$ -		$ -	-		$ -	0%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
14,4	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA COLOCACIÓN DE COMBINACIÓN DE CHAPA Y ANGEO PLÁSTICO CON MALLA EXPANDIDA EN ALUMINIO INT-16 (0,9M A 1,10M X 2,10M A 2,20M)	UNO		1,00	$ 417.366,00	$ 417.366,00	(1,00)	0,00	$ -		$ -	-		$ -	0%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
14,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES CON MARCO EN ALUMINIO Y LAMINAS EN ACRILICO PARA BAÑOS.	M2		0,00	$ 270.868,00	$ 812.604,00	(3,00)	0,00	$ -		$ -	-		$ -	0%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
15,0	**CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE**								$ -		$ -			$ -			$ -			$ -	$ -	
16,0	**CUBIERTAS**																					
17,0	**APARATOS Y ACCESORIOS**																					
18,0	**VIDRIOS Y ESPEJOS**					$ 164.643,00			$ 155.254,72		$ -			$ -			$ 155.254,72			$ -	$ -	
18,1	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FIJOTADO EN MURO)	M2		1,50	$ 109.762,00	$ 164.643,00	(0,09)	1,41	$ 155.254,72		$ -	0%		$ -	0%	1,41	$ 155.254,72	94%		$ -	$ -	0%
19,0	**CERRADURAS**								$ -		$ -			$ -			$ -			$ -	$ -	
20,0	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**					$ 131.838,00			$ 131.838,00		$ 65.919,00			$ 65.919,00			$ -			$ -	$ -	
20,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3		2,00	$ 65.919,00	$ 131.838,00		2,00	$ 131.838,00	1,00	$ 65.919,00	50%	1,00	$ 65.919,00	50%		$ -	0%		$ -	$ -	0%
	TOTAL COSTO DIRECTO VIVIENDA CIVILES RUBRO: 02 02 02 005 004 01 1- RECURSO 16					$ 40.710.468,02			$ 32.049.718,44		$ 16.908.704,84			$ 20.985.758,89			$ 155.254,72			$ -		
	ADMINISTRACIÓN		27%			$ 10.993.446,36		27%	$ 8.653.423,98	27%	$ 2.945.350,31			$ 5.668.154,90		27%	$ 41.918,77		27%	$ -		
	IMPREVISTOS		4%			$ 1.628.658,72		4%	$ 1.281.988,74	4%	$ 436.348,19			$ 839.430,36		4%	$ 6.210,19		4%	$ -		
	UTILIDADES		3%			$ 1.221.494,04		3%	$ 961.491,55	3%	$ 327.261,15			$ 629.572,77		3%	$ 4.657,64		3%	$ -		

IVA SOBRE UTILIDAD		19%		$ 232.083,87		19%	$ 182.883,40	19%	$ 62.179,52			$ 119.515,83		19%	$ 854,95		19%	$ -							
TOTAL OBRA CONTRACTUAL				$ 54.792.151,01		SUBTOTAL	$ 43.129.306,11	SUBTOTAL 2	$ 14.679.844,10	27%	SUBTOTAL 3	$ 25.240.535,74	194%	SUBTOTAL	$ 208.926,27	0%	SUBTOTAL 5	$ -	0%							
						SALDO	$ 11.662.844,90																			

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL VIVIENDA CIVILES RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 16						OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE			CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
						MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1,0	PRELIMINARES																			
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
3,0	CIMENTACIÓN																			
4,0	ESTRUCTURAS				$ 12.596.658,00			$ -		-			-			-		-	-	
4,1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFIL METALICO TIPO ACESCO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COND TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	KG	150,00	$ 83.991,00	$ 12.598.650,00	(150,00)	0,00	$ -	-	-	0%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
5,0	MAMPOSTERÍA																			
6,0	REDES HIDROSANITARIAS																			
7,0	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, DUCTERIA, TABLEROS, SALIDAS Y AFINES																			
8,0	PAÑETES																			
9,0	CIELO RASO				$ 5.549.940,00			$ 8.324.910,00		8.324.910,00			-			-		-	-	
9,1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M2	60,00	$ 92.499,00	$ 5.549.940,00	30,00	90,00	$ 8.324.910,00	90,00	8.324.910,00	150%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
10,0	BASES, PISOS Y ENCHAPES				$ 10.958.426,60			$ 10.958.426,60		1.883.341,60			9.075.085,00			-		-	-	
10,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERÁMICA TIPO DEVA CAFE CORONA O SIMILAR 33.8X33.8 EN BAÑOS	M2	3,42	$ 80.838,00	$ 274.172,60		3,42	$ 274.172,60	3,42	274.172,60	100%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBINACIÓN EN PASEO CERAFIUEGOS BRISA Y CERAFUEGOS TAUPE PARA BAÑOS H=2.10 TIPO CORONA O SIMILAR.	M2	17,00	$ 94.857,00	$ 1.609.169,00		17,00	$ 1.609.169,00	17,00	1.609.169,00	100%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO URBAN GRIS TIPO CORONA O SIMILAR DE 35X35	M2	7,00	$ 104.525,00	$ 731.675,00		7,00	$ 731.675,00		-	0%	7,00	$ 731.675,00	100%		-	0%	-	-	0%
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED ALPINO BLANCO PARA COCINA TIPO CORONA O SIMILAR.	M2	11,00	$ 85.884,00	$ 944.724,00		11,00	$ 944.724,00		-	0%	11,00	$ 944.724,00	100%		-	0%	-	-	0%
10,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED BASE DECORADO BROKLING PARA COCINA TIPO CORONA O SIMILAR.	ML	5,00	$ 93.676,00	$ 468.380,00		5,00	$ 468.380,00		-	0%	5,00	$ 468.380,00	100%		-	0%	-	-	0%
10,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MINDI RECTIFICADO CAFÉ TIPO CORONA O SIMILAR FORMATO 20X60	M2	17,00	$ 112.092,00	$ 1.905.564,00		17,00	$ 1.905.564,00		-	0%	17,00	$ 1.905.564,00	100%		-	0%	-	-	0%
10,8	GUARDAESCOBA EN CERAMICA TIPO MINDI RECTIFICADO CAFÉ CORONA O SIMILAR H=0.08M	ML	13,00	$ 26.289,00	$ 341.757,00		13,00	$ 341.757,00		-	0%	13,00	$ 341.757,00	100%		-	0%	-	-	0%
10,9	INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN FORMATO 60X60 SELLADO COLOR BEIGE KAZTELO O SIMILAR	M2	18,00	$ 86.303,00	$ 1.553.454,00		18,00	$ 1.553.454,00		-	0%	18,00	$ 1.553.454,00	100%		-	0%	-	-	0%
10,10	GUARDAESCOBA COLOR BEIGE KAZTELO O SIMILAR H=0.08M	ML	18,00	$ 23.161,00	$ 416.898,00		18,00	$ 416.898,00		-	0%	18,00	$ 416.898,00	100%		-	0%	-	-	0%
10,11	PISO EXTERIOR SALTILLO CORONA O SIMILAR EN ZONAS EXTERIORES	M2	28,00	$ 79.323,00	$ 2.221.044,00		28,00	$ 2.221.044,00		-	0%	28,00	$ 2.221.044,00	100%		-	0%	-	-	0%
10,12	GUARDAESCOBA PISO EXTERIOR SALTILLO CORONA O SIMILAR EN ZONAS EXTERIORES	ML	21,00	$ 23.409,00	$ 491.589,00		21,00	$ 491.589,00		-	0%	21,00	$ 491.589,00	100%		-	0%	-	-	0%
11,0	PINTURA																			
12,0	CARPINTERÍA DE MADERA																			
13,0	CARPINTERÍA METÁLICA																			
14,0	CARPINTERÍA ALUMINIO																			
15,0	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE																			
16,0	CUBIERTAS				$ 11.667.260,00			$ 11.667.260,00		$ 10.606.900,00			$ -			$ 1.060.660,00		-	-	
16,1	TEJA ARQUITECTONICA ACESCO 0.73 X 3.66 MTS COLOR A DEFINIR	M2	110,00	$ 106.066,00	$ 11.667.260,00		110,00	$ 11.667.260,00	100,00	10.606.600,00	91%		$ -	0%	10,00	1.060.660,00	9%	-	-	0%
17,0	APARATOS Y ACCESORIOS				$ 838.619,00			$ -		-			$ -			$ -		-	-	
17,1	COMBO AGUA PRO REDONDO CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN).	UND	1,00	$ 738.716,00	$ 738.716,00	(1,00)	0,00	$ -		-	0%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
17,2	DUCHA SENCILLA NOGAL REF. CORONA O SIMILAR.	UND	1,00	$ 99.903,00	$ 99.903,00	(1,00)	0,00	$ -		-	0%		$ -	0%		-	0%	-	-	0%

18,0	VIDRIOS Y ESPEJOS																						
19,0	CERRADURAS																						
20,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																						
	TOTAL COSTO DIRECTO VIVIENDA CIVILES RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 10			$	41,612,695,60			$	30.996.596,60		$	20.814.851,60			$	9.075.089,00			$	1.060.660,00			$	-	
	ADMINISTRACIÓN	27%		$	11.235.481,81		27%	$	8.356.661,08	27%	$	5.620.009,93			$	2.450.272,53		27%	$	286.378,20		27%	$	-	
	IMPREVISTOS	4%		$	1.664.515,82		4%	$	1.238.023,86	4%	$	832.594,06			$	363.093,40		4%	$	42.428,40		4%	$	-	
	UTILIDADES	3%		$	1.248.386,87		3%	$	928.517,90	3%	$	624.445,55			$	272.252,55		3%	$	31.819,80		3%	$	-	
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%		$	237.193,50		19%	$	176.418,40	19%	$	118.644,65			$	51.727,98		19%	$	6.045,78		19%	$	-	
	TOTAL OBRA CONTRACTUAL			$	55.998.473,61		SUBTOTAL	$	41.650.217,84	SUBTOTAL 2	$	28.010.545,80	50%	SUBTOTAL 3	$	12.212.341,88	458%	SUBTOTAL	$	1.427.330,16	3%	SUBTOTAL 6	$	-	0%
							SALDO	$	14.348.255,76															
	TOTAL COSTOS DIRECTOS VIVIENDA CIVILES			$	82.529.361,62			$	63.000.315,04		$	31.723.556,44			$	30.060.943,99			$	1.315.914,72			$	-	
	ADMINISTRACIÓN	27%		$	22.228.928,18		27%	$	17.010.085,06	27%	$	8.565.360,24			$	8.116.427,85		27%	$	328.296,97		27%	$	-	
	IMPREVISTOS	4%		$	3.293.174,54		4%	$	2.520.012,60	4%	$	1.268.942,26			$	1.202.433,76		4%	$	48.638,58		4%	$	-	
	UTILIDADES	3%		$	2.469.880,91		3%	$	1.890.009,45	3%	$	951.708,69			$	901.825,32		3%	$	36.477,44		3%	$	-	
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%		$	469.277,37		19%	$	359.101,80	19%	$	180.824,27			$	171.346,81		19%	$	6.930,71		19%	$	-	
	TOTAL OBRA CONTRACTUAL			$	110.790.624,62		SUBTOTAL	$	84.779.523,96	SUBTOTAL 2	$	42.690.389,90	39%	SUBTOTAL 3	$	40.452.977,62	274%	SUBTOTAL	$	1.836.258,43	2%	SUBTOTAL 5	$	-	0%
							SALDO	$	26.011.100,67															

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL (ALOJAMIENTOS) RADAR RUBRO: 02 02 02 005 004 01 1 - RECURSO 10						OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE			CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
						MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1,0	PRELIMINARES				$ 1.174.800,00			$ 1.174.800,00					$ 1.174.800,00			$ -			$ -	
1,1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M2	150,00	$ 7.832,00	$ 1.174.800,00		150,00	$ 1.174.800,00				150,00	$ 1.174.800,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
3,0	CIMENTACIÓN																			
4,0	ESTRUCTURAS																			
5,0	MAMPOSTERÍA																			
6,0	REDES HIDROSANITARIAS																			
7,0	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, DUCTERÍA, TABLEROS, SALIDAS Y AFINES				$ 7.588.608,00			$ 7.588.608,00					$ 7.588.608,00							
7,11	CANAL PVC TIPO AMAZONAS.	ML	56,00	$ 99.753,00	$ 5.586.168,00		56,00	$ 5.586.168,00				56,00	$ 5.586.168,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
7,12	BAJANTE PVC TIPO AMAZONAS.	ML	33,00	60.680,00	$ 2.002.440,00		33,00	$ 2.002.440,00				33,00	$ 2.002.440,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
8,0	PAÑETES																			
9,0	CIELO RASO																			
10,0	BASES, PISOS Y ENCHAPES				$ 22.765.821,33			$ 22.765.821,33					$ 22.765.821,33			$ -			$ -	
10,1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	150,00	$ 43.309,00	$ 6.496.350,00		150,00	$ 6.496.350,00				150,00	$ 6.496.350,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
10,9	INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN FORMATO 60X60 SELLADO COLOR BEIGE KAZTELO O SIMILAR	M2	150,00	$ 86.303,00	$ 12.945.450,00		150,00	$ 12.945.450,00				150,00	$ 12.945.450,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
10,10	GUARDAESCOBA COLOR BEIGE KAZTELO O SIMILAR H=8.0RM	ML	143,52	$ 23.161,00	$ 3.324.021,33		143,52	$ 3.324.021,33				143,52	$ 3.324.021,33	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
11,0	PINTURA				$ 9.082.840,00			$ 9.082.840,00					$ 9.082.840,00			$ -			$ -	
11,1	ESTUCO Y VINILO ANTIHUMEDAD TIPO-1 A 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	260,00	$ 34.934,00	$ 9.082.840,00		260,00	$ 9.082.840,00				260,00	$ 9.082.840,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
12,0	CARPINTERÍA DE MADERA																			

13,0	CARPINTERÍA METÁLICA																					
14,0	CARPINTERÍA ALUMINIO																					
15,0	CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE																					
16,0	CUBIERTAS																					
17,0	APARATOS Y ACCESORIOS				$ 5.745.492,00			$ 5.745.492,00					$ 5.745.492,00			$ -			-		
17,3	LAVAMANOS AQUAPRO BLANCO CON SEMIPEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)	UN	18,00	$ 319.194,00	$ 5.745.492,00		18,00	$ 5.745.492,00				18,00	$ 5.745.492,00	100%		-	0%	-	-	0%		
18,0	VIDRIOS Y ESPEJOS																					
19,0	CERRADURAS																					
20,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				$ 1.641.507,00			$ 1.641.507,00					$ 1.641.507,00			$ -			-		
20,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	210,00	$ 6.875,00	$ 1.443.750,00		210,00	$ 1.443.750,00				210,00	$ 1.443.750,00	100%		-	0%	-	-	0%		
20,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	3,00	$ 65.919,00	$ 197.757,00		3,00	$ 197.757,00				3,00	$ 197.757,00	100%		-	0%	-	-	0%		
	TOTAL COSTO DIRECTO (ALOJAMIENTOS) RADAR RECURSO 10				$ 47.999.068,33			$ 47.999.068,33	$ -				$ 47.999.068,33			$ -			$ -		
	ADMINISTRACIÓN	27%			$ 12.959.748,45		27%	$ 12.959.748,45	27%	$ -			$ 12.959.748,45		27%	$ -		27%	$ -		
	IMPREVISTOS	4%			$ 1.919.962,73		4%	$ 1.919.962,73	4%	$ -			$ 1.919.962,73		4%	$ -		4%	$ -		
	UTILIDADES	3%			$ 1.439.972,05		3%	$ 1.439.972,05	3%	$ -			$ 1.439.972,05		3%	$ -		3%	$ -		
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 273.594,69		19%	$ 273.594,69	19%	$ -			$ 273.594,69		19%	$ -		19%	$ -		
	TOTAL OBRA CONTRACTUAL				$ 64.592.346,25		SUBTOTAL	$ 64.592.346,25	SUBTOTAL 2	$ -		SUBTOTAL 3	$ 64.592.346,25	100%	SUBTOTAL	$ -		SUBTOTAL 5	$ -		
							SALDO	$ -														

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL (ALOJAMIENTOS)VIVIENDA DE CIVILES RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 10			BALANCE			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
									CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
6,0	REDES HIDROSANITARIAS				$ 3.561.906,00			$ 2.589.466,00					$ 2.589.466,00			$ -			$ -	
6,1	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	UND	3,00	$ 45.692,00	$ 137.076,00	(3,00)	0,00	$ -		-	-	-	$ -	0%		-	0%	-	-	0%	
6,2	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1"	UND	1,00	$ 83.579,00	$ 83.579,00		1,00	$ 83.579,00		-	-	-	$ -	0%		-	0%	-	-	0%	
6,3	SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" PLÁSTICA	UND	3,00	$ 44.618,00	$ 133.854,00	(3,00)	0,00	$ -		-	-	-	$ -	0%		-	0%	-	-	0%	
6,4	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	UND	1,00	$ 51.963,00	$ 51.963,00	(1,00)	0,00	$ -		-	-	-	$ -	0%		-	0%	-	-	0%	
6,5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UND	5,00	$ 50.875,00	$ 254.375,00	(5,00)	0,00	$ -		-	-	-	$ -	0%		-	0%	-	-	0%	
6,6	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"	ML	2,00	$ 21.507,00	$ 43.014,00		2,00	$ 43.014,00		-	-	2,00	$ 43.014,00	100%		-	0%	-	-	0%	
6,7	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	ML	9,50	$ 39.041,00	$ 370.889,50		9,50	$ 370.889,50		-	-	9,50	$ 370.889,50	100%		-	0%	-	-	0%	
6,8	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ML	15,00	$ 55.968,00	$ 839.520,00		15,00	$ 839.520,00		-	-	15,00	$ 839.520,00	100%		-	0%	-	-	0%	
6,9	PUNTO SANITARIO Ø 2"	UND	5,00	$ 50.880,00	$ 254.400,00	(5,00)	0,00	$ -		-	-	-	$ -	0%		-	0%	-	-	0%	
6,10	PUNTO SANITARIO Ø 4"	UND	2,00	$ 74.886,00	$ 149.772,00	(2,00)	0,00	$ -		-	-	-	$ -	0%		-	0%	-	-	0%	
6,11	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 MTS.	UND	1,00	$ 629.009,00	$ 629.009,00		1,00	$ 629.009,00		-	-	1,00	$ 629.009,00	100%		-	0%	-	-	0%	
6,12	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2"	ML	6,70	$ 28.022,00	$ 187.747,40		6,70	$ 187.747,40		-	-	6,70	$ 187.747,40	100%		-	0%	-	-	0%	
6,13	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1"	ML	9,00	$ 19.127,00	$ 172.143,00		9,00	$ 172.143,00		-	-	9,00	$ 172.143,00	100%		-	0%	-	-	0%	
6,14	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13,5 Ø 2"	ML	15,00	$ 16.971,00	$ 254.565,00		15,00	$ 254.565,00		-	-	15,00	$ 254.565,00	100%		-	0%	-	-	0%	
7,0	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, DUCTERIA, TABLEROS, SALIDAS Y AFINES				$ 8.856.193,00			$ 3.659.385,00		-			$ 3.659.385,00			$ -			$ -	
7,1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	3,00	$ 125.220,00	$ 375.660,00		3,00	$ 375.660,00		-	-	3,00	$ 375.660,00	100%		-	0%	-	-	0%	
7,2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	6,00	$ 126.226,00	$ 757.356,00	(6,00)	0,00	$ -		-	-		$ -	0%		-	0%	-	-	0%	
7,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA, 15A/120V,(1N+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	6,00	$ 255.668,00	$ 1.534.008,00		6,00	$ 1.534.008,00		-	-	6,00	$ 1.534.008,00	100%		-	0%	-	-	0%	

7.4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UNO	16.00	$ 191.951,00	$ 3.071.216,00	(16,00)	0,00	$ -	-	-	-	$ -	0%		-	0%	-	-	0%
7.5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 1X24", 70W/120V (RED NORMAL) INCLUYE DUCTO TIPO FLEXIBLE CORAZA METALICA 1X24" Y REJILLA, SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), DUCTERIA, CAJAS, CURUAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UNO	2,00	$ 451.444,00	$ 902.888,00	(1,00)	1,00	$ 451.444,00	-	-	1,00	$ 451.444,00	50%		-	0%	-	-	0%
7.6	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO A 220V	UNO	4,00	$ 72.109,00	$ 288.436,00	(2,00)	2,00	$ 144.218,00	-	-	2,00	$ 144.218,00	50%		-	0%	-	-	0%
7.7	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA LUMINARIA DECORATIVA TIPO LED TORTUGA 13W NW BULKHEAD DE SYLVANIA O SIMILAR QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TEMPERATURA DE COLOR, BLANCO NEUTRO 4000K, 720 LM, 16W, IP54. (INCLUYE LUMINARIA)	UNO	4,00	$ 82.050,00	$ 328.200,00	(4,00)	0,00	$ -	-	-	-	$ -	0%		-	0%	-	-	0%
7.8	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UNO	1,00	$ 931.868,00	$ 931.868,00	1,00	1,00	$ 931.868,00	-	-	1,00	$ 931.868,00	100%		-	0%	-	-	0%
7.9	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) 15A/120V (NEMA 5-15R) (RED NORMAL) INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERIA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UNO	3,00	$ 222.187,00	$ 666.561,00	(2,00)	1,00	$ 222.187,00	-	-	1,00	$ 222.187,00	33%		-	0%	-	-	0%
8.0	**PAÑETES**				**$ 1.743.600,00**			$ -	-	-		$ -			$ -		$ -		$ -	
8.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES*	M2	48,00	$ 36.325,00	$ 1.743.600,00	(48,00)	0,00	$ -	-	-		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
11.0	**PINTURA**				**$ 1.136.353,71**			$ -	-	-		-			-		-		$ -	
11.2	PINTURA EXTERIOR A DOS MANOS TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O SIMILAR ADICIONADA CON PLASTIFICANTE EN PROPORCIÓN 4:2 ONZAS POR GALÓN, CON APLICACIÓN PREVIA SOBRE FACHADA DE UNA MANO DE TEXACRYL DE PINTUCO O SIMILAR EN PROPORCIÓN 50% DE PRODUCTO CON 50% DE AGUA.	M2	35,48	$ 32.075,00	$ 1.138.353,71	(35,48)	0,00	$ -	-	-		$ -	0%		-	0%	-	-	0%
14.0	**CARPINTERIA ALUMINIO**				**$ -**			**$ 5.200.520,00**	-	-		**$ 5.200.520,00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**	
14.1	VENTANERIA ALUMINIO	M2	0,00	$ 414.055,00	$ -	8,00	8,00	$ 3.312.440,00	-	-	8,00	$ 3.312.440,00	100%		-	0%	-	-		
14.3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	0,00	$ 377.616,00	$ -	5,00	5,00	$ 1.888.080,00	-	-	5,00	$ 1.888.080,00	100%		-	0%	-	-		
14.4	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA COLOCACIÓN DE COMBINACIÓN DE CHAPA Y ANGEO PLASTICO CON MALLA EXPANDIDA EN ALUMINIO (MT-16 (0,9M X 1,10M X 2,10M A 2,30M)	UNO	0,00	$ 417.366,00	$ -	-	0,00	$ -	-	-		$ -			-		-	-	-	
14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES CON MARCO EN ALUMINIO Y LAMINAS EN ACRILICO PARA BAÑOS.	M2	0,00	$ 270.888,00	$ -	-	0,00	$ -	-	-		$ -			-		-	-	-	
17.0	**APARATOS Y ACCESORIOS**				**$ -**			**$ 836.619,00**	-	-		**$ 836.619,00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**	
17.1	COMBO AQUA PRO REDONDO CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN).	UNO	0,00	$ 739.716,00	$ -	1,00	1,00	$ 739.716,00	-	-	1,00	$ 739.716,00	100%		-	0%	-	-		
17.2	DUCHA SENCILLA NOGAL REF. CORONA O SIMILAR	UNO	0,00	$ 96.903,00	$ -	1,00	1,00	$ 96.903,00	-	-	1,00	$ 96.903,00	100%		-	0%	-	-		
TOTAL COSTO DIRECTO VIVIENDA CIVILES RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 10					**$ 15.300.053,61**			**$ 12.278.990,00**		**$ -**		**$ 12.278.990,00**			**$ -**		**$ -**		**$ -**	
ADMINISTRACIÓN		**27%**			**$ 4.131.014,48**		**27%**	$ 3.315.327,54	27%	$ -		$ 3.315.327,54		**27%**	$ -		**27%**		$ -	
IMPREVISTOS		**4%**			**$ 612.002,14**		**4%**	$ 491.159,64	4%	$ -		$ 491.159,64		**4%**	$ -		**4%**		$ -	
UTILIDADES		**3%**			**$ 459.001,61**		**3%**	$ 368.369,73	3%	$ -		$ 368.369,73		**3%**	$ -		**3%**		$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**			**$ 87.210,31**		**19%**	$ 69.990,25	19%	$ -		$ 69.990,25		**19%**	$ -		**19%**		$ -	
TOTAL OBRA CONTRACTUAL					**$ 20.589.282,15**		**SUBTOTAL**	$ 16.523.836,05	**SUBTOTAL 2**	$ -		**SUBTOTAL 3**	$ 16.523.836,05	**125%**	**SUBTOTAL**	$ -	**0%**	**SUBTOTAL 5**	$ -	
							SALDO	$ 4.065.444,06												

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL BARRACA 4 OFICIALES			RUBRO: 02 01 01 001 001 07 - RECURSO 10			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
						BALANCE			CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
7,0	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, DUCTERIA, TABLEROS, SALIDAS Y AFINES				$ -			$ 2.708.664,00					$ -			$ 2.708.664,00			$ -	
7,5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 1X24", 70W/120V (RED NORMAL) INCLUYE DUCTO TIPO FLEXIBLE CORAZA METALICA 1X24" Y REJILLA, SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO (FE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	6,00	$ 451.444,00	$ -	6,00	6,00	$ 2.708.664,00	-		-	$ -		6,00	2.708.664,00		-	-	
TOTAL COSTO DIRECTO BARRACA 4 OFICIALES RECURSO 10				RUBRO: 02 01 01 001 001 07 -	$ -			$ 2.708.664,00		$ -			$ -			$ 2.708.664,00			$ -	
ADMINISTRACIÓN			27%		$ -		27%	$ 731.339,28	27%	$ -			$ -		27%	$ 731.339,28		27%	$ -	
IMPREVISTOS			4%		$ -		4%	$ 108.346,56	4%	$ -			$ -		4%	$ 108.346,56		4%	$ -	
UTILIDADES			3%		$ -		3%	$ 81.259,92	3%	$ -			$ -		3%	$ 81.259,92		3%	$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		$ -		19%	$ 15.439,38	19%	$ -			$ -		19%	$ 15.439,38		19%	$ -	
TOTAL OBRA CONTRACTUAL					$ -		SUBTOTAL	$ 3.645.049,14	SUBTOTAL 2	$ -		SUBTOTAL 3	$ -		SUBTOTAL	$ 3.645.049,14		SUBTOTAL 5	$ -	
							SALDO	-$ 3.645.049,14												
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 505.251.109,04			$ 507.842.706,33		$ 147.988.467,50			$ 279.743.797,21			$ 81.210.441,62			$ -	
ADMINISTRACION			27%		$ 137.497.799,44		27%	$ 137.117.530,71	27%	$ 39.716.886,22		27%	$ 75.530.825,25		27%	$ 21.872.819,24		27%	$ -	
IMPREVISTOS			4%		$ 20.370.044,36		4%	$ 20.313.708,25	4%	$ 5.883.538,70		4%	$ 11.189.751,89		4%	$ 3.240.417,66		4%	$ -	
UTILIDADES			3%		$ 15.277.533,27		3%	$ 15.235.281,19	3%	$ 4.412.654,02		3%	$ 8.392.313,92		3%	$ 2.430.313,25		3%	$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		$ 2.902.731,32		19%	$ 2.894.703,43	19%	$ 838.404,26		19%	$ 1.594.539,64		19%	$ 461.759,52		19%	$ -	
TOTAL OBRA CONTRACTUAL					$ 685.299.217,43		SUBTOTAL	$ 683.403.929,90	SUBTOTAL 2	$ 197.936.950,70		SUBTOTAL 3	$ 376.451.227,91		SUBTOTAL	$ 109.015.751,29		SUBTOTAL 5	$ -	
							SALDO	$ 1.895.287,53												

EQUIPOS No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			EQUIPOS ENTREGADOS												EQUIPOS POR ENTREGAR		
						BALANCE			CORTE 1 (29/07/2022)			CORTE 2 (28/09/2022)			PRESENTE CORTE (31/10/2022)			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
				$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO					$ -			$ -		$ -			$ -			$ -			$ -	
IVA			19%		$ -			$ -		$ -			$ -			$ -			$ -	
SUBTOTALES EQUIPOS					$ -			$ -		$ -			$ -			$ -			$ -	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL				$ 685.299.217,43			SUBTOTAL 1	$ 683.403.929,90	SUBTOTAL 2	$ 197.936.950,70	29%	SUBTOTAL 3	$ 376.451.227,91	55%	SUBTOTAL 4	$ 109.015.751,29	16%	SUBTOTAL 5	$ -	0%

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% AMORTIZADO CORTES 1	VALOR AMORTIZADO CORTES 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR PENDIENTE AMORTIZAR
% ANTICIPO	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ -

Solicita:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

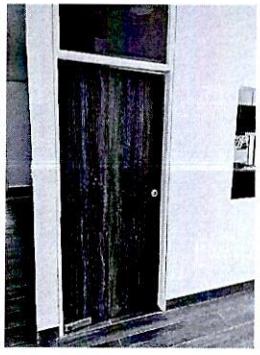
Autoriza:

JPB

Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

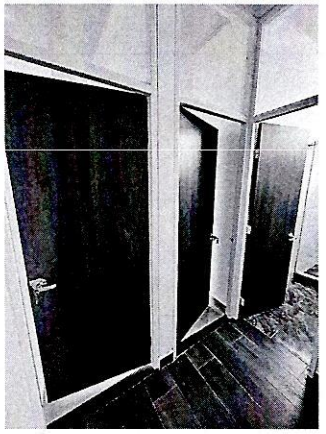
CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	12,4	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA, CON BASTIDORES EN PINO, CARAS EN HDF. MARCO DE MEDIDAS APROXIMADAS EN PINO L3CMX10CMX2.0MX0.9M (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES. MEDIDAS APROXIMADAS (0,90X2,0) ACCESO A COCINA		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Vivienda Suboficiales				1	1	1
					TOTAL		1

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	12.3	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUERTA ENTAMBORADA, CON BASTIDORES EN PINO, CARAS EN HDF. MARCO PUERTA EN PINO L3CMX10CMX2MX0.7M APROXIMADAMENTE (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS, TOPES Y CERRADURA DE POMO). MEDIDAS APROXIMADAS (0.70 A 0,80X 2,0 A 2.10). ACCESO A LOS BAÑOS Y HABITACIONES.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Vivienda Suboficiales				1	5	5
						TOTAL	5

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

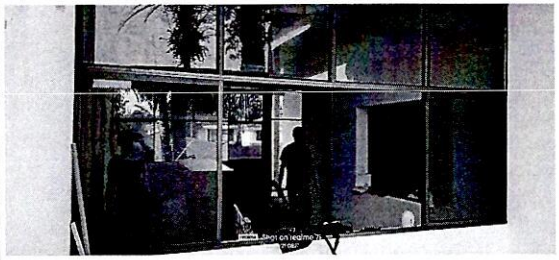
CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	18,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Vivienda Suboficiales				2	1	2
						TOTAL	2

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

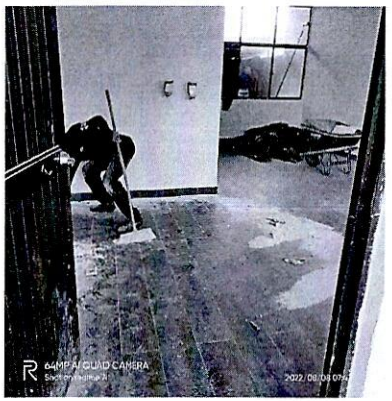
CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	4,2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VENTANERIA ALUMINIO		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Vivienda Suboficiales				0,00161375	1	0,00161375
					TOTAL		0,00161375

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	10,8	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUERTA EN ALUMINIO		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Vivienda Suboficiales				1,2	1	1,2
					TOTAL		1,2

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022


CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	14,5	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES CON MARCO EN ALUMINIO Y LAMINAS EN ACRILICO PARA BAÑOS.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Vivienda Suboficiales				6	1	6
					TOTAL		6

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022


CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	11,1	UND:	M2
,	ESTUCO Y VINILO ANTIHUMEDAD TIPO-1 A 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 10 Suboficiales				179,0	1	179,00
						TOTAL	179

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	14,6	UND:	M2
	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO INCLUYE CAMBIOS DE CERROJOS, LUBRICACION DE RIELES, REMPLAZO DE VIDRIOS ROTOS Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 10 Suboficiales				98,53	1	98,53
						TOTAL	98,53

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022


CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	18,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 10 Suboficiales				5,92	1	5,92
					TOTAL		5,92

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022


CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	7,4	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 4 Oficiales				1	20	20
						TOTAL	20

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022


CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	7,7	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA LUMINARIA DECORATIVA TIPO LED TORTUGA 10W NW BULKHEAD DE SYLVANIA O SIMILAR QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA DE COLOR BLANCO NEUTRO 4000K, 720LM, 10W, IP54. (INCLUYE LUMINARIA)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 4 Oficiales				1	4	4
						TOTAL	4

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022


CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	11,1	UND:	M2
,	ESTUCO Y VINILO ANTIHUMEDAD TIPO-1 A 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 4 Oficiales				300,0	1	300,00
						TOTAL	300

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022


CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	11,2	UND:	M2
,	PINTURA EXTERIOR A DOS MANOS TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O SIMILAR ADICIONADA CON PLASTIFICANTE EN PROPORCIÓN 4.2 ONZAS POR GALÓN, CON APLICACIÓN PREVIA SOBRE FACHADA DE UNA MANO DE TEXACRYL DE PINTUCO O SIMILAR EN PROPORCIÓN 50% DE PRODUCTO CON 50% DE AGUA.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 4 Oficiales				212,98	1	212,98
					TOTAL		212,98

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022


CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM N°	20,2	UND:	M3
,	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD		
CORTE N°:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 4 Oficiales				1	2	2
						TOTAL	2

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022


CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	18,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Vivienda civiles				1,41	1	1,41
					TOTAL		1,41

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	7,6	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO A 220V		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 4 Oficiales				1	8	8
						TOTAL	8

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

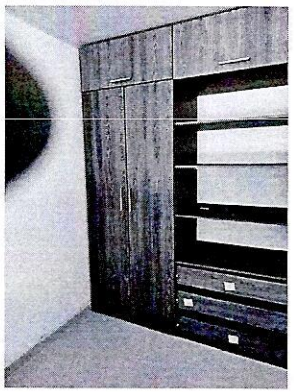
CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	12,3	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUERTA ENTAMBORADA, CON BASTIDORES EN PINO, CARAS EN HDF. MARCO PUERTA EN PINO L3CMX10CMX2MX0.7M APROXIMADAMENTE (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS, TOPES Y CERRADURA DE POMO). MEDIDAS APROXIMADAS (0.70 A 0,80X 2,0 A 2.10). ACCESO A LOS BAÑOS Y HABITACIONES.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 4 Oficiales				1	8	8
						TOTAL	8

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	12,5	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 4 Oficiales				43	1	43
					TOTAL		43

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

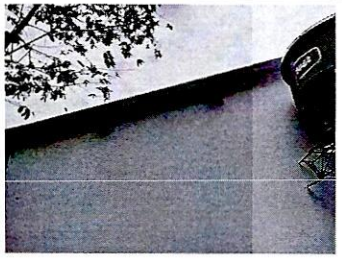
CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	18,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Barraca 4 Oficiales				17	1	17
						TOTAL	17

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	16,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TEJA ARQUITECTONICA ACESCO 0,73 X 3,66 MTS COLOR A DEFINIR		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Vivienda Civiles				10	1	10
					TOTAL		10

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	013 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES DEL CACOM - 6		
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. PEREZ BENJUMEA LAURA		
ÍTEM Nº	7,5	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 1XØ4", 70W/120V (RED NORMAL) INCLUYE DUCTO TIPO FLEXIBLE CORAZA METALICA 1XØ4" Y REJILLA, SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	31/10/2022

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Vivienda Civiles				1	6	6
					TOTAL		6

Elaboró:: Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: Supervisor del contrato ST. Perez Benjumea Laura

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2001

Yo, Camilo Eduardo Marsiglia Niño, identificado con C.C 1020808064, en mi condición de Representante Legal de TECMON CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901197184-0, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (31) treinta y un días del mes de octubre de 2022

FIRMA Camilo Marsiglia Niño

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: Camilo Eduardo Marsiglia Niño

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901197184-0	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		KR 13 #27 - 58	3194783416	tecmonltda8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	04/10/2022	60941041	$4.315.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	835.200				835.200	0	0	835.200			8.400	835.200	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	480.000	0	0	480.000	12

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901197184-0	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		KR 13 #27 - 58	3194783416	tecmonltda8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	04/10/2022	60941041	$4.315.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
240.000	0	0	240.000	12
ICBF				
360.000	0	0	360.000	12
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	480.000	480.000
Pensión	4	1.920.000	1.920.000
Riesgos Laborales	1	835.200	835.200
CCF	1	480.000	480.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	360.000	360.000
MEN	0	0	0
SENA	1	240.000	240.000
TOTALES	13	4.315.200	4.315.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901197184-0	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		KR 13 #27 - 58	3194783416	tecmonltda8@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	04/10/2022	60941041	$4.315.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolivia	Extranjero	Cédula extranjería	Extranjero	VSP	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	84025022	MARCIGLIA FERNANDEZ CARLOS EDUARDO	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
2	CC	51890983	NIÑO RONCACIO MARYAN STELLA	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
3	CC	1017506105	MARROQUIN DUCUARA ANDERSON	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
4	CC	1122726985	CUELLAR CASTRO CRISTIAN ALBERTO	1	0			N	X															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
5	CC	1117502218	LOPEZ MARULANDA JORGE RICARDO	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
6	CC	17654804	RAMIREZ SILVA SERAFIN	1	0			N																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
7	CC	17638749	SALAZAR LUIS	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
8	CC	1117495337	CASTAÑEDA BEDOYA JAIVER ARLEY	1	0			N	X															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
9	CC	17649321	MELENJE PIZO HUMBERTO	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
10	CC	1111767276	OROBIO MOSQUERA MILTON ANDRES	1	0			N																231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
11	CC	79360790	BOTERO JIMENEZ CARLOS EDUARDO	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
12	CC	80757170	MELENDEZ PEDREROS JORGE AMIR	1	0			N	X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003003202-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		17.11.2022	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TECMON CONSTRUCCIONES SAS	901197184		4500430572	

TRAZABILIDAD: 302 / 013-00-I-CACOM-6-GRUAL-22 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ADECUACION Y MTO DE LAS INTA		1,00	UN	3.645.049,14	3.645.049,14

TOTALES 3.645.049,14

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003003203-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		17.11.2022	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TECMON CONSTRUCCIONES SAS	901197184		4500430572	

TRAZABILIDAD: 302 / 013-00-I-CACOM-6-GRUAL-22 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				AIU ADECUACION Y MTO DE LAS		1,00	UN	105.370.702,15	105.370.702,15

TOTALES 105.370.702,15

MONTO: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON- QUINCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcagirald	Cesar Augusto Giraldo Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-17-3:51 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	157922	**Fecha Registro:**	2022-11-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	71522	**Nro. Cdp:**	3022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	57.236.861,96	**Valor Iva:**	461.759,52		**Valor Total:**	57.698.621,48	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901197184	**Razón Social:**	TECMON CONSTRUCCIONES SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	302	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	TERCER PAGO TOTAL CONTRATO NO. 013-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcagirald	Cesar Augusto Giraldo Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-17-3:46 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	157822	**Fecha Registro:**	2022-11-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	71522	**Nro. Cdp:**	3022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	47.672.080,67	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	47.672.080,67	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901197184	**Razón Social:**	TECMON CONSTRUCCIONES SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	302	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	TERCER PAGO TOTAL CONTRATO 013-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcagirald	Cesar Augusto Giraldo Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-17-3:40 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	157722	**Fecha Registro:**	2022-11-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	71522	**Nro. Cdp:**	3022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.645.049,14	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	3.645.049,14	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	901197184	**Razón Social:**	TECMON CONSTRUCCIONES SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	302	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	TERCER PAGO TOTAL CONTRATO 013-00-I-CAOM-6-GRUAL-2022

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
