INFORME DE AVANCE MES DOS (02)

CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022

OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**

Valledupar – septiembre 23, de 2022.

Ingeniero.
WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO.
Representante Legal, **CONSORCIO DE INTERVENTORIAS PERIJA**
E S D.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022**

Objeto: **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**

Asunto: **ENTREGA ACTA DE INFORME DE AVANCE MENSUAL DOS (02).**

Cordial saludo.

Por medio de la presente para su recibo, revisión, aprobación, y su trámite pertinente ante **CORPOCESAR**, me permito hacerle llegar, el informe del asunto de la referencia con sus respectivos soportes:

- **INFORME DE AVANCE MENSUAL DOS (02).**

Agradeciéndole su atención y colaboración.

24-11-22 05:15 P.M

RUBEN ESTRADA GAMEZ.
R.L UNIÓN TEMPORAL BERACA SERRANIA.
Contratista.

Folios: (38).

Diagonal 6Bis No 13-37 Barrio los Ángeles
Teléfono: 5814560 Celular: 3145328821 **e- mail:** proasecomltda@hotmail.com
Valledupar – Cesar

INFORME DE AVANCE MES DOS (02)

CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022

UT Beraca Serrania

CORPOCESAR

OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**

INFORME DE AVANCE MENSUAL DOS (02).

Diagonal 6Bis No 13-37 Barrio los Ángeles
Teléfono: 5814560 Celular: 3145328821 **e- mail: proasecomltda@hotmail.com**
Valledupar – Cesar

CORPOCESAR	**INFORME DE AVANCE MENSUAL DOS (02)**				UT Beraca Serrania
	ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS				
	ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL - CORPOCESAR.	Código:	Versión:	**Fecha de Suscripcion:**	

Nota. El presente Informe de Avance Mensual firmado debe ser enviado en formato digital a la Interventoria. Para efectos de adjuntar los formatos de Informe de avance mensual acumulados en el expediente físico.

Fecha del informe (dd/mm/aaaa)	**11/10/2022**	Informe Mensual No. :	**MES DOS (02)**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto:	**OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**			
Contrato de Obra No:	**CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022** - FECHA: 14/07/2022	**Región:**		**SERRANIA DEL PERIJA**
Contratante:	**CORPOCESAR**	**Departamento:**		**CESAR**
Contratista:	**UNION TEMPORAL BERACA SERRANIA** - R.L: RUBEN ESTRADA GAMEZ	**Municipios:**		**CODAZZI - SAN DIEGO**
NIT.:	**901611702-2**	**Veredas:**		
Interventoria:	**CONSORCIO INTERVENTORIAS PERIJA** - R.L: WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO	**Coordenadas Geográficas**	**Latitud:**	
NIT.:	**901.616.356-1**			
Supervision:	**JORGE HUMBERTO JIMENEZ DURAN - Profesional Universitario** Área de Gestión Ambiental - CORPOCESAR.		**Longitud:**	
Nombre del Finaciador del Proyecto:	**FONAM(CORPOCESAR).**	**Nivel de complejidad (I, II, III):**		**III**
Plazo de Ejecucion:	**SIETE (7) MESES**			
Fecha de Inicio del Contrato de Obra (dd/mm/aaaa).	**11/08/2022**			
Fecha de terminacion del Contrato de Obra (dd/mm/aaaa).	**10/03/2023**	**PORCENTAJES (%):**		
Valor del Contrato de obra:	**$ 6.677.036.893**	**100%**		
Valor Acumulado a la fecha (Informe MES 2):	**$ 516.319.162**	**7,73%**		
Valor ejecutado MES 2:	**$ 304.300.281**	**4,56%**		
Porcentajes de Avances (%) de avance de la ejecución MES ANTERIOR (01):	**$ 212.018.881**	**3,18%**		
Plazo de Ejecucion:	**SIETE (7) MESES**	**Tiempo transcurrido:**	**DOS (2 MES)**	**28,57%**
La obra presenta un desarrollo:	**NORMAL**	**ESTADO DE OBRA** (de acuerdo a los estados establecidos para seguimiento por parte de **CORPOCESAR:**	**EN EJECUCION**	

1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

1.1 Actividades de obra

Nota 1. Los porcentajes de obra descritos a continuación corresponden al avance de obra únicamente, la forma de pago es la descrita en las actas de recibo y pagos parciales del contrato.

Actividad	Entregable	Entregado	% de avance	
Contratación del ejecutor del Contrato	Contrato o convenio firmado para la ejecución	SI	100,00%	
Socialización del proyecto	Acta de Socialización del proyecto	SI	25,00%	
Inicio de obra	Acta de Inicio de obra	SI	100,00%	
Ejecución de actividades de obra	Cantidades de obra efectivamente ejecutadas	SI	7,73%	
Entrega de actividades, bienes y/o servicios	Informes Mensuales de Avance de Obra.	SI	100,00%	
Elaboración y entrega de expedientes físicos y digitales del proyecto	Mapas Georeferenciados de los sitios intervenidos.	SI	100,00%	

1.2 Socializacion.

Actividad	Entregable	Entregado	% de avance	
• TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES	Jornadas teoricas - practicas, sobre temas de manejo y Educacion Ambienta, relativas a la ejecucion de este tipo de proyectos, y a fomentar conciencia social sobre los mismos.	SI	25%	**Ver Anexo Fotografico.**
• SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION PERSONALIZADA DEL PROYECTO.	Visitas predio a predio (equipo profesional y tecnico del contratista e interventoria).	SI	100%	**Ver Anexo Fotografico.**
• CONSENSO SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	Concertacion con la comunidad en la determinacion de las areas a intervenir, asi mismo con respecto a las especies vegetales a establecer en las areas intervenidas.	SI	100%	**Ver Anexo Fotografico.**

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA

2.1 Entregables de ejecución de obra

Entregable	Realizado	Fecha de elaboración y firma (dd/mm/aaaa)	Expediente donde reposa el documento			Conclusiones, alertas y/o recomendaciones
			No. Carpeta	No. Folios	No. de folio	
Contrato de Obra	SI	14/07/2022				CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022
Socialización del proyecto	SI	26/02/2022				
Acta de inicio	SI	11/08/2022				
Bitácora de obra	SI	DIARIO				
Actas de recibo parcial 01	NO					
Actas de recibo parcial 02	NO					
Acta de suspensión (cuando aplique)	NO					
Acta de reinicio (cuando aplique)	NO					
Acta de recibo final	NO					
Acta de entrega de actividades, bienes y/o servicios firmada (incluye Plan de Sostenibilidad)	NO					
Expediente físico y digital del proyecto; informes	SI					INFORME MENSUAL 02

INFORMES DE AVANCES MENSUALES	Fecha elaboración y firma de documento	Periodo del informe		Expediente donde reposa el documento			Conclusiones, alertas y/o recomendaciones
		Desde	Hasta	No. Carpeta	No. Folios	No. de folio	
Nota 1. El cuadro se debe llenar durante la ejecución de la obra, adicionando filas según corresponda. Teniendo en cuenta el cronograma o Plan de ejecucion presentado y aprobado por la interventoria y el contratante.							
Informe No. 1 de avance mensual	13/09/2022	11/08/2022	11/09/2022				
Informe No. 2 de avance mensual	13/10/2022	11/09/2022	11/10/2022				
Informe No. 3 de avance mensual							
Informe No. 4 de avance mensual							
Informe No. 5 de avance mensual							
Informe No. 6 de avance mensual							
Informe No. 7 de avance mensual							

2.2 Visita de Supervision de obra

Visita No.	Fecha de la visita	Actividades revisadas	Expediente donde reposa el documento			Conclusiones, alertas, recomendaciones y/o observaciones.
			No. Carpeta	No. Folios	No. de folio	
1.	27/9/2022 hasta 29/09/2022	Revision de areas y predios especificos a intervenir en la Ejecucion del proyecto.				SGAGA - 0783 - "Respuesta a concepto tecnico de lainterventoria sobre los alcances de los objetivos del contrato".
Nota: El cuadro se debe llenar durante la ejecución de la obra, adicionando filas según corresponda, Teniendo en cuenta las visitas de La Supervision						

2.3 CRONOGRAMA GENERAL APROBADO.

Nota 1. Al cuadro se le podrán adicionar las filas necesarias para insertar el cronograma

UT Beraca Serranía	**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**	CORPOCESAR
	CONTRATO DE No: 19-6-0187-0-2022	CODIGO No.
UNION TEMPORAL BERACA SERRANIA. NIT. 901611702-2	**OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**	VERSIÓN:
		FECHA: 2022-08-09

1. FECHA ELABORACION:	8/08/2022	2. PLAZO:	SIETE (7) MESES	3. INICIO:	11/09/2022	4. TERMINACION	11/03/2022

	Cronograma de ejecucion														
	ACTIVIDAD	**Unid**	**Cant**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**TOTAL EJECUCION**	**%**
						11/08/2022 - 11/09/2022	11/09/2022 - 11/10/2022	11/10/2022 - 11/11/2022	11/11/2022 - 11/12/2022	11/12/2022 - 11/1/2023	11/1/2023 - 11/02/2023	11/02/2023 - 11/03/2023		
1	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL PROTECTORA	HA	480	$ 8.500.136,00	$ 4.080.065.280									
							$	$	$	$	$	$	$ 4.080.065.280	61,11%
2	AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR	KM	78,24	$ 13.366.088,00	$ 1.047.327.525									
							$	$	$	$			$ 1.047.327.525	15,69%
3	TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES	Global	1	$ 12.554.618,00	$ 12.554.618									
						$						$	$ 12.554.618	0,19%
4	REALIZAR MONTAJE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS	Global	1	$ 52.957.300,00	$ 52.957.300									
							$	$	$	$	$	$	$ 52.957.300	0,79%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 5.192.904.723**									
	ADMINISTRACION	%	22,82%		$ 1.185.020.858									
						$	$	$	$	$	$	$	$ 1.185.020.858	17,75%
	IMPREVISTOS	%	1,00%		$ 51.929.047									
						$	$	$	$	$	$	$	$ 51.929.047	0,78%
	UTILIDAD	%	4,00%		$ 207.716.189									
						$	$	$	$	$	$	$	$ 207.716.189	3,11%
	IVA (Sobre la Utilidad)	%	19,00%		$ 39.466.076									
						$	$	$	$	$	$	$	$ 39.466.076	0,59%
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 1.484.132.170**									
	TOTAL COSTOS PROYECTO				**$ 6.677.036.893**	$ 218.286.740	$ 1.162.687.859	$ 1.162.687.859	$ 1.162.687.859	$ 1.162.687.859	$ 900.855.678	$ 867.132.207	**$ 6.677.036.893**	**100,00%**
						3,27%	17,41%	17,41%	17,41%	17,41%	13,49%	12,99%		**100,00%**

2.3.1 CRONOGRAMA EJECUTADO ACTUALIZADO MES 2.

UT Beraca Serranía	**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - AVANCE MES 2**	CORPOCESAR
	CONTRATO DE No: 19-6-0187-0-2022	CODIGO Rs:
UNION TEMPORAL BERACA SERRANIA. NIT. 901611702-2	**OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**	VERSIÓN:
		FECHA: 2022-09-09

1. FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2022 | 2. PLAZO: SIETE (7) MESES | 3. INICIO: 11/08/2022 | 4. TERMINACIÓN: 11/03/2023

Cronograma de ejecucion

	ACTIVIDAD	Unid	Cant	V. UNIT	V. TOTAL	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO - MES 2	% EJECUTADO MES 2
						11/08/2022 - 11/09/2022	11/09/2022 - 11/10/2022	11/10/2022 - 11/11/2022	11/11/2022 - 11/12/2022	11/12/2022 - 11/01/2023	11/01/2023 - 11/02/2023	11/02/2023 - 11/03/2023		
1	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL	HA	480	$ 8.500.136,00	$ 4.080.065.280									
2	AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR	KM	78,24	$ 13.886.088,00	$ 1.947.327.926									
3	TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES	Global	1	$ 12.554.618,00	$ 12.554.618									
4	REALIZAR MONTAJE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS	Global	1	$ 52.957.300,00	$ 52.957.300									
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 5.192.564.723									
	ADMINISTRACION	%	22,62%		$ 1.185.020.858									
	IMPREVISTOS	%	1,20%		$ 51.929.047									
	UTILIDAD	%	4,00%		$ 207.716.189									
	IVA (Sobre la Utilidad)	%	19,00%		$ 39.466.076									
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 1.484.132.170									
	TOTAL COSTOS DEL CONTRATO				$ 6.677.036.893									

VALOR EJECUTADO MESES	$ 212.018.881	$ 304.300.281					$ 516.319.162	7,73%
% EJECUTADO MESES	3,18%	4,56%						7,73%


2.4 PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO AL MES 2

Nota 1. Al cuadro se le podrán adicionar las filas necesarias para insertar el presupuesto. El presente presupuesto debe ser acumulativo

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados).	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO ($)	V/TOTAL($)	EJECUTADO PRESENTE MES 2 ($)	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL ACUMULADO	POR EJECUTAR
	COSTOS DEL ESTABLECIMIENTO								
1	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL PROTECTORA	HA	480,0	8.500.136	4.080.065.280	-	-	-	4.080.065.280
2	AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR	KM	78,2	13.386.088	1.047.327.525	80.316.528	-	80.316.528	967.010.997
3	TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES	GB	1,0	12.554.618	12.554.618	3.138.655	-	3.138.655	9.415.964
4	REALIZAR MONTAJE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS	GB	1,0	52.957.300	52.957.300	8.826.217	-	8.826.217	44.131.083
	Subtotal COSTOS DIRECTOS				**5.192.904.723**	**92.281.399**	**$ -**	**$ 92.281.399**	**$ 5.100.623.324**
	COSTO DIRECTO				**$ 5.192.904.723**	**$ 92.281.399**	**$ -**	**$ 92.281.399**	**$ 5.100.623.324**
	Administración		22,82%		$ 1.185.020.858	$ 169.288.694	$ 169.288.694	$ 338.577.388	$ 846.443.470
	Imprevistos		1,00%		$ 51.929.047	$ 7.418.435	$ 7.418.435	$ 14.836.871	$ 37.092.177
	Utilidad		4,00%		$ 207.716.189	$ 29.673.741	$ 29.673.741	$ 59.347.483	$ 148.368.706
	I.V.A Sobre Utilidad		19,00%		$ 39.466.076	$ 5.638.011	$ 5.638.011	$ 11.276.022	$ 28.190.054
	COSTO INDIRECTO				**$ 1.484.132.170**	**$ 212.018.881**	**$ 212.018.881**	**$ 424.037.763**	**$ 6.160.717.731**
	COSTO TOTAL				**$ 6.677.036.893**	**$ 304.300.281**	**$ 212.018.881**	**$ 516.319.162**	**$ 6.160.717.731**
	PORCENTAJE(%) DE AVANCE				**100,00%**	**4,56%**	**3,18%**	**7,73%**	**92,27%**

2.5 SEGUIMIENTO AL AVANCE PRESUPUESTAL DE OBRA

PERIODO (NUMERO DE MES REPORTADO)	VALOR PROGRAMADO MES	VALOR EJECUTADO MES	PROGRAMADO %	EJECUTADO %	DIFERENCIA (%)
1	$ 215.157.536	$ 212.018.881	3,27%	3,18%	-0,1%
2	$ 1.162.687.859	$ 304.300.281	17,41%	5%	-12,9%
3					
4					
5					
6					
7					
TOTAL	**$ 1.377.845.395**	**$ 516.319.162**	**20,68%**	**7,73%**	**-12,95%**

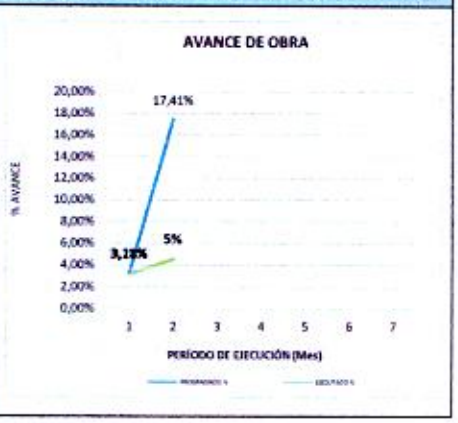

2.6 CTIVIDADES EJECUTADAS EN ELPERIODO DEL PRESENTE INFORME; MES DOS (02).

En este periodo se realizaron las siguientes actividades de ejecucion fisica:

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Localizacion	Coordenadas Geograficas	
2	**AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR** Durante el periodo del presente informe, esta actividad del presupuesto del contrato, alcanzo un avance de: dieciseis (16), Kilómetros lineales de aislamiento a través de cercado con postes de madera y alambre de púas. Lo cual representa un área aislada de 590 Hectáreas, de las cuales 260, serán establecidas con plantación forestal protectora con la ejecución del Convenio de asociación, y las restantes 330, se consideran como áreas de restauración pasiva o generación espontánea, de acuerdo a la siguiente información: Los postes de madera utilizados para el aislamiento son de eucalipto o pino provenientes de plantaciónes forestales, las cuales cuentan con el respectivo permiso de aprovechamiento y movilización para los postes,estos cuentan con un diámetro mínimo de 10 Cms, hincados cada 2,5 metros y pie de amigos ubicados cada 30 mts en línea recta o cuando la cerca cambie de dirección.	KM	6,00	Municipios De Codazzi, Cesar.		
3	**TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES** El día Veinticuatro (24) de septiembre de 2022, se desarrolló una jornada de **SOCIALIZACION, Y DIVULGACION DEL PROYECTO,** siendo este el primer taller, de los cuatro contemplados en la ejecución del Contrato, dirigido principalmente a los beneficiarios del proyecto, en su carácter de propietarios o tenedores, asi mismo a los lideres sociales de las zonas a intervenir, como tambien a los demas agentes sociales e institucionales que intervienen en los Municipos beneficiarios del proyecto. Los temas tratados en la jornada de taller se relacionaron con: • **PRESENTACION DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO.** VER: ANEXOS.	Taller	1,00	Municipio De Codazzi, 24/9/2022, Sede APROCODA.		
4	REALIZAR MONTAJE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS Teniendo en cuenta que el área a intervenir se encuentra en un amplio rango altitudinal, y en concordancia con lo contemplado presupuestalmente en el CONTRATO, se procedió por parte de la U.T BERACA SERRANIA, al establecimiento de una parcela de monitoreo y seguimiento, localizada en la vereda Sabana Rubia, del Municipio de Manaure, Cesar, con una altura superior a los 2.600 m.s.n.m. La parcela se estableció con un tamaño de 50 X 20, esto con el fin de poder medir la adaptación de las especies con las diferentes condiciones climáticas y atmosféricas, en la zona de intervención. El monitoreo permite: • Proporcionar un ecosistema de referencia que no necesariamente debe ser prístino sino en condiciones aceptables con el fin de establecer su estructura y composición para evaluar el comportamiento de un ecosistema a través del tiempo. • Medir y evaluar periódicamente las variaciones poblacionales de las especies nativas de la zona con el fin de conocer su comportamiento a través del tiempo. • Detectar tendencias no deseadas con el fin de modificar las acciones que se están realizando. **Objetivos** **Objetivo General** • Determinar los cambios ocurridos en el ecosistema como resultado de las estrategias de restauración activa empleadas en el proyecto. **Objetivos Especificos.** • Identificar las especies de mejor adaptación mediante la determinación de	Unidad	1			

	Tasa de Crecimiento •Determinar las especies de Menor mortalidad •Determinar las especies de mayor crecimiento en altura • Determinar el impacto de las labores de restauración en el caudal de rios en el área de influencia directa del proyecto. **ESTRATEGIA DE MONITOREO.** Al respecto de esta alternativa podemos sintetizar que existen 2 tipos de monitoreo el de corto plazo o de implementación y el de largo plazo o de efectividad. El monitoreo de implementación o de corto plazo persigue como objetivo principal la evaluación de la efectividad de los tratamientos o acciones de restauración empleadas tal y como fueron diseñadas, identificando los cambios en el ecosistema inmediatamente después de implementadas. Este seguimiento de los primeros cambios en el ecosistema en restauración, permite determinar si la estrategia de restauración implementada está cumpliendo con el objetivo propuesto, permitiendo el ajuste en el corto plazo de las estrategias de restauración. Evitando la pérdida de esfuerzo y recursos. Para el caso de este proyecto se plantea realizar el monitoreo en etapas tempranas posteriores a la implementación (1 cada año). VER: ANEXO.						

2.7 Logros, afectaciones y dificultades aspectos administrativos, ambientales, sociales, municipales, juridicos, técnicos o financieros del proyecto

Se continua con el desarrollo de las labores de socializacion en el terreno, Se da inicio a las labores de ejecucion fisica del contrato a traves delaislamiento de areas a restaurar, a traves de las cantidades y especificacions tecnicas de cerca contemplada en el presupuesto del proceso de contratacion.

2.8 OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME:

Informar a **CORPOCESAR**, por medio de la Interventoria contratada, el avance en el desarrollo del objeto contractual, en el periodo comprendido entre el 11/09/2022, y el 11/10/2022, correspondiente al **MES DOS (2)**, del plazo contractual, dando cumplimiento a lo establecido en la **CLÁUSULA OCHO**. Obligaciones particulares del contratista.

2.9 PLANES DE CONTINGENCIA

No aplican para el periodo del informe.

2.10 RELACION DE PREDIOS INTERVENIDOS EN EL PERIODO DEL INFORME.

2	AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.

RELACION DE PREDIOS CON AISLAMIENTO (CERCA) - AVANCE MES 2

			INFORME MES 2		ACUMULADO ANTERIOR (MES 01)		TOTAL AVANCE (MES 1+2)	
ITEM	ACTIVIDAD	PREDIOS	METROS	KILOMETROS	METROS	KILOMETROS	METROS	KILOMETROS
2.	AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR	PREDIO EL DIAMANTE BAJO (ARRIBA).	3.141	3,14	0,00	0,00	3.141	3,14
		PREDIO EL DIAMANTE BAJO	1.000	1,00	0,00	0,00	1.000	1,00
		PREDIO PARCELA PABLO	300	0,30	0,00	0,00	300	0,30
		CERCADO ARROYO DE AGUA	1.559	1,56	0,00	0,00	1.559	1,56
	TOTAL		6.000	6,00	0,00	0,00	6.000	6,00

3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO - MES DOS (2)			4. AVANCE FISICO MES DOS (2).	
DESCRIPCION	VALOR	%	DESCRIPCION	
Valor contratado	$ 6.677.036.893	100%	Avance fisico del periodo MES 2	4,56%
Valor Ejecutado Acumulado periodo anterior	$ 212.018.881	3,18%	Avance fisico acumulado	7,73%
Valor Ejecutado en el periodo	$ 304.300.281	4,56%	Avance fisico Faltante por Ejecutar	92,27%
Valor Ejecutado Acumulado	$ 516.319.162	7,73%		
Valor por Ejecutar	$ 6.160.717.731	92,27%		

5. AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO. - MES DOS (2)

El presente informe actualizado de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022**. Corresponde al periodo comprendido entre el 11 de septiembre, de 2022, hasta el 11 de octubre de 2022, informe correspondiente al mes Dos (2); en el cual se informa por parte del contratista y se certifica por parte de la interventoria un avance parcial en el periodo del **4,56%** , y una cifra acumulada del porcentaje de avance ejecutado a la fecha del **7,73%**, quedando por ejecutar el **90,26%**.

6. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL - MES DOS (02)					
Tiempo Plazo (meses):	7,00	100%			
Tiempo Plazo transcurrido (meses):	2,00	28,6%			
% del Tiempo del Plazo (meses) faltante:	5,00	71,4%			

7. JUSTIFICACIÓN DEL BALANCE DE EJECUCIÓN.

La cifra del balance arrojado por la ecuación; porcentaje de avance Programado para el mes Dos (02), de un **17,41%**, versus porcentaje de valor ejecutado Acumulado, de un **7,73%** para este periodo de informa refleja un **ESTADO NORMAL DE EJECUCION**, (ver hoja inicial), arrojando un relativo Equilibrio en la ejecucion del contrato propuesto por el contratista **UNION TEMPORAL BERACA SERRANIA**. EN su programa o cronograma de ejecucion propuesto por el contratista, y aprobado por la Interventoria **CONSORCIO DE INTERVENTORIAS PERIJA**.

8. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.

En cumplimiento de su propuesta tecnica, el contratista **UNION TEMPORAL BERACA SERRANIA**, cuenta con el siguiente personal profesional para el desarrollo del contato de la referencia, en las condiciones exigidas por el contratante en su pliego de condiciones.

NOMBRE	PROFESION	T.P	CARGO
ANTONIO RUDAS MUÑOZ	Ingeniero Forestal con posgrado en áreas forestales.	MATRICULA PROFESIONAL 03000-18847 desde el 25 de Julio de 2000	DIRECTOR DE PROYECTO/OBRA
LIZET JIMENA ROBAYO ROCHA	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal	MATRICULA PROFESIONAL 03000-23603 - 16/02/2007	RESIDENTE
MAURICIO LOPEZ RUIZ	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal	MATRICULA PROFESIONAL 6063 - 20/09/1983	RESIDENTE
RICARDO DURAN PEREZ	Ingeniero Geologo	MATRICULA PROFESIONAL 071232-0524250 CES	PROFESIONAL EXPERTO SIG

9. FUENTE DE FINANCIACION.

ENTIDAD	DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	VALOR	DEPENDENCIA
CORPOCESAR (FONAM)	Certificado de disponibilidad	1622	18/05/2022	$ 6.677.036.893	coordinador del GIT para la gestión financiera

10. CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO.

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**		Póliza No: 47-44-101021021		
DESCRIPCION DEL RIESGO	**VALOR ASEGURADO**	VIGENCIA		
		Desde	**Hasta**	**Observaciones**
Cumplimiento	$ 6.677.036.893	14/07/2022	14/08/2023	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 3.338.518.446	14/07/2022	14/08/2023	
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:	$ 6.677.036.893	14/07/2022	14/02/2026	
Estabilidad de la obra	$ 6.677.036.893	14/07/2022	14/02/2025	
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**		Póliza No: 47-40 -101006346		
DESCRIPCION DEL RIESGO	**VALOR ASEGURADO**	VIGENCIA		
		Desde	**Hasta**	**Observaciones**
Predios Laborales, y Operaciones	$ 300.000.000	14/07/2022	14/03/2023	

11. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
1	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL PROTECTORA	HA	480
2	AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR	KM	78.24
3	TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES	Global	1
4	REALIZAR MONTAJE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS	Global	1

12. CONDICIONES DE PAGO DEL CONTRATO.

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes:
Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de contrato. El anticipo se amortizará en el porcentaje otorgado de las actas de ejecución de los trabajos y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación. Actas de pago parciales mensuales aprobadas por el Interventor, y supervisor de acuerdo con lo pactado, y corresponderán al valor que resulte de multiplicar las cantidades de las actividades ejecutadas por los precios unitarios, hasta el 90% del valor total del contrato. Para cancelar la primera acta Parcial es necesario un avance mínimo del 50% del total contratado. El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de los trabajos y con el recibido a satisfacción por parte de la Interventoria asignada por **LA ENTIDAD**. Este último pago se efectuará una vez El Contratista adjunte y cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley y se firme la respectiva acta de liquidación.

13. ACTAS Y REUNONES PARA LA EJECUCION - MES DOS (2).

No	DESCRIPCION	FECHA		No	DESCRIPCION	FECHA
1	Acta de inicio	11/08/2022		4.		
2	Comité de Obra	5/09/2022		5.		
3.				6.		

observaciones:

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DEL CONTRATO MES DOS (2).



Imagen 1. **ADMINISTRACION**, suministro e instalacion de Valla informativa, Municipio de San Diego.



Imagen 2. TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES; taller desocializacion. Codazzi, 24/9/2022.



Imagen 3. TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES, taller desocializacion, Codazzi, 24/9/2022.



Imagen 4. TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES; taller desocializacion, Codazzi, 24/9/2022.



Imagen 5. **TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES; taller desocializacion, Codazzi, 24/9/2022.**



Imagen 6. TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES; taller desocializacion, Codazzi, 24/9/2022.

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DEL CONTRATO MES DOS (2).



Imagen 7. AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR; Acopio de Materiales e insumos.



Imagen 8. AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR; transporte de Materiales e insumos.



Imagen 9. AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR; Socializacion personalizada prdio a predio



Imagen 10. AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR; transporte de Materiales e insumos.



Imagen 11. REALIZAR MONTAJE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS ; establecimiento de parcelas de Monitoreo.



Imagen 12. REALIZAR MONTAJE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS ; establecimiento de parcelas de Monitoreo.

14. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DEL CONTRATO MES DOS (2).



Imagen 13. **ADMINISTRACION (22.82%)** ; campamento provisional. Codazzi(Paramos).



Imagen 14. **AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR**; cerca, municipio de San Diego, Cesar.



Imagen 15. **AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR**; cerca, municipio de San Diego, Cesar.





Imagen 16 **AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR**; cerca, municipio de Codazzi.



Imagen 14. **AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR**; cerca, municipio de Codazzi.



Imagen 14. **AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR**; cerca, municipio de Codazzi.

Elaboró:	Aprobó:
RUBEN ESTRADA GAMEZ	WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO
R.L UNION TEMPORAL BERACA SERRANIA	R.L CONSORCIO INTERVENTORIAS PERIJA
CONTRATISTA	INTERVENTORIA CONTRATADA
Proyectó: (Nombres y Apellidos)	Revisó: (Nombres y Apellidos)

INFORME DE AVANCE MES DOS (02)

CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022

UT Beraca Serrania

CORPOCESAR

OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**

CUADRO DE AVANCE PRESUPUESTAL - INFORME MENSUAL DOS (02).

Diagonal 6Bis No 13-37 Barrio los Ángeles
Teléfono: 5814560 Celular: 3145328821 **e- mail: proasecomltda@hotmail.com**
Valledupar – Cesar

CORPOCESAR	**ANEXO 1. CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES OBRA - MES DOS (2).**		
	Corresponde al Informe Mensual de avance de Actividades No.	**DOS (02)**	**Periodo del Informe:**
	Nombre del proyecto:	**OBJETO DEL CONTRATO:** IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.	

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA						**MODIFICACIONES DEL CONTRATO** (Describa las cantidades y valores unitarios ajustados, los cuales no podrán incurrir en incrementos del presupuesto total aprobado. En caso de no requerir modificaciones, estos valores deben ser iguales a las cantidades y valores aprobados del proyecto)			
ITEM	**DESCRIPCIÓN** (Corresponde a los ítems o productos aprobados)	**UND**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**MAYOR O MENOR CANTIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
	COSTOS DEL ESTABLECIMIENTO								
1	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION FORESTAL PROTECTORA	HA	480,00	8.500.136	4.080.065.280				
2	AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR	KM	78,24	13.386.088	1.047.327.525				
3	TALLERES DE SOCIALIZACION Y CAPACITACIONES	Global	1	12.554.618	12.554.618				
4	REALIZAR MONTAJE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS	Global	1	52.957.300	52.957.300				
	TOTAL COSTO DIRECTO				**5.192.904.723**				
	COSTO INDIRECTO	%							
	ADMINISTRACION (22,82%)	%	22,82%		$ 1.185.020.857,82				
	IMPREVISTOS (1%)	%	1,00%		$ 51.929.047,23				
	UTILIDAD 4%	%	4,00%		$ 207.716.188,92				
	IVA 19% (Sobre la Utilidad)	%	19,00%		39.466.076				
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**1.484.132.170**				
	TOTAL COSTOS PROYECTO				**6.677.036.893**				

11/08/2022 - 11/09/2022	**LA CORPORACION:**	**CORPOCESAR**	**LP No. 003 de 2022**	UT Beraca Serrania
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BERACA SERRANIA - R.L: RUBEN ESTRADA GAMEZ	**CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022**	

EJECUCIÓN DEL PROYECTO								**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
CANTIDADES (UN)			**VALORES ($)**			**SALDOS -FALTANTE POR EJECUTAR**			
ACUMULADO MES 01:	**PRESENTE MES 02**	**TOTAL AVANCE**	**ACUMULADO MES 01:**	**PRESENTE MES 02**	**TOTAL ACUMULADO 1+2**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**APORTES FONAN ($)**	**CORPOCESAR**
0,00	0,00	0,00	$ -	-	-	480,00	4.080.065.280		
0,00	6,00	6,00	$ -	80.316.528	80.316.528	72,24	967.010.997		
0,00	0,250	0,250	$ -	3.138.655	3.138.655	0,750	9.415.964		
0,00	0,167	0,167	$ -	8.826.217	8.826.217	0,833	44.131.083		
			$ -	**92.281.399**	**92.281.399**		**5.100.623.324**	**5.192.904.723**	
3,26%	3,26%	6,52%	169.288.694	169.288.694	338.577.388		846.443.470		
0,14%	0,14%	0,29%	7.418.435	7.418.435	14.836.871		37.092.177		
0,57%	0,57%	1,14%	29.673.741	29.673.741	59.347.483		148.368.706		
2,71%	2,71%	5,43%	5.638.011	5.638.011	11.276.022		28.190.054		
			212.018.881	**212.018.881**	**424.037.763**		**1.060.094.407**	**1.484.132.170**	
			212.018.881	**304.300.281**	**516.319.162**		**6.160.717.731**	**6.677.036.893**	
			3,18%	**4,56%**	**7,73%**		**92,27%**	**100,00%**	

INFORME DE AVANCE MES DOS (02)

CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022

UT Beraca Serrania

CORPOCESAR

OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**

RELACION DE PREDIOS INTERVENIDOS (AISLAMIENTO) - INFORME MENSUAL DOS (02).

Diagonal 6Bis No 13-37 Barrio los Ángeles
Teléfono: 5814560 Celular: 3145328821 **e- mail: proasecomltda@hotmail.com**
Valledupar – Cesar

INFORME DE AVANCE MES DOS (02)

CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022

OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.

RELACION DE PREDIOS CON AISLAMIENTO (CERCA) - AVANCE MES 2

			INFORME MES 2		ACUMULADO ANTERIOR (MES 01)		TOTAL AVANCE (MES 1+2)	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**PREDIOS**	**METROS**	**KILOMETROS**	**METROS**	**KILOMETROS**	**METROS**	**KILOMETROS**
2.	AISLAMIENTO DE AREAS A RESTAURAR	PREDIO EL DIAMANTE BAJO (ARRIBA).	3.141	3,14	0,00	0,00	3.141	3,14
		PREDIO EL DIAMANTE BAJO	1.000	1,00	0,00	0,00	1.000	1,00
		PREDIO PARCELA PABLO	300	0,30	0,00	0,00	300	0,30
		CERCADO ARROYO DE AGUA	1.559	1,56	0,00	0,00	1.559	1,56
	TOTAL		**6.000**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000**	**6,00**

Diagonal 6Bis No 13-37 Barrio los Ángeles
Teléfono: 5814560 Celular: 3145328821 **e- mail:** proasecomltda@hotmail.com
Valledupar – Cesar

INFORME DE AVANCE MES DOS (02)

CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022


UT Beraca Serrania

CORPOCESAR

OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**

MAPAS DE PREDIOS INTERVENIDOS (AISLAMIENTO) - INFORME MENSUAL DOS (02).

Diagonal 6Bis No 13-37 Barrio los Ángeles
Teléfono: 5814560 Celular: 3145328821 **e- mail:** proasecomltda@hotmail.com
Valledupar – Cesar

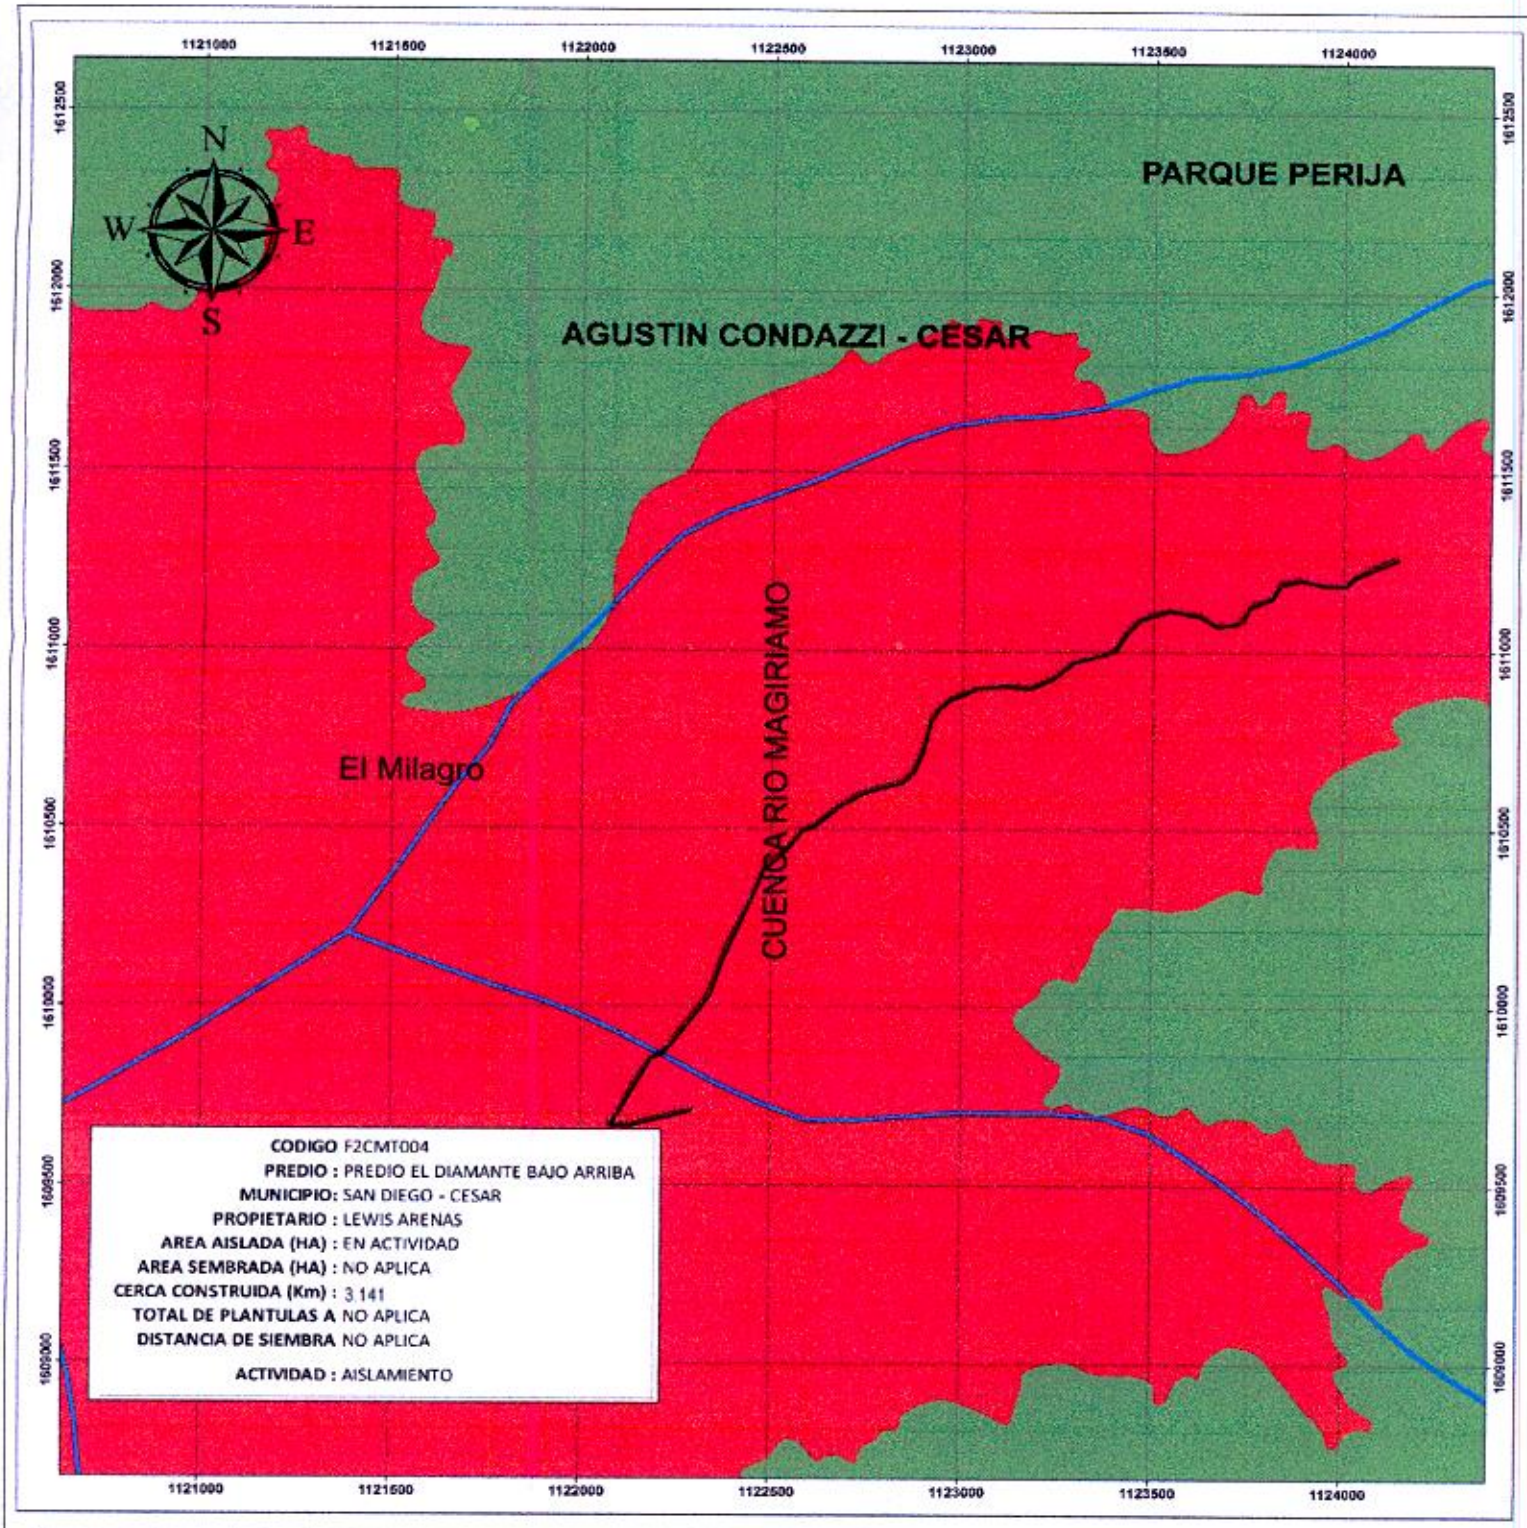

CONSORCIO INTERVENTORIAS PERIJÁ

UT Beraca Serrania

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATEGICO EN LA SERRANIA DEL PERIJÁ FASE II.

TITULO DEL MAPA

AISLAMIENTO PREDIO
EL DIAMANTE BAJO ARRIBA

0 0.25 0.5 1 Km

LEYENDA

- AREA SEMBRADA
- PARQUE PERIJA
- ZONA DE INTERVENCION
- CUENCA

CONVENCIONES

- Vias Dep cesar
- Río Cesar
- CERCA NUEVA



22

ELABORÒ
Equipo SIG UT BERACA SERRANIA
REVISÒ
Equipo tecnico UT BERACA SERRANIA
FECHA
Octubre de 2022



CONSORCIO INTERVENTORIAS PERIJÁ

UT Beraca Serrania

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

LEYENDA

- AREA SEMBRADA
- PARQUE PERIJA
- ZONA DE INTERVENCION
- CUENCA

CONVENCIONES

- Vias Dep cesar
- Río Cesar
- CERCA EXISTENTE
- CERCA NUEVA




IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATEGICO EN LA SERRANIA DEL PERIJÁ FASE II.

TITULO DEL MAPA

AREA AISLADA PREDIO PARCELA PABLO

0 0,02 0,04 0,08 Km

ELABORÒ
Equipo SIG UT BERACA SERRANIA
REVISÒ
Equipo tecnico UT BERACA SERRANIA
FECHA
Octubre de 2022

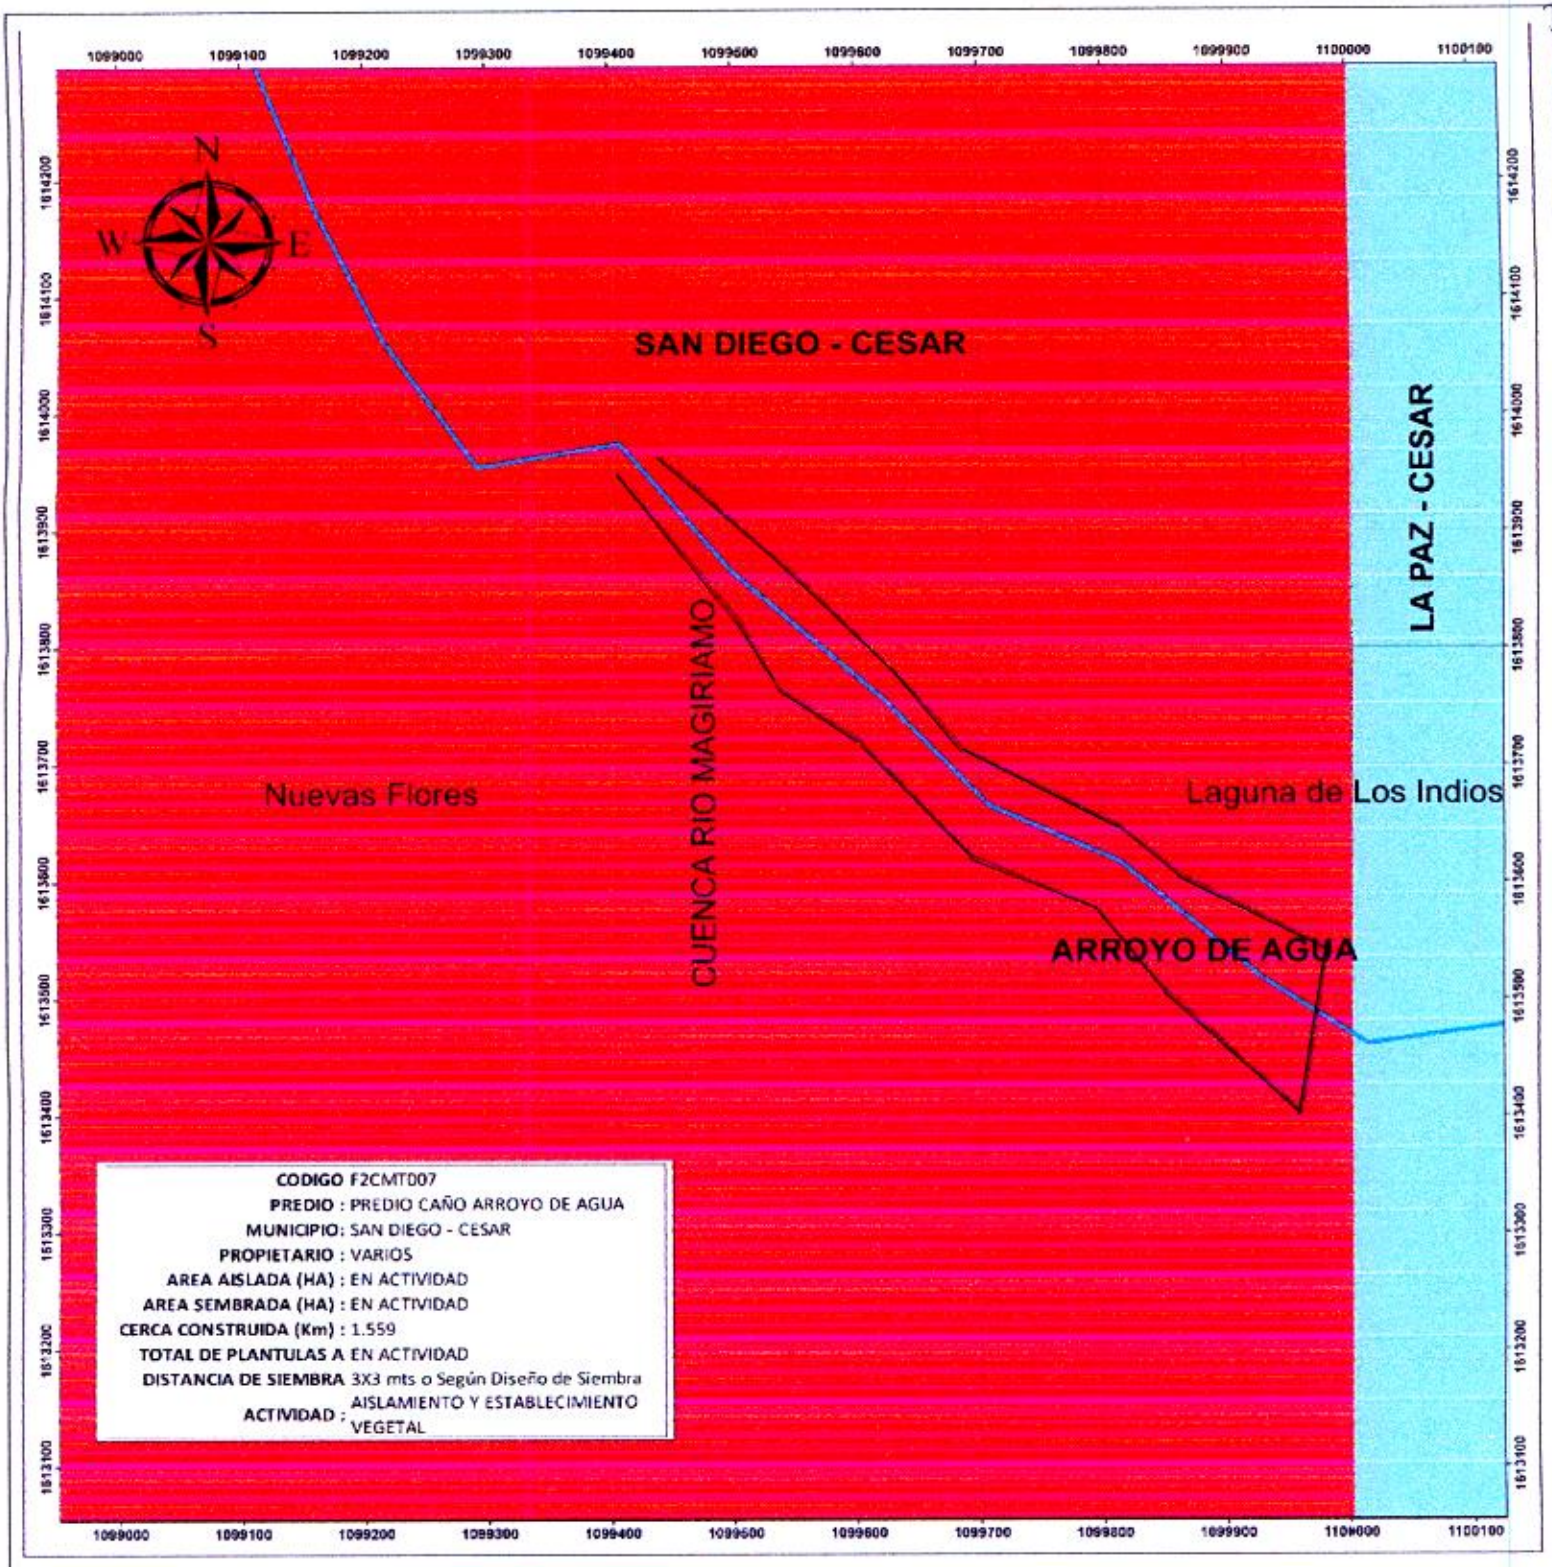

CONSORCIO INTERVENTORIAS PERIJÁ

UT Beraca Serrania


CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

LEYENDA

- AREA SEMBRADA
- PARQUE PERIJA
- ZONA DE INTERVENCION
- CUENCA

CONVENCIONES

- Vias Dep cesar
- Río Cesar
- CERCA NUEVA

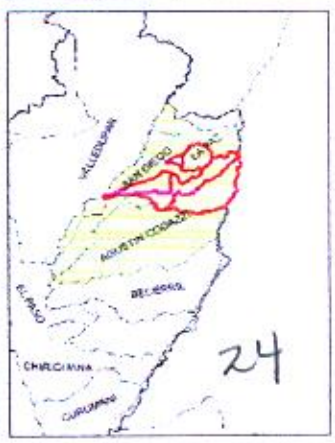

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATEGICO EN LA SERRANIA DEL PERIJÁ FASE II.

TITULO DEL MAPA


AVANCE AISLAMIENTO ARROYO DE AGUA SAN DIEGO CESAR

0 0.075 0.15 0.3 Km

ELABORÓ
Equipo SIG UT BERACA SERRANIA

REVISÓ
Equipo tecnico UT BERACA SERRANIA

FECHA
Octubre de 2022

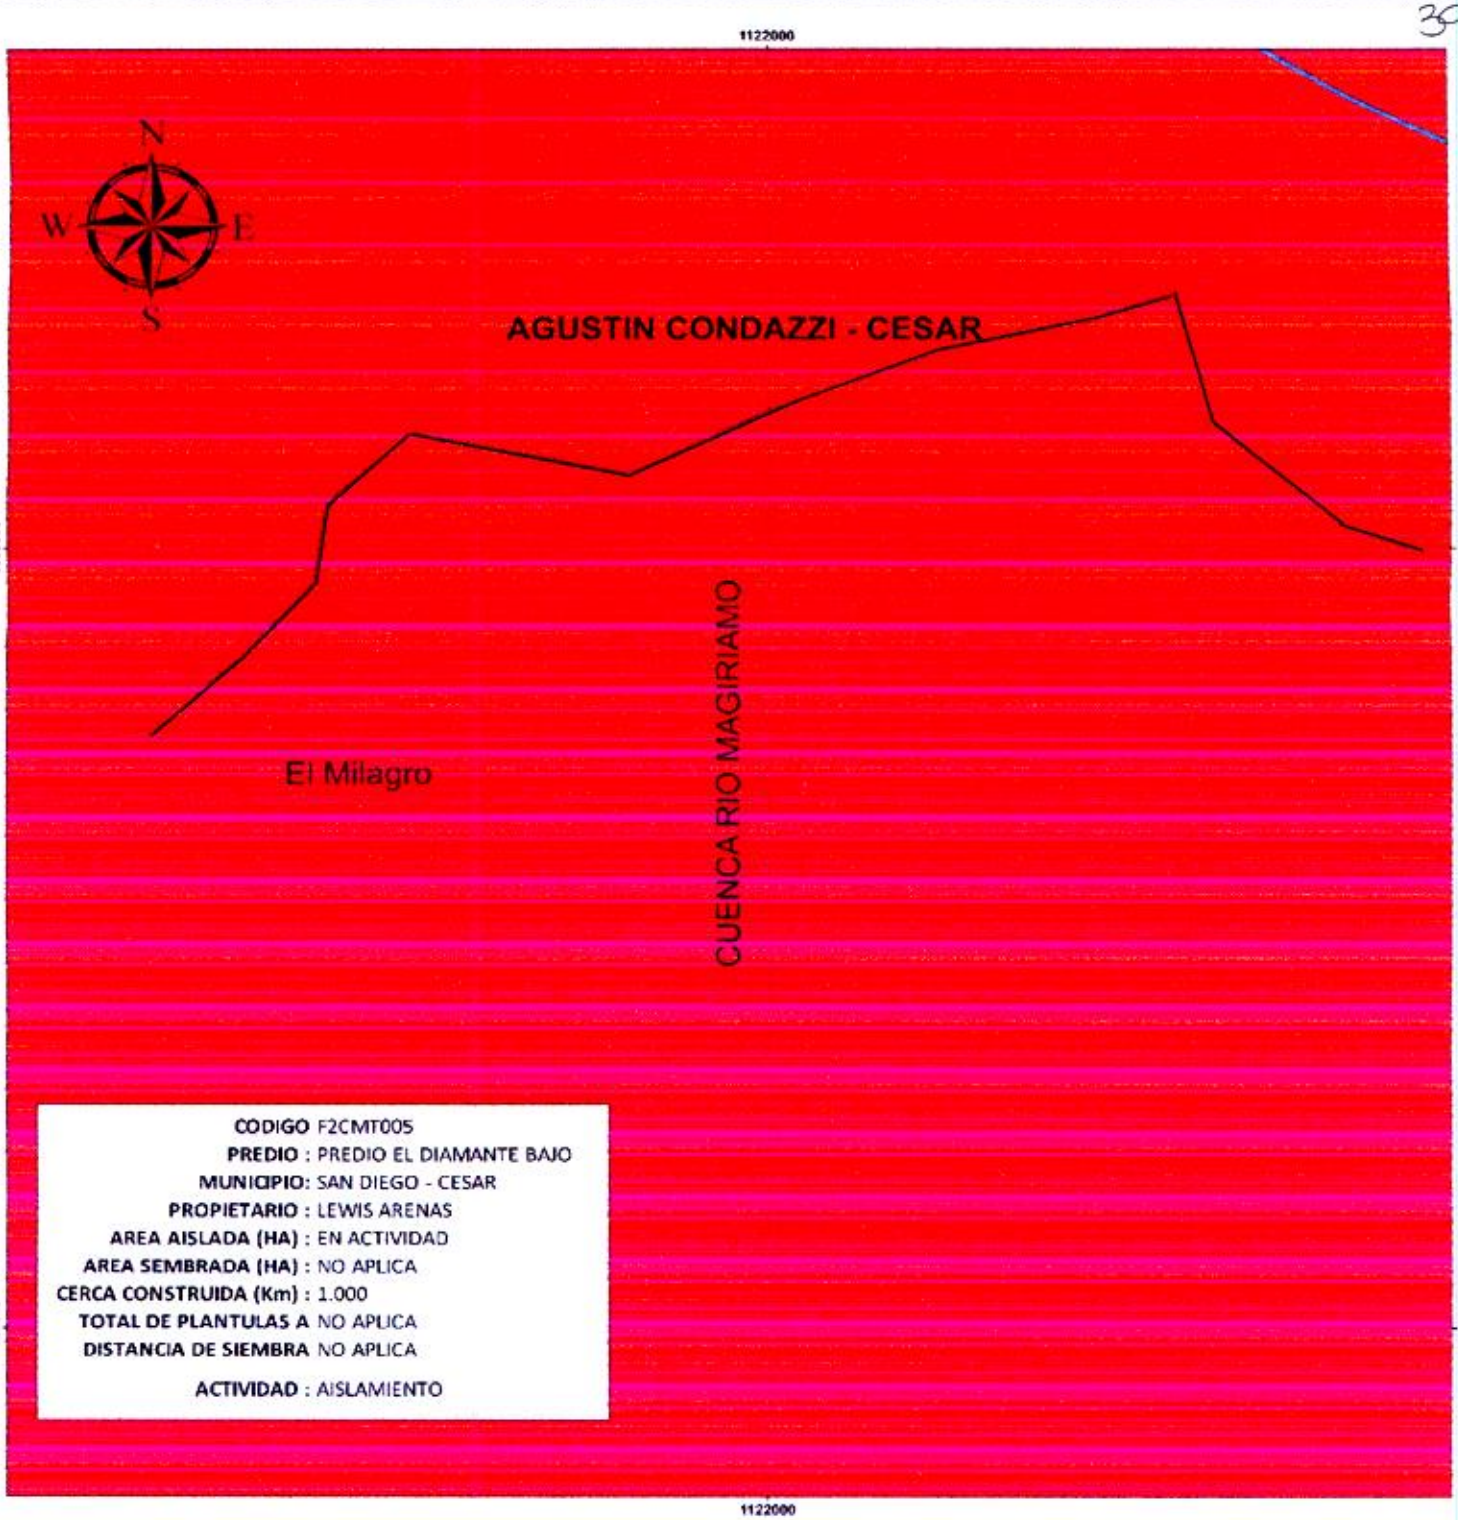

CONSORCIO INTERVENTORIAS PERIJÁ

UT Beraca Serrania

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATEGICO EN LA SERRANIA DEL PERIJÁ FASE II.

TITULO DEL MAPA

AISLAMIENTO PREDIO EL DIAMANTE BAJO

0 0,05 0,1 0,2 Km

LEYENDA

- AREA SEMBRADA
- PARQUE PERIJA
- ZONA DE INTERVENCION
- CUENCA

CONVENCIONES

- Vias Dep cesar
- Rio Cesar
- CERCA NUEVA



25

ELABORÓ
Equipo SIG UT BERACA SERRANIA
REVISÓ
Equipo tecnico UT BERACA SERRANIA
FECHA
Octubre de 2022

INFORME DE AVANCE MES DOS (02)

CONTRATO DE OBRA No: 19-6-0187-0-2022 - FECHA: 14/07/2022

UT Beraca Serrania

CORPOCESAR

OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II.**

COPIA DE LA BITACORA - INFORME MENSUAL DOS (02).

Diagonal 6Bis No 13-37 Barrio los Ángeles
Teléfono: 5814560 Celular: 3145328821 **e- mail: proasecomltda@hotmail.com**
Valledupar – Cesar

Fecha 10/09/2022.

la Union temporal Beraca semania sigue en la busqueda de predios en la cuenca rio bocaimo

V.B.

Fecha 11/09/2022

No se labora

Fecha 12/09/2022

se inicia comite tecnico interno siendo las 8:00 Am con el siguiente orden del dia:

Bienvenido

Tema: reunion con corpocesar

fin del comite

siendo las 10:30 se da por terminado el comite tecnico. en el cual se determina porcentaje y especies a sembrar de igual manera se da la orden del inicio del cercado en la parte baja de la cuenca en la vereda arroyo de agua.

V.B.

Powered by CamScanner

Fecha 13/09/2022.

Siendo las 9:00 Am en las instalaciones de Corpocesar se reunen la Union Temporal Beraca Serranio, consorcio se interventoria perito personal tecnico y Corpocesar

se expone la necesidad de ejecucion del 98% en la zona alta y el 2% en la zona baja, se expone la solicitud de la comunidad de la reforestacion de estas areas.

Corpocesar expone la necesidad de visitar el area mensionada; de igual manera esta deacuerdo con la introducion de material vejetal endemico de la zona; de igual manera deja evidencia que oficializara la decisoo tomada. respecto a las area expuestas

13/04/22 Para Constancia se Firma acta de asistencia. V°B°

Fecha 14/09/2022

la Union Temporal Beraca Serrania realiza labores administrativo; de igual manera concreta mano de obra no calificada para la ejecucion de Actividades de cercado

se da inicio al cercado. ✓

V°B°

28

Powered by CamScanner

Fecha 15/09/2022.

la Unión temporal Berolca sorrania realiza la invitacion al primer taller. el cual se llevara acaba en el municipio de codazzi se realiza la invitacion a corpocesar, interventoria. de igual manera se le realiza la invitacion a las respectivas entidades publicas y privadas del sector.

15/09/22 Se recibe invitacion al Primer taller de Capacitación #1 V.B.

Fecha 16/09/2022

se sigue con la labor de invitacion a los diferentes entes que hacen o estan dentro de la zona de ejecucion del proyecto.
se realiza logistica en la busqueda del sitio; se visita al municipio de codazzi se establece el sitio "prodoca"

16/09/22 Se evidencia la entrega #2 V.B. de invitacion al taller.

Fecha 17/09/2022

No se labora, en la cuidad no hubo flujo de energia durante toda la Jornada Laboral

Fecha 18/09/2022

No se labora.

Powered by CamScanner

19 Fecha 19/09/2022.

siendo la 8:00 AM se da inicio al comite tecnico interno.
se expone la preocupacion por el no inicio de las Actividades principales. siembra y aislamiento.

19/09/2022 La interventoria Recomienda que se de inicio inmediato al aislamiento, ya que se cuenta con el material y parte del equipo de mano de obra.

V.B.

Fecha 20/09/2022.

personal tecnico de la Union temporal Berraco serrania. realiza visita tecnica predios ubicado en la Vereda arroyo de agua realiza recorrido al arroyo de interes estrategico

se presenta informe tecnico de seguimiento se oficializa a la corporacion visita tecnica los dias 27-28-29 a la serrania del perija zona sabana rubio; de la misma manera se realiza la invitacion a la interventoria.

V.B.

Fecha 21/09/2022

se sigue con el reconocimiento y acercamiento de las areas a intervenir concientizando a la comunidad de la importancia de estos proyectos.

V.B.

Powered by CamScanner

Fecha 22/09/2022.

equipo tecnico de la Union temporal Bonaca semana realiza recorrido por el area de intervencion.
el recorrido empieza desde el corregimiento de nueva flores tomando la via de calima en el que se evidencia abundante ganaderia.

V.o.B°

Fecha 23/09/2022.

se recibe la aprobacion por parte de la alcaldia del municipio de ~~[illegible]~~ san diego.

la corporacion autonoma Regional del cesar. muestra interes por visitar las areas a intervenir en la parte alta de la cuenca zona de paramo.

V.o.B°

Fecha 24/09/2022

siendo las 9:00 Am se da inicio al primer taller de socializacion con la participacion de los diferentes entes territoriales
se expone el siguiente orden del dia
Bienvenida.

Powered by CamScanner

ho oracion
intervencion representante legal
intervencion corporacion Autonoma Regional
del cesar, intervencion consorcio intervencion
perija, intervecion por parte del exponente
preguntas y respuestas a la comunidad.

se le expone a la comunidad el proyecto a realizar. cantidades y zonas a intervenir. se expone que la cantidad de Ha a sembrar seran de 480 Ha cada hectarea con 278 plantulas. y 78Km de cerca o aislamiento.

siendo los 10:30 se ofrece un refrigerio a los Asistentes. con un receso de 30 min

a las 11:00 Am se retoma con la socializacion en donde se abre espacio a la Asistentes para realizar Preguntas.

siendo la 1:30 pm se da por culminado la socializacion quedando la comunidad satisfecha por la llegada de este tipo de proyectos a la region.

* V/B.

24/09/22 Se hizo Presencia en el lugar y se evidencio la Realizacion del Primer taller de capacitacion de buena manera, se recomienda acatar las observaciones de algunos vecinos del Sector de la zona a intervenir.

32

* V/B.

Powered by CamScanner

Fecha 25/09/2022.

la Union temporal Beraca serrania cordina la logistica para la realizacion de la visita tecnica; cordino el transporte y alimentacion de los profesionales.

25/09/22 Se realizará acompañamiento a la visita tecnica.

* V.B.

Fecha 26/09/2022

la Union temporal Beraca serrania en condicion de ejecutor del proyecto. envia itinerario del viaje para conocimiento de compocesar y profecionales que participaran de la visita tecnica.
se realiza comite tecnico para la cordinacion del viaje establecida para verificacion de areas propuestas por la UT Beraca serrania.

* V.B.

Fecha 27/09/2022

equipo tecnico de la Union temporal Beraca serrania. se encuentran de visita tecnica.

* V.B.

Fecha 28/09/2022

equipo tecnico sigue de viaje en la visita tecnica de campo.

* V.B.

Powered by CamScanner

fecha 29/09/2022

equipo tecnico regresa junto con las profesionales de la corporacion Autonoma regional del cesar regren sin inconveniente de la visita realizado a las areas de intervencion.

se instala base para la instalacion de valla informativa del proyecto.

la corporacion de la mano del delegado da visto bueno para el inicio de la siembra

* V/V.B

fecha 30/09/2022

la Union Temporal Beraca serrania realiza la instalacion de la valla informativa.

coordina logistica para el establecimiento de material vegetal e inicios del aislamiento en el que dispone mas de 30 cuadrillas cada cuadrilla conformada con 5 persona

30/04/22 Se evidencia y se hace recomendación

* V/V.B.

fecha 01/10/2022

la Union Temporal Beraca serrania inicia cercado en la Vereda arroyo de agua con mas de 20 persona en la Actividad de aislamiento.

34

se cordina la llegada del personal al area destinada para intervencion

Powered by CamScanner

en la region conocido como zabana rubia finca el sinai

01/10/22 Se Revisan Postes y se solicita Cambiar 4 Postes en mal estado. * V.B.

- Se acata Recomendación de interventoria

fecha 02/10/2022

NO se laboro; por solicitud de la comunidad expresa en el taller de socialización. que se realizara una asesoria a los propietarios de predios que no estubieron presentes. en el taller #1

fecha 03/10/2022

se inicia comite tecnico siendo las 8:20 Am en el comite se expone la necesidad de inicio de transporte de madera al area establecida. iniciando por llevar alambre via san Jose sinai en transporte de mula.

se estable el inicio de siembra, teniendo en cuenta el abrazo en mas de un mes y medio y entendiendose la lluvias que se estan presipitando se hace nesesario el inicio de siembra lo mas pronto posible

el material a sembrar sera fraileones segun lo acordado

02/10/22 Se observa el reinicio de actividades en San Jose de Sinai y se evidencia la salida del material llevado en mulas de carga animal. * V.B.

Powered by CamScanner

Fecha 4/10/2022

se Recibe oficio de corpocesar en el que expresa las siguientes recomendacion dicho oficio va dirigido a interventoria con copia al contratista:
se solicita bajar el porcentaje de frailejon
se solicita el establecimiento de especies como el Pino romeron
se recomienda la intervencion de la cuenca en el municipio de la paz y proporcional al area de interes.

por parte de la Union temporal Beraca confirma el inicio de siembra con mas de 200 personas exclusivamente para la siembra con cuadrillas de 10@ personas

equipo tecnico supervisa el inicio de estas labores

4/10/22 Se acatarón Recomendaciones V.B°

Fecha 05/10/2022.

equipo tecnico perteneciente a la UT Beraca serrania realiza talle de capacitacion al personal en obra en el que explica lo siguiente: dimensiones de siembra; cada arbol o planta se sembrara cada 3mts o segun diseño presentado en el caso del frailejon este se sembrara por nucleos de individuos a una distancia de 45mts
el cercado se realizara cada 2.5mst de distancia entre poste y cada 33mts se instalara un pie de amigo o madrina.

Powered by CamScanner

la UT Beraca serrania sigue en la labor de transporte de material.

en la zona se evidencia fuertes lluvias en la hora de la mañana.

V.B.

Fecha 06/10/2022

la Union temporal Beraca serrania en su condicion de ejecutor realiza labores de socializacion tecnicas referentes la elaccion de actividades de cercado y siembra; razon por lo que realiza una jornada de socializacion con la comunidad del conocimiento de nuevas flores. en el que se expresa la necesidad de ejecutar un aislamiento y siembra en esta zona

la comunidad expresa el compromiso y de la necesidad de aislar el arroyo conocido como arroyo de agua.

se continua siembra en el predio denominado sinai del municipio de codazzi

V.B.

Fecha 07/10/2022

la Union temporal Beraca serrania continua con labores de siembra y aislamiento en los sectores denominados arroyo de agua y finca el sinai

se transporta los insumos y material a

Powered by CamScanner

las areas en ejecucion.

la ut Barroca servanio acata las sugerencias presentadas por corpoceso excepto la ejecucion de las actividades de siembra y aislamiento en el municipio de la paz
las razones son las siguentes: en reuniones con la comunidad y en respectivas visitas se evidencia fuerte actividad ganadera a esto se le suma el estudio previo aceptivo dicha zona. razon por la cual la union temporal realiza la respectiva respuesta con la radicacion del informe pertinente.
se evidencian fuertes lluvias en la zona

V.B.

fecha 08/10/2022.

la Union temporal Berdica servanio continua con labores de siembra y cercado en los predios de la finca el sinai y arroyo de agua con un promedio de 450 personas distribuidas entre cuadrilla que van de 5 a 10 personas.
cabe mencionar que el equipo tecnico supervisa dicha actividades
seguimiento de los precipitaciones muestran fuertes lluvias en el sector

V.B.

fecha 09/10/2022

no se labora.

Powered by CamScanner
