	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
183	Plazoleta San Francisco	8/NOV/22	8:00 A.M	12:00 P.M.
RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA				

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

→ Verificación de asistentes.

→ Informe avance de obra

→ Proposiciones y/o varios

→ Consolidación compromisos.

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 183.

En la plazoleta San Francisco se reunen delegados de supervisión, contratista de obra, interventoria y demás personas que firman la presente acta.

Pompeyano cra 10 con cll 16 ⇒ En cuanto al imprevisto de afectación a la propiedad del señor Roberto Gutierrez es de indicar que delegados de la empresa Veolia y la EBSA acordaron realizar actividades que involucran la conexión de la caja de la esquina sur-oriental a través de una tubería de 4" que conecte al pozo central de la vía y que funcione como desague. por lo anterio que retomen actividades correspondientes al proyecto Bicentenario.

- Por otra parte es de exponer que a la fecha se realizó la construcción de los sumideros conforme a lo dispuesto por Veolia, asi mismo se estan desarrollando actividades de conformación de subrasante y en la presente semana se realizará el suministro e instalación de base granular. Por lo cual se evidencia que a la fecha han sido superados cada uno de los imprevistos inherentes a las empresas de servicios publicos.

* Pompeyano cr 10 con cll 17

En este pompeyano la EBSA solicitó la instalación de 8 ductos de tubería en el cruce cll 17 costado oriental, para el anillado propuesto para la soterración de las redes electricas, actividad que se ha desarrollado parcialmente conforme al desarrollo y/o construcción por costados del pompeyano.

VEOLIA ⇒ se realizó la renovación de una sección de bovedo existente que conectaba al pozo contra, la construcción de un pozo nuevo y el confinamiento y/o relleno de un tramo de bovedo existente el cual Veolia decidió que no se encontraba en funcionamiento. Así mismo esta pendiente la entrega formal de dichas adecuaciones.

Movistar ⇒ realizó adecuaciones de caja con dimensiones aproximadas de 3x3, que representan la necesidad de reforzamiento de la losa en doble parrilla de 5/8" con separación de 20 cm, dado a lo existente y transito vehicular sobre la losa.

Dentro del proyecto bicentenario a la fecha se han realizado la construcción de sumideros, demoliciones y conformación por el costado norte, junto con los relleno de la bovedo encontrada, costos que no fueron asumidos por Veolia, así mismo la presente semana se realizara

actividades de suministro, instalación y compactación de base granular.

Pompeyano cr 10 con Cll 18

Veolia ⇒ se realizó en el tramo la renovación de un tramo de red sanitaria, ya que esta se encontraba funcionando mediante bovedas, se realizó la construcción de 2 pozos y conexiones pertinentes, adecuación de un pozo existente, de igual forma se realizó los rellenos de las bovedas encontradas y de las cuales no se tenía conocimiento aspecto que generó suspensión de las actividades del proyecto Bicentenario. Así mismo esta pendiente la entrega formal de dichas adecuaciones.

EBSA ⇒ en conjunto con la empresa Veolia adelantó distanciamiento y encamisados de redes electricas para el cumplimiento de la normativa vigente.

Movistar ⇒ realizó adecuaciones de caja de telecomunicaciones con dimensiones aproximadas de 3 x 2,5 m, lo cual de igual forma a lo sucedido en el pompeyano de la cr 10 con cll 17, es necesario contemplar el reforzamiento de dicha losa.

Dentro de plan Bicentenario se realizó la construcción de sumideros, demoliciones, excavaciones, conformación de sobrecante, suministro e instalación de base granular y en la

COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTA DE COMITÉ No. 183.		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**
Apoyo en la entrega formal de las adecuaciones en el tramo Cr 10 con Cll 17 y Cr 10 con Cll 18 por parte de Veolia	• Supervisión • Interventoría	9/Nov/22
entrega formal de adecuaciones adelantadas por Veolia en el tramo Cr 10 Cll 21 a 21A	• Supervisión • Interventoria.	10/Nov/22.
Entrega formal de adecuaciones adelantadas por Veolia en el tramo Cr 10 Cll 21A-22.	• Supervisión • Interventoría.	• Conforme a la entrega de Veolia.
Organizar comité con asistencia de delegados de Gobierno y Obracon	• Supervisión • Interventoría	11/Nov/22.

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 183

la presente semana se realizará la entrega del componente concreto MR 41 acelerando a 7 días.

° Tramo vía cr 10 cll 21 - 21A.

- Violla ⇒ Realizó renovación de red sanitaria conforme a las bóvedas existentes, construcciones de pozos, conexiones domiciliarias sanitarios, junto con los rellenos respectivos, para lo cual Violla entrego formalmente a supervisión de las actividades realizadas el día 2 de de noviembre de 2021, por lo cual a la fecha se iniciaron actividades de demoliciones de carpeta asfáltica, excavación y conformación de subrasante dentro del proyecto descontaminado.
- Vanti ⇒ conforme a comités realizados se acordó que se realizarían procesos de excavaciones y la tubería se trasladaría a un costado, por ende estas quedaría expuestas por un momento. Aspecto que el presente comité si evidencia que requiere ser evaluado por lo cual se requiere realizar un comité con delegados de Vanti.
- EB Telecomunicaciones ⇒ En cuanto a las redes de telecomunicaciones es de indicar, que una vez se proceda a intervenir andenes, se realizara las adecuaciones necesarias por cada una de las empresas.

EBSA ⇒ se esta pendiente la programación de las adecuaciones necesarias, así mismo en campo se coordenco que estas actividades se realizarán una vez se inicie la intervención de anteriores.

Cr 10 cll 21A – 23.

VEOLIA ⇒ A la fecha se evidencia que Veolia se encuentra realizando adecuaciones de la red sanitaria en la Cr 10 entre Cll 21A y 22, por la existencia de bordas los cuales no se tenían previstas. Aspecto que es de gran preocupación ya que es un aspecto que fue solicitado con anterioridad y para lo cual se solicito realizar los apiques y/o diagnosticos necesarios.

Así mismo preliminarmente se evidencia que en el tramo de Vía Cr 10 entre cll 22 a 24 Veolia requiere realizar adecuaciones al sistema de alcantarillado de los cuales siempre ha expuesto no requeria adecuación alguna, por lo cual se deberá verificar dicho aspecto

Cr 10 cll 24 – 25.

A la fecha se esta pendiente de los ajustes a diseños del sistema de alcantarillado pluvial, conforme a las interferencias de estructuras, redes de agua potable,

bovedas encontradas, redes de gas y demás novedades, aspecto que se esta realizando por parte de los profesionales de Veolia, quienes ayudarán a la entidad contratantes con los diseños requeridos.


Por lo cual se indica que estos ajustes se requieren con celeridad, ya que desde el dia mes de septiembre se iniciaron actividades de excavaciones y dado a los diferentes imprevistos tecnicos no se ha podido avanzar en el desarrollo de actividades conforme a la programación de obra, para lo cual se han adelantado comités con los profesionales de Veolia.

CAMARAS DE SEGURIDAD

En cuanto a las camaras de seguridad es de indicar que desde julio de 2022, todas estas estaran en funcionamiento, por lo cual se solicita el recibo del capitulo. Asi mismo se requiere coordinar para configurar alarmas de camaras y gabinetes, de igual forma se requiere configurar los movimientos de la camaras. De igual forma se reitera que la UPS se encuentra en funcionamiento desde aproximadamente un año.

Bateria de Baños

A la fecha se realizó la construcción de la estructura, asi mismo se esta realizando la construcción de muros de fachada y divisorios, conforme a los diseños estructurales, se continua con el muro bajo placa.

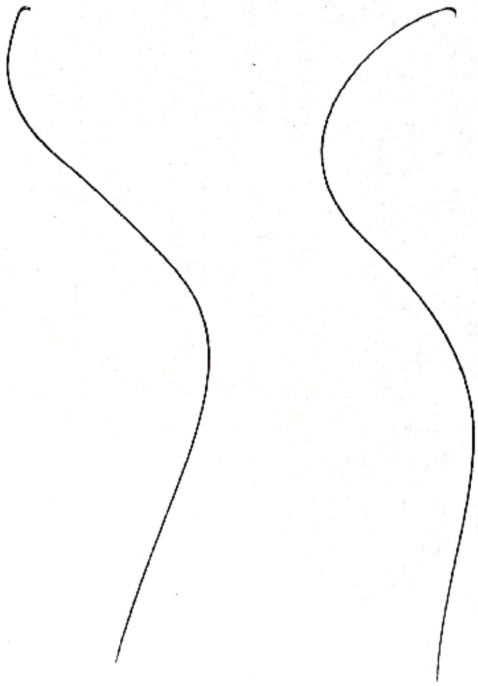

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 183

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Alexis Fabian Gonzalez T.	3214345133 Cel: Interventoria	
Ariel Rolando Castillo	Saga Chavez Cel: 3142557565	
Elsa Lopez	Saga - Chavez Cel: 3125718784	
TITO GUTIERREZ	SAGA CHAVEZ. Cel: 3219242254	
Cristian Fabian Rodriguez	O.A.P. Contratista Alcaldia Cel: 3204991799	
CAMILO TORRES GAMA	OAP Contratista Cel: 3176500271	
	Cel:	
