**LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA**

**CERTIFICA QUE**

**ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO**, identificado con **CC** No. **19399373**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. 3010/2022**, en la forma y oportunidad pactadas.

***En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.***(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 10.304.251,65 "DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 65/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Segundo Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

| No. COMPROMISO | RUBRO | USO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 819422 | C-3302-1603-10-0-3302018-02 | A-02-02-02-008-003-09 | $10.304.251,65 |
| **T O T A L** | | | **$10.304.251,65** |

Se expide en Bogotá, D.C. a los 21 días del mes de noviembre de 2022

**MARCELA CRISTINA CUELLAR SANCHEZ**
**DIRECTOR(A) DE PATRIMONIO Y MEMORIA**
**Supervisor**

**Vo. Bo.:** MARCOS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 19399373 | | TOVAR BAQUERO ENRIQUE ALONSO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 47A N 95 - 56 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8051341 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 1767344371 | 9442848571 | N | 2022/12/19 | 2022/11/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,211,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 19399373 | TOVAR ENRIQUE | | | | | | | | A | | | | | | | | | | 230201 | 30 | ($1,000,000) | ($160,000) | EPS008 | 30 | ($1,000,000) | ($125,000) | CCF24 | 30 | ($1,000,000) | ($20,000) | 14-11 | 30 | ($1,000,000) | ($69,600) | 30 | $0 | $0 | No | ($374,600) |
| 2 | CC | 19399373 | TOVAR ENRIQUE | | | | | | | | C | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $4,121,700 | $700,900 | EPS008 | 30 | $4,121,700 | $515,300 | CCF24 | 30 | $4,121,700 | $82,500 | 14-11 | 30 | $4,121,700 | $286,900 | 30 | $0 | $0 | No | $1,585,600 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,121,700 | $540,900 | | | $3,121,700 | $390,300 | | | $3,121,700 | $62,500 | | | $3,121,700 | $217,300 | | $0 | $0 | | $1,211,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 19399373 | | TOVAR BAQUERO ENRIQUE ALONSO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 47A N 95 - 56 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8051341 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 1767344371 | 9442848571 | N | 2022/12/19 | 2022/11/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,211,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $540,900 | $0 | $0 | $540,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $540,900 | $0 | $0 | $540,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $217,300 | $0 | $0 | $217,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $217,300 | $0 | $0 | $217,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $62,500 | $0 | $0 | $62,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $62,500 | $0 | $0 | $62,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $390,300 | $0 | $0 | $390,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $390,300 | $0 | $0 | $390,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $1,211,000 | $0 | $0 | $1,211,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 19399373 | | TOVAR BAQUERO ENRIQUE ALONSO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 47A N 95 - 56 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8051341 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-10 | 2022-10 | 1724019721 | 9441899103 | N | 2022/11/18 | 2022/10/26 | NEQUI | 0 | $69,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 19399373 | TOVAR ENRIQUE | | | | | | | | C | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS008 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | CCF24 | 30 | $1,000,000 | $20,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | No | $374,600 |
| 2 | CC | 19399373 | TOVAR ENRIQUE | | | | | | | | A | | | | | | | | | | 230201 | 30 | ($1,000,000) | ($160,000) | EPS008 | 30 | ($1,000,000) | ($125,000) | CCF24 | 30 | ($1,000,000) | ($20,000) | 14-11 | 0 | $0 | $0 | 30 | $0 | $0 | No | ($305,000) |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $69,600 | | $0 | $0 | | $69,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 19399373 | | TOVAR BAQUERO ENRIQUE ALONSO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 47A N 95 - 56 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8051341 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-10 | 2022-10 | 1724019721 | 9441899103 | N | 2022/11/18 | 2022/10/26 | NEQUI | 0 | $69,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $69,600 | $0 | $0 | $69,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $69,600 | $0 | $0 | $69,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $69,600 | $0 | $0 | $69,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901149923 | 2 | ATICCO S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 47 A No. 95-56 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8051341 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-09 | 2022-10 | 1687739192 | 9441020579 | E | 2022/10/07 | 2022/10/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $1,195,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)** | | | | | | | $4,000,000 | $640,000 | | | $5,000,000 | $200,000 | | | $5,000,000 | $200,000 | | | $5,000,000 | | $155,100 | | $0 | $0 | | $1,195,100 |
| **Centro de Trabajo: SURA I (3 Afiliados)** | | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | | $15,900 | | $0 | $0 | | $575,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | | $15,900 | | $0 | $0 | | $575,900 |
| 1 | CC | 52956724 | MORENO RUTH | | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS017 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | 0.522% | $5,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $245,300 |
| 2 | CC | 1233492165 | SALCEDO SHARON | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | 0.522% | $5,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $245,300 |
| 3 | CC | 41753518 | TOVAR NINNA | | | 0 | $0 | $0 | EPS008 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | 0.522% | $5,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $85,300 |
| **Centro de Trabajo: SURA V (2 Afiliados)** | | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $80,000 | | | $2,000,000 | $80,000 | | | $2,000,000 | | $139,200 | | $0 | $0 | | $619,200 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $80,000 | | | $2,000,000 | $80,000 | | | $2,000,000 | | $139,200 | | $0 | $0 | | $619,200 |
| 4 | CC | 80074674 | RODRIGUEZ JUAN | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | 6.960% | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 5 | CC | 1002364950 | TORRES ANGIE | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS008 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | 6.960% | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | | $4,000,000 | $640,000 | | | $5,000,000 | $200,000 | | | $5,000,000 | $200,000 | | | $5,000,000 | | $155,100 | | $0 | $0 | | $1,195,100 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901149923 | 2 | ATICCO S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 47 A No. 95-56 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8051341 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-09 | 2022-10 | 1687739192 | 9441020579 | E | 2022/10/07 | 2022/10/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $1,195,100 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $640,000 | $0 | $0 | $640,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $480,000 | $0 | $0 | $480,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $155,100 | $0 | $0 | $155,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $155,100 | $0 | $0 | $155,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 5 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 5 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| TOTAL | | | | 5 | $1,195,100 | $0 | $0 | $1,195,100 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1085310828 | | PANTOJA NOGALES BRIAM DAVID | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Barrio Maria Auxiliadora | TUMACO-NARIÑO | 7274562 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-10 | 2022-10 | 1740757235 | 9441714827 | I | 2022/11/08 | 2022/11/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $309,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1085310828 | PANTOJA BRIAM | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $125,000 | | | $0 | $0 | | | $1,000,000 | $24,400 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $24,400 | $0 | $0 | $24,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $24,400 | $0 | $0 | $24,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $309,400 | $0 | $0 | $309,400 |



2022/11/04 11:31 AM

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1086724424 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ABRAHAM RODOLFO YELA GARCIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN LORENZO | DEPARTAMENTO: | NARINO |
| DIRECCIÓN: | BR LIBERTADORES | TELÉFONO: | 7274562 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7857169079** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | octubre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | octubre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2022 | SALUD: | AÑO: | 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2022/10/27 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1725299746 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 160.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 160.000** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | $ 125.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 125.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 24.400 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 24.400** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 309.400** |

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2

**“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 004-2022 CON OBJETO DE CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO”**



**24/10/2022**

## TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO ..... 2
INTRODUCCIÓN ..... 3
1. DATOS GENERALES ..... 3
2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA ..... 3
3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA ..... 4
4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA ..... 4
5. ACTIVIDADES DEL MES ..... 5
5.1. Actividades por hitos. ..... 6
5.2. Seguimiento al plan de compras ..... 6
5.3. Seguimiento al cumplimiento del cronograma ..... 7
5.4 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría ..... 7
5.5 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría ..... 7
5.6 Informes semanales ..... 7
5.4. Plan de Calidad ..... 7
5.4.1. Control de inspección y ensayos: ..... 8
5.4.2. Control de Maquinaria y Equipo: ..... 8
5.5. Plan de seguridad y salud en el trabajo: ..... 8
5.6. Plan ambiental: ..... 8
6. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ..... 8
*7.* IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES ..... 8
8. CONTROL DE PERSONAL ..... 8
9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. ..... 9
10. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. ..... 10
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 11
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ..... 12

## INTRODUCCIÓN

El contrato objeto de la interventoría hace referencia a la CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA TALLER EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. El proyecto se compone por 4 bloques (cocina tradicional, taller de joyería, salón de danza y computo, y cocina de emprendimiento), zonas comunes, y la conexión entre los bloques existentes y nuevos en estructura deck.

El tiempo establecido contractualmente para la ejecución de la obra es de cuatro (4) meses, contados a partir de 24 de agosto de 2022 fecha en que se suscribió el acta de inicio.

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 24/10/2022 | **INFORME No.** | **2** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO No.** | 2 | **DEL**: | **24/09/2022** | **AL**: | **24/10/2022** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | *"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 004-2022 CON OBJETO DE CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO"* |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | *MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO* |

## 2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE:** | OBRA |
| **CONTRATO No.:** | *3004-2022* |
| **CONTRATISTA:** | *CONSORCIO VYNSAP* |
| **PLAZO INICIAL:** | *CUATRO (4) MESES* |
| **FECHA DE INICIO:** | *24/08/2022* |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | *24/12/2022* |
| **PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):** | *CUATRO (4) MESES* |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | *DOS (2) MESES* |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE:** | OBRA |
| **VALOR INICIAL:** | *MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.878.582.837)* |
| **VALOR ADICIONES:** | *N/A* |
| **VALOR ACTUALIZADO (***Incluido adiciones***):** | *MIL OCHOCIENTOS SETANTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.878.582.837)* |

## 3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

| **CONTRATO DE:** | **INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | *3010-2022* |
| **CONTRATISTA:** | *ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO* |
| **PLAZO INICIAL:** | *CINCO (5) MESES* |
| **FECHA DE INICIO:** | *24/08/2022* |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | *30 DE DICIEMBRE DE 2022* |
| **PLAZO ACTUALIZADO (***incluido prorrogas***):** | *CINCO (5) MESES* |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | *DOS (2) MESES* |
| **VALOR INICIAL:** | *CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ($108.237.938) M/CTE.,* |
| **VALOR ADICIONES:** | *N/A* |
| **VALOR ACTUALIZADO (***Incluido adiciones***):** | *CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ($108.237.938) M/CTE.,* |

## 4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

| **NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SUSPENSIONES Y REINICIOS:** | Suspensión No.1 | ***Desde*** | ***Hasta*** | ***Comité técnico / fiduciario donde se aprueba*** |
| | | *N/A* | *N/A* | |
| | Prórroga a la suspensión No. | *N/A* | *N/A* | |
| | Reinicio No. 1 | *N/A* | | |


| NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA | | | |
|---|---|---|---|
| **TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN** | *N/A* | | |
| **PRÓRROGAS** | Prórroga No. 1 | *N/A* | |
| **TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS** | | | |
| **ADICIONES** | *N/A* | *N/A* | |
| **VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES** | *N/A* | | |

## 5. ACTIVIDADES DEL MES

En este segundo mes se ejecutaron actividades relacionadas con corte, y figurado del acero para

Por otro lado, el contratista continúa cotizando el suministro e instalación de acero, actividad que definen la ruta crítica de la obra, no obstante, este mes finaliza sin la compra de esto, según lo manifestado en ocasiones pasadas por el contratista las especificaciones no se encuentran en el mercado actual, por lo que solicita un cambio de especificación al ministerio, teniendo en cuenta que la estructura inicial fue diseñada para dos niveles, sin embargo el apoyo a la supervision extendió la solicitud a los profesionales encargados y sugirieron continuar con la especificación de la estructura contratada.

**PROGRAMADO VS EJECUTADO**

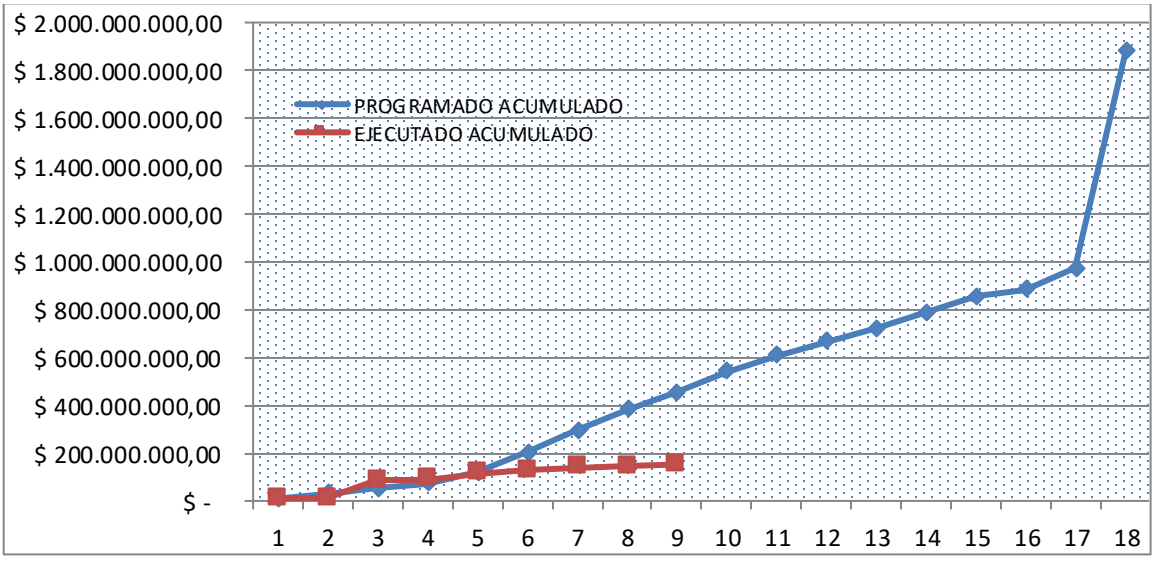

Para este segundo mes, se evidencia un aumento significativo en el retraso de la obra. Teniendo en cuenta la programación remitida por el contratista el valor ejecutado en la semana 9 correspondería a $ 455.187.749 M/CTE, sin embargo, este mes las actividades adelantadas no corresponden a la inversión programada, y el valor ejecutado cierra en $ 152.191.782 M/CTE. Respondiendo a esta situación la interventoría ha manifestado en reiteradas ocasiones durante los respectivos comités de seguimiento la necesidad de aumentar las cuadrillas en obra, y la ejecución de actividades todos los dias, con el fin de revertir la situación actual.

Aun no se ha logrado obtener la definición de los ítems de deck, tanques y cerramiento anti-basuras, por lo que es posible que se modifique la programación inicial

### 5.1. Actividades por hitos.

MINISTERIO DE CULTURA — INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA — Página 6 de 9 — Código: F-GIN-098 — Versión: 4 — Fecha: 24/Abr/2019

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | SEMANA 9 | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo. | M2 | 393,12 | $ 11.157,00 | $ 4.386.040,00 | | $ - | 0,00% | 393,12 | $ 4.386.039,84 | 100,00% |
| 1.2 | Descapote del terreno e=0,20m | M2 | 403,12 | $ 6.647,00 | $ 2.679.539,00 | | $ - | 0,00% | 403,12 | $ 2.679.538,64 | 100,00% |
| | **VALOR TOTAL DEL CAPITULO** | | | | **$ 7.065.579,00** | | $ - | 0,00% | | $ 7.065.578,48 | |
| | **CAPITULO 2: CIMENTACION** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavacion manual | M3 | 49,00 | $ 41.883,00 | $ 2.052.267,00 | | $ - | 0,00% | 49,00 | $ 2.052.267,00 | 100% |
| 2.2 | Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros | ML | 417,00 | $ 171.995,00 | $ 71.721.915,00 | | $ - | 0,00% | 373,50 | $ 64.240.132,50 | 90% |
| 2.3 | Demolición de cabezas de pilotes | M3 | 2,02 | $ 561.749,00 | $ 1.134.733,00 | | $ - | 0,00% | 1,56 | $ 876.328,44 | 77% |
| 2.4 | Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m | M3 | 4,47 | $ 373.513,00 | $ 1.669.603,00 | | $ - | 0,00% | 1,37 | $ 511.712,81 | 31% |
| 2.5 | Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto) | M3 | 15,91 | $ 536.803,00 | $ 8.540.536,00 | | $ - | 0,00% | 13,43 | $ 7.209.264,29 | 84% |
| 2.6 | Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación) | KG | 2929,80 | $ 4.939,00 | $ 14.470.282,00 | | $ - | 0,00% | 2465,72 | $ 12.178.191,08 | 84% |
| 2.7 | Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto) | M3 | 9,03 | $ 601.049,00 | $ 5.427.472,00 | | $ - | 0,00% | 11,72 | $ 7.044.294,28 | 130% |
| 2.8 | Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación) | KG | 1838,02 | $ 4.939,00 | $ 9.077.981,00 | | $ - | 0,00% | 1087,32 | $ 5.370.273,48 | 59% |
| 2.9 | Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto) | M3 | 41,98 | $ 595.979,00 | $ 25.019.198,00 | | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0% |
| 2.10 | Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación) | KG | 5557,46 | $ 5.093,00 | $ 28.304.144,00 | 1316,77 | $ 6.706.309,61 | 0,45% | 2805,23 | $ 14.287.036,39 | 50% |
| | **VALOR TOTAL DEL CAPITULO** | | | | **$ 167.418.131,00** | | **$ 6.706.309,61** | **0,45%** | | **$ 113.769.500,27** | |
| | **COSTOS DIRECTOS** | | **%** | | **$ 1.491.530.637,00** | | **$ 6.706.309,61** | **0,45%** | | **$ 120.835.078,75** | |
| | ADMINISTRACION | | 19,00% | | $ 283.390.821,00 | | $ 1.274.198,83 | | | $ 22.958.664,96 | |
| | IMPREVISTOS | | 1,00% | | $ 14.915.306,00 | | $ 67.063,10 | | | $ 1.208.350,79 | |
| | UTILIDAD | | 5,00% | | $ 74.576.532,00 | | $ 335.315,48 | | | $ 6.041.753,94 | |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | 19,00% | | $ 14.169.541,00 | | $ 63.709,94 | | | $ 1.147.933,25 | |
| | | | | | | | **$ 1.740.287,34** | | | **$ 31.356.702,94** | |
| | **SUBTOTAL COSTO INDIRECTO** | | | | **$ 387.052.200** | | **$ 8.446.596,95** | | | **$ 152.191.781,69** | |
| | **TOTAL** | | | | **$ 1.878.582.837** | | **$ 8.446.596,95** | | | **$ 152.191.782** | |

Teniendo en cuenta el anterior cuadro, 5.1 Actividades por Hitos en donde se relacionan las cantidades ejecutadas hasta la semana 9, la interventoría evidencia que el valor ejecutado corresponde a $ 152.191.782 M/CTE, correspondientes al capítulo 1 y 2 (actividades preliminares y cimentación).

### 5.2. Seguimiento al plan de compras

De la misma manera que en el reporte anterior no se ha podido cumplir a cabalidad el plan de compras, debido a la falta de definición en este periodo de los elementos metálicos que conforman la estructura de los bloques, ya que no ha sido posible conseguir algunas IPE en el mercado.

En cuanto a los componentes en madera de las fachadas, el contratista manifiesta que ya ha realizado la contratación de la misma, la cual se encuentra en el proceso de inmunización y se continua a la espera de la llegada del material a la obra.

### 5.3. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Este mes se avanzó en el corte y figurado de acero para zapatas y pedestales, se inicia con la fundida de las zarpas en el bloque de cocina y se realizó el figurado para las canastas de las primeras vigas aéreas lo que corresponde al 8.02% de avance de ejecución de la obra.

Es de aclarar que a la fecha no se ha podido evidenciar una programación definitiva y coherente debido a la falta de definición de varios temas técnicos que impiden el ajuste de la programación original, por lo tanto el avance hasta el momento no ha sido acorde a lo presentado dentro del cronograma inicialmente, esta situación genera al termino del segundo mes de ejecución de la obra, un retraso de 19.22% donde se va a presentar un probable incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, si esta situación no se revierte en lo que queda del contrato.

### 5.4 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Teniendo en cuenta la forma de pago del contrato a la fecha, de acuerdo con el avance reportado en este informe la interventoría inicia la gestión para el pago del segundo corte de obra correspondiente a $178.934.783 M/CTE

### 5.5 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De la misma manera que en el contrato de obra se radica el segundo corte de obra de interventoría correspondiente al 9.52% determinado por el avance de la obra en el segundo mes, el cual equivale $10.304.252 m/cte.

### 5.6 Informes semanales

Se reportaron los siguientes informes semanales:

| INFORMES SEMANALES | |
|---|---|
| No. | PERIODO |
| 06 | 26 de septiembre al 02 de octubre de 2022 |
| 07 | 03 al 09 de octubre de 2022 |
| 08 | 10 al 16 de octubre 2022 |
| 09 | 17 al 23 de octubre de 2022 |

Se anexan los cuatro informes semanales relacionados, completando 61 días de avance desde la firma del acta de inicio.

### 5.4. Plan de Calidad

La interventoría continúa realizando las verificaciones semanalmente y aprobando los materiales que se vienen utilizando hasta el momento, los cuales hacen referencia a cemento, material de cantera, madera y los aceros de refuerzo, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas que hacen parte del contrato.

### 5.4.1. Control de inspección y ensayos:

De acuerdo con los requerimientos de la interventoría, efectivamente el contratista ha tomado las muestras de los concretos que se han utilizado hasta el momento en pilotes y zapatas, encontrándose pendientes los resultados de laboratorio de las muestras enviadas para determinar la resistencia de estos concretos.

### 5.4.2. Control de Maquinaria y Equipo:

En este segundo mes se utilizaron los equipos necesarios para la fundición del concreto de zarpas y pedestales. *(mezcladora, pulidora, taladro percutor y herramienta menor para el amarre y figurado de hierro)*

### 5.5. Plan de seguridad y salud en el trabajo:

Este plan se encuentra revisado por el profesional de interventoría y se anexa el informe. *(ver anexo)*

### 5.6. Plan ambiental:

La interventoría hace las respectivas verificaciones y observaciones en los informes semanales de acuerdo con el plan entregado inicialmente por el contratista.

## 6. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Con respecto a este tema únicamente se encuentra pendiente los ajustes técnicos solicitados desde el inicio al Ministerio, relacionados con la cimentación del deck, el cerramiento anti-basuras y el sistema de tratamiento de aguas (tanques).

## 7. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Para este segundo mes las actividades se vienen desarrollando de acuerdo con las cantidades contratadas y no se han generado mayores cantidades de obra, sin embargo, a medida que se ha avanzado se han tenido que realizar actividades no previstas, el contratista de acuerdo con sus obligaciones ha remitido a la interventoría dichas actividades no previstas, las cuales a la fecha se encuentran revisadas y aprobadas.

## 8. CONTROL DE PERSONAL

Se deja constancia de las hojas de vida aprobadas, teniendo en cuenta con lo establecido en los términos de referencia y/o documentos contractuales que soportan la contratación, las cuales se relacionan a continuación:

## PERSONAL DE OBRA

***INGRESO DE PERSONAL***

| | Cedula | Nombre | ARL | EPS | AFP | Telefono | Fecha de Afiliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.085.273.318 | CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO | POSITIVA | SANITAS | COLPENSIONES | 3106355794 | 1/09/2022 |
| 2 | 13.054.008 | EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ | POSITIVA | NUEVA EPS | PROTECCION | 3113103901 | 1/09/2022 |
| 3 | 71.787.108 | JORGE ISAC SALAZAR HERRERA | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3185372041 | 1/10/2022 |
| | | | | | | | |
| 1 | 1.087.118.776 | JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3123348915 | 22/09/2022 |
| 2 | 87.140.082 | JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3188823025 | 30/08/2022 |
| 3 | 1.087.197.263 | NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA | POSITIVA | EMSSANAR S.A.S. | PORVENIR | 3175282094 | 30/08/2022 |
| 5 | 1.004.616.384 | BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES | POSITIVA | SANITAS | PORVENIR | 3162363823 | 1/09/2022 |
| 6 | 1.087.779.147 | CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3235483715 | 7/09/2022 |
| 7 | 1.004.574.705 | ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3186483518 | 12/09/2022 |
| 8 | 1.087.187.627 | LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3103678875 | 20/09/2022 |
| 9 | 1.087.112.705 | HECTOR FABIO GUERRERO MONTENEGRO | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3112073461 | 21/09/2022 |
| 10 | 1.087.794.597 | KEVIN ANGULO FERRIN | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3148719588 | 21/09/2022 |
| 11 | 1.004.768.954 | ALIRIO CUERO RIASCOS | POSITIVA | XXX | XXX | 3184066273 | 18/10/2022 |
| 12 | 12.913.998 | JUAN EMIRO PRETEL CALLE | POSITIVA | SANITAS | PORVENIR | 3156168083 | 24/10/2022 |

***RETIRO DE PERSONAL***

| | Cedula | Nombre | ARL | EPS | AFP | Telefono | RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.085.273.318 | CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO | POSITIVA | SANITAS | COLPENSIONES | 3106355794 | |
| 2 | 13.054.008 | EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ | POSITIVA | NUEVA EPS | PROTECCION | 3113103901 | |
| 3 | 71.787.108 | JORGE ISAC SALAZAR HERRERA | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3185372041 | |
| | | | | | | | |
| 1 | 1.087.118.776 | JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3123348915 | |
| 2 | 87.140.082 | JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3188823025 | |
| 3 | 1.087.197.263 | NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA | POSITIVA | EMSSANAR S.A.S. | PORVENIR | 3175282094 | |
| 5 | 1.004.616.384 | BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES | POSITIVA | SANITAS | PORVENIR | 3162363823 | |
| 6 | 1.087.779.147 | CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3235483715 | |
| 7 | 1.004.574.705 | ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3186483518 | |
| 8 | 1.087.187.627 | LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3103678875 | 9/10/2022 |
| 9 | 1.087.112.705 | HECTOR FABIO GUERRERO MONTENEGRO | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3112073461 | 9/10/2022 |
| 10 | 1.087.794.597 | KEVIN ANGULO FERRIN | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3148719588 | |
| 11 | 1.004.768.954 | ALIRIO CUERO RIASCOS | POSITIVA | XXX | XXX | 3184066273 | 20/10/2022 |

## PERSONAL INTERVENTORÍA

| CARGO | NOMBRE DE CONTACTO | DIRECCIÓN OFICINA | PORCENTAJE DE DEDICACIÓN |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | Juan Carlos Rodríguez | CRA 47ª No.95-56 | 25% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | Abraham Yela García | CRA 47ª No.95-56 | 100% |
| PROFESIONAL HSQ | Brian David Pantoja | CRA 47ª No.95-56 | 100% |

## 9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

| RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE OBRA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Póliza No.** | **Aseguradora** | **Amparo** | **Vigencia** | **Valor Aseg.** | **Expedición** | **Observaciones** |
| **14-44-101158678** | SEGUROS DEL ESTADO | CUMPLIMIENTO | 24/08/2022-24/04/2023 | $ 375.716.567.40 | 09/09/2022 | |
| **14-44-101158678** | SEGUROS DEL ESTADO | SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/08/2022-25/12/2025 | $ 93.929.141.85 | 09/09/2022 | |
| **14-44-101158678** | SEGUROS DEL ESTADO | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | AMPARA 5 AÑOS | $ 375.716.567.40 | 09/09/2022 | |
| **14-44-101158678** | SEGUROS DEL ESTADO | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | AMPARA 4 AÑOS, 4 MESES Y 2 DIAS | $ 375.716.567.40 | 09/09/2022 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14-40-101047088** | SEGUROS DEL ESTADO | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 24/08/2022-25/12/2022 | $ 300.000.000.00 | 09/09/2022 | |
| **14-40-101047088** | SEGUROS DEL ESTADO | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 24/08/2022-25/12/2022 | $ 300.000.000.00 | 09/09/2022 | |
| **14-40-101047088** | SEGUROS DEL ESTADO | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 24/08/2022-25/12/2022 | $ 300.000.000.00 | 09/09/2022 | |
| **14-40-101047088** | SEGUROS DEL ESTADO | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 24/08/2022-25/12/2022 | $ 300.000.000.00 | 09/09/2022 | |
| **14-40-101047088** | SEGUROS DEL ESTADO | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 24/08/2022-25/12/2022 | $ 300.000.000.00 | 09/09/2022 | |
| **14-40-101047088** | SEGUROS DEL ESTADO | PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 24/08/2022-25/12/2022 | $ 300.000.000.00 | 09/09/2022 | |

## RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| Póliza No. | Aseguradora | Amparo | Vigencia | Valor Aseg. | Expedición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21-44-101389183** | SEGUROS DEL ESTADO | CUMPLIMIENTO | 25/07/2022-30/06/2023 | $ 21.647.587,60 | 28/07/2022 | |
| **21-44-101389183** | SEGUROS DEL ESTADO | SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 25/07/2022-30/12/2025 | $ 5.411.896,90 | 28/07/2022 | |
| **21-44-101389183** | SEGUROS DEL ESTADO | CALIDAD DEL SERVICIO | 30/12/2022-30/12/2027 | $ 21.647.587,60 | 28/07/2022 | |
| **21-44-101389183** | SEGUROS DEL ESTADO | CUMPLIMIENTO | 24/08/2022-30/07/2023 | $ 21.647.587,60 | 07/09/2022 | |
| **21-44-101389183** | SEGUROS DEL ESTADO | SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/082022-29/01/2026 | $ 5.411.896,90 | 07/09/2022 | |
| **21-44-101389183** | SEGUROS DEL ESTADO | CALIDAD DEL SERVICIO | 29/01/2023-29/01/2028 | $ 21.647.587,60 | 07/09/2022 | |

## 10. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

| COMITÉ DE SEGUIMIENTO | | |
|---|---|---|
| **FECHA Y No ACTA** | **TEMA** | **COMPROMISOS** |
| **No 05**<br><br>**03/10/2022** | 1. Avance de obra y situación actual del proceso | • Suscribir el acta de comité No. 4.<br>• Definir situación de la estructura deck y solicitar cambio de especificación |
| **No. 06**<br>**10/10/2022** | 2. Seguimiento de las actividades ejecutadas hasta el momento | • Suscribir y enviar acta de comité No. 5<br>• Envió de diseño de tanques<br>• Responder solicitud de cambio de especificación de la estructura metálica<br>• Definir y enfiar oficio con especificaciones de cerramiento anti-basuras. |

Se anexan copia de actas de comités llevados a cabo en este periodo.

## 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el seguimiento fotografico de las primeras actividades realizadas en la obra, relacionadas con los preliminares y cimentacion.





## 12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES


A pesar que ya han pasado dos meses desde la iniciación del contrato de obra, se continua con varios aspectos técnicos sin definir por parte del Ministerio, situación que no permite avanzar técnicamente dentro de las condiciones establecidas contractualmente y de acuerdo a los tiempos pactados, esta situación probablemente va a incidir de manera negativa impidiendo probablemente que el contratista cumpla con la obligación contractual de entregar la obra el 24 de diciembre de 2022 como quedo establecido en el acta de inicio.

Mas sin embargo la falta de definición de estos aspectos técnicos, aunque retrasa el desarrollo de la obra, no ha impedido que el contratista continúe con actividades ya definidas dentro del proyecto, por cuanto al terminar el segundo mes, ya se ha fundido toda la cimentación de los tres bloques hasta el pedestal y se continua con las formaletas para las vigas aéreas y las placas de piso también de los tres bloques.

Finalmente, y teniendo en cuenta lo anterior la interventoría recomienda mayor diligencia por parte de los profesionales del Ministerio encargados de esclarecer los requerimientos del contratista, con el fin de evitar posibles retrasos en el avance de la obra.

Mientras esta condición anómala continúe, mas grande va a ser la probabilidad de que el contratista no pueda cumplir con la entrega de la obra en el tiempo establecido, ya que hasta el momento no ha sido posible determinar el alcance definitivo del proyecto.

Como conclusión y de acuerdo con el avance de la obra es muy probable que el contratista no alcance a cumplir con la obligación contractual de entregar el proyecto en la fecha determinada contractualmente.



**ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO**
INTERVENTOR ASIGNADO

*ANEXOS:*
*Informes semanales de interventoría*
*Bitácoras*

| | |
|---|---|
| **DOCUMENTO:** | INFORME DE GESTIÓN SST |
| **CONTRATANTE:** | MINISTERIO DE CULTURA |
| **CONTRATISTA:** | ENRIQUE ALFONSO TOVAR |
| **CONTRATO DE OBRA N°:** | 3004 DE 2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO, EN NARIÑO", |
| **PERIODO INFORME:** | 24/SEP/2022 – 24/OCT/2022 |
| **RESPONSABLE DEL INFORME INTERVENTORIA SST OBRA** | BRIAM PANTOJA |

## TABLA DE CONTENIDO

# Contenido


**1. INTRODUCCION ..... 3**

**2. OBJETIVO GENERAL..... ¡Error! Marcador no definido.**

**2.1 Objetivos espesificos ..... ¡Error! Marcador no definido.**

**3. GENERALIDADES DEL Contrato ..... ¡Error! Marcador no definido.**

**3.1 Contrato: 3004 2022 ..... ¡Error! Marcador no definido.**

**3.2 Descripción del proyecto..... ¡Error! Marcador no definido.**

**3.3 Localización del proyecto..... ¡Error! Marcador no definido.**

**3.4 Estructura organizacional de la obra..... ¡Error! Marcador no definido.**

**3.5 Politica SST y reglamento de higiene y seguridad industrial .....** ¡Error! Marcador no definido.

**4. AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL...** ¡Error! Marcador no definido.

**5. Ingreso del personal ..... ¡Error! Marcador no definido.**

**6 Retiro del personal..... ¡Error! Marcador no definido.**

**7. INDICADORES DE GESTIÓN ..... ¡Error! Marcador no definido.**

**8. PROGRAMA DE INSPECCIONES ..... 10**

**9. ANEXO ..... ¡Error! Marcador no definido.**

**10. CONCLUSIONES ..... ¡Error! Marcador no definido.**

## 1. INTRODUCCION

La empresa “CONSORCIO VYNSAP” en cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 2012 y la normatividad vigente, ha estructurado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST), a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Para su efecto, “CONSORCIO VYNSAP”, aborda la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico por etapas cuyo principio se basa en el ciclo PHVA (PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR) Y que incluye una política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoria y acciones de mejora.

Este informe describe las actividades realizadas durante el periodo del 24 septiembre hasta el 24 de octubre de 2022 en cumplimiento con los parámetros establecido y la normativa vigente.

## 2. OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades desarrolladas dentro del mecanismo de seguridad y salud en el trabajo respecto al desarrollo, verificación y seguimiento correspondiente del proceso desarrollado por el CONSORCIO VYNSAP, atendiendo las actividades establecidas dentro del SG-SST.

### 2.1 Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 0312 de 2019 y lo correspondientes que apliquen dentro de lo establecido en el contrato 3004 de 2022

- Describir las actividades de seguridad y salud en el trabajo del contrato 3004 de 2022 adelantadas durante el periodo comprendido 24 septiembre hasta el 24 de octubre de 2022

- Presentar documentación del personal, equipo y maquinaria que desarrolla actividades para el cumplimiento del contrato.

## 3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

### 3.1 Contrato:3004 de 2022

| **CONTRATO No 3004 DE 2022** | |
|---|---|
| *Objeto* | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO, EN NARIÑO |
| *Contratista* | *Consorcio VYNSAP NIT 901.608.766-2* |
| *Representante legal* | *HERLEY RINCON* |
| *Dirección* | Aeropuerto – Barrio la Florida |
| *Estado actual* | *Vigente* |
| *Estado iniciación* | *Agosto 24 de 2022* |
| *Estado de terminación* | *Diciembre 29 de 2022* |

### 3.2 Descripción del proyecto

El proyecto de la ampliación de la Escuela Taller de San Andrés de Tumaco contempla una disposición espacial de 4 módulos de 1 piso. La nueva intervención atiende la ampliación de 3 módulos más de 1 piso conservando la fachada estética de los módulos existentes.

La Escuela Taller de San Andrés de Tumaco cuenta con módulos de 1 piso con áreas de formación en cocina y restaurante, orfebrería y danza. A treves del proceso de formación los cursos técnicos de construcción han aportado en la realización de la sede.

### 3.3 localización del proyecto





*tomado de Google Maps*

**Datos del distrito especial San Andrés de Tumaco**

- Departamento: Nariño
- Superficie: 3760 km 2
- Altitud promedio: 2 mts
- Temperatura: 28°
- Población: habitantes 257052
- Coordenadas: 1°48´24N – 78°45´53”O
- Distancia de la capital del departamento: 1100,7 km
- Gentilicio: Tumaqueño/a

*El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)*

### 3.4 Estructura de la obra

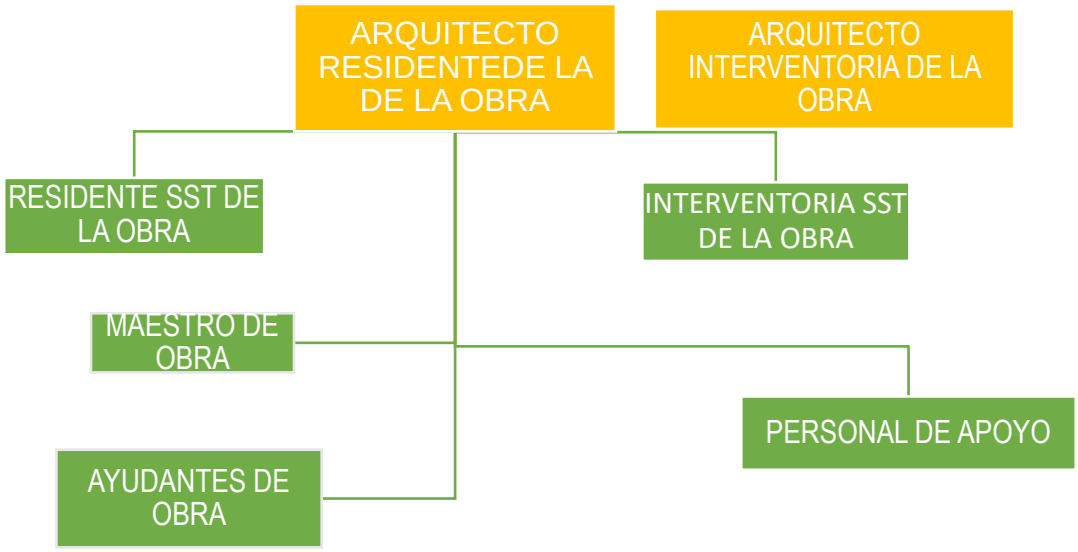

### 3.5 Política SST y reglamento de higiene y seguridad industrial.

Durante el periodo que se comprende desde el 24 de septiembre hasta el 24 de octubre 2022, realizó la divulgación del SG-SST al personal en obra. Realizando la inducción al personal donde se divulgó la política integral y los lineamientos del SG-SST al personal.

Observación: la divulgación de la política SST y reglamento de higiene y seguridad industrial se encuentra en la inducción del personal.

| REGISTRO FOTOGRAFICO | |
|---|---|
|  |  |
| Cuidado de ojos en el lugar de trabajo y condiciones inseguras. | Reglas básicas de seguridad y medidas preventivas sobreesfuerzo. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Charla de reporte de actos y condiciones inseguras | Comunicación asertiva y trabajo en equipo |


se realizaron las capacitaciones para todo el personal en obra, se dio inicio en el mes de octubre: comunicación asertiva y trabajo en equipo, reglas básicas de seguridad y medidas preventivas sobreesfuerzo, cuidado de ojos en lugar de trabajo, reporte de actos y condiciones inseguras.

*Anexo 1. Registros de inducción.*

A la fecha no se ha generado ninguna alteración en el ambiente laboral.

## 4. AFILICACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

Durante el periodo que se comprende desde el 24 de septiembre hasta el 24 de octubre 2022, realizó la verificación de contratación del personal necesario para la realización de las actividades iniciales de esta etapa de ejecución de obra, acorde a la normativa vigente.

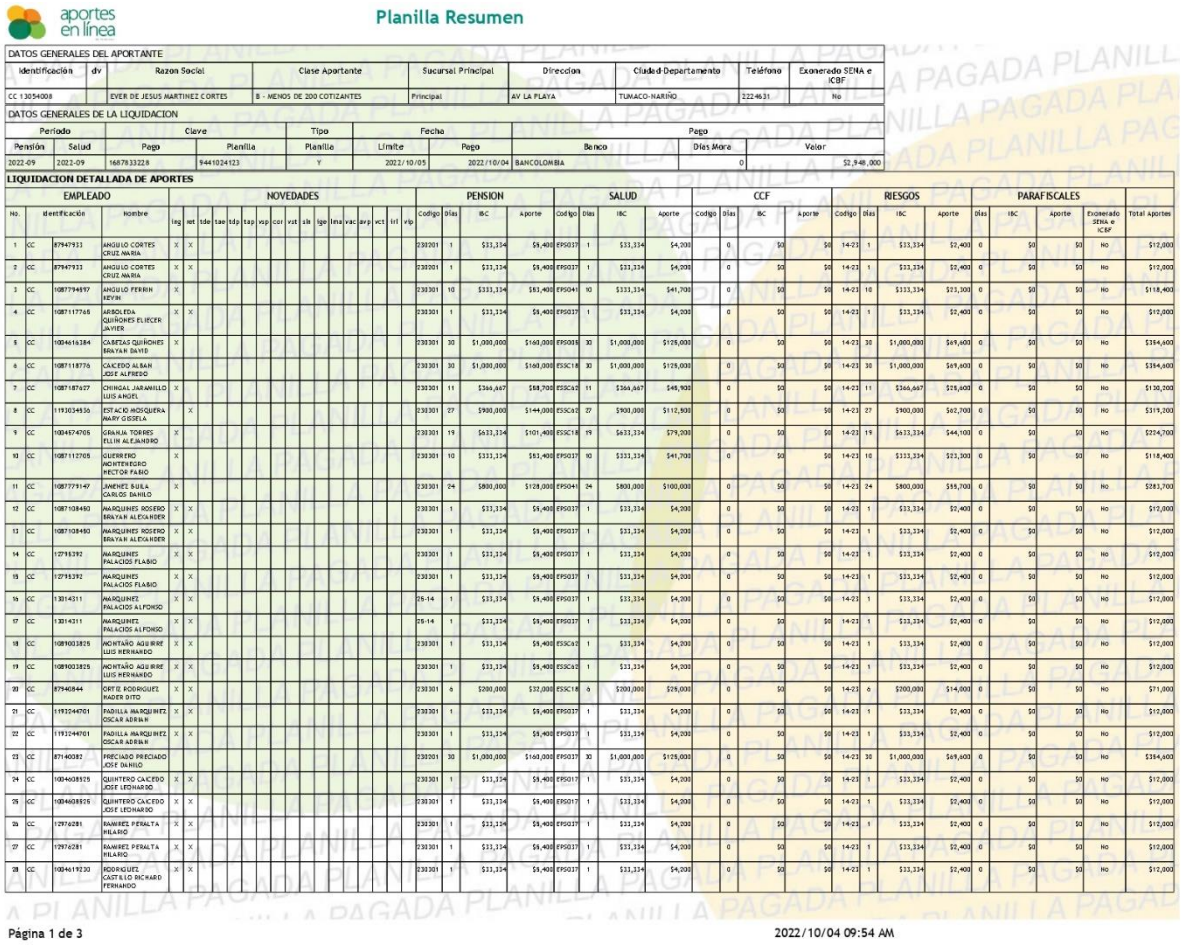

aportes en línea

**Planilla Resumen**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 13054008 | | EVER DE JESUS MARTINEZ CORTES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal | AV LA PLAYA | TUMACO-NARIÑO | 2224631 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2022-09 | 2022-09 | 1687833228 | 9441024123 | Y | 2022/10/05 | 2022/10/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,948,000 | |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 87947933 | ANGULO CORTES CRUZ MARIA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 2 | CC | 87947933 | ANGULO CORTES CRUZ MARIA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 3 | CC | 1087794597 | ANGULO FERRIN KEVIN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 10 | $333,334 | $83,400 | EPS041 | 10 | $333,334 | $41,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 10 | $333,334 | $23,300 | 0 | $0 | $0 | No | $148,400 |
| 4 | CC | 1087117765 | ARBOLEDA QUIÑONES ELIECER JAVIER | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 5 | CC | 1004616384 | CABEZAS QUIÑONES BRAYAN DAVID | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS038 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 0 | $0 | $0 | No | $354,600 |
| 6 | CC | 1087118776 | CAICEDO ALBAN JOSE ALFREDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC18 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 0 | $0 | $0 | No | $354,600 |
| 7 | CC | 1087187677 | CHINGAL JARAMILLO LUIS ANGEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | $366,667 | $58,700 | ESSC62 | 11 | $366,667 | $45,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 11 | $366,667 | $25,600 | 0 | $0 | $0 | No | $130,200 |
| 8 | CC | 1193034536 | ESTACIO MOSQUERA MARY GISSELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 27 | $900,000 | $144,000 | ESSC62 | 27 | $900,000 | $112,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 27 | $900,000 | $62,700 | 0 | $0 | $0 | No | $319,200 |
| 9 | CC | 1004674705 | GRANJA TORRES ELLIN ALEJANDRO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 19 | $633,334 | $101,400 | ESSC18 | 19 | $633,334 | $79,200 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 19 | $633,334 | $44,100 | 0 | $0 | $0 | No | $224,700 |
| 10 | CC | 1087112705 | GUERRERO MONTENEGRO HECTOR FABIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 10 | $333,334 | $53,400 | EPS037 | 10 | $333,334 | $41,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 10 | $333,334 | $23,300 | 0 | $0 | $0 | No | $118,400 |
| 11 | CC | 1087779147 | JIMENEZ BUELA CARLOS DANILO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 24 | $800,000 | $128,000 | EPS041 | 24 | $800,000 | $100,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 24 | $800,000 | $55,700 | 0 | $0 | $0 | No | $283,700 |
| 12 | CC | 1087108490 | MARQUINES ROSERO BRAYAN ALEXANDER | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 13 | CC | 1087108490 | MARQUINES ROSERO BRAYAN ALEXANDER | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 14 | CC | 12795392 | MARQUINES PALACIOS FLABIO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 15 | CC | 12795392 | MARQUINES PALACIOS FLABIO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 16 | CC | 13014311 | MARQUINEZ PALACIOS ALFONSO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 28-14 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 17 | CC | 13014311 | MARQUINEZ PALACIOS ALFONSO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 28-14 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 18 | CC | 1089003825 | MONTAÑO AGUIRRE LUIS HERNANDO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | ESSC62 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 19 | CC | 1089003825 | MONTAÑO AGUIRRE LUIS HERNANDO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | ESSC62 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 20 | CC | 87940844 | ORTIZ RODRIGUEZ NADER OTTO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 6 | $200,000 | $32,000 | ESSC18 | 6 | $200,000 | $25,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 6 | $200,000 | $14,000 | 0 | $0 | $0 | No | $71,000 |
| 21 | CC | 1193244701 | PADILLA MARQUINEZ OSCAR ADRIAN | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 22 | CC | 1193244701 | PADILLA MARQUINEZ OSCAR ADRIAN | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 23 | CC | 87140082 | PRECIADO PRECIADO JOSE DANILO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 0 | $0 | $0 | No | $354,600 |
| 24 | CC | 1004608525 | QUINTERO CAICEDO JOSE LEONARDO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 25 | CC | 1004608525 | QUINTERO CAICEDO JOSE LEONARDO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 26 | CC | 12976281 | RAMIREZ PERALTA HILARIO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 27 | CC | 12976281 | RAMIREZ PERALTA HILARIO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |
| 28 | CC | 1004619230 | RODRIGUEZ CASTILLO RICHARD FERNANDO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $4,000 | EPS037 | 1 | $33,334 | $4,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 1 | $33,334 | $2,400 | 0 | $0 | $0 | No | $12,000 |

Página 1 de 3

2022/10/04 09:54 AM

*Anexo 2. Afiliaciones de seguridad social*

## 5. INGRESO DEL PERSONAL

A continuación, se presenta la relación del personal que ingresó en el periodo desde el 24 de septiembre hasta el 24 de octubre 2022, y se registra la información pertinente, el señor Aurio Cuero Riacos que se encuentra marcado xxx se le realizó la filiación para ingreso, pero no se presentó en obra, por ende, se le realizó el retiro.

*El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)*

| | Cedula | Nombre | ARL | EPS | AFP | Telefono | Fecha de Afiliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.085.273.318 | CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO | POSITIVA | SANITAS | COLPENSIONES | 3106355794 | 1/09/2022 |
| 2 | 13.054.008 | EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ | POSITIVA | NUEVA EPS | PROTECCION | 3113103901 | 1/09/2022 |
| 3 | 71.787.108 | JORGE ISAC SALAZAR HERRERA | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3185372041 | 1/10/2022 |
| | | | | | | | |
| 1 | 1.087.118.776 | JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3123348915 | 22/09/2022 |
| 2 | 87.140.082 | JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3188823025 | 30/08/2022 |
| 3 | 1.087.197.263 | NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA | POSITIVA | EMSSANAR S.A.S. | PORVENIR | 3175282094 | 30/08/2022 |
| 5 | 1.004.616.384 | BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES | POSITIVA | SANITAS | PORVENIR | 3162363823 | 1/09/2022 |
| 6 | 1.087.779.147 | CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3235483715 | 7/09/2022 |
| 7 | 1.004.574.705 | ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3186483518 | 12/09/2022 |
| 8 | 1.087.187.627 | LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3103678875 | 20/09/2022 |
| 9 | 1.087.112.705 | HECTOR FABIO GUERRERO MONTENEGRO | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3112073461 | 21/09/2022 |
| 10 | 1.087.794.597 | KEVIN ANGULO FERRIN | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3148719588 | 21/09/2022 |
| 11 | 1.004.768.954 | ALIRIO CUERO RIASCOS | POSITIVA | XXX | XXX | 3184066273 | 18/10/2022 |
| 12 | 12.913.998 | JUAN EMIRO PRETEL CALLE | POSITIVA | SANITAS | PORVENIR | 3156168083 | 24/10/2022 |

*Anexo 3. Ingreso del personal*

## 6. RETIRO DEL PERSONAL

Durante el periodo comprendido desde el 24 de septiembre hasta el 24 de octubre 2022, se realizó el retiro de (3) trabajadores: Luis Ángel Chingal, Héctor Fabio Guerrero y Aurio Cuero Riascos

A continuación, se encuentra subrayado en rojo.

| | Cedula | Nombre | ARL | EPS | AFP | Telefono | RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.085.273.318 | CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO | POSITIVA | SANITAS | COLPENSIONES | 3106355794 | |
| 2 | 13.054.008 | EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ | POSITIVA | NUEVA EPS | PROTECCION | 3113103901 | |
| 3 | 71.787.108 | JORGE ISAC SALAZAR HERRERA | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3185372041 | |
| | | | | | | | |
| 1 | 1.087.118.776 | JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3123348915 | |
| 2 | 87.140.082 | JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3188823025 | |
| 3 | 1.087.197.263 | NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA | POSITIVA | EMSSANAR S.A.S. | PORVENIR | 3175282094 | |
| 5 | 1.004.616.384 | BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES | POSITIVA | SANITAS | PORVENIR | 3162363823 | |
| 6 | 1.087.779.147 | CARLOS DANILO JIMENEZ BUILA | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3235483715 | |
| 7 | 1.004.574.705 | ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3186483518 | |
| 8 | 1.087.187.627 | LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO | POSITIVA | EMSSANAR | PORVENIR | 3103678875 | 9/10/2022 |
| 9 | 1.087.112.705 | HECTOR FABIO GUERRERO MONTENEGRO | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3112073461 | 9/10/2022 |
| 10 | 1.087.794.597 | KEVIN ANGULO FERRIN | POSITIVA | NUEVA EPS | PORVENIR | 3148719588 | |
| 11 | 1.004.768.954 | ALIRIO CUERO RIASCOS | POSITIVA | XXX | XXX | 3184066273 | 20/10/2022 |

*Anexo 4. Retiro del personal.*

*El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)*

## 7. INDICADORES DE GESTIÓN

En el presente periodo que se comprende desde el 24 de septiembre hasta 24 de octubre **No** se presentaron ausentismo por enfermedad laboral.

En el presente periodo que se comprende desde el 24 de septiembre hasta 24 de octubre **No** se presentaron Accidentes laborales.

En el presente periodo que se comprende desde el 24 de septiembre hasta 24 de octubre **No** se presentaron incidentes laborales.

| CONSORCIO VYNSAP | CONSORCIO VINSAP<br>NIT. 901608766 -2 | SST -FR |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSION 1 |
| | 16. CONSOLIDADO INDICADORES – EL | FECHA: 30/08/2022 |

| INDICADOR | FORMULACION | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGY | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | | TOTAL |
| No. DE CASOS REPORTADOS COMO ENFERMEDAD LABORAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| No. DE DIAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD LABORAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TASA DE ENFERMEDAD LABORAL (P.P.G.E.L.) | TEL= No. EL / No. PROMEDIO DE TRABAJADORES | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| INDICE DE FRECUENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL | IF EL= (No. TOTAL DE EL EN EL AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| INDICE DE SEVERIDAD DE ENFERMEDAD LABORAL | IS EL = (No. DIAS PERDIDOS POR EL EN EL AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES POR EL | ILI EL= IF EL * IS EL/1000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

Página 1


| CONSORCIO VYNSAP | CONSORCIO VINSAP<br>NIT. 901608766 -2 | SST -FR |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSION 1 |
| | 16. CONSOLIDADO INDICADORES – EL | FECHA: 30/08/2022 |

| INDICADOR | FORMULACION | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGY | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | | TOTAL |
| No. DE CASOS REPORTADOS COMO ENFERMEDAD LABORAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| No. DE DIAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD LABORAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TASA DE ENFERMEDAD LABORAL (P.P.G.E.L.) | TEL= No. EL / No. PROMEDIO DE TRABAJADORES | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| INDICE DE FRECUENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL | IF EL= (No. TOTAL DE EL EN EL AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| INDICE DE SEVERIDAD DE ENFERMEDAD LABORAL | IS EL = (No. DIAS PERDIDOS POR EL EN EL AÑO / No. HHT AÑO) X 240.000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES POR EL | ILI EL= IF EL * IS EL/1000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |


Página 1

*Anexo 5. Indicadores de gestión*

*El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)*

## 8. PROGRAMA DE INSPECCION

En este periodo se realizaron las correspondientes inspecciones de: locativas, preoperacional de maquinaria y equipos, equipos de emergencia y elementos de protección personal establecidos dentro del programa de inspecciones.

| REGISTRO FOTOGRAFICO | |
|---|---|
| <br>Inspección de obra (señalización) | <br>Acopio de material |
| <br>Uso correcto de los EPP | <br>Manejo de herramientas eléctricas (pulidora, cierra circular) |

*Anexo 6. Registro de inspecciones*

*El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para identificar las fallas y oportunidades de mejora al interior del SG-SST. (Resolución 0312 de 2019 Art.21)*

## 9. ANEXOS

Anexo 1. Inducción

Anexo 2. Afiliaciones de seguridad social

Anexo 3. Ingreso del personal

Anexo 4. Retiro del personal

Anexo 5. Indicadores de gestión

Anexo 6. Registro de inspecciones

## 10. CONCLUSIONES

A continuación, en el periodo que se comprende desde 24 de septiembre hasta el 24 de octubre 2022.

Todo el personal cuenta con afiliaciones de seguridad social.

Todo el personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP)

Se realizan registro de asistencia y se tiene desarrollando las actividades de seguridad industrial y de higiene, de la misma forma se evidencio la accidentalidad llegando al cumplimiento de cero lo que indica los controles de implementados en el SST.

Durante este periodo no se presentaron ausentismo por accidentes o enfermedad laborales.

MINISTERIO DE CULTURA

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

**Código:** F-GIN-098
**Versión:** 4
**Fecha:** 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | Semana: 6 | 26/09/2022 | 2/10/2022 | |
| **OBJETO:** | **CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO** | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | 3004 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** | 3010 | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO VYNSAP | **INTEVENTOR** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **VALOR CONTRATO DE OBRA:** | $ 1.878.582.837,00 | **VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | $ 108.237.938,00 | |
| **FECHA DE INICIO OBRA:** | 24 DE AGOSTO DE 2022 | **FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:** | 24 DE AGOSTO DE 2022 | |
| **FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:** | N/A | **FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:** | N/A | |
| **FECHA DE REINICIO DE OBRA:** | N/A | **FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:** | N/A | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:** | 24 DE DICIEMBRE DE 2022 | **FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| **NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:** | N/A | **NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:** | N/A | |
| **PLAZO DE DURACIÓN OBRA:** | 4 MESES | **PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:** | 5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |

## 3. Descripción Obras ejecutadas

SE CONTINUA REALIZANDO OBRAS DE CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATAS Y PEDESTALES, SE REALIZA ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE ZAPATAS DE TODOS LOS BLOQUES Y PEDESTALES DEL BLOQUE DE COCINA

## 1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>



<ángulo visual 2>

<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

## E. Curva "S"





Gráfico porcent ejecutadas vs programadas





Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

## 2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

## 5. Control Avance de Obra

| ESTADO DEL PLAZO | DIAS TRANSCURRIDOS | PORCENTAJE DEL PLAZO (%) |
|---|---|---|
| | **40** | **32,52%** |
| | VALOR ($) | PORCENTAJE (%) |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1) | **$ 202.166.685,0** | **10,76%** |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2) | **$ 127.473.705,7** | **6,79%** |
| EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1) | **-$ 74.692.979,34** | **-3,97%** |
| Se presenta un atraso en la Obra | | |
| ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso) | -5 | |

## 6. Personal de obra e interventoría

| | CARGO | CANT |
|---|---|---|
| INTERVENTORÍA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 1 |
| | PROFESIONAL HSQ | 1 |
| | **CARGO** | **CANT** |
| CONTRATISTA | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| | PROFESIONAL HSQ | 1 |
| | ALMACENISTA | |
| | MAESTRO DE OBRA | 1 |
| | AYUDANTES | 8 |
| | OFICIALES | 2 |
| | HERREROS | 2 |
| TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA | | **19** |


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


## PORCENTAJES SEMANA

| SEM | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| 2 | 1,10% | 1,62% | 0,05% | 0,57% |
| 3 | 1,09% | 2,71% | 3,88% | 4,45% |
| 4 | 1,07% | 3,78% | 0,41% | 4,86% |
| 5 | 2,56% | 6,34% | 1,35% | 6,21% |
| 6 | 4,42% | 10,76% | 0,58% | 6,79% |
| 7 | 4,81% | 15,57% | | |
| 8 | 7,75% | 23,32% | | |
| 9 | 3,92% | 27,24% | | |
| 10 | 4,66% | 31,90% | | |
| 11 | 3,55% | 35,45% | | |
| 12 | 3,07% | 38,52% | | |
| 13 | 2,88% | 41,40% | | |
| 14 | 2,49% | 43,89% | | |
| 15 | 3,53% | 47,42% | | |
| 16 | 1,55% | 48,97% | | |
| | 4,37% | 53,34% | | |
| | 46,66% | 100,00% | | |

## CANTIDADES SEMANA

| SEM | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 9.762.565,00 | $ 9.762.565,00 | $ 9.780.498,05 | $ 9.780.498,05 |
| 2 | $ 20.705.168,00 | $ 30.467.733,00 | $ 1.007.556,30 | $ 10.788.054,34 |
| 3 | $ 20.388.155,00 | $ 50.855.888,00 | $ 72.840.833,43 | $ 83.628.887,78 |
| 4 | $ 20.147.663,00 | $ 71.003.551,00 | $ 7.736.604,85 | $ 91.365.492,63 |
| 5 | $ 48.113.256,00 | $ 119.116.807,00 | $ 25.297.356,79 | $ 116.662.849,42 |
| 6 | $ 83.049.878,00 | $ 202.166.685,00 | $ 10.810.856,23 | $ 127.473.705,66 |
| 7 | $ 90.275.460,00 | $ 292.442.145,00 | | |
| 8 | $ 89.149.998,00 | $ 381.592.143,00 | | |
| 9 | $ 73.595.606,00 | $ 455.187.749,00 | | |
| 10 | $ 87.544.963,00 | $ 542.732.712,00 | | |
| 11 | $ 66.715.538,00 | $ 609.448.250,00 | | |
| 12 | $ 57.664.344,00 | $ 667.112.594,00 | | |
| 13 | $ 54.175.172,00 | $ 721.287.766,00 | | |
| 14 | $ 65.572.294,00 | $ 786.860.060,00 | | |
| 15 | $ 66.369.512,00 | $ 853.229.572,00 | | |
| 16 | $ 29.208.430,00 | $ 882.438.002,00 | | |
| | $ 88.908.022,00 | $ 971.346.024,00 | | |
| | $ 907.236.814,00 | $ 1.878.582.838,00 | | |

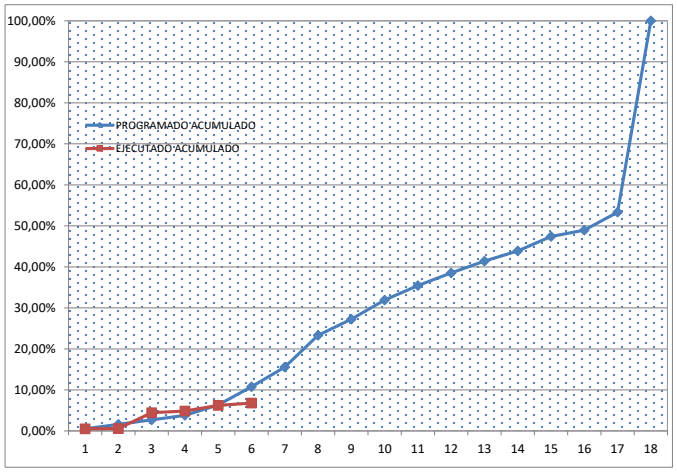

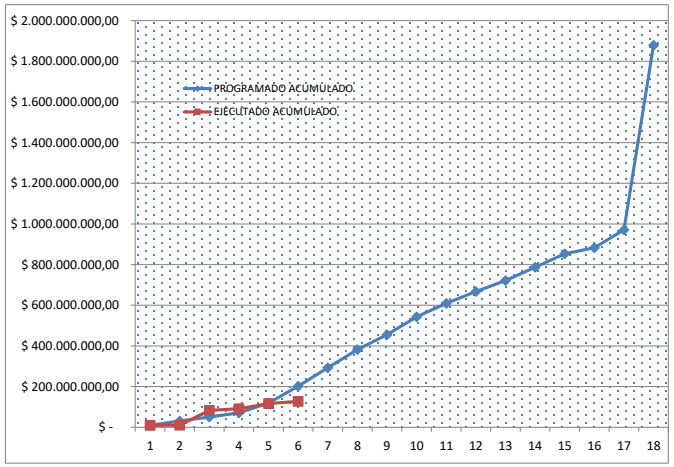

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

**ANEXO 3**

| | | |
|---|---|---|
| **Proyecto Nº.** | 3004 de 2022 | |
| **Interventor:** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **Constructor:** | CONSORCIO VYNSAP | |
| **Semana Reportada:** | 6 | |
| **Perido de Informe:** | 26/09/2022 | 2/10/2022 |

## REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

**1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS**

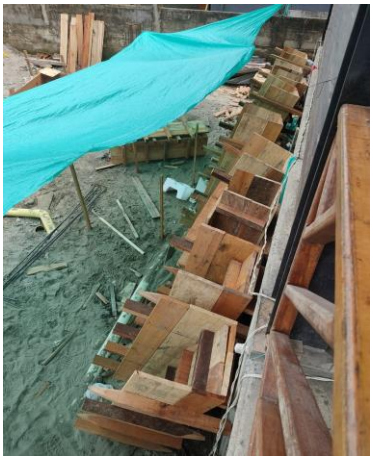

se realizan cortes de madera para formaleta de los pedestales



Se realizó vaciado de concreto de pedestal.

**2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA**



No hay disposición de escombros ya que no se ha realizdo actividad de demolición o retiro de formaleta en la obra, y el material que se esta excavando nuevamente se utiliza para la nivelacion del terreno despues de fundir las zapatas.

**3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.**

No se han reaizado actividades que requieran adquisición de materiaes.

**4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales**

No aplica

**5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas**

Se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en pozo profundo para mezcla de concreto para fundición de pedestal.

**6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:**



En la semana, se realiza actividad de vaciado de concreto en pedestales en modulo de restaurante.
Estas actividades son realizadas con herramientas manuales que no representan impactos ambientales.

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

**ANEXO 4**

| | | |
|---|---|---|
| **Proyecto Nº.** | | |
| **Interventor:** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **Constructor:** | CONSORCIO VYNSAP | |
| **Semana Reportada:** | 6 | |
| **Perido de Informe:** | 26/09/2022 | 2/10/2022 |

## REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

**1. CALIDAD DE MATERIALES**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.<br>**Según Formato No.** _____ | x | |

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, CEMENTO, MADERA PARA FORMALETAS

**2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.<br>**Según Formato No.** _____ | x | |

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA

**3. ENSAYOS**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.<br>**Según Formato No.** _____ | x | |

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

En la presente semana se recibio el informe de laboratorio, certificando la resistencia de los concretos utilizados en la fundida de los pilotes y se continua a la espera de verificar dicha resistencia en la solicitud realizada de los resultados a los 28 dias.

















| MINISTERIO DE CULTURA | SECRETARIA GENERAL |
|---|---|
| | MINISTERIO DE CULTURA |
| | FORMATO DE PRESUPUESTO |

| INFORMACION BASICA | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA REG. | 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE | DEPARTAMENTO | NARIÑO |
| SEMANA No. | 6 | OBJETO | PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL |
| NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE | | ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO | |
| BALANCE DE OBRA | | | |

MINISTERIO DE CULTURA

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**



**Código:** F-GIN-098
**Versión: 4**
**Fecha:** 24/Abr/2019

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | SEMANA 6 | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo. | M2 | 393,12 | $ 11.157,00 | $ 4.386.040,00 | | $ - | 0,00% | 393,12 | $ 4.386.039,84 | 100,00% |
| 1.2 | Descapote del terreno e=0,20m | M2 | 403,12 | $ 6.647,00 | $ 2.679.539,00 | | $ - | 0,00% | 403,12 | $ 2.679.538,64 | 100,00% |
| | **VALOR TOTAL DEL CAPITULO** | | | | **$ 7.065.579,00** | | **$ -** | **0,00%** | | **$ 7.065.578,48** | |
| | **CAPITULO 2: CIMENTACION** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavacion manual | M3 | 49,00 | $ 41.883,00 | $ 2.052.267,00 | | $ - | 0,00% | 49,00 | $ 2.052.267,00 | 100% |
| 2.2 | Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros | ML | 417,00 | $ 171.995,00 | $ 71.721.915,00 | | $ - | 0,00% | 373,50 | $ 64.240.132,50 | 90% |
| 2.3 | Demolición de cabezas de pilotes | M3 | 2,02 | $ 561.749,00 | $ 1.134.733,00 | | $ - | 0,00% | 1,56 | $ 876.328,44 | 77% |
| 2.4 | Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m | M3 | 4,47 | $ 373.513,00 | $ 1.669.603,00 | | $ - | 0,00% | 1,37 | $ 511.712,81 | 31% |
| 2.5 | Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto) | M3 | 15,91 | $ 536.803,00 | $ 8.540.536,00 | 8,63 | $ 4.632.609,89 | 0,31% | 13,43 | $ 7.209.264,29 | 84% |
| 2.6 | Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación) | KG | 2929,80 | $ 4.939,00 | $ 14.470.282,00 | | $ - | 0,00% | 2465,72 | $ 12.178.191,08 | 84% |
| 2.7 | Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto) | M3 | 9,03 | $ 601.049,00 | $ 5.427.472,00 | 2,3 | $ 1.382.412,70 | 0,09% | 7,50 | $ 4.507.867,50 | 0% |
| 2.8 | Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación) | KG | 1838,02 | $ 4.939,00 | $ 9.077.981,00 | 520,03 | $ 2.568.428,17 | 0,17% | 520,03 | $ 2.568.428,17 | 28% |
| 2.9 | Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto) | M3 | 41,98 | $ 595.979,00 | $ 25.019.198,00 | | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0% |
| 2.10 | Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación) | KG | 5557,46 | $ 5.093,00 | $ 28.304.144,00 | | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0% |
| | **VALOR TOTAL DEL CAPITULO** | | | | **$ 167.418.131,00** | | **$ 8.583.450,76** | **0,58%** | | **$ 94.144.191,79** | |
| | **COSTOS DIRECTOS** | | **%** | **$ 1.491.530.637,00** | | **$ 8.583.450,76** | **0,58%** | | **$ 101.209.770,27** | | |
| | ADMINISTRACION | | 19,00% | $ 283.390.821,00 | | $ 1.630.855,64 | | | $ 19.229.856,35 | | |
| | IMPREVISTOS | | 1,00% | $ 14.915.306,00 | | $ 85.834,51 | | | $ 1.012.097,70 | | |
| | UTILIDAD | | 5,00% | $ 74.576.532,00 | | $ 429.172,54 | | | $ 5.060.488,51 | | |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | 19,00% | $ 14.169.541,00 | | $ 81.542,78 | | | $ 961.492,82 | | |
| | | | | | | **$ 2.227.405,47** | | | **$ 26.263.935,39** | | |
| | **SUBTOTAL COSTO INDIRECTO** | | | **$ 387.052.200** | | **$ 10.810.856,23** | | | **$ 127.473.705,66** | | |
| | **TOTAL** | | | **$ 1.878.582.837** | | **$ 10.810.856,23** | | | **$ 127.473.705,66** | | |

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
**INTERVENTOR**

MINISTERIO DE CULTURA

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA No.** | **6** | | | | |
| **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** | 26/09/2022 | **Y EL** | 2/10/2022 | **PLAZO:** | 83 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VYNSAP | | | **CONTRATO No.** | 3004 |
| **INTERVENTOR:** | ENRIQUEALONSO TOVAR BAQUERO | | | **CONTRATO No.** | 3010 |

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

| FECHA | MES SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| **CARGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| MAESTRO DE OBRA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| OFICIAL | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| AYUDANTE | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL CONTRATISTA** | **12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **0** |

| **TOTAL PERIODO** | **72** |
|---|---|

| **PROCEDENCIA / CONDICIÓN** | **MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **SUMATORIA** | **PORCENTAJE** | **CUMPLE S/N** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MANO OBRA NO CALIFICADA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| De fuera de la región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| **MANO OBRA CALIFICADA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 25,00% | |
| De fuera de la región | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8,33% | |
| **PROFESIONALES - TÉCNICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 50,00% | |
| De fuera de la región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| **POBLACIÓN VULNERABLE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0,00%** | |
| En proceso de reinserción social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| En condición de desplazamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| **MUJERES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | **0,00%** | |
| Mano de Obra no Calificada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| Mano de Obra Calificada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| Profesionales - Técnicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| **PROVEEDORES** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Internacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

**ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO**
**INTERVENTOR**

## OBRA

| NOMBRE | CARGO | DEDICACION |
|---|---|---|
| HERLEY RINCON LEGUIZAMON | DIRECTOR DE OBRAS | % |
| LUIS CARLOS OBANDO | RESIDENTE DE OBRAS | 100% |
| CAMILA TELLO ROSERO | PROFESIONAL HSQ | 100% |
| EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ | MAESTRO | 100% |
| JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| MARY GISSELA ESTACIO MOSQUERA | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| CARLOS DANILO JIMENES BUILA | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## INTERVENTORIA

| NOMBRE | CARGO | DEDICACION |
|---|---|---|
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 25% |
| ABRAHAM YELA GARCIA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 100% |
| BRIAM DAVID PANTOJA | PROFESIONAL HSQ | 100% |

MINISTERIO DE CULTURA

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | Semana: | 7 | 3/10/2022 | 9/10/2022 | |
| **OBJETO:** | **CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO** | | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | 3004 | | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** | 3010 | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO VYNSAP | | **INTEVENTOR** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **VALOR CONTRATO DE OBRA:** | $ | 1.878.582.837,00 | **VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | $ | 108.237.938,00 |
| **FECHA DE INICIO OBRA:** | 24 DE AGOSTO DE 2022 | | **FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:** | 24 DE AGOSTO DE 2022 | |
| **FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:** | N/A | | **FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:** | N/A | |
| **FECHA DE REINICIO DE OBRA:** | N/A | | **FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:** | N/A | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:** | 24 DE DICIEMBRE DE 2022 | | **FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| **NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:** | N/A | | **NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:** | N/A | |
| **PLAZO DE DURACIÓN OBRA:** | 4 MESES | | **PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:** | 5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |

## 3. Descripción Obras ejecutadas

SE CONTINUA REALIZANDO OBRAS DE CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATAS Y PEDESTALES, SE REALIZA ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE ZAPATAS DE TODOS LOS BLOQUES Y PEDESTALES DEL BLOQUE DE COCINA

## 1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>



<ángulo visual 2>

<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

## E. Curva "S"





Gráfico porcent ejecutadas vs programadas





Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

## 2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

## 5. Control Avance de Obra

| ESTADO DEL PLAZO | DIAS TRANSCURRIDOS | PORCENTAJE DEL PLAZO (%) |
|---|---|---|
| | **47** | **38,21%** |
| | VALOR ($) | PORCENTAJE (%) |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1) | **$ 292.442.145,0** | **15,57%** |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2) | **$ 138.215.503,3** | **7,36%** |
| EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1) | **-$ 154.226.641,67** | **-8,21%** |
| Se presenta un atraso en la Obra | | |
| ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso) | **-10** | |

## 6. Personal de obra e interventoría

| | CARGO | CANT |
|---|---|---|
| INTERVENTORÍA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 1 |
| | PROFESIONAL HSQ | 1 |
| | **CARGO** | **CANT** |
| CONTRATISTA | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| | PROFESIONAL HSQ | 1 |
| | ALMACENISTA | |
| | MAESTRO DE OBRA | 1 |
| | AYUDANTES | 8 |
| | OFICIALES | 2 |
| | HERREROS | 2 |
| TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA | | **19** |


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


## PORCENTAJES SEMANA

| SEM | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| 2 | 1,10% | 1,62% | 0,05% | 0,57% |
| 3 | 1,09% | 2,71% | 3,88% | 4,45% |
| 4 | 1,07% | 3,78% | 0,41% | 4,86% |
| 5 | 2,56% | 6,34% | 1,35% | 6,21% |
| 6 | 4,42% | 10,76% | 0,58% | 6,79% |
| 7 | 4,81% | 15,57% | 0,57% | 7,36% |
| 8 | 7,75% | 23,32% | | |
| 9 | 3,92% | 27,24% | | |
| 10 | 4,66% | 31,90% | | |
| 11 | 3,55% | 35,45% | | |
| 12 | 3,07% | 38,52% | | |
| 13 | 2,88% | 41,40% | | |
| 14 | 2,49% | 43,89% | | |
| 15 | 3,53% | 47,42% | | |
| 16 | 1,55% | 48,97% | | |
| 17 | 4,37% | 53,34% | | |
| 18 | 46,66% | 100,00% | | |

## CANTIDADES SEMANA

| SEM | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 9.762.565,00 | $ 9.762.565,00 | $ 9.780.498,05 | $ 9.780.498,05 |
| 2 | $ 20.705.168,00 | $ 30.467.733,00 | $ 1.007.556,30 | $ 10.788.054,34 |
| 3 | $ 20.388.155,00 | $ 50.855.888,00 | $ 72.840.833,43 | $ 83.628.887,78 |
| 4 | $ 20.147.663,00 | $ 71.003.551,00 | $ 7.736.604,85 | $ 91.365.492,63 |
| 5 | $ 48.113.256,00 | $ 119.116.807,00 | $ 25.297.356,79 | $ 116.662.849,42 |
| 6 | $ 83.049.878,00 | $ 202.166.685,00 | $ 10.810.856,23 | $ 127.473.705,66 |
| 7 | $ 90.275.460,00 | $ 292.442.145,00 | $ 10.741.797,67 | $ 138.215.503,33 |
| 8 | $ 89.149.998,00 | $ 381.592.143,00 | | |
| 9 | $ 73.595.606,00 | $ 455.187.749,00 | | |
| 10 | $ 87.544.963,00 | $ 542.732.712,00 | | |
| 11 | $ 66.715.538,00 | $ 609.448.250,00 | | |
| 12 | $ 57.664.344,00 | $ 667.112.594,00 | | |
| 13 | $ 54.175.172,00 | $ 721.287.766,00 | | |
| 14 | $ 65.572.294,00 | $ 786.860.060,00 | | |
| 15 | $ 66.369.512,00 | $ 853.229.572,00 | | |
| 16 | $ 29.208.430,00 | $ 882.438.002,00 | | |
| 17 | $ 88.908.022,00 | $ 971.346.024,00 | | |
| 18 | $ 907.236.814,00 | $ 1.878.582.838,00 | | |

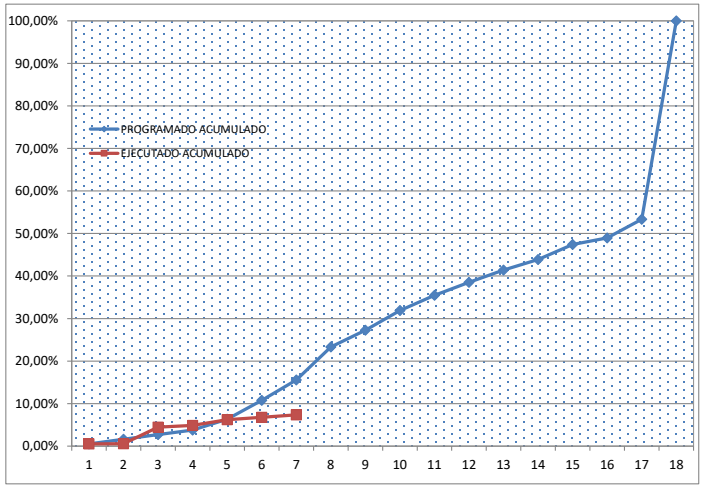

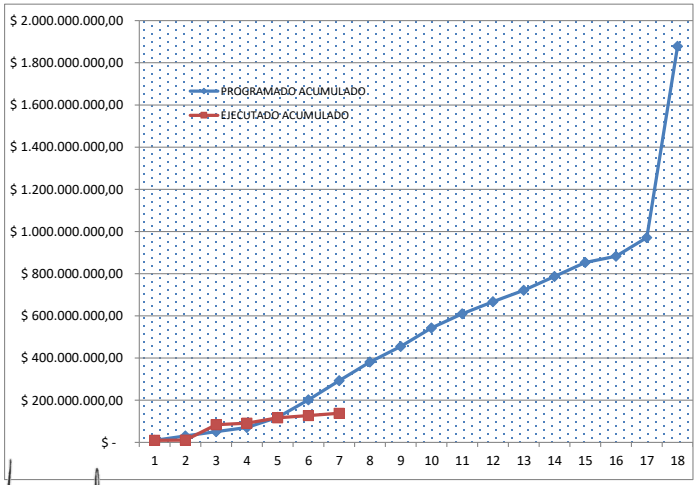
ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

**ANEXO 3**

| | | |
|---|---|---|
| **Proyecto Nº.** | 3004 de 2022 | |
| **Interventor:** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **Constructor:** | CONSORCIO VYNSAP | |
| **Semana Reportada:** | 7 | |
| **Perido de Informe:** | 3/10/2022 | 9/10/2022 |

## REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

**1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS**



se realizan cortes de madera para formaleta de los pedestales



Se realizó vaciado de concreto de pedestal.

**2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA**



No hay disposición de escombros ya que no se ha realizdo actividad de demolición o retiro de formaleta en la obra, y el material que se esta excavando nuevamente se utiliza para la nivelacion del terreno despues de fundir las zapatas.

**3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.**

No se han reaizado actividades que requieran adquisición de materiaes.

**4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales**

No aplica

**5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas**

Se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en pozo profundo para mezcla de concreto para fundición de pedestal.

**6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:**



En la semana, se realiza actividad de vaciado de concreto en pedestales en modulo de restaurante.
Estas actividades son realizadas con herramientas manuales que no representan impactos ambientales.

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

**ANEXO 4**

| | | |
|---|---|---|
| **Proyecto Nº.** | | |
| **Interventor:** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **Constructor:** | CONSORCIO VYNSAP | |
| **Semana Reportada:** | 7 | |
| **Perido de Informe:** | 3/10/2022 | 9/10/2022 |

## REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

**1. CALIDAD DE MATERIALES**

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
**Según Formato No.** _____

| **SI** | **NO** |
|---|---|
| x | |

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, CEMENTO, MADERA PARA FORMALETAS

**2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS**

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
**Según Formato No.** _____

| **SI** | **NO** |
|---|---|
| x | |

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA

**3. ENSAYOS**

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
**Según Formato No.** _____

| **SI** | **NO** |
|---|---|
| x | |

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

En la presente semana se recibio el informe de laboratorio, certificando la resistencia de los concretos utilizados en la fundida de los pilotes y se continua a la espera de verificar dicha resistencia en la solicitud realizada de los resultados a los 28 dias.

















| MINISTERIO DE CULTURA | SECRETARIA GENERAL |
|---|---|
| | MINISTERIO DE CULTURA |
| | FORMATO DE PRESUPUESTO |

| INFORMACION BASICA | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA REG. | 03 DE OCTUBRE HASTA 09 DE OCTUBRE | DEPARTAMENTO | NARIÑO |
| SEMANA No. | 7 | OBJETO | PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL |
| NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE | | ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO | |
| BALANCE DE OBRA | | | |

MINISTERIO DE CULTURA

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**



**Código:** F-GIN-098
**Versión: 4**
**Fecha:** 24/Abr/2019

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | SEMANA 7 | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo. | M2 | 393,12 | $ 11.157,00 | $ 4.386.040,00 | | $ - | 0,00% | 393,12 | $ 4.386.039,84 | 100,00% |
| 1.2 | Descapote del terreno e=0,20m | M2 | 403,12 | $ 6.647,00 | $ 2.679.539,00 | | $ - | 0,00% | 403,12 | $ 2.679.538,64 | 100,00% |
| | **VALOR TOTAL DEL CAPITULO** | | | | **$ 7.065.579,00** | | **$ -** | **0,00%** | | **$ 7.065.578,48** | |
| | **CAPITULO 2: CIMENTACION** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavacion manual | M3 | 49,00 | $ 41.883,00 | $ 2.052.267,00 | | $ - | 0,00% | 49,00 | $ 2.052.267,00 | 100% |
| 2.2 | Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros | ML | 417,00 | $ 171.995,00 | $ 71.721.915,00 | | $ - | 0,00% | 373,50 | $ 64.240.132,50 | 90% |
| 2.3 | Demolición de cabezas de pilotes | M3 | 2,02 | $ 561.749,00 | $ 1.134.733,00 | | $ - | 0,00% | 1,56 | $ 876.328,44 | 77% |
| 2.4 | Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m | M3 | 4,47 | $ 373.513,00 | $ 1.669.603,00 | | $ - | 0,00% | 1,37 | $ 511.712,81 | 31% |
| 2.5 | Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto) | M3 | 15,91 | $ 536.803,00 | $ 8.540.536,00 | | $ - | 0,00% | 13,43 | $ 7.209.264,29 | 84% |
| 2.6 | Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación) | KG | 2929,80 | $ 4.939,00 | $ 14.470.282,00 | | $ - | 0,00% | 2465,72 | $ 12.178.191,08 | 84% |
| 2.7 | Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto) | M3 | 9,03 | $ 601.049,00 | $ 5.427.472,00 | 1,39 | $ 835.458,11 | 0,06% | 8,89 | $ 5.343.325,61 | 0% |
| 2.8 | Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación) | KG | 1838,02 | $ 4.939,00 | $ 9.077.981,00 | 567,29 | $ 2.801.845,31 | 0,19% | 1087,32 | $ 5.370.273,48 | 59% |
| 2.9 | Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto) | M3 | 41,98 | $ 595.979,00 | $ 25.019.198,00 | | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0% |
| 2.10 | Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación) | KG | 5557,46 | $ 5.093,00 | $ 28.304.144,00 | 960,4 | $ 4.891.317,20 | 0,33% | 960,40 | $ 4.891.317,20 | 17% |
| | **VALOR TOTAL DEL CAPITULO** | | | | **$ 167.418.131,00** | | **$ 8.528.620,62** | **0,57%** | | **$ 102.672.812,41** | |
| | **COSTOS DIRECTOS** | | **%** | | **$ 1.491.530.637,00** | | **$ 8.528.620,62** | **0,57%** | | **$ 109.738.390,89** | |
| | ADMINISTRACION | | 19,00% | | $ 283.390.821,00 | | $ 1.620.437,92 | | | $ 20.850.294,27 | |
| | IMPREVISTOS | | 1,00% | | $ 14.915.306,00 | | $ 85.286,21 | | | $ 1.097.383,91 | |
| | UTILIDAD | | 5,00% | | $ 74.576.532,00 | | $ 426.431,03 | | | $ 5.486.919,54 | |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | 19,00% | | $ 14.169.541,00 | | $ 81.021,90 | | | $ 1.042.514,71 | |
| | | | | | | | **$ 2.213.177,05** | | | **$ 28.477.112,44** | |
| | **SUBTOTAL COSTO INDIRECTO** | | | | **$ 387.052.200** | | **$ 10.741.797,67** | | | **$ 138.215.503,33** | |
| | **TOTAL** | | | | **$ 1.878.582.837** | | **$ 10.741.797,67** | | | **$ 138.215.503,33** | |

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
**INTERVENTOR**

MINISTERIO DE CULTURA

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA No.** | **7** | | | | |
| **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** | 3/10/2022 | **Y EL** | 9/10/2022 | **PLAZO:** | 76 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VYNSAP | | | **CONTRATO No.** | 3004 |
| **INTERVENTOR:** | ENRIQUEALONSO TOVAR BAQUERO | | | **CONTRATO No.** | 3010 |

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

| FECHA | MES SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| **CARGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| MAESTRO DE OBRA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| OFICIAL | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| AYUDANTE | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL CONTRATISTA** | **12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL PERIODO** | **72** | | |
| **PROCEDENCIA / CONDICIÓN** | **MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*** | **SUMATORIA** | **PORCENTAJE** | **CUMPLE S/N** |
| **MANO OBRA NO CALIFICADA** | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | | 0 | 0,00% | |
| De fuera de la región | | 0 | 0,00% | |
| **MANO OBRA CALIFICADA** | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | 3 | 18 | 25,00% | |
| De fuera de la región | 1 | 6 | 8,33% | |
| **PROFESIONALES - TÉCNICOS** | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | 6 | 36 | 50,00% | |
| De fuera de la región | | 0 | 0,00% | |
| **POBLACIÓN VULNERABLE** | | **0** | **0,00%** | |
| En proceso de reinserción social | | 0 | 0,00% | |
| En condición de desplazamiento | | 0 | 0,00% | |
| **MUJERES** | | **0** | **0,00%** | |
| Mano de Obra no Calificada | | 0 | 0,00% | |
| Mano de Obra Calificada | | 0 | 0,00% | |
| Profesionales - Técnicos | | 0 | 0,00% | |
| **PROVEEDORES** | 1 | | | |
| Local | | | | |
| Nacional | | | | |
| Internacional | | | | |

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:



**ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO**
**INTERVENTOR**

## OBRA

| NOMBRE | CARGO | DEDICACION |
|---|---|---|
| HERLEY RINCON LEGUIZAMON | DIRECTOR DE OBRAS | % |
| LUIS CARLOS OBANDO | RESIDENTE DE OBRAS | 100% |
| CAMILA TELLO ROSERO | PROFESIONAL HSQ | 100% |
| EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ | MAESTRO | 100% |
| JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| MARY GISSELA ESTACIO MOSQUERA | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| CARLOS DANILO JIMENES BUILA | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## INTERVENTORIA

| NOMBRE | CARGO | DEDICACION |
|---|---|---|
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 25% |
| ABRAHAM YELA GARCIA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 100% |
| BRIAM DAVID PANTOJA | PROFESIONAL HSQ | 100% |

MINISTERIO DE CULTURA

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



**Código:** F-GIN-098
**Versión:** 4
**Fecha:** 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | Semana: 8 | 10/10/2022 | 16/10/2022 | |
| **OBJETO:** | **CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO** | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | 3004 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** | 3010 | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO VYNSAP | **INTEVENTOR** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **VALOR CONTRATO DE OBRA:** | $ 1.878.582.837,00 | **VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | $ 108.237.938,00 | |
| **FECHA DE INICIO OBRA:** | 24 DE AGOSTO DE 2022 | **FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:** | 24 DE AGOSTO DE 2022 | |
| **FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:** | N/A | **FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:** | N/A | |
| **FECHA DE REINICIO DE OBRA:** | N/A | **FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:** | N/A | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:** | 24 DE DICIEMBRE DE 2022 | **FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| **NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:** | N/A | **NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:** | N/A | |
| **PLAZO DE DURACIÓN OBRA:** | 4 MESES | **PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:** | 5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |

## 3. Descripción Obras ejecutadas

SE CONTINUA REALIZANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA PEDESTALES, SE FINALIZA LA FUNDICION DE PEDESTALES, SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE RELLENO DE ZAPATAS Y EL CORTE Y FIGURADO PARA LAS CANASTAS DE LAS VIGAS AEREAS, LOSA DEL BLOQUE DE RESTAURANTE COCINA. SE INICIA EL ARMADO DE TABLEROS Y COLOCACION DE SOPORTE PARA VIGAS DEL BLOQUE COCINA, SE DEMUELE LA TRAMPA DE GRASAS DEBIDO A QUE ESTA SE ENCONTRABA SOBRE EJE DE ZAPATAS Y PEDESTALES POR LO QUE FUE NECESARIO REALIZAR LA DEMOCION PARA MANTENER EL EJE DE ACUERDO A LOS DISEÑOS DEL PROYECTO.

## 1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>

<ángulo visual 2>



<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

## E Curva "S"





Gráfico porcent ejecutadas vs programadas





Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

## 2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

## 5. Control Avance de Obra

| ESTADO DEL PLAZO | DIAS TRANSCURRIDOS | PORCENTAJE DEL PLAZO (%) |
|---|---|---|
| | **54** | **43,90%** |
| | VALOR ($) | PORCENTAJE (%) |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1) | **$ 381.592.143,0** | **23,32%** |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2) | **$ 143.745.184,7** | **7,57%** |
| EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1) | **-$ 237.846.958,27** | **-15,75%** |
| Se presenta un atraso en la Obra | | |
| ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso) | **-19** | |

## 6. Personal de obra e interventoria

| | CARGO | CANT |
|---|---|---|
| INTERVENTORÍA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 1 |
| | PROFESIONAL HSQ | 1 |
| | **CARGO** | **CANT** |
| CONTRATISTA | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| | PROFESIONAL HSQ | 1 |
| | ALMACENISTA | |
| | MAESTRO DE OBRA | 1 |
| | AYUDANTES | 5 |
| | OFICIALES | 2 |
| | HERREROS | |
| TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA | | **14** |

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA:

De acuerdo con el desarrollo de la obra hasta el momento, se ha podido evidenciar que el contratista no ha podido balancear las actividades en obra contra lo programado originalmente y semana a semana se va acumulando un retraso que a la fecha es muy representativo, de acuerdo a lo reportado en el presente informe se aprecia un retraso de 19 dias con respecto a la programacion, generando un retraso del 15,75%. En las diferentes reuniones de avance, se le ha reiterado al contratista la necesidad de implementar un plan de contingencia para revertir el atraso, pero no se ha tenido una respuesta positiva y bajo estas circuntancias la obra posiblemente no va a ser entregada dentro de los tiempos establecidos en el contrato.


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


## PORCENTAJES SEMANA

| SEM | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,52% | 0,52% | 0,44% | 0,44% |
| 2 | 1,10% | 1,62% | 0,05% | 0,49% |
| 3 | 1,09% | 2,71% | 3,88% | 4,37% |
| 4 | 1,07% | 3,78% | 0,41% | 4,78% |
| 5 | 2,56% | 6,34% | 1,35% | 6,13% |
| 6 | 4,42% | 10,76% | 0,58% | 6,70% |
| 7 | 4,81% | 15,57% | 0,57% | 7,28% |
| 8 | 7,75% | 23,32% | 0,29% | 7,57% |
| 9 | 3,92% | 27,24% | | |
| 10 | 4,66% | 31,90% | | |
| 11 | 3,55% | 35,45% | | |
| 12 | 3,07% | 38,52% | | |
| 13 | 2,88% | 41,40% | | |
| 14 | 2,49% | 43,89% | | |
| 15 | 3,53% | 47,42% | | |
| 16 | 1,55% | 48,97% | | |
| 17 | 4,37% | 53,34% | | |
| 18 | 46,66% | 100,00% | | |

## CANTIDADES SEMANA

| SEM | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 9.762.565,00 | $ 9.762.565,00 | $ 9.780.498,05 | $ 9.780.498,05 |
| 2 | $ 20.705.168,00 | $ 30.467.733,00 | $ 1.007.556,30 | $ 10.788.054,34 |
| 3 | $ 20.388.155,00 | $ 50.855.888,00 | $ 72.840.833,43 | $ 83.628.887,78 |
| 4 | $ 20.147.663,00 | $ 71.003.551,00 | $ 7.736.604,85 | $ 91.365.492,63 |
| 5 | $ 48.113.256,00 | $ 119.116.807,00 | $ 25.297.356,79 | $ 116.662.849,42 |
| 6 | $ 83.049.878,00 | $ 202.166.685,00 | $ 10.810.856,23 | $ 127.473.705,66 |
| 7 | $ 90.275.460,00 | $ 292.442.145,00 | $ 10.741.797,67 | $ 138.215.503,33 |
| 8 | $ 89.149.998,00 | $ 381.592.143,00 | $ 5.529.681,41 | $ 143.745.184,73 |
| 9 | $ 73.595.606,00 | $ 455.187.749,00 | | |
| 10 | $ 87.544.963,00 | $ 542.732.712,00 | | |
| 11 | $ 66.715.538,00 | $ 609.448.250,00 | | |
| 12 | $ 57.664.344,00 | $ 667.112.594,00 | | |
| 13 | $ 54.175.172,00 | $ 721.287.766,00 | | |
| 14 | $ 65.572.294,00 | $ 786.860.060,00 | | |
| 15 | $ 66.369.512,00 | $ 853.229.572,00 | | |
| 16 | $ 29.208.430,00 | $ 882.438.002,00 | | |
| 17 | $ 88.908.022,00 | $ 971.346.024,00 | | |
| 18 | $ 907.236.814,00 | $ 1.878.582.838,00 | | |

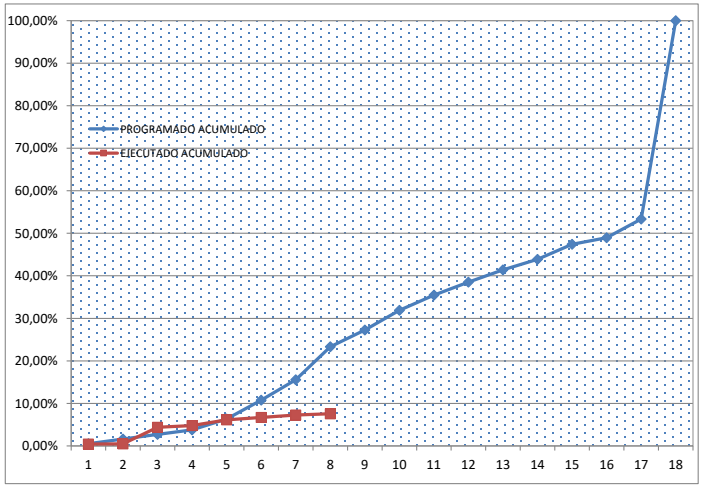

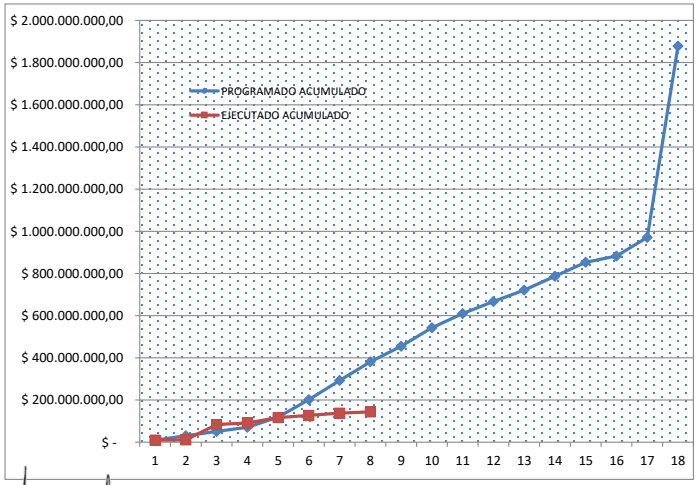
ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

**ANEXO 3**

| | | |
|---|---|---|
| **Proyecto Nº.** | 3004 de 2022 | |
| **Interventor:** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **Constructor:** | CONSORCIO VYNSAP | |
| **Semana Reportada:** | 6 | |
| **Perido de Informe:** | 10/10/2022 | 16/10/2022 |

## REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

**1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS**



Se realiza encofrado en madera en vigas aeras modulo de restaurante.



Se realiza figurado de acero de refuerzo.

**2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA**



Se desencofraron los pedestales y se relleno con material de sitio las zapatas .

**3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.**

No se ejecutaron actividades que requieran la adquisición y almacenamiento de materiales para relleno.

**4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales**

| |
|---|
| N/A |

**5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas**

| |
|---|
| Se capto agua por medio de bombeo con electrobomba en pozo profundo para mezcla de concreto para fundición de pedestal en el modulo de orfebreria. |

**6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:**

| | |
|---|---|
|  | Se realiza actividades de encofrado de madera para vigas aereas en modulo de restaurante, fundicion de concreto en pedestales en modulo de orfebreria y relleno de material de sitio de zapatas .<br>Estas actividades son realizadas con herramientas manuales que no representan impactos ambientales. |

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

**ANEXO 4**

| | | |
|---|---|---|
| **Proyecto Nº.** | | |
| **Interventor:** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **Constructor:** | CONSORCIO VYNSAP | |
| **Semana Reportada:** | 8 | |
| **Perido de Informe:** | 10/10/2022 | 16/10/2022 |

## REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

**1. CALIDAD DE MATERIALES**

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
**Según Formato No.** _____

| **SI** | **NO** |
|---|---|
| x | |

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, AGREGADOS, CEMENTO, MADERA PARA FORMALETAS

**2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS**

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
**Según Formato No.** _____

| **SI** | **NO** |
|---|---|
| x | |

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA, TROMPO Y RANA

**3. ENSAYOS**

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
**Según Formato No.** _____

| **SI** | **NO** |
|---|---|
| x | |

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

Nuevamente se solicita al contratista los resultados de laboratorios de los concretos, la interventoria aun se encuentra a la espera de estos para la verificacion final de la resistencia de los concretos utilizados.

























| MINISTERIO DE CULTURA | SECRETARIA GENERAL |
|---|---|
| | MINISTERIO DE CULTURA |
| | FORMATO DE PRESUPUESTO |

| INFORMACION BASICA | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA REG. | 19 DE SEPTIEMBRE HASTA 258 DE SEPTIEMBRE | DEPARTAMENTO | NARIÑO |
| SEMANA No. | 5 | OBJETO | PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL |
| NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE | | ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO | |
| BALANCE DE OBRA | | | |

MINISTERIO DE CULTURA

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**



**Código:** F-GIN-098
**Versión: 4**
**Fecha:** 24/Abr/2019

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | SEMANA 8 | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo. | M2 | 393,12 | $ 11.157,00 | $ 4.386.040,00 | | $ - | 0,00% | 393,12 | $ 4.386.039,84 | 100,00% |
| 1.2 | Descapote del terreno e=0,20m | M2 | 403,12 | $ 6.647,00 | $ 2.679.539,00 | | $ - | 0,00% | 403,12 | $ 2.679.538,64 | 100,00% |
| | **VALOR TOTAL DEL CAPITULO** | | | | **$ 7.065.579,00** | | **$ -** | **0,00%** | | **$ 7.065.578,48** | |
| | **CAPITULO 2: CIMENTACION** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavacion manual | M3 | 49,00 | $ 41.883,00 | $ 2.052.267,00 | | $ - | 0,00% | 49,00 | $ 2.052.267,00 | 100% |
| 2.2 | Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros | ML | 417,00 | $ 171.995,00 | $ 71.721.915,00 | | $ - | 0,00% | 373,50 | $ 64.240.132,50 | 90% |
| 2.3 | Demolición de cabezas de pilotes | M3 | 2,02 | $ 561.749,00 | $ 1.134.733,00 | | $ - | 0,00% | 1,56 | $ 876.328,44 | 77% |
| 2.4 | Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m | M3 | 4,47 | $ 373.513,00 | $ 1.669.603,00 | | $ - | 0,00% | 1,37 | $ 511.712,81 | 31% |
| 2.5 | Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto) | M3 | 15,91 | $ 536.803,00 | $ 8.540.536,00 | | $ - | 0,00% | 13,43 | $ 7.209.264,29 | 84% |
| 2.6 | Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación) | KG | 2929,80 | $ 4.939,00 | $ 14.470.282,00 | | $ - | 0,00% | 2465,72 | $ 12.178.191,08 | 84% |
| 2.7 | Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto) | M3 | 9,03 | $ 601.049,00 | $ 5.427.472,00 | 2,83 | $ 1.700.968,67 | 0,11% | 11,72 | $ 7.044.294,28 | 130% |
| 2.8 | Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación) | KG | 1838,02 | $ 4.939,00 | $ 9.077.981,00 | | $ - | 0,00% | 1087,32 | $ 5.370.273,48 | 59% |
| 2.9 | Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto) | M3 | 41,98 | $ 595.979,00 | $ 25.019.198,00 | | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0% |
| 2.10 | Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación) | KG | 5557,46 | $ 5.093,00 | $ 28.304.144,00 | 528,06 | $ 2.689.409,58 | 0,18% | 1488,46 | $ 7.580.726,78 | 27% |
| | **VALOR TOTAL DEL CAPITULO** | | | | **$ 167.418.131,00** | | **$ 4.390.378,25** | **0,29%** | | **$ 107.063.190,66** | |
| | **COSTOS DIRECTOS** | | **%** | | **$ 1.491.530.637,00** | | **$ 4.390.378,25** | **0,29%** | | **$ 114.128.769,14** | |
| | ADMINISTRACION | | 19,00% | | $ 283.390.821,00 | | $ 834.171,87 | | | $ 21.684.466,14 | |
| | IMPREVISTOS | | 1,00% | | $ 14.915.306,00 | | $ 43.903,78 | | | $ 1.141.287,69 | |
| | UTILIDAD | | 5,00% | | $ 74.576.532,00 | | $ 219.518,91 | | | $ 5.706.438,46 | |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | 19,00% | | $ 14.169.541,00 | | $ 41.708,59 | | | $ 1.084.223,31 | |
| | | | | | | | **$ 1.139.303,16** | | | **$ 29.616.415,59** | |
| | **SUBTOTAL COSTO INDIRECTO** | | | | **$ 387.052.200** | | **$ 5.529.681,41** | | | **$ 143.745.184,73** | |
| | **TOTAL** | | | | **$ 1.878.582.837** | | **$ 5.529.681,41** | | | **$ 143.745.184,73** | |

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
**INTERVENTOR**

MINISTERIO DE CULTURA

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA No.** | **8** | | | | |
| **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** | 10/10/2022 | **Y EL** | 16/10/2022 | **PLAZO:** | 69 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VYNSAP | | | **CONTRATO No.** | 3004 |
| **INTERVENTOR:** | ENRIQUEALONSO TOVAR BAQUERO | | | **CONTRATO No.** | 3010 |

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

| FECHA | MES OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| **CARGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAESTRO DE OBRA | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFICIAL | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTE | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL CONTRATISTA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **TOTAL PERIODO** 72 |

| **PROCEDENCIA / CONDICIÓN** | **MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*** | **SUMATORIA** | **PORCENTAJE** | **CUMPLE S/N** |
|---|---|---|---|---|
| **MANO OBRA NO CALIFICADA** | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | | 0 | 0,00% | |
| De fuera de la región | | 0 | 0,00% | |
| **MANO OBRA CALIFICADA** | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | | 18 | 25,00% | |
| De fuera de la región | | 6 | 8,33% | |
| **PROFESIONALES - TÉCNICOS** | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | | 30 | 41,67% | |
| De fuera de la región | | 0 | 0,00% | |
| **POBLACIÓN VULNERABLE** | | **0** | **0,00%** | |
| En proceso de reinserción social | | 0 | 0,00% | |
| En condición de desplazamiento | | 0 | 0,00% | |
| **MUJERES** | | **0** | **0,00%** | |
| Mano de Obra no Calificada | | 0 | 0,00% | |
| Mano de Obra Calificada | | 0 | 0,00% | |
| Profesionales - Técnicos | | 0 | 0,00% | |
| **PROVEEDORES** | | | | |
| Local | | | | |
| Nacional | | | | |
| Internacional | | | | |

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

**ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO**
**INTERVENTOR**

## OBRA

| NOMBRE | CARGO | DEDICACION |
|---|---|---|
| HERLEY RINCON LEGUIZAMON | DIRECTOR DE OBRA | % |
| JORGE SALAZAR | RESIDENTE DE OBRA | 100% |
| CAMILA TELLO ROSERO | PROFESIONAL HSQ | 100% |
| EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ | MAESTRO | 100% |
| JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| CARLOS DANILO JIMENES BUILA | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## INTERVENTORIA

| NOMBRE | CARGO | DEDICACION |
|---|---|---|
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 25% |
| ABRAHAM YELA GARCIA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 100% |
| BRIAM DAVID PANTOJA | PROFESIONAL HSQ | 100% |

MINISTERIO DE CULTURA

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA



**Código:** F-GIN-098
**Versión:** 4
**Fecha:** 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | Semana: 9 | 17/10/2022 | 23/10/2022 | |
| **OBJETO:** | **CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO** | | | |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | 3004 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** | 3010 | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO VYNSAP | **INTEVENTOR** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **VALOR CONTRATO DE OBRA:** | $ 1.878.582.837,00 | **VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** | $ 108.237.938,00 | |
| **FECHA DE INICIO OBRA:** | 24 DE AGOSTO DE 2022 | **FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:** | 24 DE AGOSTO DE 2022 | |
| **FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:** | N/A | **FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:** | N/A | |
| **FECHA DE REINICIO DE OBRA:** | N/A | **FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:** | N/A | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:** | 24 DE DICIEMBRE DE 2022 | **FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE IN/TORIA:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| **NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:** | N/A | **NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE IN/TORIA:** | N/A | |
| **PLAZO DE DURACIÓN OBRA:** | 4 MESES | **PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:** | 5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |

## 3. Descripción Obras ejecutadas

SE CONTINUA REALIZANDO OBRAS DE CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE VIGAS DE CIMENTACION DE LOSA , SE CONTINUA CON EL CORTE E INSTALACION DE ENTABLADO EN MADERA PARA EL SOPORTE DE LOSA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE VARILLAS DE 5/8 EN ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJES DE ESTRUCTURA METALICA, SE INICIA CON EL CORTE SE REALIZA ACTIVIDADES DE RELLENO DE ZAPATAS, SE REALIZA ACTIVIDADES CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE VIGAS DE AEREAS LOSA DEL BLOQUE DE RESTAURANTE COCINA. SE CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE LOSA. SE INICIA CON EL CORTE Y FUGURADO DE ACERO DEL BLOQUE DE ORFEBRERIA, INICIANDO AMARRE DE VIGAS AEREAS. SE REALIZA LA ACOMETIDA INDEPENDIENTE E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO EN LA OBRA

## 1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

<ángulo visual 1>

<ángulo visual 2>



<ángulo visual 3>

<ángulo visual 4>

## E Curva "S"





Gráfico porcent ejecutadas vs programadas





Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

## 2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

## 5. Control Avance de Obra

| ESTADO DEL PLAZO | DIAS TRANSCURRIDOS | PORCENTAJE DEL PLAZO (%) |
|---|---|---|
| | **61** | **49,59%** |
| | VALOR ($) | PORCENTAJE (%) |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1) | **$ 455.187.749,0** | **27,24%** |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2) | **$ 152.191.781,7** | **8,02%** |
| EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1) | **-$ 302.995.967,31** | **-19,22%** |
| Se presenta un atraso en la Obra | | |
| ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso) | **-24** | |

## 6. Personal de obra e interventoria

| | CARGO | CANT |
|---|---|---|
| INTERVENTORÍA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 1 |
| | PROFESIONAL HSQ | 1 |
| | **CARGO** | **CANT** |
| CONTRATISTA | DIRECTOR DE OBRA | |
| | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| | PROFESIONAL HSQ | 1 |
| | ALMACENISTA | |
| | MAESTRO DE OBRA | 1 |
| | AYUDANTES | 5 |
| | OFICIALES | 2 |
| | HERREROS | |
| TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA | | **12** |

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA:

En la presente semana se evidencia un avance significativo en las formaletas de las placas de piso de los tres bloques, y el amarre de las vigas, sin embargo tanto la interventoria como el contratista tienen reparos con respecto al despiece del hierro en las vigas de 5,65 de luz, pues sobre el terreno al armar esas vigas se puede apreciar que posiblemente se requiere mayor refuerzo teniendo en cuenta las luces, por lo tanto se hace solicitud al Ministerio dar aprobacion al armado de los hierros de acuerdo a los planos recibidos o de lo contrario revisar el tema y ajustar lo requerido, con el fin de poder fundir toda la estructura de vigas y placas lo mas pronto posible para evitar que esta situacion, de alguna manera pudiera retrasar el desarrollo de esta ac tividad.


ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR


## PORCENTAJES SEMANA

| SEM | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,52% | 0,52% | 0,44% | 0,44% |
| 2 | 1,10% | 1,62% | 0,05% | 0,49% |
| 3 | 1,09% | 2,71% | 3,88% | 4,37% |
| 4 | 1,07% | 3,78% | 0,41% | 4,78% |
| 5 | 2,56% | 6,34% | 1,35% | 6,13% |
| 6 | 4,42% | 10,76% | 0,58% | 6,70% |
| 7 | 4,81% | 15,57% | 0,57% | 7,28% |
| 8 | 7,75% | 23,32% | 0,29% | 7,57% |
| 9 | 3,92% | 27,24% | 0,45% | 8,02% |
| 10 | 4,66% | 31,90% | | |
| 11 | 3,55% | 35,45% | | |
| 12 | 3,07% | 38,52% | | |
| 13 | 2,88% | 41,40% | | |
| 14 | 2,49% | 43,89% | | |
| 15 | 3,53% | 47,42% | | |
| 16 | 1,55% | 48,97% | | |
| 17 | 4,37% | 53,34% | | |
| 18 | 46,66% | 100,00% | | |

## CANTIDADES SEMANA

| SEM | PROGRAMADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 9.762.565,00 | $ 9.762.565,00 | $ 9.780.498,05 | $ 9.780.498,05 |
| 2 | $ 20.705.168,00 | $ 30.467.733,00 | $ 1.007.556,30 | $ 10.788.054,34 |
| 3 | $ 20.388.155,00 | $ 50.855.888,00 | $ 72.840.833,43 | $ 83.628.887,78 |
| 4 | $ 20.147.663,00 | $ 71.003.551,00 | $ 7.736.604,85 | $ 91.365.492,63 |
| 5 | $ 48.113.256,00 | $ 119.116.807,00 | $ 25.297.356,79 | $ 116.662.849,42 |
| 6 | $ 83.049.878,00 | $ 202.166.685,00 | $ 10.810.856,23 | $ 127.473.705,66 |
| 7 | $ 90.275.460,00 | $ 292.442.145,00 | $ 10.741.797,67 | $ 138.215.503,33 |
| 8 | $ 89.149.998,00 | $ 381.592.143,00 | $ 5.529.681,41 | $ 143.745.184,73 |
| 9 | $ 73.595.606,00 | $ 455.187.749,00 | $ 8.446.596,95 | $ 152.191.781,69 |
| 10 | $ 87.544.963,00 | $ 542.732.712,00 | | |
| 11 | $ 66.715.538,00 | $ 609.448.250,00 | | |
| 12 | $ 57.664.344,00 | $ 667.112.594,00 | | |
| 13 | $ 54.175.172,00 | $ 721.287.766,00 | | |
| 14 | $ 65.572.294,00 | $ 786.860.060,00 | | |
| 15 | $ 66.369.512,00 | $ 853.229.572,00 | | |
| 16 | $ 29.208.430,00 | $ 882.438.002,00 | | |
| 17 | $ 88.908.022,00 | $ 971.346.024,00 | | |
| 18 | $ 907.236.814,00 | $ 1.878.582.838,00 | | |

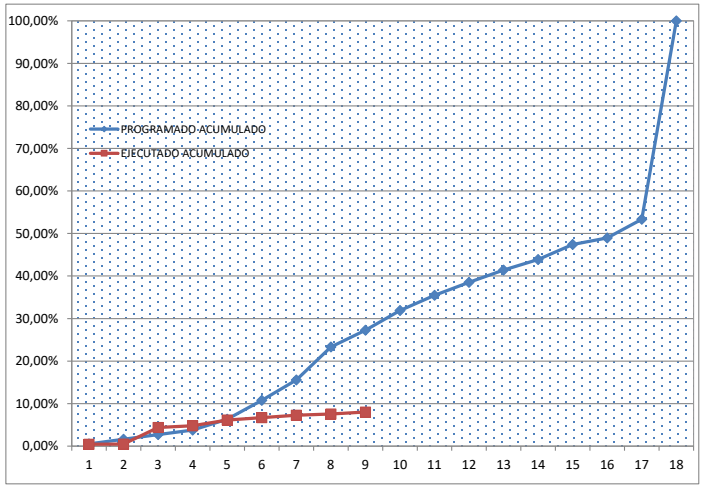

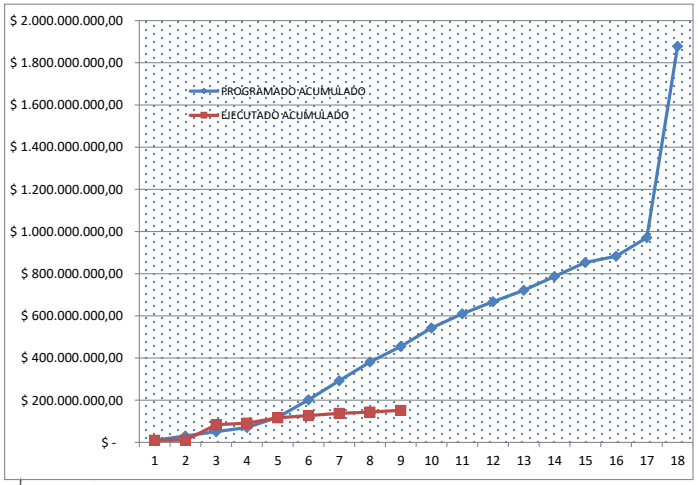
ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

**ANEXO 3**

| | | |
|---|---|---|
| **Proyecto Nº.** | 3004 de 2022 | |
| **Interventor:** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **Constructor:** | CONSORCIO VYNSAP | |
| **Semana Reportada:** | 9 | |
| **Perido de Informe:** | 17/10/2022 | 23/10/2022 |

## REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

**1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS**



Almacenamiento de madera para actividades de encofrado.



Corte de madera para encofrado de losa en el modulo de cocina.

**2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA**



Disposición por parte del contratista para el almacenamiento de residuos de madera en la parte posterior del bloque de cocina.

**3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.**

No se ha reaizado actividades que se requiera adquisición de materiales para relleno.

**4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales**

| |
|---|
| N/A |

**5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas**

| |
|---|
| No se realizó la captación de agua por medio de bombeo con electrobomba en pozo profundo ya que no hubo funcición. |

**6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:**

| | |
|---|---|
|  | Se identifica un impacto ambiental negativo en la parte posterior de obra en zona de manglar, el ingreso de basura a la obra por arrastre del mar. |

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
INTERVENTOR

**ANEXO 4**

| | | |
|---|---|---|
| **Proyecto Nº.** | | |
| **Interventor:** | ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO | |
| **Constructor:** | CONSORCIO VYNSAP | |
| **Semana Reportada:** | 9 | |
| **Perido de Informe:** | 17/10/2022 | 23/10/2022 |

## REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

**1. CALIDAD DE MATERIALES**

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
**Según Formato No.** _____

| **SI** | **NO** |
|---|---|
| x | |

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:
ACERO, AGREGADOS, CEMENTO, MADERA PARA FORMALETAS

**2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS**

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
**Según Formato No.** _____

| **SI** | **NO** |
|---|---|
| x | |

Enumere los equipos calibrados: PULIDORA, TROMPO Y RANA

**3. ENSAYOS**

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
**Según Formato No.** _____

| **SI** | **NO** |
|---|---|
| x | |

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales:

Nuevamente se solicita al contratista los resultados de laboratorios de los concretos, la interventoria aun se encuentra a la espera de estos para la verificacion final de la resistencia de los concretos utilizados.

























| MINISTERIO DE CULTURA | SECRETARIA GENERAL<br>MINISTERIO DE CULTURA<br>FORMATO DE PRESUPUESTO |
|---|---|

| INFORMACION BASICA | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA REG. | 17 DE OCTUBRE HASTA EL 23 DE OCTUBRE | DEPARTAMENTO | NARIÑO |
| SEMANA No. | 9 | OBJETO | PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL |
| NOMBRE DEL INMUEBLE O SEDE | | ESCUELA TALLER DE TUMACO EN NARIÑO | |

**BALANCE DE OBRA**

MINISTERIO DE CULTURA

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**



**Código:** F-GIN-098
**Versión: 4**
**Fecha:** 24/Abr/2019

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPITULO 1: ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | SEMANA 9 | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo. | M2 | 393,12 | $ 11.157,00 | $ 4.386.040,00 | | $ - | 0,00% | 393,12 | $ 4.386.039,84 | 100,00% |
| 1.2 | Descapote del terreno e=0,20m | M2 | 403,12 | $ 6.647,00 | $ 2.679.539,00 | | $ - | 0,00% | 403,12 | $ 2.679.538,64 | 100,00% |
| | **VALOR TOTAL DEL CAPITULO** | | | | **$ 7.065.579,00** | | **$ -** | **0,00%** | | **$ 7.065.578,48** | |
| | **CAPITULO 2: CIMENTACION** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavacion manual | M3 | 49,00 | $ 41.883,00 | $ 2.052.267,00 | | $ - | 0,00% | 49,00 | $ 2.052.267,00 | 100% |
| 2.2 | Pilotes hincados S=25cm x 25cm (incluye excavación, Concreto 3500 psi, Acero 60000psi, Bentonita, cargue y retiro de escombros | ML | 417,00 | $ 171.995,00 | $ 71.721.915,00 | | $ - | 0,00% | 373,50 | $ 64.240.132,50 | 90% |
| 2.3 | Demolición de cabezas de pilotes | M3 | 2,02 | $ 561.749,00 | $ 1.134.733,00 | | $ - | 0,00% | 1,56 | $ 876.328,44 | 77% |
| 2.4 | Concreto de limpieza (2000 psi) e=0.10m | M3 | 4,47 | $ 373.513,00 | $ 1.669.603,00 | | $ - | 0,00% | 1,37 | $ 511.712,81 | 31% |
| 2.5 | Zarpa o dados en concreto para amarre de pilotes hincados en concreto premesclado de 3000psi (incluye formaleta y concreto) | M3 | 15,91 | $ 536.803,00 | $ 8.540.536,00 | | $ - | 0,00% | 13,43 | $ 7.209.264,29 | 84% |
| 2.6 | Acero Zarpa de Amarre (Incluye figurado e instalación) | KG | 2929,80 | $ 4.939,00 | $ 14.470.282,00 | | $ - | 0,00% | 2465,72 | $ 12.178.191,08 | 84% |
| 2.7 | Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye formaleteado y concreto) | M3 | 9,03 | $ 601.049,00 | $ 5.427.472,00 | | $ - | 0,00% | 11,72 | $ 7.044.294,28 | 130% |
| 2.8 | Acero Pedestal en Concreto de 3000 psi (Incluye figurado e instalación) | KG | 1838,02 | $ 4.939,00 | $ 9.077.981,00 | | $ - | 0,00% | 1087,32 | $ 5.370.273,48 | 59% |
| 2.9 | Viga de Amarre cimentación concreto 3000 psi (Incluye Formaleta y concreto) | M3 | 41,98 | $ 595.979,00 | $ 25.019.198,00 | | $ - | 0,00% | 0,00 | $ - | 0% |
| 2.10 | Acero viga de Amarre Cimentación (Incluye figurado e instalación) | KG | 5557,46 | $ 5.093,00 | $ 28.304.144,00 | 1316,77 | $ 6.706.309,61 | 0,45% | 2805,23 | $ 14.287.036,39 | 50% |
| | **VALOR TOTAL DEL CAPITULO** | | | | **$ 167.418.131,00** | | **$ 6.706.309,61** | **0,45%** | | **$ 113.769.500,27** | |
| | **COSTOS DIRECTOS** | | **%** | **$ 1.491.530.637,00** | | **$ 6.706.309,61** | **0,45%** | | **$ 120.835.078,75** | |
| | ADMINISTRACION | | 19,00% | $ 283.390.821,00 | | $ 1.274.198,83 | | | $ 22.958.664,96 | |
| | IMPREVISTOS | | 1,00% | $ 14.915.306,00 | | $ 67.063,10 | | | $ 1.208.350,79 | |
| | UTILIDAD | | 5,00% | $ 74.576.532,00 | | $ 335.315,48 | | | $ 6.041.753,94 | |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | 19,00% | $ 14.169.541,00 | | $ 63.709,94 | | | $ 1.147.933,25 | |
| | | | | | | **$ 1.740.287,34** | | | **$ 31.356.702,94** | |
| | **SUBTOTAL COSTO INDIRECTO** | | | **$ 387.052.200** | | **$ 8.446.596,95** | | | **$ 152.191.781,69** | |
| | **TOTAL** | | | **$ 1.878.582.837** | | **$ 8.446.596,95** | | | **$ 152.191.781,69** | |

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
**INTERVENTOR**

MINISTERIO DE CULTURA

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA No.** | **9** | | | | |
| **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** | 17/10/2022 | **Y EL** | 23/10/2022 | **PLAZO:** | 62 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VYNSAP | | | **CONTRATO No.** | 3004 |
| **INTERVENTOR:** | ENRIQUEALONSO TOVAR BAQUERO | | | **CONTRATO No.** | 3010 |

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

| FECHA | MES OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| **CARGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| MAESTRO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| AYUDANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL CONTRATISTA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **TOTAL PERIODO** 72 |

| **PROCEDENCIA / CONDICIÓN** | **MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*** | **SUMATORIA** | **PORCENTAJE** | **CUMPLE S/N** |
|---|---|---|---|---|
| **MANO OBRA NO CALIFICADA** | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | | 0 | 0,00% | |
| De fuera de la región | | 0 | 0,00% | |
| **MANO OBRA CALIFICADA** | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | | 18 | 25,00% | |
| De fuera de la región | | 6 | 8,33% | |
| **PROFESIONALES - TÉCNICOS** | | **0** | **0,00%** | |
| De la región | | 30 | 41,67% | |
| De fuera de la región | | 0 | 0,00% | |
| **POBLACIÓN VULNERABLE** | | **0** | **0,00%** | |
| En proceso de reinserción social | | 0 | 0,00% | |
| En condición de desplazamiento | | 0 | 0,00% | |
| **MUJERES** | | **0** | **0,00%** | |
| Mano de Obra no Calificada | | 0 | 0,00% | |
| Mano de Obra Calificada | | 0 | 0,00% | |
| Profesionales - Técnicos | | 0 | 0,00% | |
| **PROVEEDORES** | | | | |
| Local | | | | |
| Nacional | | | | |
| Internacional | | | | |

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

**ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO**
**INTERVENTOR**

## OBRA

| NOMBRE | CARGO | DEDICACION |
|---|---|---|
| HERLEY RINCON LEGUIZAMON | DIRECTOR DE OBRA | % |
| JORGE SALAZAR | RESIDENTE DE OBRA | 100% |
| CAMILA TELLO ROSERO | PROFESIONAL HSQ | 100% |
| EVER DE JESUS MARTINEZ CORTEZ | MAESTRO | 100% |
| JOSE ALFREDO CAICEDO ALBAN | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| JOSE DANILO PRECIADO PRECIADO | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| NAYDER ALEXIS VALVERDE VALENCIA | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| BRAYAN DAVID CABEZAS QUIÑONES | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| CARLOS DANILO JIMENES BUILA | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| ELLIN ALEJANDRO GRANJA TORRES | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| LUIS ANGEL CHINGAL JARAMILLO | AYUDANTE DE OBRA | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## INTERVENTORIA

| NOMBRE | CARGO | DEDICACION |
|---|---|---|
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 25% |
| ABRAHAM YELA GARCIA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 100% |
| BRIAM DAVID PANTOJA | PROFESIONAL HSQ | 100% |

Se une tubería eléctrica en una de las zapatas del Bloque de Danza

Personal en obra.

1 Maestro. Juan Martínez
1 Oficial Héctor Guerrero
9 Ayudantes. José Alfredo Cacedo
José Pregnado
Nayder Valverde
Mario Estacio
Brayan Cadena.
Carlos Jiménez
Elin Granja
Luis Chinchal
Kevin Angulo.

Excavaciones y corte de acero y fleje para vigas. Las excavaciones son del Bloque de Orfebrería, se armó formaleta de zapatas.

Residente de obra.

Res. Interventoría

September 24 2022

Se está desencofrado la capa de inspección (Tramo de Granja). Se sigue armando formaleta de pedestales, también se sigue colocando varilla 3/8 para figurar los fleje de vigas.

Son las 8.30 y se inicia el Hincado de pilotes, la terminación de los 10 pilotes faltantes en el Bloque de Danza y se sigue en el Bloque de Orfebrería

Residente de obra

Res. Interventoría

SEPTIEMBRE 26 2022

SE ARMAN LAS PARRILLAS INFERIORES DEL BLOQUE DE PORTAL, SE CONTINUA CON LA FORMALETA DE PEDESTALES Y CON EL CORTE Y FIGURADO DE ESTRIBOS O FLEJES DE VIGAS.

SE CONTINUA TRABAJAR POR MEDIO DE IMAGENES O PANTILLAZOS, NO SE CUENTA CON PLANOS EN OBRA.

- SE SOLICITA PLANOS EN OBRA EN SU TOTALIDAD.

LLOVIZNA A LAS 11 AM PERO SE PUDO TRABAJAR LLUVIA AM PERO PRACTICAMENTE IMPOSIBLE TRABAJAR INICIO DESDE LA 1:50 PM PARO DE LLUVIA 3:01 PM.

SE FUNDIO CONCRETO DE LIMPIEZA. (SOLADO).

RESIDENTE DE OBRA

Ros. Interventoria

SEPTIEMBRE 27 2022

AMANECE CON LLUVIA. SOBRE LAS 7.00 AM Y HAY UNA LLOVIZNA MOLESTA QUE NO DEJA TRABAJAR EN FORMA, LLUVE HASTA (M). 8:30 AM

- Se tiene armado las formaletas de los pedestales Sin embargo hasta el momento. Falta la Instalacion de esquineros. ademas como las formaletas es en madera, No garantiza un buen acabado teniendo encuenta que es la union de dos tablas. Se le recomienda al Contratista Forrar las formaletas en triplex u otro elemento que Garantise un acabado homogeneo. teniendo encuenta que es concreto a la Vista.
- DE ACUERDO CON LO QUE SOLICITA INTERVENTORIA EN NINGUNA ESPECIFICACION O EN MEMORIAS DE CALCULO HABLA DE QUE EL CONCRETO ES A LA VISTA, YA QUE LLEVARIA UNA FORMALETA ESPECIAL. PERO SI ESTAN DISPUESTOS A ASUMIR EL COSTO CON MUCHO GUSTO SE PROCEDERA

EN UN PROCESO ADECUADO PARA LA EJECUCION DEL CONCRETO A LA VISTA, SE TIENEN YA LA FORMALETA LOS BISELES AUN NO ESTAN PARA LA FORMALETA PORQUE ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION PARA ENTREGA.

RESIDENTE DE OBRA.

Septiembre 28 2022

SE SIGUE CON EL CONTEO DE ACERO PARA MUROS. PARRILLAS DE ZAPATAS., FLEJADOS DE VIGAS; A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS PARA PROCEDER A FUNDICIONES DE PEDESTALES.
SE UBICAN PEDESTALES CON PARRILLA INFERIOR DE ZAPATA Y PARRILLA SUPERIOR EN EL BLOQUE PAUZA.

Maestro de obra Taller. Solicita ingreso con Personal Estudiantil. realiza entrega de Comprobante de Radicacion de Afiliación ARL Positiva. de Estudiantes; A la obra hace el ingreso de 6 estudiantes. mas el Maestro Jose Quiñones.
Se Autoriza el ingreso a obra teniendo en cuenta las medidas de Seguridad y uso obligatoro de elementos de Proteccion Personal.
Camilo Arello
SST obra

Residente de obra

SEPTIEMBRE 29 2022

SE SIGUE TRABAJANDO SIN PLANOS, HASTA LA FECHA NO CONTAMOS CON PLANOS EN OBRA, TRABAJANDO SOLO CON PANTALLAZOS.

- SE SOLICITA PLANOS COMPLETOS, FIRMADOS O CON CARTA DE RESPONSABILIDAD, EL PERSONAL SE PREPARA PARA FUNDICION DE DADOS O ZAPATAS DEL BLOQUE DE ANCLAS.

SE FUNDIERON ZAPATAS DEL BLOQUE DE ANCLAS.

RESIDENTE DE OBRA

SEPTIEMBRE 30 2022

SE INICIA A ARMAR FORMALETA DE PEDESTALES. Y REEXCAVACION PARA ARMAR PARRILLAS DE ZAPATAS EN EL BLOQUE DE CIMENTACION QUE FALTA.

HOY SE HARAN TRABAJOS MANUALES PORQUE NO HAY FLUIDO ELECTRICO EN TODO TUMACO, HUBO UN DAÑO EN LA VIA PASTO - TUMACO POR JUNIN EL CUAL COMPROMETE LA LINEA 115 KV, QUE ES LA QUE SUMINISTRA TODO TUMACO.

SE RESTABLECIO EL FLUIDO ELECTRICO. AL MEDIO DIA, SE TERMINO DE FUNDIR ZAPATAS SE FUNDIO SOLO DE EL BLOQUE CIMENTACION Y SE FUNDIERON 3 PEDESTALES.

RESIDENTE DE OBRA

Octubre 01 2022

- Se Continua con el armado de formaletas de pedestales y Reexcavacion para la Instalacion de parrilla en sitio.

- Se Continua con ul figurado de acero de parrillas Zapatas. y amarre de los mismos.
- Se Encontro una Caja de Inspeccion existente en Sitio la Cual obstaculiza Con una Zapata Rectangular del bloque de orfebreria, por lo Tanto. Se ordeno la demolicion de la misma, y El Contratista debera Realizar los Apu. para mayores Cantidades obra, teniendo en cuenta que esta No esta dentro del presupuesto. igualmente dicha Caja Se reubicara a un punto donde No obstaculice la Ejecucion de Obras Futuras. En estos momento No se puede realizar teniendo Encuenta que falta ul diseño Estructural del Soporte del deck

- Se Fundieron 8 pedestales de 0,35 x 0,35 en el bloque de la cocina

Jorge A Delazt M.
Residente Obra.

Octubre 03 - 2022

- Se fundieron 2 pedestales en concreto de 0,35 x 0,35 m en el bloque de la Cocina
- Se cuantifico las medidas de la Caja de concreto existente que se va a demoler para realizar los APU.
- Se inicio el armado de las parrillas de las zapatas del bloque de orfebreria.
- Se continua con el corte y figurado del acero de refuerzo
- Se solicita revisión del acero de refuerzo de las vigas aereas del bloque de cocina
- Se esta trabajando con planos no definitivos sin firmar


Jorge I. Salazar Mb.
Residente Obra.



Octubre 04 - 2022

- Se continuo con el armado de las parrillas de las zapatas del blogue de orfebreria
- Se preparó, se transportó y se vacio la mezcla de Concreto en las zapatas del blogue de orfebreria
- Se le solicito a la interventoria aumentar el espesor de la zapata de 35 cm a 40 cm para un mayor recubrimiento del acero,
- la Interventoria autorizó el aumento del espesor de la zapata a 40 cm en este blogue de orfebreria.
- Se fundieron 7 zapatas del blogue de orfebreria
- Se realizarón cilindros de concreto para la prueba de resistencia del concreto a la compresión.
- Durante el vaciado del concreto en las zapatas en construcción se vibró la mezcla utilizando un equipo a gasolina.

Jorge I. Salazar Mb
Residente Obra.



Octubre 05 - 2022

- Se desencofro los pedestales del blogue de cocina, se limpio la formaleta, y se le agrego acpm.
- Se inicio a encofrar los pedestales de las aulas de dauza
- Se suspendio momentoneamente el armado de los castillos de las vigas aereas del blogue de la cocina.
- Con la revisión entre la Interventoria y el Contratista se encuentra que el detalle del despiece del hierro

de la viga aerea según el plano no comple con la longitud de confinamiento de acuerdo al espesor del elemento estructural como lo contempla la NSR-10.

- Por lo tanto se cambia la cantidad de estribos de 8E@0,07m a 12E@0,07m cumpliendo asi con la NSR-10 que dice que la distancia minima de confinamiento debe ser el doble del peralte o espesor de la viga.
- Se solicito a la interventoria realizar una excavación para poder desplazar una tuberia electrica conduit, la cual está interfiriendo en el encofrado y posterior fundición del pedestal esquinero del bloque de dauza.
- La Interventoria autoriza la excavación manual para realizar el desplazamiento de la tuberia conduit.
- Se le informa a la Interventoria que de los elementos estructurales no está contratado como concreto a la vista, ni la formaleta no contempla esquineros "Biseles" por lo tanto el concreto y la formaleta sera normal sin ninguna esquinero o algun material en especial.

Jorge I. Salazar Hb.
Residente Obra

Res. Interventoria

Octubre 06-2022

- Se demolio la caja en concreto que obstaculizaba la construccion de la zapata del bloque de orfebreria utilizando un taladro eléctrico.
- Se presentaron lluvias en la mañana de 8am hasta las 9am retrasando las actividades de la obra. En la tarde volvio a llover durante aproximadamente 45 minutos lo cual volvio a retrasar las actividades
- El fluido de energia fue suspendido en el sector por causas desconocidas
- Se encofro pedestales en el bloque de dauzas.

- Se armo castillos de las vigas aereas con acero de repuerto para el blogue de cocina.
- Estos castillos se arman con planos no definitivos que no están firmados
- Se hace observación sobre los detalles estructurales de las vigas aereas de los blogues
- Se fundieron en concreto 11 pedestales de 0,35x0,35m en el blogue de danzas
- Se realizo cilindros en concreto para la prueba de resistencia a la compresión
- El concreto se vibró utilizando un equipo de Vibración a gasolina "Vibrador"
- Los cilindros anteriormente fundidos se sumergen agua para su curado del concreto.

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra

Res. Interventoría

Octubre 7-2022

* Se desencofro los pedestales fundidos del blogue de danzas.
* Se continuo con la demolición de la Caja en Concreto, se cortó el acero que tenia para evitar accidentes.
* Se relleno con material de sitio los huecos que quedaron despues de fundir la Zapata y el pedestal, para
- asi evitar un accidente en la obra.
* Se continuo armando los castillos de las vigas aereas del blogue de Cocina.
* Se arreglarón las formaleta dañadas luego de desencofrar los pedestales.
* No se encuentra en el municipio de Tumaco Cable #2 para realizar la acometida eléctrica

de la obra, se está consiguiendo con on almacen eléctrico del municipio de Tumaco.

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra

Rep. Interventoría

Octubre - 08 - 2022

- Se fundieron 4 pedestales de 0,35x0,35 m en el blogue de danzas
- Se fundio 1 zapata que faltaba en el bloque de orfebreria
- Se fundio 1 pedestal de 0,35x0,35m en el bloque de orfebreria
- Se armo castillos en Acero de refuerzo de las Vigas Aereas del bloque de Cocina
- Se fundio solado de limpieza de la zapata que faltaba en el Bloque de orfebreria.

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Rep. Interventoría

Octubre - 10 - 2022

* Se desencofro los pedestales del bloque de danzas
* Se continuo armando los castillos en Acero de refuerzo de las vigas Aereas del bloque de Cocina
* Se arreglarón las formaletas dd madera para los pedestales.
* No hubo energia en el municipio por mantenimiento realizado por la empresa de Energia Cedenar, El servicio de energia se suspendio a las 6:00 am hasta las 2:00 pm, esto hizo que las actividades

se retrasaran.

* Se encofro algunos pedestales del bloque de orfebreria
* Se fundieron 3 pedestales en concreto del bloque de orfebreria
* Se relleno con material de sitio, los huecos de las zapatas fundidas con pedestales del bloque de dauzas
* Se solicitan planos estructurales definitivas y firmados

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Rep. Interventoría

Octubre 11-2022

-

* Se encofraron 4 pedestales en el blogue de Orfebreria
* Se continuo armando castillos en Acero de refuerzo de las Vigas Aereas del blogue de la Cocina. Estos castillos se estan construyendo de acuerdo a planos estructurales sin firmar
* Se fundieron 4 pedestales en concreto del blogue de orfebreria
* Se continua rellenando con material de sitio el hueco que queda de la zapata y pedestal fundido para evitar algun accidente.
* Se hicieron cilindros en Concreto para la prueba de resistencia a la compresión.
* Los cilindros anteriormente construidos estan sumergidos en agua.

Jorge L. Salazar M.
Residente obra.

Rep. Interventoría

Octubre 12-2022

- Se construyeron tableros en madera para las vigas aereas del bloque de cocina.
- Se desencofro pedestales en el bloque de orfebrería
- Se relleno con material de sitio, la excavación de los zapatas para evitar algún accidente
- Se continua amarrando castillos en acero de refuerzo de las vigas aereas de la cocina
- Se solicita a la interventoria revisión de los planos estructurales de las vigas y losa por parte de la entidad contratante. ya que no estamos de acuerdo con la cantidad de Acero
- Se desencofro los cilindros en Concreto y se colocaron en agua para el curado del concreto.

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Octubre 13-2022

- Se continua construyendo tableros en madera para las vigas aereas del bloque de cocina.
- Se inicia el encofrado de los fondos de las vigas aereas de la cocina, soportandolo con tacos de guadua.
- Se sigue armando los castillos de las vigas aereas de la cocina, esto se hace con planos sin firmar.
- Se está trabajando con planos sin firma y sin carta de responsabilidad, trabajamos con planos que nos envian por medio magnetico
-

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Octubre 14 - 2022

- Se realizo una visita de obra por parte de la empresa de Energia de Nariño "CEDENAR"
- Se Cortó y se figuró acero de repuerto para las vigas aereas del bloque de orfebreria.
- En Vista de que en los detalles estructurales la longitud de los fleyes de las vigas eran de 1,26 mts para un fleje de 0,25x0,30m con gancho de 8 cm; por lo tanto habia un desperdicio de acero en cada varilla cortada ya que solo salen 4 pedazos y sobra 0,96 m de varilla, por lo cual es antieconómico para el contratista Por este motivo se le solicito a la Interventoria cortar la longitud del fleje de 1,20 mts para un fleje de 0,25x0,30 m con gancho de 5 cm y se pueda sacar 5 pedazos "Flejes".
- La Interventoria aprobó la (situación) solicitud del Contratista de obra.
- Se continua construyendo tableros en madera para las vigas aereas del bloque de cocina.
- Se sigue armando castillo en acero de las vigas aereas del bloque de cocina.
- El Residente de Obra como el Residente de Interventoria tienen dudas sobre el acero de repuerto longitudinal de las vigas aereas del proyecto, en nuestro criterio solicitamos que se revise el diseño estructural de las vigas por parte de la entidad Contratante

Jorge J. Sedazr M.
Residente Obra

Res. Interventoria

Octubre 15 - 2022

- Se continua elaborando tableros en madera para el

bloque de cocina, se sigue encofraudo vigas aereas.

- Se colocaron las U para el anclaje de las platinas donde van a instalar la estructuras metálicas.
- Se amarraron castillos en acero de repuerto para las vigas aereas del bloque de Cocina.
- Se inicio el armado de castillos en acero de refuerzo de las vigas aereas en el bloque de orfebreria.
- No hay planos estructurales firmados, Ni con carta de responsabilidad, solo por avanzar en actividades se trabaja con planos que nos envian por medio magnetico
- Se corto y se figuro acero de repuerzo para vigas aereas.

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra

Res. Interventoría

Octubre - 18 - 2022

- Se continua cortando y figurando acero para flejes de orfebreria
- Se hicieron tableros en madera para la parte lateral interna de las vigas aereas.
- Se instalaron tableros laterales en madera en las vigas aereas del bloque de Cocina.
- Se inicio a embarrugar el bloque de cocina, se colocaron tacos de guaduas de soporte de las Varengas para el empisado de la losa,.
- Los tacos de guaduas se colocaron sobre pedazos de tablas para que no se entierren con el peso del concreto ya que el suelo es arena suelta.
- Se sigue armando castillos en acero para las vigas aereas del bloque de Cocina y de orfebreria

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Residente Interventoría

Octubre -19- 2022

- Se armó el tablero provisional eléctrico para poder realizar las conexiones de los equipos eléctricos.
- Se instaló tableros laterales en madera en las vigas aereas
- Se sigue instalando varengas soportadas con tacos de guaduas para el empisado de la losa.
- Se inicio la instalación del empisado de la losa del bloque de cocina.
- Se sigue armando los castillos de las vigas aereas del bloque de orfebreria.
- No se instaló la acometida provisional electrica porque CEDENAR No tiene en el momento Cable de Aluminio N. 2 7 hilos.
- El Contratista se compromotio en conseguir el Cable N.2 en Pasto.

Jorge I. Salazar M.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Octubre - 20 - 2022.

- Se continua instalando varengas soportadas con tacos de guaduas para el empisado de la losa.
- Se continua instalando el empisado de la losa del bloque de Cocina.
- Se sigue armando los Castillos de las Vigas aereas del bloque de orfebreria.
- El Contratista ya consiguio el Cable N.2 de Aluminio 7 hilos, se le comunico a CEDENAR que el Cable esta en Obra.

Jorge I. Salazar M.
Residente Obra

Res. Interventoría

Octubre 21 - 2022

- La empresa de Energia de Nariño CEDENAR, realizó la instalación de la Acometida Provisional Eléctrica con su respectivo medidor
- Se instaló el tablero provisional eléctrico a la acometida provisional eléctrica, con su totalizador, Caja de Brekers de 3 puestos con 3 Brekers, tambien se instalo 3 tomas dobles, se reviso el voltaje de los Tomas dobles.
- Se instaló 2 reflectores Led de 100W en la obra por seguridad en la noche.
- Se armó castillos en Acero de las Vigas aereas del bloque de orfebreria.
- Se terminó de instalar Vareugas soportadas con tacos de guaduas
- Se culminó con el empisado de la losa del bloque de Cocina.
- Se revisó con la interventoria el detalle estructural de la losa del bloque de Cocina
- Se inicio el encofrado de las Vigas aereas del bloque de orfebreria.

Jorge L. Salazar M.
Residente Obra.

Residente Interventoría

Octubre - 22 - 2022

- Se entregó via magnetica o internet un oficio al Contratista de obra y al Director de Interventoria un oficio elaborado por los residentes de obra e Interventoria donde se informa de la inconformidad respecto al diseño estructural de las vigas aereas del proyecto.
Donde se hace la observación para que la entidad contratante haga la revisión del diseño estructural ya que según la NSR-10, San Andres de Tumaco se

encuentra ubicado en Zona de Alta Sismicidad.

- Se continuo armando castillos en acero de las vigas aereas del bloque de orfebreria.
- Los residentes de obra e Interventoria esperamos una respuesta por escrito para salvar nuestra responsabilidad en el caso de que suceda algo.
- Se sigue encofrando con tableros en madera las vigas aereas del bloque de orfebreria
- Se construyeron tableros en madera para las vigas aereas del bloque de orfebreria.

Jorge A. Salazar M.
Residente Obra

Res. Interventoria

Octubre - 24 - 2022.

- En los planos de las instalaciones sanitarias del proyecto, encontramos muchas dudas, como por ejemplo no hay medidas exactas de los puntos sanitarios de 2" y 4" etc.
- Se inició la instalación de la parrilla en 3/8" de la losa del bloque de Cocina.
- Con la Interventoria se sacaron unas medidas aproximadamente, donde algunos puntos sanitarios quedan ubicados en las vigas aereas.
- La parrilla se está instalandó de acuerdo a la revisión que se hizo con la interventoria de acuerdo a planos enviados por internet. los cuales no estáin firmados.
- Se encofró el fondo de las vigas aereas y se soportaron con tacos de guaduas en el bloque de orfebreria, a los tacos se les coloco tablas en pequeños longitudes para apoyarlo y que no se hunda el taco.

- Se construyeron tableros laterales en madera para la parte interna de las vigas aereas.

Jorge L. Salazar Mb.
Residente Obra.

Res. Interventoría

Octubre - 25 - 2022

- Se instalarón camaras en la obra para la seguridad
- Se siguio armando la parrilla de acero de refuerzo de la losa, tambien se inicio la instalación de los bastones de la losa del blogue de cocina
- Se inicio la colocación de los niveles de las vigas aereas en el blogue de danzas
- Se cortó y se figuro acero de refuerzo para los bastones de la losa de Cocina.
- Se instaló tableros laterales en las vigas aereas del blogue de orfebreria.
- Se inicio la instalación de varengas soportados con tacos de guaduas para el empisado de la losa del blogue de orfebrería.
- Una vez mas se informa o se hace la observación sobre la cantidad de refuerzo de las vigas aereas de los bloques, porque segon el despiece del acero solo lleva 1 baston en un solo vano de la Viga longitudinal y en el otro vano no lleva, sabiendo que tiene la mismo distancia.
- Entre los residentes de Interventoria y Obra se decidio no vaciar el concreto en la losa del blogue de cocina hasta que lleguen de Bogota la funcionaria del Ministerio, el director de Interventoria y el Director de Obra para revisión de las observaciones que tenemos respecto al diseño estructural.

Jorge L Salazar Mb
Residente Obra.

Res. Interventoría

# Certificado
# Bancario

Martes, 26 de julio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO identificado(a) con CC 19399373, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 21963845992 | 2010/10/29 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14833758062

(415)7707212489984(8020) 000001483375806 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 9 3 9 9 3 7 3 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 9 3 9 9 3 7 3 | 1 9 7 8 1 1 1 6 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| TOVAR | BAQUERO | ENRIQUE | ALONSO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 119 50 50 IN 5 AP 303

42. Correo electrónico: TOVARQUITECTO@GMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 8 7 8 7 1 1 3 | 6 0 1 8 0 3 4 3 4 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 2 | 1 9 9 3 1 1 0 1 | 4 3 1 1 | 1 9 9 3 1 1 0 1 | 4 3 9 0 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 16 / 15 : 16: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TOVAR BAQUERO ENRIQUE ALONSO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

**ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO**

CC: 19399373

Bogotá D.C. CARRERA 47A # 95-56 Of. 501
**Teléfono** 8051341
**Correo Electrónico** arqetb@gmail.com

# Factura Electrónica de Venta

**E 9**

RESOLUCION DIAN 18764031672375 FECHA 26-07-2022 AL 26-01-2023 NUMERACION AUTORIZADA CON PREFIJO E QUE HABILITA DESDE EL NUMERO 02 AL 100
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica

**Cliente:** MINISTERIO DE CULTURA | **NIT:** 830034348 - 5

**Dirección:** CARRERA 8 No. 8 - 55

**Ciudad:** Bogotá D.C. | **Teléfono:** 3424100

**Fecha:** 10/11/2022 | **Vencimiento:** 10/12/2022 | **Forma de Pago:** Crédito

**Vendedor:** ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

**Por Concepto de:**

FACTURA DE VENTA

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 1 | 01 | INTERVENTORIA DE PROYECTOS | und | 1,00 | 8.659.035,00 | 0,00 | 19 | 1.645.216,65 | 8.659.035,00 |
| 2 | 15 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA | und | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 16 | DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA No. LP 004-2022 CON OBJETO DE CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS | und | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 17 | UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA ESCUELA TALLER DE TUMACO | und | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 0,00 | 0,00 |

**ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO**

CC: 19399373

Bogotá D.C. CARRERA 47A # 95-56 Of. 501
**Teléfono** 8051341
**Correo Electrónico** arqetb@gmail.com

# Factura Electrónica de Venta

**E 9**

RESOLUCION DIAN 18764031672375 FECHA 26-07-2022 AL 26-01-2023 NUMERACION AUTORIZADA CON PREFIJO E QUE HABILITA DESDE EL NUMERO 02 AL 100
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 5 | 25 | EN NARIÑO CORRESPONDIENTE AL 9.52% | und | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 0,00 | 0,00 |

**Valor en Letras**

**DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS**

**Favor Consignar en la cuenta de ahorros No 219-638459-92 De BANCOLOMBIA a nombre de ENRIQUE A. TOVAR BAQUERO**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 5 |
| **SUBTOTAL** | **$ 8.659.035,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 1.645.216,65 |
| TOTAL OPERACION | $ 10.304.251,65 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 10.304.251,65** |

**Recibido Por** _____

**Firma Responsable** _____

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2022-11-10 10:24:49

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: d5f5885016e16493a9fb3707371e82ca93bd82d155a6c104caae43f44d7aa374259f431807e39a30a9049b934d339012
