CONTENIDO

1. ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN.
2. ACTA DE RECIBO PARCIAL.
3. INFORME DE GESTIÓN.
4. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURA.
5. CERTIFICADO BANCARIO
6. CONTRATO
7. PRORROGAS
8. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
9. CEDULA Y TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
10. ESTAMPILLAS
11. RUT
12. INFORME MENSUAL

	GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	Fecha: 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	X
	Contrato de Obra	

ACTA No.	10

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-566-2021
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
Contratista	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
Valor	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
Fecha de Firma del Contrato/Orden	23 JULIO DE 2021
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	01 SEPTIEMBRE DE 2021
Prorroga 1	6 meses
Prorroga 2	10 meses
Fecha Terminación del Contrato/Orden	30 DE ABRIL DE 2023

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Póliza	Calidad del servicio No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	31/12/2021
	Hasta	31/12/2026
Tipo de Póliza	Cumplimiento No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	31/10/2023
Tipo de Póliza	Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	30/04/2026
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	30/04/2023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 115.661.725,73

VALOR EN LETRAS	CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los diez (10) dias de mes de noviembre de 2022.

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.10
CONTRATO EDU-566 DE 2021

CONTRATO DE OBRA [ ] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [X] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] **OTRO** [ ]

CONTRATO No:	EDU-566-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR TOTAL:	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR INICIAL:	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR ADICION:	*NA*
VALOR ACUMULADO:	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
PLAZO INICIAL:	*HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021*
PRORROGA 1:	*6 MESES*
PRORROGA 2:	*10 MESES*
FECHA DE INICIACION:	*1 DE SEPTIEMBRE DE 2021*
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	*NA*
FECHA DE REINICIO No.1:	*NA*
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	*30 ABRIL DE 2023*

DRS

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17
Versión: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA RECIBO INFORME INTERVENTORIA	Contrato de Obra No EDU-561-2021 UF1	Valor Acta Parcial de Obra	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	Contrato Interventoria EDU-566-2021	Valor Acta Parcial Interventoria	ACUMULADO INTERVENTORIA	Saldo
VALOR INICIAL	$ 82.464.264.620			$ 3.974.629.750			
ACTA No 1		$ 1.628.531.995,79	1,97%		$ 78.300.206,00	$ 78.300.206,00	$ 3.896.329.544,00
ACTA No 2		$ 1.365.320.628,62	1,66%		$ 65.978.854,00	$ 144.279.060,00	$ 3.830.350.690,00
ACTA No 3		$ 1.399.878.857,78	1,70%		$ 67.568.706,00	$ 211.847.766,00	$ 3.762.781.984,00
ACTA No 4		$ 5.566.544.118,72	6,75%		$ 268.287.508,00	$ 480.135.274,00	$ 3.494.494.476,00
ACTA No 5		$ 3.838.560.382,20	4,65%		$ 184.820.283,00	$ 664.955.557,00	$ 3.309.674.193,00
ACTA No 6		$ 3.461.952.945,32	4,20%		$ 166.934.449,50	$ 831.890.006,50	$ 3.142.739.743,50
ACTA No 7		$ 3.411.534.139,78	4,14%		$ 164.549.671,65	$ 996.439.678,15	$ 2.978.190.071,85
ACTA No 8		$ 3.201.796.207,74	3,88%		$ 154.215.634,30	$ 1.150.655.312,45	$ 2.823.974.437,55
ACTA No 9		$ 3.574.401.335,44	4,33%		$ 172.101.468,18	$ 1.322.756.780,63	$ 2.651.872.969,37
ACTA No 10		$ 2.402.162.442,68	2,91%		$ 115.661.725,73	$ 1.438.418.506,36	$ 2.536.211.243,64
Valor Total Acumulado	$ 82.464.264.620	$ 29.850.683.054,07	36,19%	$ 3.974.629.750,00	$ 1.438.418.506,36		

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Informe de Interventoría No 14 y Factura No. 10 de Recibo Parcial No 10 del Contrato de No. EDU-566-2021,

Se firma en Barranquilla a los (10) diez días del mes de noviembre de 2022.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
Interventoría

DIEGO RADA ALTAHONA
Supervisor- EDUBAR S.A

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN **Código: GC-FA-19**

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	10	
Contrato N°	EDU-566-2021		
Nombre del Supervisor	DIEGO RADA ALTAHONA		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Nombre del contratista	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN		
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		
Plazo	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 3.974.629.750	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 3.974.629.750	

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
01-09-2021	30-04-2023	-	-

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101111717	31-12-2021	31-12-2026
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101111717	01-09-2021	31-10-2023
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	85-44-101111717	01-09-2021	30-04-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101049329	01-09-2021	30-04-2023
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 3.974.629.750
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 3.974.629.750
Porcentaje del Anticipo	0 %	$
Porcentaje del Pago anticipado	0 %	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 115.661.725,73**
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 1.438.418.506,36
No. Factura o Cuenta de Cobro		010

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza el contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría 5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección Abierta (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material. 8.Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. 9.Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos. 11.Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A, en los términos de la Selección Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las obras, objeto de esta interventoría. 13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A, sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 14. informar oportunamente a EDUBAR S.A sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de interventoría. 15. Incluir dentro de las pólizas que ampara el contrato de interventoría como beneficiario, además de EDUBAR S.A al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de objeto de la interventoría. 17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de	La Interventoría dispuso del personal en obra y administrativo para el seguimiento de las actividades del contrato de obra. La Interventoría remitió a EDUBAR S.A los siguientes informes mensuales: Informe mensual 14, 1-31 octubre de 2022. CINP-504-161-4533 Se entregaron informes semanales de la Interventoría a la supervisión a lo largo del periodo del acta. Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo donde asistieron representantes del Contratista de obra, La Interventoría, Supervisión EDUBAR S.A y Puerta de Oro. Se realizó levantamientos de actas de cada uno de los comités. La Interventoría revisó y firmó el Acta de Avance Obra No 10 y los soportes correspondientes de esta. La Interventoría presenta el certificado de pago de parafiscales del consocio UF1 MALLORQUIN La Interventoría presente los aportes correspondientes al sistema de seguridad social del personal. Se suscribió el acta parcial de obra No. 10 con los debidos soportes.

obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. 19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas pro EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A 20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la económica, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previas en el contrato. 21. Desarrollar la interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. 24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante el contrato de Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar procure en ningún caso se adelante la obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATIANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y	

hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 33. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. 35. Acompañar a EDUBAR S.A en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 37. Armonizar la interacción del CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. 40. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDUBAR S.A, así como en el Manual de Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR S.A en razón del Convenido interadministrativo N° CD-12-2020-2435. 42. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las obras.	

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Informe mensual No. 14

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2022.

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022.

Diego Rada Altahona

DIEGO RADA ALTAHONA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764015219033

(415)7707212489984(8020) 001876401521903 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 0 2 5 3 3	7				

11. Razón social
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla — Cód. 2

24. Dirección
CL 77 B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWERS

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Atlántico	Barranquilla

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-07-21 / 08:04:28 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GUTIERREZ VISBAL PEDRO ANTONIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 17190137 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

997. Fecha formalización 2021-07-21/08:04:28

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764015219033

(415)7707212489984(8020) 001876401521903 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901502533	7				

11. Razón social
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN CL 77 B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWERS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1	50	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificado
Bancario

Martes, 08 de febrero de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN identificado(a) con 901.502.533-7, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	773-000012-91	2021/07/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

IDENTIFICACIÓN: 901.502.533-7

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía N° 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.**, con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 17.190.137, en Representación Legal de CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.502.533-7 estructura plural integrada por: INP SERVICIOS S.A.S., identificado con NIT: 901.300.211-3, con un porcentaje de participación del 40%, e INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT: 890.116.722-8, con un porcentaje de participación del 60%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el contrato de interventoría, que se regulará por las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: **1.** Que entre el DISTRITO Y EDUBAR S.A., se suscribió Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de proyectos N° CD-12-2020-2435, cuyo objeto es: "GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." **2.** Que el Manual de Contratación de EDUBAR S.A., en el Capítulo 2 numeral 17.3. correspondiente a la Supervisión en la ejecución del contrato, contempla lo siguiente: "La vigilancia y control de los contratos, estará a cargo de un Supervisor o Administrador o Interventor Externo, según el caso, quienes deberán cumplir las funciones fijadas por las normas que regulen la actividad vigilada y las estipuladas en los respectivos contratos". Por tal motivo, la entidad acorde con las disposiciones legales vigentes y con el objeto de satisfacer las necesidades y velar porque el objeto y las obligaciones del contrato se cumplan en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactado, durante el término del mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, consideró necesario y oportuno contratar la interventoría integral (técnica, administrativa, ambiental y financiera) para las intervenciones necesarias para la ejecución del proyecto Ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de mallorquín en la ciudad de Barranquilla. **3.** Que para cumplir con las obligaciones del contrato interadministrativo de Gerencia Integral de proyectos N° CD-12-2020-2435, **EDUBAR S.A.** consideró necesario y oportuno realizar el proceso de contratación orientado a contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. **4.** Que la Gerencia General de **EDUBAR S.A.**, procedió a adelantar el trámite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratación para lo cual publicó en la página WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP I, el proceso de Selección Abierta N° SA-06-2021. **5.** Que una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación, el comité evaluador rindió informe recomendando aceptar la oferta para del CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.502.533-7. Durante el término de traslado del informe de evaluación no se presentaron observaciones. **6.** Que de acuerdo con lo anterior, se procedió a aceptar la oferta presentada por CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.502.533-7, quien obtuvo la mayor calificación y cumplió con todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en la Convocatoria, resultando favorable a los intereses de la Sociedad. **7.** Que una vez cumplidas cada una de las etapas del Proceso de Selección, corresponde a las partes, sujetándose a la convocatoria del mismo y la propuesta presentada por el Contratista, celebrar el Contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. – OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS**

modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, segun sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A. **20.** Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previstas en el contrato. **21.** Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. **22.** Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. **23.** Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. **24.** Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Obra. **25.** Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. **26.** Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. **27.** Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso se adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. **28.** Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de diseño y construcción de componentes del espacio público, Las normas Invias para pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos y autorizaciones de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Las normas de diseño y construcción del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de señalización vial (dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares de diseño y construcción, Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto. **29.** Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental **30.** Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. **31.** Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. **32.** Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al termino de la reunión. **33.** Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. **34.** Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. **35.** Acompañar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. **36.** Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. **37.** Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. **38.** Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. **39.** Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. **40.** Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDUBAR S.A., así como en el Manual de Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. **41.** Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR S.A. en razón del Convenio Interadministrativo N° CD-12-2020-2435. **42.** Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° N°CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las obras. **PARÁGRAFO ÚNICO:** El incumplimiento de estas obligaciones por parte del **CONTRATISTA,** dará lugar a las sanciones establecidas en el presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE EDUBAR S.A.: EDUBAR S.A.** se compromete a: **1.** Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. **2.** Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. **3.** Verificar el cumplimiento de la

no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA** tratará en forma estrictamente confidencial toda información que llegue a su conocimiento relacionada con los asuntos y negocios de **EL CONTRATANTE** y de forma expresa se compromete a guardar en el desempeño de las actividades asignadas y fuera de ellas, la discreción, reserva y sigilo que exige la confidencialidad de la información perteneciente a **EL CONTRATANTE**. Por lo dicho, se abstendrá de revelar en detrimento de los intereses de **EL CONTRATANTE**, información confidencial o secreta que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones o por fuera de ellas. Se aclara que los documentos, datos e información de todo tipo tales como secretos industriales, patentes e inventos, know-how y software desarrollado o licenciado por **EL CONTRATANTE** es material clasificado, y en consecuencia **EL CONTRATISTA** tiene la obligación de guardar la confidencialidad a la que se ha comprometido en todo momento, aún después de terminada la prestación del servicio. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA** ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre **EDUBAR S.A.** y El **CONTRATISTA**. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: ETAPA DE ARREGLO DIRECTO.** Las controversias que surjan entre **EL CONTRATISTA** y **EDUBAR S.A.**, con ocasión a la celebración, ejecución, ampliación, o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos contractuales expedidos en ejercicio de la ejecución contractual, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política ni en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordantes con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1°, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar. **CLÁUSULA VIGÉSIMA. - LIQUIDACIÓN:** Este contrato deberá liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. – NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta del contratista. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - ANEXOS DEL CONTRATO:** Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: a) Oferta presentada por EL CONTRATISTA. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Documentos del proceso de selección SA-06-2021. e) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que correspondan. f) Estudios previos. g) Cuadro de asignación de riesgos. h) Las actas y demás documentos que suscriban las partes. **VIGESIMA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente contrato, se desarrollarán en el Distrito de Barranquilla, y para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Barranquilla. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal correspondiente, la aprobación de las garantías exigidas y la suscripción del Acta de inicio. **PARAGRAFO:** El contratista asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en Barranquilla el veintitrés (23) de julio de 2021.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL,
Representante Legal – Contratista

Proyectó: John Bilbao Ebratt
Revisó: Mauricio Valdeblanquez Tamara

PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
NIT: 901.502.533-7

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía N° 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.**, con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 17.190.137, en Representación del **CONSORCIO UF1 MALLORQUIN,** identificado con NIT: 901.502.533-7 estructura plural integrada por: INP SERVICIOS S.A.S., identificado con NIT: 901.300.211-3, con un porcentaje de participación del 40%, e INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT: 890.116.722-8, con un porcentaje de participación del 60%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar Prorroga N° 1 al Contrato de interventoría **N° EDU-566-2021,** suscrito el día veintitrés (23) de julio de 2021, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables, el manual de contratación de EDUBAR S.A., y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: **1.-** Que el día veintitrés (23) de julio de 2021, se suscribió Contrato de interventoría **N° EDU-566-2021,** cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." **2.-** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **3.-** Que el valor del Contrato se estableció en la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 3.974.629.750.oo)** Incluido IVA, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **4.-** Que el nueve (09) de agosto de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el contrato. **5.-** Que el día primero (01) de septiembre de 2021 se suscribió Acta de inicio al Contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**. **6.-** Que el supervisor del contrato remitió a Gerencia General oficio de fecha diecisiete (17) de diciembre de 2021, solicitando Prorrogar el plazo de ejecución al contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, en los siguientes términos: *"En mi calidad de supervisor del contrato me permito solicitar una prórroga a los contratos de la referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. La madera detallada en las especificaciones técnicas es pino amarillo del sur (Southern Yellow Pine). Este material fue adquirido por el contratista con un proveedor en Estados Unidos en el estado de la Florida. 2. La situación referente a los plazos de entrega oportuna de estos insumos se ha visto afectada por la situación del comercio exterior a causa de la crisis de contenedores, un hecho real que ha sido noticia en los medios de comunicación nacional e internacional. De acuerdo con lo anterior, se han generado retrasos en la llegada oportuna del insumo principal del proyecto al sitio de la obra. 3. Que teniendo en cuenta el plan de entregas del proveedor del contratista, se requiere de un plazo adicional de seis (6) meses para poder cumplir con el alcance del contrato." Por otra parte, se solicita una prórroga por el mismo plazo al contrato de interventoría teniendo en cuenta que es un contrato accesorio del contrato de obra, basado en los mismos argumentos expuestos por el contratista.* En concordancia con el oficio de Interventoría N° CINP-504-031-4556 del treinta (30) de noviembre de 2021. **7.-** Que en consideración a lo expuesto, la Gerencia General de EDUBAR S.A., atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a

PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
NIT: 901.502.533-7
realizar la presente **PRORROGA N° 1** al contrato de interventoría N° **EDU-566-2021**, en atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO:** El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, suscrito entre las partes el día veintitrés (23) de julio de 2021. **CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO A PRORROGAR:** El plazo a prorrogar será por el termino de seis (6) meses, es decir, hasta el treinta (30) de junio de 2022, contado a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en el contrato principal. **CLÁUSULA TERCERA. - GARANTIAS:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las pólizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la Prorroga N° 1 aquí estipulada. **CLÁUSULA CUARTA: EQUILIBRIO ECONÓMICO:** La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente Prorroga N° 1 quedará perfeccionada con la firma de las partes.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en Barranquilla, el día veinte (20) de diciembre de 2021.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal - CONTRATISTA

Proyectó: Alfiero García
Revisó: Mauricio Valdeblanquez

PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
NIT: 901.502.533-7

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía Nº 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.**, con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 17.190.137, en Representación del **CONSORCIO UF1 MALLORQUIN,** identificado con NIT: 901.502.533-7 estructura plural integrada por: INP SERVICIOS S.A.S., identificado con NIT: 901.300.211-3, con un porcentaje de participación del 40%, e INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT: 890.116.722-8, con un porcentaje de participación del 60%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar Prorroga N° 2 al Contrato de interventoría **N° EDU-566-2021,** suscrito el día veintitrés (23) de julio de 2021, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables, el manual de contratación de EDUBAR S.A., y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: **1.-** Que el día veintitrés (23) de julio de 2021, se suscribió Contrato de interventoría **N° EDU-566-2021,** cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." **2.-** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **3.-** Que el valor del Contrato se estableció en la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 3.974.629.750.oo)** Incluido IVA, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **4.-** Que el nueve (09) de agosto de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el contrato. **5.-** Que el día primero (01) de septiembre de 2021 se suscribió Acta de inicio al Contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**. **6.-** Que el veinte (20) de diciembre de 2021 se suscribió Prórroga Nº 1 al contrato de interventoría **Nº EDU-566-2021,** ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2022. **7.-** Que el supervisor del contrato remitió a Gerencia General oficio de fecha veintitrés (23) de junio de 2022, solicitando Prorrogar el plazo de ejecución al contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, en los siguientes términos: *"En mi calidad de supervisor del contrato me permito solicitar una prórroga al contrato de la referencia por el termino de diez (10) meses, con el fin de seguir garantizando el control y seguimiento de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que es un contrato accesorio del contrato de obra Nº EDU-561-2021, de acuerdo con los mismos argumentos expuestos por el contratista.* En concordancia con el oficio de Interventoria Nº CINP-504-103-2040 del veintitrés (23) de mayo de 2022. **8.-** Que en consideración a lo expuesto, la Gerencia General de EDUBAR S.A., atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a realizar la presente **PRORROGA N° 2** al contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, en atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO:** El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, suscrito entre las partes el día veintitrés (23) de julio de 2021. **CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO A PRORROGAR:** El plazo a prorrogar será por el término de diez (10) meses, contado a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en

PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
NIT: 901.502.533-7
el contrato principal y la Prórroga Nº 1. **CLÁUSULA TERCERA. - GARANTIAS:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las pólizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la Prorroga N° 2 aquí estipulada. **CLÁUSULA CUARTA: EQUILIBRIO ECONÓMICO:** La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente Prorroga N° 2 quedará perfeccionada con la firma de las partes.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en Barranquilla, el día veintitrés (23) de junio de 2022.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal - CONTRATISTA

Proyectó: Albeiro Garcia
Revisó: Mauricio Valdeblanquez



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.190.137

GUTIERREZ VISBAL

APELLIDOS

PEDRO ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1948

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 B+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-MAR-1969 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300150-00198452-M-0017190137-20091120 0018128870A 1 29851861

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250520-T

VANESSA DE JESUS
RUIZ MARCHENA
C.C. 1045735835
RES. INSCRIPCION 1030 DEL 26/11/2018
UNIVERSIDAD LIBRE



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258386 278225

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.045.735.835
RUIZ MARCHENA
APELLIDOS
VANESSA DE JESUS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1995
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-ENE-2014 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

A-0900150-00848923-F-1045735835-20160906 0050947627A 2 3304000378

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C7EBBB0250B35C8E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VANESSA DE JESUS RUIZ MARCHENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045735835 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 250520-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO identificado(a) con CC 72192643 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-11	1746495940	9442043647	E	2022-11-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SKANDIA	30	16%	$14,000,000	$2,240,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$14,000,000	$70,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$14,000,000	$70,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$14,000,000	$974,400
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$14,000,000	$560,000
EPS	SANITAS	30	12.5%	$14,000,000	$1,750,000
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$14,000,000	$420,000
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$14,000,000	$280,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 10:24.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CYNTHIA LORENA VILLEGAS ANDRADE identificado(a) con CC 39046307 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INP SERVICIOS SAS NI 901300211

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-11	1739393541	9442421752	E	2022-11-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SKANDIA	30	16%	$5,200,000	$832,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$5,200,000	$26,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$5,200,000	$26,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$5,200,000	$362,000
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$5,200,000	$208,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$5,200,000	$208,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 10:25.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ ABDALA identificado(a) con CC 1118862602 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-11	1746495940	9442043647	E	2022-11-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,200,000	$352,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$2,200,000	$11,500
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$2,200,000	$88,000
EPS	SANITAS	30	4%	$2,200,000	$88,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 10:23.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LILIANA DEL CARMEN GALLARDO PEREZ identificado(a) con CC 32797520 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-11	1746495940	9442043647	E	2022-11-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$4,700,000	$752,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$4,700,000	$23,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$4,700,000	$23,500
ARL	COLMENA	30	6.96%	$4,700,000	$327,200
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$4,700,000	$188,000
EPS	SANITAS	30	4%	$4,700,000	$188,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 10:23.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ARMANDO OTERO DIAZ identificado(a) con CC 10767066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-11	1746495940	9442043647	E	2022-11-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,100,000	$656,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$4,100,000	$20,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$4,100,000	$20,500
ARL	COLMENA	30	6.96%	$4,100,000	$285,400
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$4,100,000	$164,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$4,100,000	$164,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 10:22.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BETSY LILIANA BURGOS MOYA identificado(a) con CC 1234093876 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN NI 901502533

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-11	1739473081	9442424424	E	2022-11-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,000,000	$320,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$2,000,000	$139,200
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$2,000,000	$80,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$2,000,000	$80,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 10:26.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CRISTHIAN BENAVIDES NEGRETE identificado(a) con CC 17957001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INP SERVICIOS SAS NI 901300211

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-11	1739393541	9442421752	E	2022-11-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,800,000	$608,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,800,000	$264,500
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,800,000	$152,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,800,000	$152,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 10:25.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIELA ESTHER VILORIA MARTINEZ identificado(a) con CC 23221529 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-11	1746495940	9442043647	E	2022-11-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SKANDIA	30	16%	$3,150,000	$504,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,150,000	$219,300
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,150,000	$126,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,150,000	$126,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 10:24.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que OSCAR DAVID GUTIERREZ RETAMOSO identificado(a) con CC 1080017884 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN NI 901502533

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-11	1739473081	9442424424	E	2022-11-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,800,000	$288,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,800,000	$125,300
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$1,800,000	$72,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$1,800,000	$72,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 10:26.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YIMY ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 8786773 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-11	1746495940	9442043647	E	2022-11-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 10:22.

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS — Usuario YCALDERON

Declarante:	N 901502533	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Fecha Emision:	04-08-2021	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	CONT. D INERV. No 566-2021	Fecha Vence:	06-08-2021	582810

Impuesto: 95 ESTAMPILLA ITSA — Base / Cantidad 3,974,629,750

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	$11,923,889

Banco de Occidente
1 06 AGO 2021 1
RECIBIDO CON PAGO

BANCO DE OCCIDENTE 47022 31
RECAUDO CODIGO BARRAS
08:34:53 2021/08/06 Normal 002
7707277260214 11,923,889.00 D
79725915
11,923,889.00 CR

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 23/07/2021 hasta 06/08/2021, sobre una estampilla por valor de: $11,923,889

Valor Total a Pagar: $11,923,889

(415)7707277260214(8020)000000582810(3900)00000011923889(96)20210806

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 860.525.148-5

CONTRIBUYENTE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14772223911

(415)7707212489984(8020) 000001477222391 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 2 5 3 3	7	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWERS

42. Correo electrónico info@inproyectos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 6 8 0 0 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 7 1 6	4 2 9 0	2 0 2 1 0 7 1 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8																			

07- Retención en la fuente a titulo de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 6 61. Fecha 2021 - 07 - 16 / 14 : 30: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MENESES ESCORCIA DIANA MARIA
985. Cargo Gestor II

Fecha generación documento PDF: 16-07-2021 02:30:41PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14772223911

(415)7707212489984(8020) **000001477222391 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 2 5 3 3	7	Impuestos de Barranquilla	2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 6 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 6 1 7	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 6 1 7	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 7 1 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14772223911

(415)7707212489984(8020) 000001477222391 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 2 5 3 3	7	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 7 1 9 0 1 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	VISBAL	PEDRO	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **14772223911**

(415)7707212489984(8020) **000001477222391 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 2 5 3 3	7	Impuestos de Barranquilla 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 0 0 2 1 1	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INP SERVICIOS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 6 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 1 0 6 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

uf1 mallorquin	HOJA DE CONTROL DE INFORMES	FC-11-02 (10/08/2016)

CONTRATO No. :	EDU- 566-2021
ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
TIPO DE INFORME:	**INFORME MENSUAL No 14**
CODIGO: IM-504-14	

CONTROL DE REVISIONES

Responsables \ No. De Revisiones		0	1	2	3
Responsable de Elaboración	Nombre:	CYNTHIA VILLEGAS			
	Firma:	Cynthia V. Vlegas			
	Fecha:	nov-22			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma.	Karina S.			
	Fecha:	nov-22			
Vo. Bo. Gerente del Proyecto	Nombre:	FABIAN SUAREZ			
	Firma.	F. Suárez H			
	Fecha:	nov-22			

CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	EDUBAR S.A	1 COPIA FÍSICA
1	EDUBAR S.A	1 COPIA MAGNETICA
1	UF1 MALLORQUIN	1 COPIA MAGNETICA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA S.A



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14

(PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022)

IM-504-14

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

INTERVENTOR: CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

BARRANQUILLA – NOVIEMBRE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EDU- 566 – 2021.
CONTRATO DE OBRA:	EDU – 561 – 2021.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN – NIT 901.501.273 – 2
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14

Control de Distribución del Documento				
Nombre	Área o Entidad	Copia No.	Tipo de Copia Controlada C No Controlada NC	Fecha
Ing. Diego Rada Altahona	Edubar	1	C	Noviembre/2022
Pedro Gutiérrez	Interventoría	1	C	Noviembre/2022

CONTROL DE MODIFICACIONES		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha

Elaboró:	Ing. Cynthia Villegas	
Aprobó:	Ing. Fabian Suarez	
Responsable:	Ing. Pedro Gutiérrez	

Contenido

INTRODUCCIÓN 5
1.0 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....6
1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.....6
1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO.....8
1.3. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....11
1.4. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.....12
2.0 ESTADO DE LOS CONTRATOS.....16
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....16
2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....17
2.3. INFORMACIÓN PÓLIZAS CONTRATISTA.....18
2.4. INFORMACIÓN PÓLIZAS INTERVENTORÍA.....18
2.5 BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS.....19
2.5.1. CONTRATO DE OBRA.....19
2.5.1.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO DE OBRA.....19
2.5.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....20
2.5.2.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....20
3.0 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.....21
3.1. CONTRATO DE OBRA.....21
3.2 CONTRATO INTERVENTORÍA.....42
4.0 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS.....44
5.0 CONTROL DEL PERSONAL.....46
5.1. CONTRATO DE OBRA.....46
5.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....46
6.0 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.....48
7.0. ESTADO DEL TIEMPO.....50
8.0 CONTROL DE CALIDAD.....51
9.0 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.....52

LISTA DE ANEXOS

ANEXO No. 1 INFORMES SEMANALES.

ANEXO No. 2 OFICIOS RECIBIDOS

ANEXO No. 3 OFICIOS ENVIADOS.

ANEXO No. 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO No. 5 INFORME Y ASPECTOS AMBIENTALES

ANEXO No. 6 COMITÉ DE OBRA

ANEXO No. 7 INDICADORES DE CALIDAD

ANEXO No. 8 GESTIÓN SOCIAL

ANEXO No. 9 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO No. 10 BITÁCORA

ANEXO No. 11 INFORME Y ASPECTOS SST

INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las actividades ejecutadas por el CONSORCIO JCO MALLORQUÍN, durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre 2022, en el cual se desarrollaron algunas de las actividades contenidas dentro del Contrato de Obra **No. EDU-561 – 2021,** que tiene por objeto **"INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA".**

A través de este informe se presentan los procesos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y de seguridad en el trabajo, a cargo del CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN., en la ejecución del Contrato **N.º EDU-566-2021**, suscrito con **EDUBAR SAS**, con el fin de realizar el seguimiento del Proyecto e informar el debido cumplimiento por parte del Contratista de Obra de cada una de las actividades contratadas para la ejecución a satisfacción de la obra y las eventualidades que se presenten durante el desarrollo del mismo.

1.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

EDUBAR S.A.S., en el marco de sus obligaciones, considera necesario y oportuno realizar el proceso de contratación de la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

La Gerencia General de **EDUBAR S.A.,** procedió a adelantar el trámite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de Contratación para lo cual publicó en la página WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP I, el proceso de Selección Abierta N° SA-06-2021 y una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación, el comité evaluador rindió informe recomendando aceptar la oferta por parte del CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN, identificado con NIT: 901.502.533-7.

Que el 23 de julio de 2021, EDUBAR SA., suscribió un Contrato Interventoría No. EDU-566-2021 con el CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN por valor de $3,974.629.750 incluido IVA y con plazo hasta 31 de diciembre de 2021.

De igual forma, la Gerencia General de **EDUBAR S.A.,** procedió a adelantar el trámite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratación para lo cual publicó en la página WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP I, el proceso de Selección Abierta N° SA-04-2021 y una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación, el comité evaluador rindió informe recomendando aceptar la oferta por parte del CONSORCIO JCO MALLORQUÍN, identificado con NIT: 901.501.273 – 2.

Que el 21 de julio de 2021, EDUBAR SA., suscribió un Contrato Obra No EDU-561-2021 con el CONSORCIO JCO MALLORQUÍN por valor de $82.464.264.620 incluido IVA y con plazo hasta 31 de diciembre de 2021.

Que el 20 de diciembre de 2021, EDUBAR SA., suscribió Prorroga No 1 del EDU-561-2021 con el CONSORCIO JCO MALLORQUÍN con plazo hasta 30 de junio de 2022.

Que al ampliar el plazo del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 objeto de la Interventoría a cargo del Consorcio UF1 Mallorquín, en la misma fecha se suscribió la Prorroga No. 1 del Contrato de Interventoría No. EDU-566-2021 que amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2022

Que el 23 de junio de 2022, EDUBAR SA., suscribió Prorroga No 2 del EDU-561-2021 con el CONSORCIO JCO MALLORQUÍN con plazo hasta 30 de abril de 2023.

Que al ampliar el plazo del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 objeto de la Interventoría a cargo del Consorcio UF1 Mallorquín, en la misma fecha se suscribió la Prorroga No. 2 del Contrato de Interventoría No. EDU-566-2021 que amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2023

1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO.

La Ciénaga de Mallorquín cuenta con 650 hectáreas de extensión y se ubica al norte del departamento del Atlántico, en jurisdicción de los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia que forman parte del área metropolitana de Barranquilla. Funciona como una laguna costera después de que en 1935, con la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza, se modificará el régimen estuarino dada su conexión y dependencia del río Magdalena. Con esta circunstancia comenzaron los problemas para el cuerpo de agua, pues el intercambio necesario de aguas para el equilibrio se rompió causando grandes consecuencias negativas a la vida acuática que alberga, y estimuló la acumulación de contaminantes en niveles no aceptables y procesos de sedimentación importantes.

Actualmente, una de las problemáticas es la contaminación, ya que el sector de las Flores se ha utilizado para disponer residuos sólidos de la ciudad de forma indiscriminada, funcionando como un botadero de basuras a cielo abierto, promoviendo la contaminación progresiva de las aguas, así como la proliferación de enfermedades para la población aledaña. Así mismo, la Ciénaga ha sido contaminada por la entrada de grandes cantidades de desechos provenientes de sectores aledaños, del suroccidente de la ciudad y de los municipios de la parte alta y media de la cuenca del Arroyo Grande y León.

Otra problemática latente es el cambio de borde de Ciénaga por erosión y sedimentación debido a los asentamientos informales y no controlados de edificaciones sobre la ribera de la misma. Con el aterramiento de toneladas de escombros y material de relleno se ha provocado la destrucción de numerosas hectáreas de manglar, fuente y base de la productividad pesquera y acuática de la Ciénaga y protector natural de la línea de costa, que en el

sector tiene una alta dinámica erosiva. Al analizar el área de estudio, se evidencian las modificaciones drásticas que han alterado no sólo las dinámicas naturales, sino esencialmente la manera en que la ciudad y los ciudadanos se relacionan con el agua. A raíz del crecimiento no controlado de los barrios La Playa y Las Flores, además de las grandes obras de ingeniería, siendo la más importante el Tajamar de Bocas de Ceniza, se ha rellenado y construido la costa y sobre la Ciénaga para solucionar problemas de accesibilidad y conectividad, olvidando la condición ecológica de dicho cuerpo de agua. Así, en cuento a la evolución costera de la Ciénaga de Mallorquín se considera que:

- Con la construcción de los tajamares se pasó de un régimen estuarino a uno de laguna costera, ya que se perdió la conexión y dependencia permanente del río Magdalena.
- Desde los años 30 la barra ha sufrido erosión progresiva y un déficit de sedimentos transportados a las playas a causa de la construcción de los tajamares.
- En la actualidad (desde 1980 hasta ahora), la Ciénaga de Mallorquín ha venido sufriendo cambios severos, especialmente relacionados con las variaciones de la urbanización.
- A causa de la fuerte presión antropogénica dominante, la Ciénaga de Mallorquín en su cuerpo de agua, ha perdido entre 1984 y el 2018 unas 370 hectáreas que equivalen a casi un 50%
- Al proceso evolutivo de la Ciénaga de Mallorquín se suman diversas problemáticas ambientales en sus ecosistemas afluentes y a lo largo de toda su cuenca hidrográfica. En esta última se ha generado un desequilibrio en los

cauces de los arroyos y por ende en cantidad de agua que debería llegar a la Ciénaga.

Como parte del desarrollo de la ciudad de Barranquilla en 2019 se propone el Plan de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín, como una respuesta al cambio climático y a la urgente necesidad de desarrollar un espacio de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza en una ciudad que no sólo piensa en el presente, sino también planea la calidad de vida de la futura Barranquilla. En 2019, se propone el programa de gobierno para la ciudad de Barranquilla 2020-2023, que establece el objetivo de plantear no sólo el crecimiento y los lineamientos de la ciudad en estos cuatro (4) años, sino también consolidar las bases para el desarrollo urbano de la ciudad en la década próxima basándose en seis (6) líneas de acción, desarrollo de capital humano, mejores espacios públicos, conectividad de la ciudad, cultura y deporte, empleabilidad y gestión pública. En consecuencia, la Ciénaga de Mallorquín se presenta de vital importancia no sólo para la integración del tejido natural a las dinámicas de Barranquilla, sino también para ser un punto de partida para un crecimiento resiliente en los años venideros de la Ciudad. La Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín busca Potencializar la Ciénaga de Mallorquín y su entorno a través de la recuperación integral de los ecosistemas, la implementación de implementado acciones de recuperación de calidad el agua, playas, el desarrollo urbano, mangares, parques, senderos e infraestructura que permita el disfrute y uso sostenible por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo en esta zona. Esto incluye obras de infraestructura, de transporte y espacio público.

De igual manera, se buscará la recuperación de servicios eco-sistémicos y la protección de la ronda hídrica de la Ciénaga.

1.3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El Proyecto Ecoparque Uf1 Distrito Familiar, se desarrolla en el Departamento del Atlántico, en la vía que comunica a Barranquilla con el Corregimiento de La Playa.

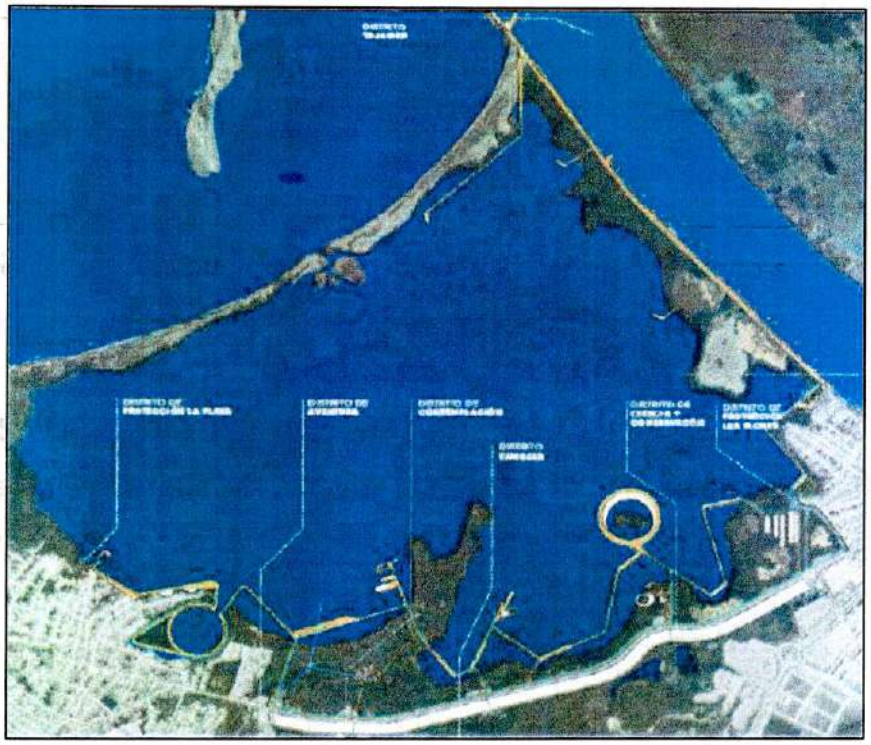


Ilustración 1Localización del Proyecto

La propuesta para el Ecoparque Ciénaga Mallorquín se basa en el diseño de elementos urbanos y de paisaje que solucionen problemas de accesibilidad, contaminación, crecimiento urbano no controlado, y que a su vez, generen las bases para una ciudad biodiversa. La propuesta corresponde a 7 características espaciales y de usos que se representan en distritos a lo largo del borde de Ciénaga, y son; Distrito de protección La Playa, Distrito de Aventura, Distrito de Contemplación, Distrito Familiar, Distrito de Ciencia y

Conservación, Distrito de protección Las Flores, y Distrito Tajamar. Como resultado se presenta una red ecoturística activa que busca reestablecer los vínculos entre la ciudadanía y las dinámicas naturales costeras, visibilizar el patrimonio natural, y proveer a la ciudad de nuevos espacios públicos.

1.4. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.

El Distrito de contemplación se propone como un espacio para el encuentro con la naturaleza, que promueva la cultura ambiental e incremente la biodiversidad de fauna y flora local. Está pensado para el disfrute de actividades de contemplación a través de recorridos ecológicos por senderos entre el manglar y el agua de la Ciénaga, que permiten apreciar la flora local, respirar aire fresco y observar el ecosistema en el que confluye río y mar. El avistamiento de aves también hace parte de las actividades que se pueden realizar en este distrito, por lo que se plantean paradas o estaciones en medio del recorrido que permiten el encuentro con las especies de aves de la región. El recorrido del Distrito termina dentro de la Ciénaga con un muelle y un equipamiento deportivo, pensado para prácticas de ecoturismo y excursiones. El proyecto incluye las siguientes partes:

- Estación III: La estación es la conexión entre la ciudad y el Distrito, es donde empieza el recorrido. Funciona como control de acceso peatonal y de bicicletas y se encuentran los equipamientos de servicios básicos como baños y parqueadero de bicicletas. Esto permitirá que no se supere el aforó máximo permitido dentro del Ecoparque.
- Gradas Playa. Siguiente a la estación, se encuentra una plazoleta con grada que bajan hacia una playa naturalmente formada en la Ciénaga, de manera que esta pueda ser usada para el baño o contemplación de los visitantes. Se podrán realizar actividades de contemplación, recreación, observación.

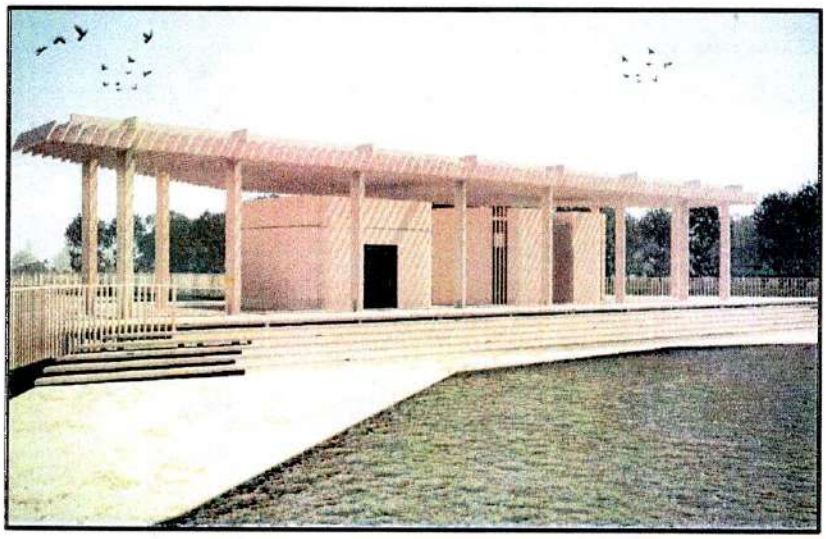


Ilustración 2Gradas Playa

- Contemplación: La tercera parada del recorrido es la gradería de contemplación, desciende al suelo desde el recorrido y está pensada como espacio de receso, meditación y contemplación. Las gradas permiten un acercamiento a los árboles y especies de fauna.



Ilustración 3. Gradas Contemplación

- Avistamiento de aves: Para el avistamiento de aves, el recorrido del sendero se convierte en una hélice que sube y vuelve a descender. Esta rodea los árboles, lo que permite tener una visual más amplia del

paisaje, así como mayor contacto con la naturaleza y las especies de aves de la región.



Ilustración 4. Avistamiento de Aves

- Muelle: El recorrido de los senderos termina en un muelle hacia el norte, planteado para la salida y llegada de pequeñas embarcaciones que realicen excursiones o paseos en la Ciénaga.
- Equipamiento deportivo: El Distrito contemplación, plantea un equipamiento deportivo, que posibilite el desarrollo de actividades y deportes náuticos dentro de la Ciénaga. Funciona como un equipamiento de servicios y almacenamiento, así como otra forma de acercamiento al agua en el recorrido.

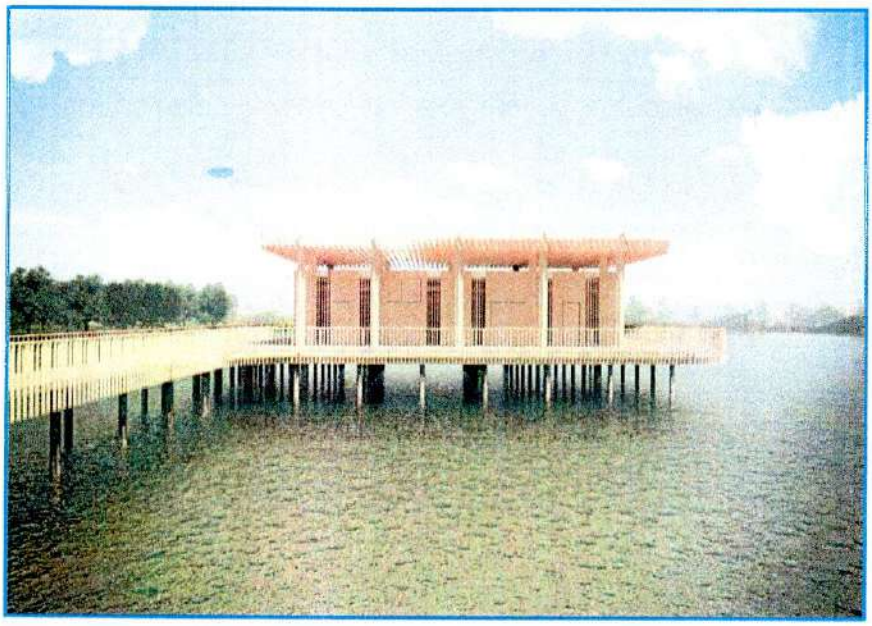


Ilustración 5. Equipamiento Deportivo

2.0 ESTADO DE LOS CONTRATOS.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación se relaciona la información general del Contrato de obra y sus modificaciones.

CONTRATO No:	EDU-561 – 2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A – EDUBAR S.A Nit: 800.091.140 – 4
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN Representante legal : ADALBERTO VIVERO CORONEL
NIT.	901.501.273 – 2
SUPERVISOR:	ING. DIEGO RADA ALTAHONA.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA .
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L. **($ 82.464.264.620,00)**
FECHA DE INICIO:	1 de Septiembre 2021.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta 31 de Diciembre de 2021
PRORROGA No 1	6 meses
PRORROGA No 2	10 meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	Hasta 30 de abril de 2023

Cuadro No. 1Estado General del Contrato de Obra.

2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO No:	EDU – 566 – 2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A. ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL. Representante Legal.
CONTRATISTA:	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
NIT	901.502.533-7
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 3.974.629.750).
FECHA DE INICIO:	1 de Septiembre 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta 31 de Diciembre de 2021
PRORROGA No 1	6 meses
PRORROGA No 2	10 meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	Hasta 30 de abril de 2023

Cuadro No. 2Estado General del Contrato de Interventoría

2.3. INFORMACIÓN PÓLIZAS CONTRATISTA.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:	No. BQ – 100043007 – ANEXO No 6
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	No. BQ – 100011003 – ANEXO No 7
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA EXPEDICION MODIFICACION	1 JULIO DE 2022

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2021	30/10/2023	$ 16.492.852.924
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31/12/2021	30/04/2026	$ 12.369.639.693
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2022	30/04/2028	$ 24.739.279.386
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/09/2021	30/07/2023	$ 16.492.852.924

Cuadro No. 3Resumen de las pólizas del Contrato de Obra

2.4. INFORMACIÓN PÓLIZAS INTERVENTORÍA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:	No. 85-44-101111717 – ANEXO 6
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	No. 85-40-101049329 – ANEXO 5
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN INICIAL:	29 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA EXPEDICION MODIFICACION	15 DE JULIO DE 2022

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2021	31/10/2023	$ 794.925.950
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/09/2021	30/04/2026	$ 596.194.462,5
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2021	31/12/2026	$ 794.925.950
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/09/2021	30/04/2023	$ 794.925.950

Cuadro No. 4Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría

2.5 BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS.

2.5.1. CONTRATO DE OBRA.

El valor del Contrato No. EDU-561-2021 es por la suma de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L. **($82.464.262.620,00),** los cuales serán pagados mediante la presentación de actas parciales de obra dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la factura.

2.5.1.1 Actas Generadas al Contrato de Obra.

- Actas Generales.

A la fecha se han generado las siguientes actas, de acuerdo con las actividades ejecutadas en el presente periodo.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO DE OBRA	1 de Septiembre 2021
ACTA DE MODIFICACION No. 1	31 mayo de 2022

Cuadro No. 5 Resumen de las actas del Contrato de obra.

- Acta Parcial de Obra.

A la fecha del cierre del presente informe se han presentado por parte del Contratista diez (10) actas parciales de obra, así:.

Acta	Período	Valor del Acta	Acumulado
1	1 diciembre/21 – 31 enero 2022	$1.628.531.995,79	$1.628.531.995,79
2	1 - 28 febrero de 2022	$1.365.320.628,62	$2.993.852.624,41
3	1 – 31 de marzo de 2022	$1.399.878.857,78	$4.393.731.482,19
4	1 – 30 de abril de 2022	$5.566.544.118,72	$9.960.275.600,91
5	1 - 31 de Mayo de 2022	$3.838.560.382,80	$13.798..835,983,79
6	1 - 30 de Junio de 2022	$3.461.952.945,32	$17.260..788,928,43
7	1 - 31 de Julio de 2022	$3.411.534.139,78	$20.672.323.068,23
8	1 – 31 de Agosto de 2022	$3.201.796.207,74	$23.874.119.275,95
9	1 – 30 de Septiembre de 2022	$3.574.401.335,44	$27.448.520.611,39
10	1 – 31 de Octubre de 2022	$2.403.412.756,68	$29.851.933.368,07

Cuadro No. 6 Resumen de las actas parciales de obra.

2.5.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El valor del Contrato de Interventoría No. EDU-566 - 2021 es la suma de *TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.* ***($ 3.974.629.750).***

EDUBAR pagará al CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN el servicio prestado, en proporción al avance de obra durante el período correspondiente.

2.5.2.1 Actas Generadas al Contrato de Interventoría.

- Actas Generales.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO DE OBRA	1 de Septiembre 2021

Cuadro No. 7 Resumen de las actas del Contrato de Interventoría.

- Acta Parcial de Interventoría.

A la fecha del cierre del presente informe esta Interventoría ha presentado diez (10) actas parciales de costos, así:

Acta	Período	Valor del Acta	Acumulado	Estado
1	1 diciembre/21 – 31 enero/22	$78.300.206	$78.300.206	Pagada
2	1 - 28 febrero de 2022	$65.978.854	$144.279.060	Pagada
3	1 - 31 de marzo de 2022	$67.568.706	$211.847.766	Pagada
4	1-30 de abril de 2022	$268.287.508	$480.126.274	Pagada
5	1 – 31 de mayo de 2022	$ 184.820.283	$664.946.557	Pagada
6	1 – 30 de junio de 2022	$ 166.934.450	$831.890.006,50	Pagada
7	1 – 31 de julio de 2022	$ 164.549.678	$996.439.678,15	Facturada
8	1 – 31 de agosto de 2022	$154.215.634,30	$1.150.655.312,45	Facturada
9	1 – 30 de Septiembre de 2022	$172.101.468,18	$1.322.756.780,63	Presentada
10	1 – 31 de Octubre de 2022	$115.661.725,73	$1.438.418.506,36	Presentada

Cuadro No. 8 Resumen de las actas de costos de Interventoría.

3.0 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.

3.1. CONTRATO DE OBRA.

A continuación se describen las actividades realizadas por el Contratista **CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**, durante el período comprendido del 01 al 31 de octubre del 2022:

Actividades realizadas:

- Localización y replanteo del proyecto
- Revisión de planos y especificaciones del Proyecto

- Asistencia a dos (2) comités de obra.

Acta de comité	Fecha
33	06/10/2022
34	20/10/2022

Cuadro No. 9Resumen de Comités de obra en el período

- Seguimiento a los siguientes documentos: Plan de calidad, Cronograma de obra, Flujo de Inversiones, Matriz de Riesgo, Programa de Gerencia, Plan de Trabajo, Plan de Gestión de Riesgo, Protocolo de Bioseguridad, Programa SST, Programa de Gestión Social, PMA
- Trámite de permisos ante diferentes entidades para el desarrollo de la obra
- Seguimiento a la actividad de hinca de pilotes en el frente de tierra (Estación III, Modulo 12,13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42) y en el frente de agua se finalizó el hincado de pilotes (Modulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50).
- Recepción y acopio de vigas de madera laminada en campamento de Caribe Verde
- Recepción en el campamento de Caribe Verde de la herrería que necesita el proyecto.
- Corte de las platinas para el proyecto en el campamento de Caribe Verde e instalación de viguetas
- Talleres y Capacitaciones del proyecto con la comunidad de la playa
- Seguimiento a la actividad de instalación de corte de pilotes, instalación de tocones de madera, instalación de riostras módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Estación III, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33.

- Instalación de viga laminada e instalación de viguetas en módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y Estación III.
- Supervisión de actividad de instalación de plataforma en deck del módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Estación III, 15,16,17,18,19 y 20.
- Supervisión de actividad de instalación de parales de barandas módulos 1, 2, 3, 15,16 y 17.
- Instalación de columnas módulo 2 y estación III.
- Instalación de vigas laminadas de cubierta en modulo 2

3. 2 INFORMACIÓN TÉCNICA

HINCADO DE PILOTES

- Resumen de hincado de pilotes

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
1	25	11	11,3	124,3
	20	28	10,3	288,4
2	20	10	10,2	102
	25	8	10,2	81,6
	25	13	10,2	132,6
3	20	22	11,3	248,6
	25	11	10,3	113,3
4	20	22	11,3	248,6
	25	11	10,3	113,3
5	20	22	11,3	248,6
	25	11	10,3	113,3
6	20	22	11,3	248,6
	25	11	10,3	113,3
7	20	14	11,3	158,2
	25	7	10,3	72,1
8	25	28	11,3	316,4
	25	47	10,3	484,1
	20	12	10,3	123,6

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
9	25	6	11,3	67,8
10	20	20	10,3	206
	25	10	11,3	113
11	25	25	10,3	257,5
	25	27	11,3	305,1
12	20	13	10,2	132,6
	25	4	11,2	44,8
13	20	28	9,95	278,6
	25	21	9,95	208,95
	25	16	9,3	148,8
14	20	2	7,7	15,4
	25	16	11,65	186,4
	25	30	8,65	259,5
	25	18	13,65	245,7
15	20	6	9,3	55,8
	25	7	9,3	65,1
	25	3	9,95	29,85
	20	4	9,95	39,8
	25	1	9,65	9,65
16	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
17	20	10	9,3	93
	25	11	9,3	102,3
18	20	6	9,3	55,8
	25	7	9,3	65,1
19	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
20	20	6	9,3	55,8
	25	8	9,3	74,4
21	20	6	9,3	55,8
	25	8	9,3	74,4
22	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
	20	6	9,3	55,8

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
23	25	7	9,3	65,1
24	20	6	9,3	55,8
	25	8	9,3	74,4
25	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
26	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
27	20	6	9,3	55,8
	25	8	9,3	74,4
28	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
29	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
30	20	6	9,3	55,8
	25	8	9,3	74,4
31	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
32	20	8	9,3	74,4
	25	9	9,3	83,7
33	20	8	9,3	74,4
	25	5	9,3	46,5
34	20	0	0	0
	25	22	9,3	204,6
35	25	18	8,8	158,4
	25	2	9	18
	25	2	9,3	18,6
	25	2	9,7	19,4
36	25	24	8,68	208,32
	20	3	9,6	28,8
	20	5	9,75	48,75
	20	6	10,4	62,4
	20	10	10,5	105
	20	4	10,6	42,4
	20	4	11	44

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
	20	6	11,2	67,2
	20	4	11,3	45,2
37	25	20	8,68	173,6
	20	3	9,6	28,8
	20	5	9,75	48,75
	20	6	10,4	62,4
	20	10	10,5	105
	20	4	10,6	42,4
	20	4	11	44
	20	6	11,2	67,2
	20	4	11,3	45,2
38	20	1	9,3	9,3
	25	26	9,3	241,8
39	25	6	9,3	55,8
	25	2	9,75	19,5
	25	2	10,2	20,4
	25	2	10,7	21,4
	25	4	11,2	44,8
40	25	48	9,1	436,8
	25	24	12,1	290,4
41	25	22	9,3	204,6
42	25	20	10,3	206
43	20	20	10,3	206
44	20	19	12,3	233,7
	25	3	12,3	36,9
45	20	2	9,9	19,8
	20	2	9,6	19,2
	20	4	9,3	37,2
	20	12	9	108
	25	10	9	90
46	20	18	10,3	185,4
	20	2	10,65	21,3
	20	2	11,05	22,1

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
47	20	13	12,3	159,9
48	20	32	13,4	428,8
	25	26	13,4	348,4
	25	14	15,4	215,6
49	20	11	12,8	140,8
	25	2	12,8	25,6
50	20	2	12,65	25,3
	20	2	12,2	24,4
	20	4	11,75	47
	20	2	11,3	22,6
	20	2	10,7	21,4
	20	22	10,3	226,6

Cuadro No. 10 Resumen de hincado por módulos terminados.

Frente Tierra

- **Módulo 42**

Se ha hincado 438,3 (41 pilotes) de 438,3 ml correspondientes a pilotes de 20 y 25 centímetros de diámetro.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
25	6	10,3	61,8
25	3	11,3	33,9
20	12	11,3	135,6
TOTAL	21		231,3

Cuadro No. 11Listado de pilotes M-42

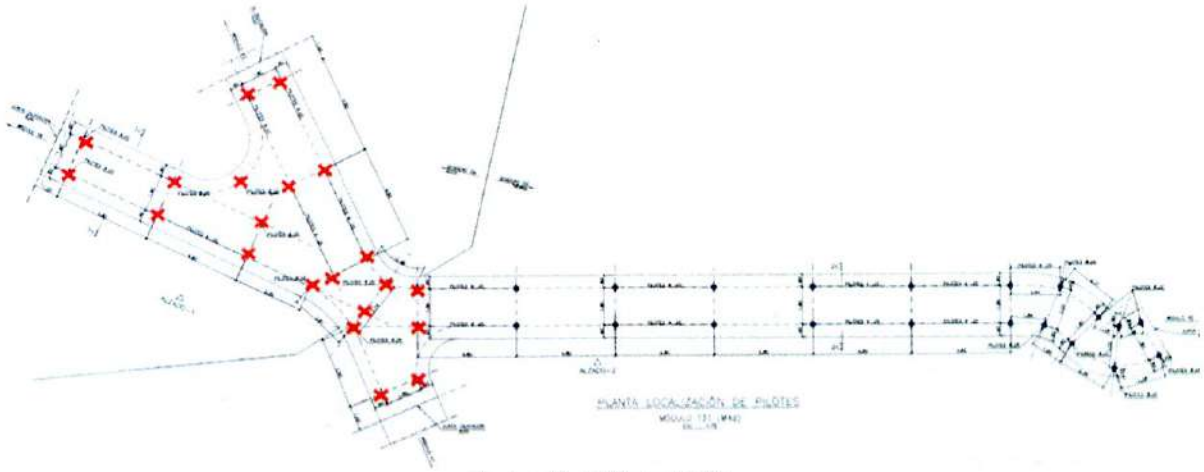


Ilustración 6 Pilotes M-42

INSTALACION DE RIOSTRAS

- Resumen de instalación de riostras

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
1	15	48	3,3	158,4
	17	30	5,3	159
2	15	28	3,3	92,4
	17	12	5,3	63,6
3	15	44	3,3	145,2
	17	22	5,3	116,6
4	15	44	3,3	145,2
	17	22	5,3	116,6
5	15	44	3,3	145,2
	17	24	5,3	127,2
6	15	44	3,3	145,2
	17	24	5,3	127,2
7	15	28	3,3	92,4
	17	12	5,3	63,6
8	15	102	3,3	336,6
	17	58	5,3	307,4
9	15	44	3,3	72,6
	17	24	5,3	127,2

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
10	15	40	3,3	132
	17	18	5,3	95,4
14	15	104	3,3	343,2
	17	78	5,3	413,4
15	15	10	3,3	33
	17	8	5,3	42,4
16	15	4	3,3	13,2
	17	4	5,3	21,2
17	15	10	3,3	33
	17	6	5,3	31,8
18	15	6	3,3	19,8
	17	8	5,3	42,4
19	15	4	3,3	13,2
	17	4	5,3	21,2
20	15	6	3,3	19,8
	17	8	5,3	42,4
21	15	6	3,3	19,8
	17	6	5,3	31,8
22	15	4	3,3	13,2
	17	4	5,3	21,2
23	15	6	3,3	19,8
	17	4	5,3	21,2
24	15	6	3,3	19,8
	17	4	5,3	21,2
25	15	4	3,3	13,2
	17	4	5,3	21,2
26	15	4	3,3	13,2
	17	4	5,3	21,2
27	15	6	3,3	19,8
	17	6	5,3	31,8
28	15	4	3,3	13,2
	17	4	5,3	21,2
29	15	4	3,3	13,2
	17	4	5,3	21,2
	15	6	3,3	19,8

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
30	17	6	5,3	31,8
31	15	4	3,3	13,2
	17	4	5,3	21,2
32	15	8	3,3	26,4
	17	6	5,3	31,8
33	15	8	3,3	26,4
	17	4	5,3	21,2

Cuadro No. 12Resumen Instalación de Riostras

- **Módulo 11**

Se instalaron a la fecha 484 ml (120 riostras) de 484 ml para completar el módulo.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
15	76	3,30	250,8
17	44	5,30	233,2
TOTAL	120		484

Cuadro No. 13 Listado de riostras – M11

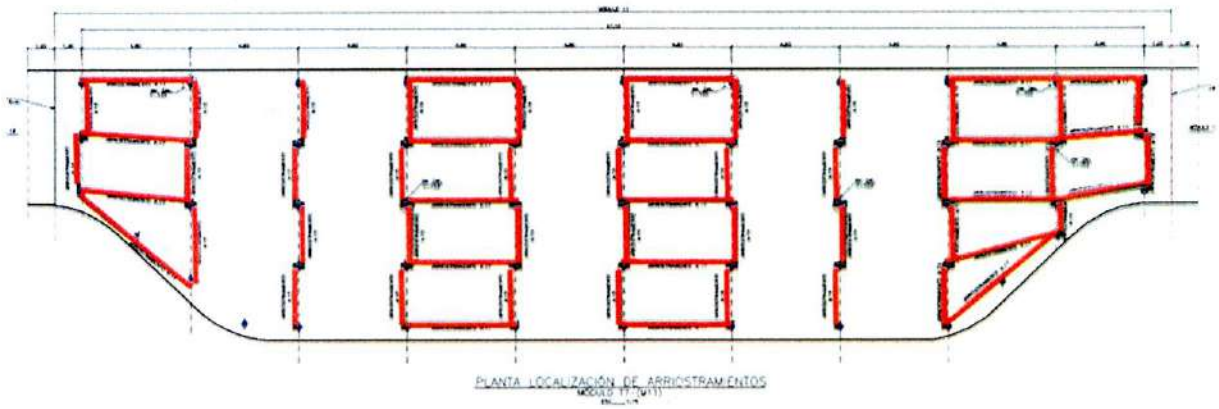


Ilustración 7 Riostras – M26,28,29 y 31

- **Módulo 12**

Se instalaron a la fecha 182,6 ml (42 riostras) de 182,6 ml completando todo el módulo.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
15	20	3,30	66
17	22	5,30	116,6
TOTAL	42		182,6

Cuadro No. 14 Listado de riostras – M27

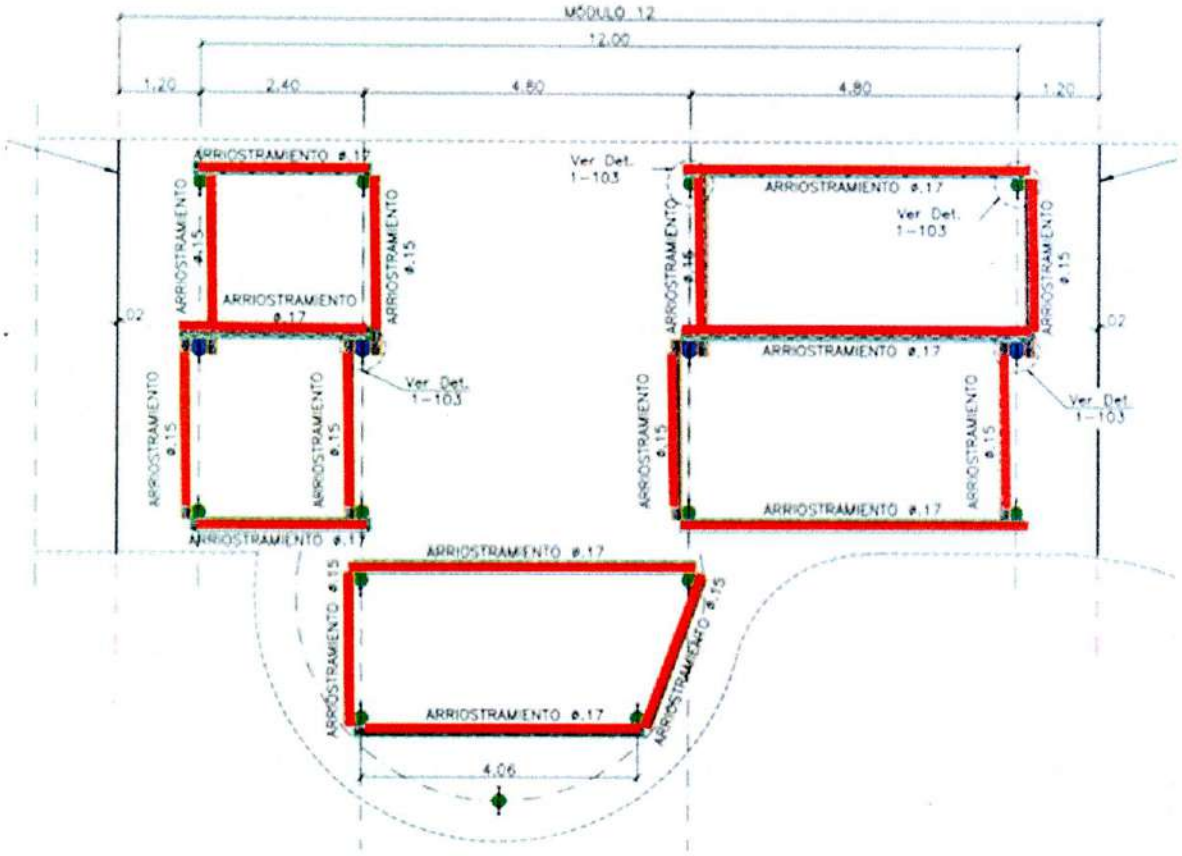


Ilustración 8. Riostras Instaladas – M27

- **Módulo 13**

Se instalaron a la fecha 694,6 (162 riostras) de 694,6 ml completando todo el módulo.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
15	82	3,30	270,6
17	80	5,30	424
TOTAL	162		694,6

Cuadro No. 15 Listado de riostras – M30

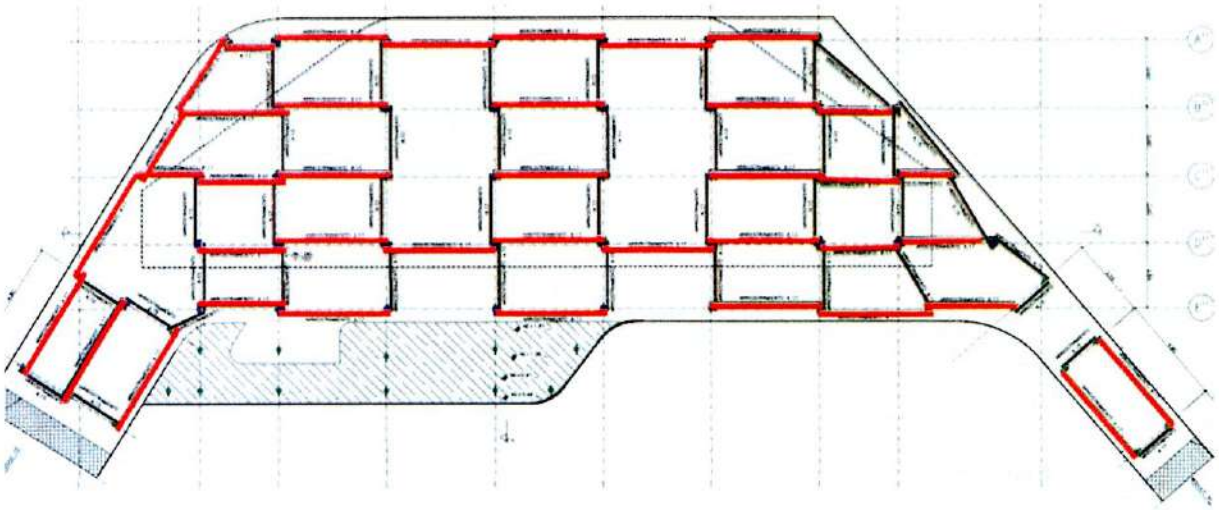


Ilustración 9. Riostras Instaladas – M30

INSTALACION DE VIGAS LAMINADAS

- Resumen de instalación de vigas laminadas a corte del presente informe

Módulo	Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
1	30	2	121,02	242,04
	36	1	122,4	122,4
	30	2	105,63	211,26

Módulo	Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
2	36	1		
3	30	2	100,8	201,6
	36	1	100,8	100,8
4	30	2	100,8	201,6
	36	1	100,8	100,8
5	30	2	100,8	201,6
	36	1	100,8	100,8
6	30	2	100,8	201,6
	36	1	100,8	100,8
7	30	2	62,4	124,8
	36	1	62,4	62,4
8	30	2	215,6	431,2
	36	1	420,44	420,44
9	30	2	100,8	201,6
	36	1	100,8	100,8
10	30	2	91,2	182,4
	36	1	91,2	91,2
14	30	2	98,905	197,81
	36	1	365,49	365,49
15	36	2	45,07	90,14
16	36	2	25,2	50,4
17	36	2	43,7	87,4
18	36	2	30	60
19	36	2	25,2	50,4
20	36	2	30,1	60,2
21	36	2	29,84	59,68
22	36	2	25,2	50,4
23	36	2	29,62	59,24
24	36	2	31,06	62,12
25	36	2	25,2	50,4
26	36	2	25,2	50,4
27	36	2	30,11	60,22

Módulo	Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
28	36	2	25,2	50,4
29	36	2	25,2	50,4
30	36	2	30,92	61,84
31	36	2	25,2	50,4
32	36	2	36,31	72,62
33	30	1	11,12	11,12
	36	2	23,81	47,62

Cuadro No. 16 Listado Resumen de vigas instaladas

- **Módulo 11**

Se instalaron a la fecha 468,28 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	134,48	268,96
30	2	99,66	199,32
TOTAL			468,28

Cuadro No. 17 Listado de vigas – M24

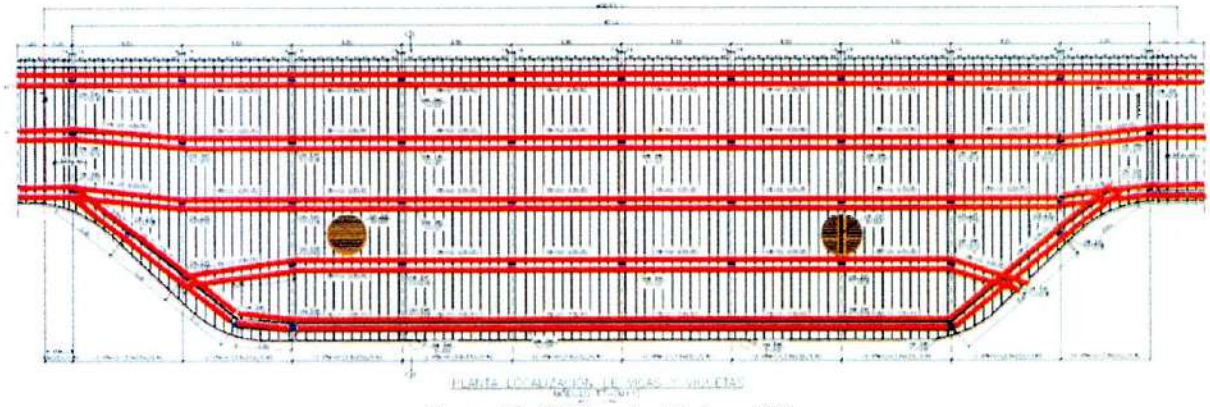


Ilustración 10 Vigas Instaladas – M11

- **Módulo 12**

Se instalaron a la fecha 126,22 ml completando cada uno de los módulos.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	22,39	44,78
30	2	40,72	81,44
TOTAL			126,22

Cuadro No. 18 Listado de vigas – M12

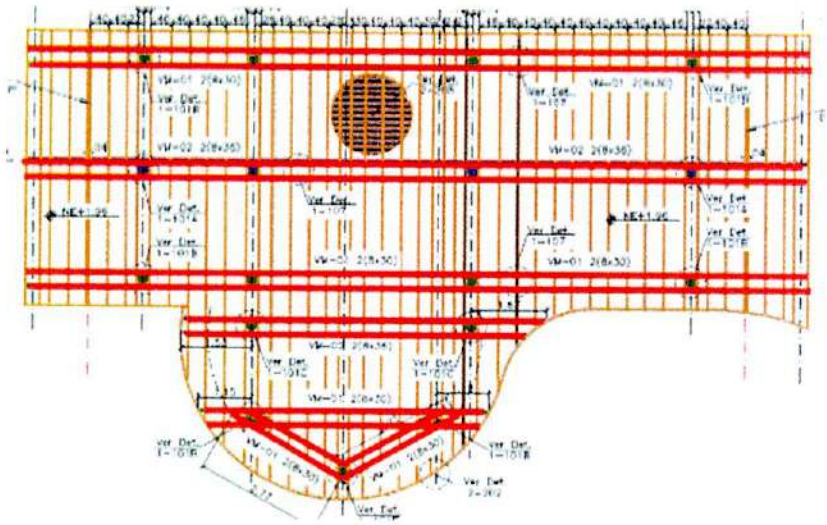


Ilustración 11 vigas instaladas – M12

- **Módulo 2**

Se instalaron a la fecha 85,82 ml completando el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
50	transversal	56,07	56,07
50	rotonda	29,75	29,75
TOTAL			85,82

Cuadro No. 19 Listado de vigas – M2

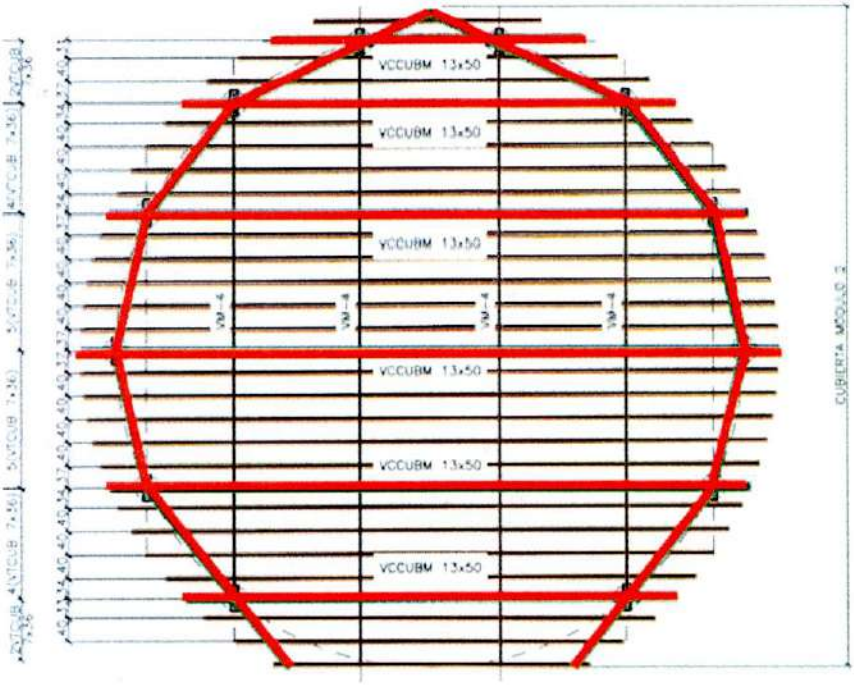


Ilustración 12 vigas instaladas – M2

- **Módulo 14**

Se instalaron a la fecha 181,63 ml completando cada uno de los módulos.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
50	transversal	87,97	87,97
50	diagonal	21,31	21,31
50	longitudinal	72,35	72,35
TOTAL			181,63

Cuadro No. 20 Listado de vigas – M14

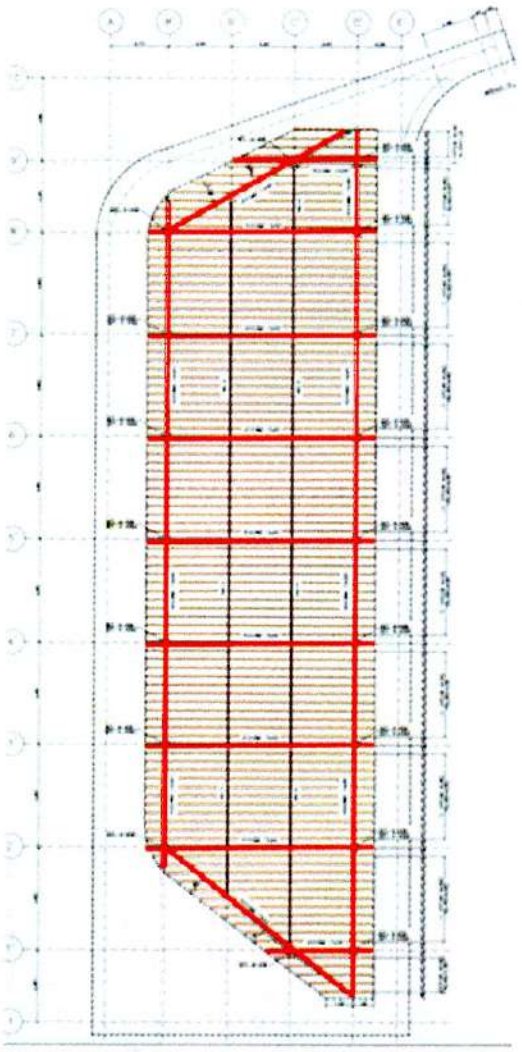


Ilustración 13 vigas instaladas – M14

INSTALACION DE PISO DECK

- Resumen de piso deck instalado a corte del presente informe

Módulo	Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
1	50,4	6	302,4	302,4
			31,43	31,43
2	18	3	54	54
	Curvo		118	118

Módulo	Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
3	50,4	6	302,4	302,4
4	50,4	6	302,4	302,4
5	50,4	6	302,4	302,4
6	50,4	6	302,4	302,4
7	31,2	6	187,2	187,2
8	recto		710,00	
	curvo		70	70
9	50,4	6	302,40	302,40
10	45,6	6	273,60	273,60

Cuadro No. 21 Listado Resumen Piso Deck

- **Módulo 15**

Se instalaron a la fecha 67,65 m^2 completando todo el módulo.

Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
45,10	1,5	67,65	67,65
TOTAL			67,65

Cuadro No. 22 Listado de piso Deck – M15

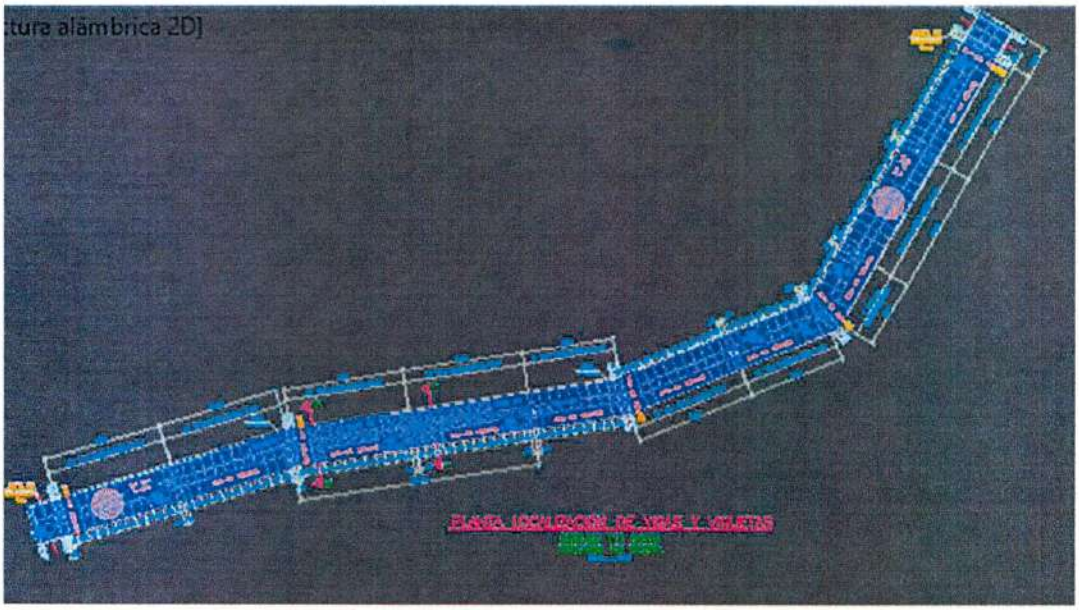


Ilustración 14 Piso Deck Instalado – M15

- **Módulo 16 y 19**

Se instalaron a la fecha 37,80 m² completando todo el módulo.

Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
25,20	1,5	37,80	37,80
TOTAL			37,80

Cuadro No. 23 Listado de piso Deck – M16 y 19

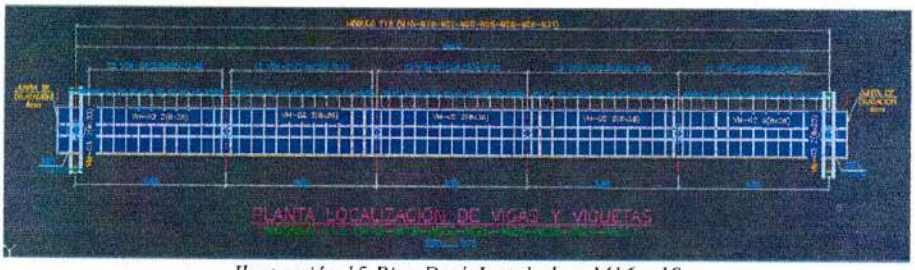


Ilustración 15 Piso Deck Instalado – M16 y 19

- **Módulo 17**

Se instalaron a la fecha 65,55 m² completando todo el módulo.

Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
43,70	1,5	65,55	65,55
TOTAL			65,55

Cuadro No. 24 Listado de piso Deck – M17



Ilustración 16 Piso Deck Instalado – M10

- **Módulo 18**

Se instalaron a la fecha 45,57 m^2 completando todo el módulo.

Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
30,38	1,5	45,57	45,57
TOTAL			45,57

Cuadro No. 25 Listado de piso Deck – M18

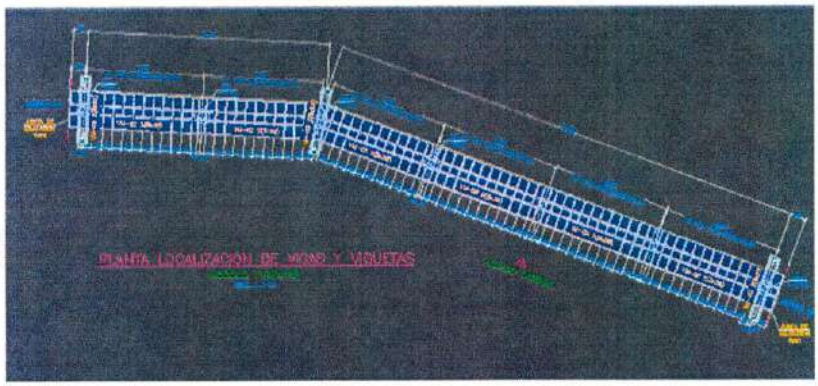


Ilustración 17 Piso Deck Instalado – M10

- **Módulo 20**

Se instalaron a la fecha 44,70 m^2 completando todo el módulo.

Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
29,80	1,5	44,70	44,70
TOTAL			44,70

Cuadro No. 26 Listado de piso Deck – M20

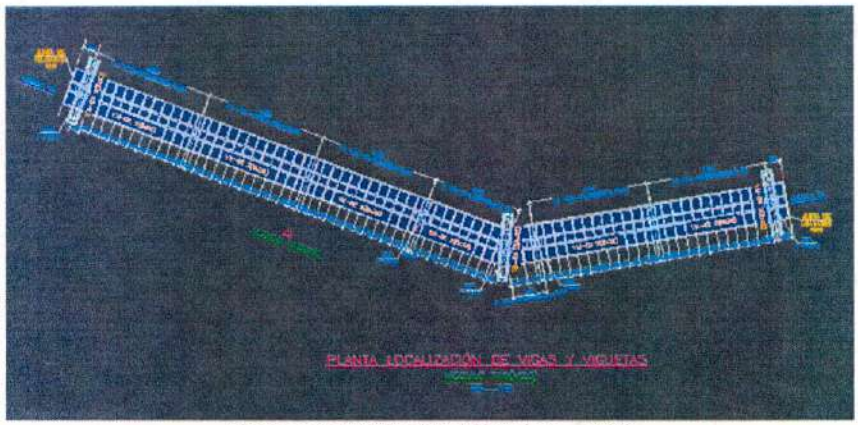


Ilustración 18 Piso Deck Instalado – M10

INSTALACION DE COLUMNAS EN CRUZ

- Resumen de columnas en cruz instaladas a corte del presente informe

Módulo	Longitud (m)	Cantidad	Total (m)
2	5	12	60
14	5	18	90

Cuadro No. 27 Resumen Columnas

INSTALACION DE BARANDAS

- Resumen de barandas instaladas a corte del presente informe

Modulo	Longitud (m)	N° de lados	Total (m)
1 curvo	3,02	1	3,02
1 curvo	6,68	1	6,68
1	46,45	1	46,45
1	50,4	1	50,40
2 curvo	37,78	1	37,78
2	16,47	2	32,94
Total			177,27

Cuadro No. 28 Listado de barandas

INSTALACION DE TACOS

- Resumen de tacos de refuerzo viga laminada a corte del presente informe

Modulo	tipo	Longitud (m)	Cantidad de tacos	Medida Total
1	20	0,3	42	12,6
	25	0,36	20	7,2
2	20	0,3	12	3,6
3	20	0,3	40	12
	25	0,36	20	7,2
4	20	0,3	40	12
	25	0,36	20	7,2
5	20	0,3	40	12
	25	0,36	20	7,2
6	20	0,3	40	12
	25	0,36	20	7,2
7	20	0,3	24	7,2
	25	0,36	12	4,32
8	20	0,3	70	21

Modulo	tipo	Longitud (m)	Cantidad de tacos	Medida Total
	25	0,36	36	12,96
9	20	0,3	44	13,2
	25	0,36	22	7,92
10	20	0,3	32	9,6
	25	0,36	16	5,76
13	20	0,3	1	28
14	20	0,3	28	8,4
	25	0,36	70	25,2
15	25	0,36	4	1,44
16	25	0,36	8	2,88
17	25	0,36	8	2,88
18	25	0,36	12	4,32
19	25	0,36	8	2,88
20	25	0,36	10	3,6
21	25	0,36	8	2,88
22	25	0,36	8	2,88
23	25	0,36	8	2,88
24	25	0,36	8	2,88
25	25	0,36	8	2,88
26	25	0,36	8	2,88
27	25	0,36	6	2,16

Cuadro No. 29 Listado de tacos

En el **Anexo No 4** se adjunta el registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo.

3.3 CONTRATO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo del presente informe, el equipo de la Interventoría ha realizado las actividades que se relacionan a continuación:

Actividades realizadas

- Revisión, control y seguimiento permanentemente de los documentos radicados por el Contratista

- Se realizaron requerimientos al Contratista por medio de oficios, de manera verbal, a través de la bitácora y en los comités de obra sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista.
- Se realizaron informes semanales discriminando las actividades realizadas.

Informe semanal	Periodo
56	26/09/2022 - 02/10/2022
57	3/10/2022 - 09/10/2022
58	10/10/2022 - 16/10/2022
59	17/10/2022 - 23/10/2022
60	24/10/2022 – 30/10/2022

Ver anexo No.1 Informes Semanales.

- Seguimiento al Contratista a las actividades de campo a fin de que se cumplan con las normas técnicas de calidad y normas ambientales.
- Durante la ejecución de las actividades se proporcionaron oportunamente las sugerencias y respectivas recomendaciones de aspectos técnicos, de seguridad industrial y ambiental.
- Supervisión a las actividades de localización y replanteo
- Supervisión a las actividades de hincado de pilotes en tierra
- Supervisión a las actividades de instalación de tocones, riostras, vigas laminadas, viguetas, piso deck y columnas.
- Elaboración y presentación del informe de Interventoría correspondiente al periodo de octubre de 2022
- Seguimiento a la reprogramación del cronograma de obras y del programa de inversiones correspondientes a la prórroga No 2.
- Revisión y aprobación de acta parcial de obra.

4.0 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS.

A continuación se presenta el cuadro resumen del avance y estado de las obras ejecutadas por el Contratista, teniendo en cuenta la programación de actividades con fecha de terminación 30 de Abril de 2023.

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	3/07/2022	10/07/2022	37.00%	20.00%	-17.00%	21.61%	21.13%	$ 17.428.497.637,57	-0.48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39.00%	21.00%	-18.00%	22.30%	21.17%	$ 17.454.340.378,22	-1.13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41.00%	22.00%	-19.00%	22.98%	21.73%	$ 17.913.450.711,29	-1.25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43.00%	23.00%	-20.00%	23.66%	25.07%	$ 20.672.324.008,91	1.41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45.00%	24.00%	-21.00%	24.58%	25.29%	$ 20.933.618.186,57	0.71%
50	8/08/2022	14/08/2022	47.00%	25.00%	-22.00%	25.50%	26.04%	$ 21.471.925.010,83	0.54%
51	15/08/2022	21/08/2022	49.00%	26.00%	-23.00%	26.41%	28.13%	$ 23.194.385.714,11	1.72%
52	22/08/2022	28/08/2022	51.00%	27.00%	-24.00%	27.33%	28.91%	$ 23.831.614.015,45	1.58%
53	29/08/2022	4/09/2022	52.00%	28.00%	-24.00%	28.55%	29.05%	$ 23.957.263.245,29	0.50%
54	5/09/2022	11/09/2022	54.00%	28.00%	-26.00%	29.77%	29.79%	$ 24.566.019.017,21	0.02%
55	12/09/2022	18/09/2022	56.00%	29.00%	-27.00%	31.00%	30.07%	$ 24.796.853.052,47	-0.93%
56	19/09/2022	25/09/2022	58.00%	30.00%	-28.00%	32.22%	30.70%	$ 25.319.782.611,95	-1.52%
57	26/09/2022	2/10/2022	59.00%	31.00%	-28.00%	33.34%	33.29%	$ 27.448.520.611,39	-0.05%
58	3/10/2022	9/10/2022	61.00%	32.00%	-29.00%	34.46%	33.59%	$ 27.695.796.119,18	-0.87%
59	10/10/2022	16/10/2022	63.00%	32.00%	-31.00%	35.58%	33.75%	$ 27.831.743.114,74	-1.83%
60	17/10/2022	23/10/2022	65.00%	33.00%	-32.00%	36.69%	33.94%	$ 27.979.669.210,60	-2.76%
61	24/10/2022	30/10/2022	66.00%	34.00%	-32.00%	37.81%	34.69%	$ 28.608.425.053,14	-3.12%

Cuadro No. 30 Resumen de avance de obras ejecutadas

- A la fecha del presente corte y según la programación entregada por el Contratista luego de aprobada la prórroga No 2, el porcentaje de obras ejecutadas a la fecha es de **34%** vs obras programadas de **66%** presentándose un atraso del **32%**. Retraso que está debidamente justificado en los retrasos en las obras del carril de desaceleración y parqueadero que aún se encuentra en trámite del convenio para la intervención de la vía, así como también en el inicio de la construcción de edificaciones de madera, el inicio de la construcción de la pasarela de 3m. y.
- Durante el periodo se continua con la instalación de las vigas laminadas, riostras, barandas, columnas, viguetas y deck procedentes del taller especializado en Bogotá.

- Durante el período se continua la instalación de la plataforma en Deck en el módulo 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
- Durante todo el periodo del informe Puerta de Oro, el Distrito, Edubar y el Contratista, han venido realizando ingentes esfuerzos para conseguir permisos ante la ANI para la intervención de la vía y poder iniciar la construcción del carril de desaceleración y Parqueadero, se espera que para el próximo mes ya se tenga firmado el convenio, ya que el no contar con este permiso está generando retrasos importantes en la meta física.
- Puerta de Oro entregó a Edubar los nuevos diseños del parqueadero, luego de la decisión de trasladar del sitio original y que ahora estará ubicado al lado de la Estación III. El Contratista realizó el replanteo en campo del nuevo diseño y la implantación, donde evidenció que hacía falta información de la versión anterior, por lo que remitió el plano con estas observaciones a EDUBAR. Igualmente, el Contratista entregó para su revisión una nueva propuesta para la ubicación del tanque de agua potable y cuarto eléctrico.
- El Contratista continua con el trazado y replanteo del proyecto para la ubicación de los pilotes de cada módulo, esto con el fin de verificar el alineamiento y poder realizar los ajustes necesarios durante el proceso de hincado.
- A fecha de corte del presente informe se han hincado 744 pilotes en tierra (Estación III y modulo 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42) y se finalizó el hincado 639 en agua correspondientes a los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. A fecha de corte del presente informe solo no quedan pendiente por hincar pilotes.

5.0 CONTROL DEL PERSONAL.

5.1. CONTRATO DE OBRA.

El Contratista cuenta con el siguiente personal profesional aprobado, los cuales se relacionan a continuación:

NOMBRE	CARGO
ADALBERTO VIVIERO	GERENTE DEL PROYECTO
JAVIER VELEZ	DIRECTOR DE OBRA
JHORVIS DE LUQUE	RESIDENTE DE OBRA
LUIS POLO	RESIDENTE DE OBRA
ANTONIO FRANCO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
CARLOS DUSSAN	ESPECIALISTA AMBIENTAL
LAYTON GONZALEZ-RUBIO	ESPECIALISTA HIDRAULICO
COMISIÓN DE TOPOGRAFIA	2
OPERADORES CABRIA	4

Cuadro No. 31Resumen Personal en obra

NOMBRE	CARGO
AYUDANTES	23
VIGILANTE	3
SOLDADORES	1
DIANA DAZA	INSPECTORA/SISO
OPERADOR TELEHANDLER	1
OFICIOS VARIOS	3
INGENIERO AUXILIAR	1
ISABELLA MONTERROZA	PSICOLOGA SOCIAL
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES DE OBRA	7
ALMACENISTA	1
CONDUCTOR	1

Cuadro No. 32 Resumen Mano de Obra Calificada

5.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El equipo de trabajo de la Interventoría en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2022 se relaciona a continuación:

No.	PERSONAL	CARGO
1	PEDRO GUTIERREZ B.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	FABIAN SUAREZ H.	GERENTE DE PROYECTO
3	CYNTHIA VILLEGAS A.	RESIDENTE INTERVENTORÌA
4	LILIANA GALLARDO P.	ESPECIALISTA AMBIENTAL
5	JAIME CURVELO G.	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
6	MARIELA VILORIA	PROFESIONAL SOCIAL
7	CRISTIAN BENAVIDES N.	RESIDENTE AMBIENTAL
8	HERNANDO GÓMEZ CASAS	ESPECIALISTA ELÉCTRICO

Cuadro No. 33 Resumen Personal Interventoría.

NOMBRE	CARGO
COMISIÓN TOPOGRÁFICA	1
INGENIERO AUXILIAR	2
CONDUCTOR	1

Cuadro No. 34 Resumen mano de obra calificada.

6.0 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.

Entrega de planos.

A la fecha todos los planos y diseños definitivos de las plataformas y edificios de madera del proyecto han sido remitidos por la Entidad contratante. Está pendiente por remitir el ajuste final de los diseños del tanque y redes hidrosanitarias que sufrieron cambios por el traslado del parqueadero.

Análisis de precios unitarios y presupuesto.

El Contratista remitió el presupuesto y apus iniciales que fueron presentados en su oferta licitatoria. Sin embargo, luego de la revisión de los diseños y los ajustes entregados por la Entidad contratante, el Contratista deberá entregar un informe con el balance real del Contrato que incluye el presupuesto y apu´s actualizados para revisión y aprobación por parte de la Interventoría y la Entidad contratante.

Trámites y Permisos

Durante el presente período Puerta de Oro, Edubar, el Distrito y el Contratista han venido realizando ingentes esfuerzos en lo que respecta a los trámites ante la ANI que permitan obtener el permiso de intervención de la vía que comunica a Barranquilla con el corregimiento de la Playa y que es colindante con el proyecto, donde se construirá el carril de desaceleración, la cicloruta y el parqueadero.

Balance del Contrato

Dentro del primer mes de ejecución, el Contratista debía realizar una revisión detallada del proyecto, por lo que esta Interventoría está a la espera que se presente un informe detallado que contenga el presupuesto detallado actualizado y análisis de precios unitarios acompañados de las respectivas especificaciones. A la fecha de corte del presente informe, la Interventoría le remitió al Contratista debidamente aprobado el diseño eléctrico una vez cumplía con las normas de RETIE y RETILAP. Igualmente,

se remitió el presupuesto de dicho componente eléctrico para que fuera tramitado su incorporación en el Contrato. Para incorporar este presupuesto, el Contratista presentó el Acta de Modificación No 1 e igualmente realizó un balance de las cantidades reales a ejecutar en los pilotes, riostras, vigas y viguetas. El Contratista presentó el desglose de los presupuestos de Voz y Datos al que la interventoría ya dio su no objeción por lo que debe presentar la modificación correspondiente para desglosar los ítems aprobados. Para el caso de la Red Contraincendio, el presupuesto y los apu correspondientes están siendo revisados por la interventoría. El Contratista está pendiente por remitir los desgloses de los presupuestos de Aires Acondicionados, Redes Hidrosanitarias y Acometidas hidrosanitarias.

Plan de Compras

Es importante mencionar que dicho Plan no se encuentra dentro de las obligaciones del Contrato de Obra e Interventoría. Sin embargo, debido a que gran parte de los materiales del proyecto no se producen en Colombia y vienen siendo importados desde Estados Unidos y China, la Interventoría está realizando un seguimiento a la compra e importación de la madera, para verificar que cumpla con todas las especificaciones y se garantice un suministro al proyecto que permita cumplir con los plazos programados.

7.0. EQUIPO DE OBRA

Durante el periodo el Contratista utilizó en obra los siguientes equipos:

EQUIPO	CANTIDAD
CABRIA 1500 Y 1300 KG – En zona seca	1
LANCHA	1
TELEHANDLER CAT TH103	1
PLANTA ELECTRICA	5
EQUIPO DE SOLDADURA	3
ESTACIÓN TOTAL	2
NIVEL AUTOMÁTICO	2

EQUIPO	CANTIDAD
VEHÍCULO	1

Cuadro No. 35 Equipo de Obra

Por parte de la Interventoría se contó con los siguientes equipos:

EQUIPO	CANTIDAD
DRON	1
COMPUTADORES	4
ESTACIÓN TOTAL	1
NIVEL	1
VEHÍCULO	1

Cuadro No. 36 Equipo de Interventoría

8.0. ESTADO DEL TIEMPO.

A continuación se relaciona el estado del tiempo durante el periodo en curso.

FECHA	DURACIÓN (HORAS)	LEVES	FUERTES	NUBLADOS
1/10/2022	0			
2/10/2022	0			
3/10/2022	0			
4/10/2022	0			
5/10/2022	0			
6/10/2022	3	1	1	1
7/10/2022	7,5	1		1
8/10/2022	1			
9/10/2022	0			
10/10/2022	1	1		1
11/10/2022	1,2	1		1
12/10/2022	0			
13/10/2022	4	1	1	1
14/10/2022	0			1
15/10/2022	0			
16/10/2022	0			
17/10/2022	0			
18/10/2022	2,4		1	1

FECHA	DURACIÓN (HORAS)	LEVES	FUERTES	NUBLADOS
19/10/2022	0			
20/10/2022	1			1
21/10/2022	1,1		1	1
22/10/2022	0			1
23/10/2022	0			
24/10/2022	1,2		1	1
25/10/2022	2	1	1	1
26/10/2022	0			
27/10/2022	0			
28/10/2022	0			
29/10/2022	0			
30/10/2022	0			
31/10/2022	0			

Cuadro No. 37 Estado del Tiempo

9.0 CONTROL DE CALIDAD.

La Interventoría realizó seguimiento y control a las actividades de topografía, hincado de pilotes, instalación de riostras, vigas, viguetas, plataforma del deck y columnas en cruz para garantizar la calidad de las obras.

10 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

A partir de las actividades ejecutadas en el presente período se pueden resaltar los siguientes aspectos:

- **Aspectos Técnicos.**

A la fecha Edubar S.A ha realizado la entrega completa de los diseños definitivos eléctricos y de los diseños estructurales de los módulos curvos y el módulo de avistamiento de aves.

Sin embargo, de acuerdo con la verificación de topografía realizada por el Contratista en conjunto con la Interventoría, se encontró que las riostras de la pasarela de 1,5 m de ancho están quedando enterradas por debajo del nivel del suelo si se construyen a la cota +1,96 establecida en el diseño; y por lo tanto, no estarían cumpliendo con la función de apoyo estructural para la que fueron diseñadas.

Es por ello que, Puerta de Oro entregó una versión a la cota +2,20 para las pasarelas de 1,5 y 6 m de ancho que garantiza no solo el empotramiento de los pilotes y niveles de seguridad de la estructura, sino que se respeta el diseño de mantener las pasarelas lo más cerca posible del agua. Para el caso de la Estación III se establece cota de plataforma de +2,72 y el módulo 15, sería donde se realizaría la transición entre la estación y las pasarelas.

En el caso de los módulos 36 y 37, debido a la cota que presentaba el terreno y al impacto que generaría sobre la vegetación existente en esta área, se decidió subir el nivel en estos módulos a la cota (+3.2), para lo cual se hará una transición en el módulo 35.

Para el diseño del parqueadero, tanque de agua potable y redes hidrosanitarias, Edubar S.A hizo entrega de la nueva posición donde fue reubicado el parqueadero.

Está pendiente por remitir las cotas de implantación de estas estructuras para iniciar la construcción de las mismas.

Con respecto a los permisos para la intervención de la vía, es importante casi que imperativo obtener la viabilidad por parte de la ANI lo más pronto posible para permitir al Contratista iniciar los trabajos del carril de desaceleración, cicloruta, ampliación de box coulvert y parqueadero. La entidad contratante debe entregar los nuevos diseños del carril de aceleración, andenes y cicloruta teniendo en cuenta la nueva ubicación del parqueadero. El hecho de no contar con este permiso ha venido incidiendo en el retraso de la meta física propuesta toda vez que no se han podido realizar las intervenciones programadas acorde al cronograma de obra aprobado,

El Contratista remitió el presupuesto del componente eléctrico teniendo en cuenta los diseños definitivos remitidos por la Entidad contratante; la Interventoría realizó las respectivas observaciones y emitió su No objeción al ajuste del diseño y presupuesto; sin embargo, durante el presente periodo el Contratista incorporó el presupuesto eléctrico dentro de la modificativa No 1 y realizó el respectivo balance de cantidades para los pilotes, riostras y vigas de las pasarelas.

Durante el mes de diciembre de 2021, la Interventoría dio trámite a la solicitud de prorroga No 1 tanto del Contrato de Obra como de Interventoría por 6 meses, por lo que la nueva fecha de finalización de los Contratos había quedado establecida para el 30 de junio de 2022.

Para el mes de mayo de 2022, teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución que llevaba la obra en ese momento, y que en el tiempo restante del Contrato (un mes), no era posible culminar con el objeto contractual, el Contratista presentó una solicitud de prórroga No 2 donde la nueva fecha de terminación del Contrato sería para el 30 de abril de 2023. La Interventoría luego de analizar los documentos soportes y las

justificaciones presentadas por el Contratista, remite a la Entidad Contratante recomendándole darle trámite a la solicitud. Esta solicitud recibe el aval de la entidad contratante con la aprobación de la prórroga No 2 el pasado 23 de junio de 2022 para los Contratos de Obra e Interventoría.

Durante el presente período el Contratista presentó el presupuesto desglosado para el componente del sistema de la red contraincendio y se realizaron las observaciones por parte de la Interventoría. Para el caso del componente de voz y datos, el Contratista propuso a la Entidad contratante y a la Interventoría implementar unos ajustes al diseño original buscando hacerlo más versátil, que permitiera al proyecto integrarse no solo con las demás Unidades Funcionales sino que además ir acorde con los proyectos que adelanta el Distrito actualmente. La interventoría remitió la No objeción al componente de Voz y Datos y solicita al contratista remitir el desglose de dicho componente en las cantidades contractuales.

EDUBAR, como Entidad contratante, manifestó que, basados en lo establecido en el Contrato EDU-506-2021, solicita que el Contratista proceda a complementar y/o adicionar y/o modificar y/o ajustar lo correspondiente al componente de voz y datos, presentando a la Interventoría debidamente soportada la propuesta de optimizar dicho componente.

- **Programación.**

Se realizó control de la programación de la obra con corte al día 31 de octubre del 2022, teniendo en cuenta la programación entregada por el Contratista para la prórroga No 2, con un porcentaje programado de **66%** y ejecutado de **34%**, con una diferencia de atraso del **32%**. La derivación de los retrasos de estas actividades se presentan por temas pendientes en los trámites para la intervención de la vía, los retrasos en el inicio de la construcción de la pasarela de 3m y el inicio de la construcción de las edificaciones.

- **Avance Presupuestal.**

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre del 2022 el Contratista ejecutó obras por valor de $ 2.403.412.756,68 incluido AIU equivalente a un 2,91% del valor contractual, con un valor acumulado de $ 29.851.933.368,07 equivalentes al 36,2%.

- **Gestión Social**

El seguimiento a los documentos y gestión social del periodo se adjunta en el **Anexo No 8**

- **Gestión Ambiental**

El seguimiento a los documentos y gestión ambiental del periodo se adjunta en el **Anexo No 5**

- **Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.**

El seguimiento a los documentos y gestión SST del periodo se adjunta en el **Anexo No 11**

- **Bitácora de Obra.**

El Contratista inició actividades el día 3 de enero de 2022 y se lleva las anotaciones respectivas en la bitácora desde la fecha. Ver **Anexo No 10.**

uf1 mallorquín

ANEXO No. 1

INFORMES SEMANALES

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 56	código:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


Contrato Nº:	EDU-561-2021	Valor Inicial:	$	82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN				
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	Valor Total Inicial:	$		82.464.262.620,00
Fecha de Inicio:	1/09/2021	Valor Adiciones:			
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	Valor Actualizado:	$		82.464.262.620,00
Prórroga No 1	6 meses	Valor Facturado:	$	27.448.520.611,39	33,29%
Prórroga No 2	10 meses	Valor por Pagar:	$	82.464.262.620,00	100,0%
Suspensiones	N/A				
Reinicios	N/A				
Plazo Actualizado:	30/04/2023	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			
Plazo en Semanas:	87 semanas	ANTICIPO		NA	
		ACTA No.1	$	1.628.531.995,79	1,97%
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.2	$	1.365.320.628,62	1,66%
Contrato Nº:	EDU-566-2021	ACTA No.3	$	1.399.878.857,78	1,70%
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA No.4	$	5.566.544.118,72	6,75%
Fecha de Inicio:	1/09/2021	ACTA No.5	$	3.838.560.382,20	4,65%
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	ACTA No.6	$	3.461.952.945,32	4,20%
Suspensiones	N/A	ACTA No 7	$	3.411.534.139,78	4,14%
Reinicios	N/A	ACTA No 8	$	3.201.796.207,74	3,88%
Prórroga No 1	6 meses	ACTA No 9 (revisión)	$	3.574.401.335,44	4,33%
Prórroga No 2	10 meses				
Plazo Actualizado:	30/04/2023				

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45,00%	24,00%	-21,00%	24,58%	25,39%	$ 20.933.618.186,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022	47,00%	25,00%	-22,00%	25,50%	26,04%	$ 21.471.925.010,83	0,54%
51	15/08/2022	21/08/2022	49,00%	26,00%	-23,00%	26,41%	28,13%	$ 23.194.305.714,11	1,72%
52	22/08/2022	28/08/2022	51,00%	27,00%	-24,00%	27,33%	28,91%	$ 23.843.634.035,45	1,58%
53	29/08/2022	4/09/2022	52,00%	28,00%	-24,00%	28,55%	29,05%	$ 23.957.263.245,29	0,50%
54	5/09/2022	11/09/2022	54,00%	28,00%	-26,00%	29,77%	29,79%	$ 24.566.019.017,21	0,02%
55	12/09/2022	18/09/2022	56,00%	29,00%	-27,00%	31,00%	30,07%	$ 24.796.853.052,97	-0,93%
56	19/09/2022	25/09/2022	58,00%	30,00%	-28,00%	32,22%	30,70%	$ 25.319.782.611,95	-1,52%
57	26/09/2022	2/10/2022	59,00%	31,00%	-28,00%	33,34%	33,29%	$ 27.448.520.611,39	-0,05%
58	3/10/2022	9/10/2022				34,46%			
59	10/10/2022	16/10/2022				35,58%			
60	17/10/2022	23/10/2022				36,69%			
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%			
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			
76	6/02/2023	12/02/2023				64,72%			

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 56	CODIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

77	13/02/2023	19/02/2023				66,70%				
78	20/02/2023	26/02/2023				68,68%				
79	27/02/2023	5/03/2023				70,66%				
80	6/03/2023	12/03/2023				74,25%				
81	13/03/2023	19/03/2023				77,83%				
82	20/03/2023	26/03/2023				81,41%				
83	27/03/2023	2/04/2023				85,00%				
84	3/04/2023	9/04/2023				88,75%				
85	10/04/2023	16/04/2023				92,50%				
86	17/04/2023	23/04/2023				96,25%				
87	24/04/2023	30/04/2023				100,00%				



PERSONAL PROMEDIO EN OBRA			EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Interventoría:	5 Personas		3 Cabrias
Contratista:	1 Director.		1 Bobcat
	1 Residente		2 Barcazas
	1 Especialista Ambiental		1 Grúa
	1 Especialista Estructural		1 Retrocargador
	22 Ayudantes.		1 Bomba
	2 Comisión de Topografía		1 Telehandler
	1 Especialista Hidráulica	1	
	Trabajadora Social	1	
	Profesional Siso	1	
	Vigilante		

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites de los permisos ante la ANI para poder intervenir la vía concesionada
2. Entrega de predios faltantes por parte de Edubar
3. Ajuste de la nueva ubicación del tanque de agua potable por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,00	10,00
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,00	18,00
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e instalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suministro e instalación pilote diámetro 20	ML	54,00	6.479,44
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML	716,64	8.449,41
CM-06	Suministro e instalación arriostramientos D15	ML	3,40	2.244,00
CM-07	Suministro e instalación arriostramientos D17	ML		2.257,80
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
CM-08	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x30, incluye complemento central	ML	19,12	2.401,03
CM-09	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x36, incluye complemento central	ML	142,21	2.690,21
CM-10	Suministro e instalación entrepiso-sección curva, incluye viguetas, frisos y listón de deck		70,00	188,00
CM-11	Suministro e instalación entrepiso-sección recta, incluye viguetas, frisos y listón de deck	M2	679,62	3.070,63
5	BARANDAS EN MADERA			
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
CM-21	Suministro e instalación columna en cruz pórtico 45x45, incluye anclaje al pilote	ML	60,00	150,00
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 56	código:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			
19,01	PMA	GLB	0,030	0,145

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	26/09/2022 Columnas Modulo 2, pasarelas módulos 1 al 4



FOTO 2	27/09/2022 Hincado de pilotes Modulo 41



FOTO 3	28/09/2022 Instalación piso Deck Modulo 8



FOTO 4	29/09/2022 Instalación de viguetas Estación III

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 56	CODIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



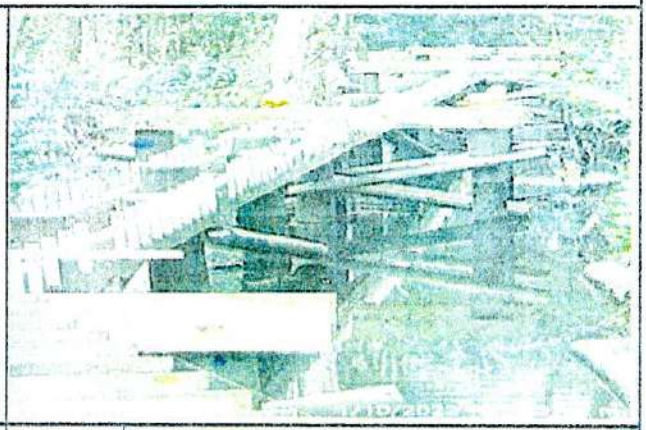


FOTO 5	29/09/2022 Pilotes Modulo 40 - Loop de aves	FOTO 6	1/10/2022 Instalación de viguetas modulo 19

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los módulos 40, 41 y 42 en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (Módulo 40, 41 y 42): 20 pilotes. Acumulado: 709 pilotes. Se continua el hincado de pilotes en el módulo 40, 41 y 42. De acuerdo con lo anterior estarían pendientes por hincar 35 pilotes para culminar con esta actividad.

Pilotes Agua (pasarelas 6m): Finalizado. Acumulado 639 pilotes.

El Contratista esta semana continuó con la instalación de las viguetas (modulo 10, 17 y 18), instalación de piso deck en modulo 2, 8 Y 9, por lo que hay cuatro (4) frentes trabajando en la construcción de la plataforma, estas actividades se realizaron en los módulos 2, 8, 9. Se inició la instalación del piso deck en el modulo 9.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra, a la fecha no se ha dado inicio a las siguientes actividades: Riostras en pasarela de 3m, en la construcción de las edificaciones en madera solo se ha iniciado la instalación de las columnas en cruz pero hay 9 actividades sin iniciar, por lo que el Contratista viene mostrando retrasos en estas actividades, los cuales son totalmente imputables a éste. De acuerdo con lo informado en el comité del pasado 22 de septiembre/22 el Contratista iniciará la próxima semana la construcción de la pasarela de 3 m con el corte de pilotes e instalación de tacos y riostras, también se tiene programado iniciar la construcción del tanque y el parqueadero que por ahora no tenía programado el inicio pero permite adelantar otros frentes mientras se obtienen los permisos por parte de la ANI. Para el caso de las edificaciones, el Contratista informa que para el próximo comité se estará entregando la fecha de inicio de estas actividades, pero aclara que en Bogotá se están trabajando todas las piezas de las estructuras por lo que llegarían a Barranquilla listas para el ensamble. Igualmente se presenta un retraso bastante considerable en la construcción del carril de desaceleración, ciclorruta, ampliación de box coulvert y accesos, pero estas actividades están sujetos al permiso de intervención de la vía con la ANI que aun esta en proceso de suscripción del convenio.
El Contratista realiza solicitud para la definición de las cotas de implantación del parqueadero, tanque de agua y del cerramiento perimetral de la estación III para iniciar con este frente de obra. Igualmente presenta una solicitud para trasladar el cuarto técnico o una modificación al cerramiento para que quede protegido por dicho cerramiento. Esta solicitud fue remitida a la entidad contratante para sus comentarios.
El Contratista se encuentra implementado en su totalidad el PMA. El Contratista realizó la entrega del presupuesto para revisión de la Interventoría de la red contraincendios e igualmente remitió el presupuesto del sistema de Voz y Datos.

La Entidad Contratante hizo entrega de las cotas finales para los módulos 34 a 50, teniendo en cuenta las revisiones realizadas por la Interventoría y el Contratista para que las cotas actuales del terreno y las dimensiones de las riostras permitan que estas ultimas no queden enterradas y que las vigas laminadas no queden sumergidas. Teniendo en cuenta esta solicitud, la Entidad Contratante modificó la cota final del módulo 34 a módulo 50 y elevó la cota de la gradería de contemplación a la +3,20.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A	NOMBRE: Ing. Fabian Suarez	NOMBRE: Ing. Pedro Gutiérrez B.	Elaborado:
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	CARGO: Gerente de Proyectos	CARGO: Director de Interventoría	3-oct-22

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 57	CÓDIGO:	Página 1 de 3


Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA				
Contrato Nº:	EDU-561-2021	**Valor Inicial:**	$	82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN				
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	**Valor Total Inicial:**	$		82.464.262.620,00
Fecha de Inicio:	1/09/2021	**Valor Adiciones:**			
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	**Valor Actualizado:**	$		82.464.262.620,00
Prórroga No 1	6 meses	**Valor Facturado:**	$	27.448.520.611,39	**33,29%**
Prórroga No 2	10 meses	**Valor por Pagar:**	$	82.464.262.620,00	**100,0%**
Suspensiones	N/A				
Reinicios	N/A				
Plazo Actualizado:	30/04/2023	**ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**			
Plazo en Semanas:	87 semanas	ANTICIPO		NA	
		ACTA No.1	$	1.628.531.995,79	**1,97%**
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.2	$	1.365.320.628,62	**1,66%**
Contrato Nº:	EDU-566-2021	ACTA No.3	$	1.399.878.857,78	**1,70%**
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA No.4	$	5.566.544.118,72	**6,75%**
Fecha de Inicio:	1/09/2021	ACTA No.5	$	3.838.560.382,20	**4,65%**
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	ACTA No.6	$	3.461.952.945,32	**4,20%**
Suspensiones	N/A	ACTA No 7	$	3.411.534.139,78	**4,14%**
Reinicios	N/A	ACTA No 8	$	3.201.796.207,74	**3,88%**
Prórroga No 1	6 meses	ACTA No 9	$	3.574.401.335,44	**4,33%**
Prórroga No 2	10 meses				
Plazo Actualizado:	30/04/2023				

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45,00%	24,00%	-21,00%	24,58%	25,39%	$ 20.933.618.186,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022	47,00%	25,00%	-22,00%	25,50%	26,04%	$ 21.471.925.010,83	0,54%
51	15/08/2022	21/08/2022	49,00%	26,00%	-23,00%	26,41%	28,13%	$ 23.194.305.714,11	1,72%
52	22/08/2022	28/08/2022	51,00%	27,00%	-24,00%	27,33%	28,91%	$ 23.843.634.035,45	1,58%
53	29/08/2022	4/09/2022	52,00%	28,00%	-24,00%	28,55%	29,05%	$ 23.957.263.245,29	0,50%
54	5/09/2022	11/09/2022	54,00%	28,00%	-26,00%	29,77%	29,79%	$ 24.566.019.017,21	0,02%
55	12/09/2022	18/09/2022	56,00%	29,00%	-27,00%	31,00%	30,07%	$ 24.796.853.052,97	-0,93%
56	19/09/2022	25/09/2022	58,00%	30,00%	-28,00%	32,22%	30,70%	$ 25.319.782.611,95	-1,52%
57	26/09/2022	2/10/2022	59,00%	31,00%	-28,00%	33,34%	33,29%	$ 27.448.520.611,39	-0,05%
58	3/10/2022	9/10/2022	61,00%	32,00%	-29,00%	34,46%	33,59%	$ 27.695.798.119,18	-0,87%
59	10/10/2022	16/10/2022				35,58%			
60	17/10/2022	23/10/2022				36,69%			
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%		-	
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			
76	6/02/2023	12/02/2023				64,72%			

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 57	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

77	13/02/2023	19/02/2023				66,70%			
78	20/02/2023	26/02/2023				68,68%			
79	27/02/2023	5/03/2023				70,66%			
80	6/03/2023	12/03/2023				74,25%			
81	13/03/2023	19/03/2023				77,83%			
82	20/03/2023	26/03/2023				81,41%			
83	27/03/2023	2/04/2023				85,00%			
84	3/04/2023	9/04/2023				88,75%			
85	10/04/2023	16/04/2023				92,50%			
86	17/04/2023	23/04/2023				96,25%			
87	24/04/2023	30/04/2023				100,00%			





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA			EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Interventoría:	5 Personas		3 Cabrias
Contratista:	1 Director.		1 Bobcat
	1 Residente		2 Barcazas
	1 Especialista Ambiental		1 Grúa
	1 Especialista Estructural		1 Retrocargador
	22 Ayudantes.		1 Bomba
	2 Comisión de Topografía		1 Telehandler
	1 Especialista Hidráulica	1	
	Trabajadora Social	1	
	Profesional Siso	1	
	Vigilante		

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites de los permisos ante la ANI para poder intervenir la vía concesionada
2. Ajuste a las cotas finales de ubicación del tanque de agua potable, cuarto tecnico y parqueadero por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,25	10,25
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,50	18,50
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e instalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suministro e instalación pilote diámetro 20	ML	17,88	6.497,32
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML		8.449,41
CM-06	Suministro e instalación arriostramientos D15	ML		2.244,00
CM-07	Suministro e instalación arriostramientos D17	ML		2.257,80
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
CM-08	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x30, incluye complemento central	ML		2.401,03
CM-09	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x36, incluye complemento central	ML		2.690,21
CM-10	Suministro e instalación entrepiso-sección curva, incluye viguetas, frisos y listón de deck			188,00
CM-11	Suministro e instalación entrepiso-sección recta, incluye viguetas, frisos y listón de deck	M2	125,65	3.196,28
5	BARANDAS EN MADERA			
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
CM-21	Suministro e Instalación columna en cruz pórtico 45x45, incluye anclaje al pilote	ML		150,00
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 57	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			
19,01	PMA	GLB	0,030	0,145

REGISTRO FOTOGRÁFICO

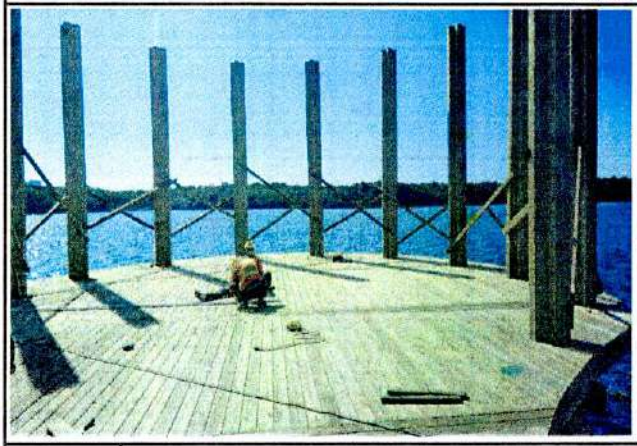


FOTO 1	3/10/2022 Columnas y piso deck Modulo 2

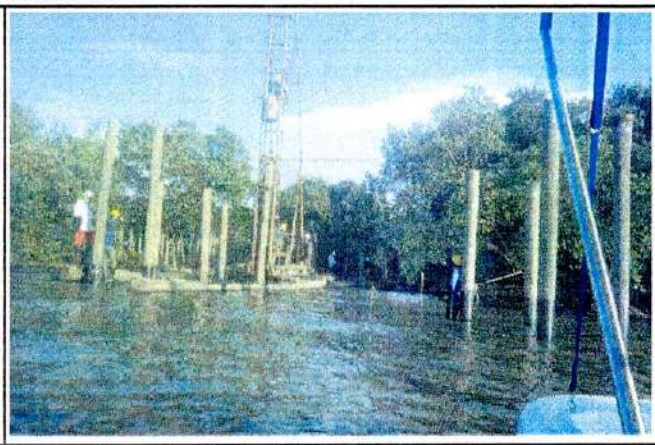


FOTO 2	4/10/2022 Hincado de pilotes Modulo 42



FOTO 3	5/10/2022 Instalación de columnas Estación III



FOTO 4	6/10/2022 Instalación de tacos modulo 22

EDUMAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 57	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



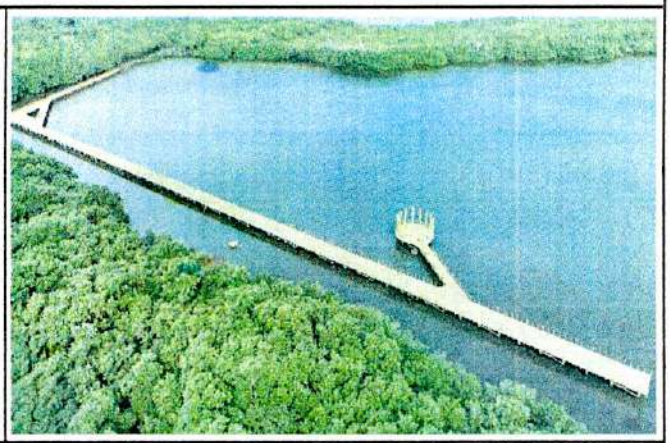


FOTO 5	7/10/2022 Instalación de vigueta modulo 19	FOTO 6	8/10/2022 Instalación de deck

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los módulos 40 y 42 en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (Módulo 40, 42): 9 pilotes. Acumulado: 718 pilotes. Se continua el hincado de pilotes en el módulo 40 y 42. De acuerdo con lo anterior estarían pendientes por hincar 26 pilotes para culminar con esta actividad.

Pilotes Agua (pasarelas 6m): Finalizado. Acumulado 639 pilotes.

El Contratista esta semana continuó con la instalación de las viguetas (modulo 10, 18 y 19), instalación de piso deck en modulo 9, instalación de barandas modulo 4 y corte e instalación de tacos en los módulos 11, 12 y 13 por lo que hay cuatro (4) frentes trabajando en la construcción de la plataforma.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra, a la fecha no se ha dado inicio a las siguientes actividades: Riostras en pasarela de 3m, en la construcción de las edificaciones en madera solo se ha iniciado la instalación de las columnas en cruz pero hay 9 actividades sin iniciar, por lo que el Contratista viene mostrando retrasos en estas actividades, los cuales son totalmente imputables a éste. En el comité de obra del 6 de octubre/22, el Contratista informa que a finales de mes estará llegando a Barranquilla los primeros muros de las edificaciones para iniciar el ensamble con un tiempo estimado de 2 meses por edificación, por lo que se espera que la estación III pueda estar terminadas en el mes de diciembre/22. Para el caso de las demás edificaciones el contratista verificará la implementación de frentes independientes para finalizar antes de lo programado las edificaciones. Igualmente se presenta un retraso bastante considerable en la construcción del carril de desaceleración, ciclorruta, ampliación de box coulvert y accesos, pero estas actividades están sujetos al permiso de intervención de la vía con la ANI que aun esta en proceso de suscripción del convenio.
En cuento al diseño definitivo del parqueadero, el Contratista remitirá a la Entidad Contratante las cotas actuales del terreno y la vía para ajustar el nuevo diseño de parqueadero y definir los niveles constructivos de las estructuras allí presentes.
El Contratista se encuentra implementado en su totalidad el PMA. El Contratista realizó la entrega del presupuesto para revisión de la Interventoría de la red contraincendios e igualmente remitió el presupuesto del sistema de Voz y Datos.

La Entidad Contratante hizo entrega de las cotas finales para los módulos 34 a 50, teniendo en cuenta las revisiones realizadas por la Interventoría y el Contratista para que las cotas actuales del terreno y las dimensiones de las riostras permitan que estas ultimas no queden enterradas y que las vigas laminadas no queden sumergidas. Teniendo en cuenta esta solicitud, la Entidad Contratante modificó la cota final del módulo 34 a módulo 50 y elevó la cota de la gradería de contemplación a la +3,20.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A	**NOMBRE:** Ing. Fabian Suarez	**NOMBRE:** Ing. Pedro Gutiérrez B.	**Elaborado:**
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	**CARGO:** Gerente de Proyectos	**CARGO:** Director de Interventoría	10-oct-22

EDUVAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 58	CÓDIGO:	Página 1 de 3


Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA				
Contrato Nº:	EDU-561-2021	**Valor Inicial:**	$	82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN				
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	**Valor Total Inicial:**	$		82.464.262.620,00
Fecha de Inicio:	1/09/2021	**Valor Adiciones:**			
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	**Valor Actualizado:**	$		82.464.262.620,00
Prórroga No 1	6 meses	**Valor Facturado:**	$	27.448.520.611,39	33,29%
Prórroga No 2	10 meses	**Valor por Pagar:**	$	82.464.262.620,00	100,0%
Suspensiones	N/A				
Reinicios	N/A				
Plazo Actualizado:	30/04/2023	**ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**			
Plazo en Semanas:	87 semanas	ANTICIPO		NA	
		ACTA No.1	$	1.628.531.995,79	1,97%
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.2	$	1.365.320.628,62	1,66%
Contrato Nº:	EDU-566-2021	ACTA No.3	$	1.399.878.857,78	1,70%
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA No.4	$	5.566.544.118,72	6,75%
Fecha de Inicio:	1/09/2021	ACTA No.5	$	3.838.560.382,20	4,65%
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	ACTA No.6	$	3.461.952.945,32	4,20%
Suspensiones	N/A	ACTA No 7	$	3.411.534.139,78	4,14%
Reinicios	N/A	ACTA No 8	$	3.201.796.207,74	3,88%
Prórroga No 1	6 meses	ACTA No 9	$	3.574.401.335,44	4,33%
Prórroga No 2	10 meses				
Plazo Actualizado:	30/04/2023				

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45,00%	24,00%	-21,00%	24,58%	25,39%	$ 20.933.618.186,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022	47,00%	25,00%	-22,00%	25,50%	26,04%	$ 21.471.925.010,83	0,54%
51	15/08/2022	21/08/2022	49,00%	26,00%	-23,00%	26,41%	28,13%	$ 23.194.305.714,11	1,72%
52	22/08/2022	28/08/2022	51,00%	27,00%	-24,00%	27,33%	28,91%	$ 23.843.634.035,45	1,58%
53	29/08/2022	4/09/2022	52,00%	28,00%	-24,00%	28,55%	29,05%	$ 23.957.263.245,29	0,50%
54	5/09/2022	11/09/2022	54,00%	28,00%	-26,00%	29,77%	29,79%	$ 24.566.019.017,21	0,02%
55	12/09/2022	18/09/2022	56,00%	29,00%	-27,00%	31,00%	30,07%	$ 24.796.853.052,97	-0,93%
56	19/09/2022	25/09/2022	58,00%	30,00%	-28,00%	32,22%	30,70%	$ 25.319.782.611,95	-1,52%
57	26/09/2022	2/10/2022	59,00%	31,00%	-28,00%	33,34%	33,29%	$ 27.448.520.611,39	-0,05%
58	3/10/2022	9/10/2022	61,00%	32,00%	-29,00%	34,46%	33,59%	$ 27.695.798.119,18	-0,87%
59	10/10/2022	16/10/2022	63,00%	32,00%	-31,00%	35,58%	33,75%	$ 27.831.743.114,74	-1,83%
60	17/10/2022	23/10/2022				36,69%			
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%			
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			
76	6/02/2023	12/02/2023				64,72%			

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 58	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

77	13/02/2023	19/02/2023				66,70%			
78	20/02/2023	26/02/2023				68,68%			
79	27/02/2023	5/03/2023				70,66%			
80	6/03/2023	12/03/2023				74,25%			
81	13/03/2023	19/03/2023				77,83%			
82	20/03/2023	26/03/2023				81,41%			
83	27/03/2023	2/04/2023				85,00%			
84	3/04/2023	9/04/2023				88,75%			
85	10/04/2023	16/04/2023				92,50%			
86	17/04/2023	23/04/2023				96,25%			
87	24/04/2023	30/04/2023				100,00%			





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA			EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Interventoría:	5 Personas		3 Cabrias
Contratista:	1 Director.		1 Bobcat
	1 Residente		2 Barcazas
	1 Especialista Ambiental		1 Grúa
	1 Especialista Estructural		1 Retrocargador
	22 Ayudantes.		1 Bomba
	2 Comisión de Topografía		1 Telehandler
	1 Especialista Hidráulica	1	
	Trabajadora Social	1	
	Profesional Siso	1	
	Vigilante		

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites de los permisos ante la ANI para poder intervenir la vía concesionada
2. Ajuste a las cotas finales de ubicación del tanque de agua potable, cuarto técnico y parqueadero por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,25	10,50
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,50	19,00
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e instalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suministro e instalación pilote diámetro 20	ML	10,30	6.507,62
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML		8.449,41
CM-06	Suministro e instalación arriostramientos D15	ML		2.244,00
CM-07	Suministro e instalación arriostramientos D17	ML		2.257,80
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
CM-08	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x30, incluye complemento central	ML		2.401,03
CM-09	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x36, incluye complemento central	ML		2.690,21
CM-10	Suministro e instalación entrepiso-sección curva, incluye viguetas, frisos y listón de deck			188,00
CM-11	Suministro e instalación entrepiso-sección recta, incluye viguetas, frisos y listón de deck	M2	63,85	3.260,13
5	BARANDAS EN MADERA			
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
CM-21	Suministro e instalación columna en cruz pórtico 45x45, incluye anclaje al pilote	ML		150,00
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 58	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			
19,01	PMA	GLB	0,030	0,145

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	10/10/2022 Instalación de viguetas Estación III



FOTO 2	11/10/2022 Corte de pilotes e instalación de tacos modulo 11 y 12

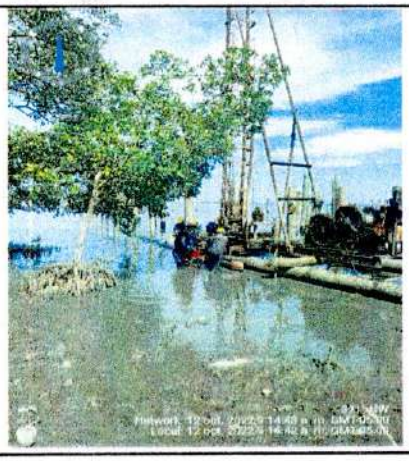


FOTO 3	12/10/2022 Hincado de pilotes modulo 42



FOTO 4	13/10/2022 Instalación de deck modulo 9 y 10

ADVANCE	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 58	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA





FOTO 5	14/10/2022 Instalación de vigueta modulo 22	FOTO 6	15/10/2022 Instalación de barandas módulo 15

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los módulos 41 y 42 en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (Módulo 41, 42): 11 pilotes. Acumulado: 729 pilotes. Se continua el hincado de pilotes en el módulo 41 y 42. De acuerdo con lo anterior estarían pendientes por hincar 16 pilotes para culminar con esta actividad.

Pilotes Agua (pasarelas 6m): Finalizado. Acumulado 639 pilotes.

El Contratista esta semana continuó con la instalación de las viguetas (modulo 19, 20, 21 y 22), instalación de piso deck en módulo 9, instalación de barandas módulo 15 y corte e instalación de tacos en los módulos 11, 12 y 13 por lo que hay cuatro (4) frentes trabajando en la construcción de la plataforma.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra, a la fecha no se ha dado inicio a las siguientes actividades: Riostras en pasarela de 3m, en la construcción de las edificaciones en madera solo se ha iniciado la instalación de las columnas en cruz pero hay 9 actividades sin iniciar, por lo que el Contratista viene mostrando retrasos en estas actividades, los cuales son totalmente imputables a éste. En el comité de obra del 6 de octubre 2022, el Contratista informa que a finales de mes estará llegando a Barranquilla los primeros muros de las edificaciones para iniciar el ensamble con un tiempo estimado de 2 meses por edificación, por lo que se espera que la estación III pueda estar terminadas en el mes de diciembre 2022. Para el caso de las demás edificaciones el Contratista verificará la implementación de frentes independientes para finalizar antes de lo programado las edificaciones. Igualmente se presenta un retraso bastante considerable en la construcción del carril de desaceleración, ciclorruta, ampliación de box coulvert y accesos, pero estas actividades están sujetos al permiso de intervención de la vía con la ANI que aun está en proceso de suscripción del convenio.
En cuento al diseño definitivo del parqueadero, el Contratista remitió a la Entidad Contratante las cotas actuales del terreno y la vía para ajustar el nuevo diseño de parqueadero y definir los niveles constructivos de las estructuras allí presentes.
El Contratista se encuentra implementado en su totalidad el PMA. El Contratista realizó la entrega del presupuesto para revisión de la Interventoría de la red contraincendios e igualmente remitió el presupuesto del sistema de Voz y Datos.

La Entidad Contratante hizo entrega de las cotas finales para los módulos 34 a 50, teniendo en cuenta las revisiones realizadas por la Interventoría y el Contratista para que las cotas actuales del terreno y las dimensiones de las riostras permitan que estas ultimas no queden enterradas y que las vigas laminadas no queden sumergidas. Teniendo en cuenta esta solicitud, la Entidad Contratante modificó la cota final del módulo 34 a módulo 50 y elevó la cota de la gradería de contemplación a la +3,20.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A.	NOMBRE: Ing. Fabian Suarez	NOMBRE: Ing. Pedro Gutiérrez B.	Elaborado:
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	CARGO: Gerente de Proyectos	CARGO: Director de Interventoría	18-oct-22

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 59		Página 1 de 3
Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		

Contrato Nº:	EDU-561-2021	Valor Inicial:	$ 82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO ICO MALLORQUIN			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	Valor Total Inicial:	$	82.464.262.620,00
Fecha de Inicio:	1/09/2021	Valor Adiciones:		
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	Valor Actualizado:	$	82.464.262.620,00
Prórroga No 1	6 meses	Valor Facturado:	$ 27.448.520.611,39	33,29%
Prórroga No 2	10 meses	Valor por Pagar:	$ 82.464.262.620,00	100,0%
Suspensiones	N/A			
Reinicios	N/A	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Plazo Actualizado:	30/04/2023	ANTICIPO	NA	
Plazo en Semanas:	87 semanas	ACTA No.1	$ 1.628.531.995,70	1,97%
		ACTA No.2	$ 1.365.320.628,62	1,66%
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.3	$ 1.399.878.857,78	1,70%
Contrato Nº:	EDU-566-2021	ACTA No.4	$ 5.566.544.110,72	6,75%
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA No.5	$ 3.838.560.302,20	4,65%
Fecha de Inicio:	1/09/2021	ACTA No.6	$ 3.461.952.945,32	4,20%
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	ACTA No.7	$ 3.411.534.139,78	4,14%
Suspensiones	N/A	ACTA No.8	$ 3.201.796.207,74	3,88%
Reinicios	N/A	ACTA No.9	$ 3.574.401.835,44	4,33%
Prórroga No 1	6 meses			
Prórroga No 2	10 meses			
Plazo Actualizado:	30/04/2023			

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	$ 17.426.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	$ 17.919.460.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45,00%	24,00%	-21,00%	24,58%	25,39%	$ 20.933.618.166,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022	47,00%	25,00%	-22,00%	25,50%	26,04%	$ 21.471.925.010,63	0,54%
51	15/08/2022	21/08/2022	49,00%	26,00%	-23,00%	26,41%	28,13%	$ 23.194.805.714,13	1,72%
52	22/08/2022	28/08/2022	51,00%	27,00%	-24,00%	27,33%	28,91%	$ 23.843.634.035,45	1,58%
53	29/08/2022	4/09/2022	52,00%	28,00%	-24,00%	28,25%	29,05%	$ 23.957.263.245,28	0,80%
54	5/09/2022	11/09/2022	54,00%	28,00%	-26,00%	29,77%	29,79%	$ 24.566.019.017,21	0,02%
55	12/09/2022	18/09/2022	56,00%	29,00%	-27,00%	31,00%	30,07%	$ 24.796.853.052,57	-0,93%
56	19/09/2022	25/09/2022	58,00%	30,00%	-28,00%	32,22%	30,70%	$ 25.319.787.631,95	-1,52%
57	26/09/2022	2/10/2022	59,00%	31,00%	-28,00%	33,34%	33,29%	$ 27.448.520.611,39	-0,05%
58	3/10/2022	9/10/2022	61,00%	32,00%	-29,00%	34,46%	33,59%	$ 27.695.708.118,18	-0,87%
59	10/10/2022	16/10/2022	63,00%	32,00%	-31,00%	35,58%	33,75%	$ 27.831.743.114,74	-1,83%
60	17/10/2022	23/10/2022	65,00%	33,00%	-32,00%	36,69%	33,93%	$ 27.979.609.230,80	-2,76%
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%			
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			
76	6/02/2023	12/02/2023				64,72%			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 59										
Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA										
77	13/03/2023	19/03/2023				66,70%					
78	20/03/2023	26/03/2023				68,68%					
79	27/03/2023	5/03/2023				70,66%					
80	6/03/2023	12/03/2023				74,25%					
81	13/03/2023	19/03/2023				77,83%					
82	20/03/2023	26/03/2023				81,41%					
83	27/03/2023	2/04/2023				85,00%					
84	3/04/2023	9/04/2023				88,75%					
85	10/04/2023	16/04/2023				92,50%					
86	17/04/2023	23/04/2023				96,25%					
87	24/04/2023	30/04/2023				100,00%					



PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Interventoría:	5 Personas		
Contratista:	1 Director. 1 Residente 1 Especialista Ambiental 1 Especialista Estructural 22 Ayudantes. 2 Comisión de Topografía 1 Especialista Hidráulico Trabajadora Social 1 Profesional Sisa 1 Vigilante	3 Cabrias 1 Dobcat 2 Barcazas 1 Grúa 1 Retrocargador Bomba 1 Telehandler 1	

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites de los permisos ante la ANI para poder intervenir la vía concesionada
2. Ajuste a las cotas finales de ubicación del tanque de agua potable, cuarto técnico y parqueadero por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5518	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,25	10,75
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,50	18,50
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
5519	Suministro e instalación valla informativa	UNO		1,00
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suministro e instalación pilote diámetro 20	ML		6.507,62
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML		9.449,41
CM-06	Suministro e instalación arriostramientos D15	ML		2.244,00
CM-07	Suministro e instalación arriostramientos D17	ML		2.257,80
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
CM-08	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x30, incluye complemento central	ML		2.401,03
CM-09	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x36, incluye complemento central	ML		2.690,21
CM-10	Suministro e instalación entrepiso-sección curva, incluye viguetas, frisos y listón de deck		4,81	192,31
CM-11	Suministro e instalación entrepiso-sección recta, incluye viguetas, frisos y listón de deck	M2	50,59	8.810,73
5	BARANDAS EN MADERA			
CM-12	Suministro e instalación baranda - sección curva, incluye poral estructural, pasamanos y marco con barrotes			47,40
CM-13	Suministro e instalación baranda - sección recta, incluye poral estructural, pasamanos y marco con barrotes			253,52
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
CM-22	Suministro e instalación columna en cruz pórtico 45x45, incluye anclaje al pilote	ML		150,00
CM-23	Suministro e instalación viga laminada pórtico - 19X50, incluye enclaje a columna	ML	50,80	50,80
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 59			Página 1 de 3
Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			
19,01	PMA	GLB		0,145

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 | 18/10/2022 Instalación de viguetas modulo 22

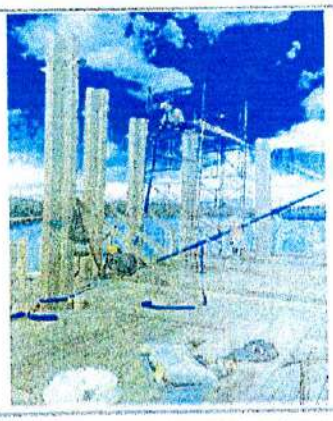


FOTO 2 | 19/10/2022 Instalación de vigas laminadas parte superior modulo 2



FOTO 3 | 19/10/2022 Remate instalación Deck Modulo 10

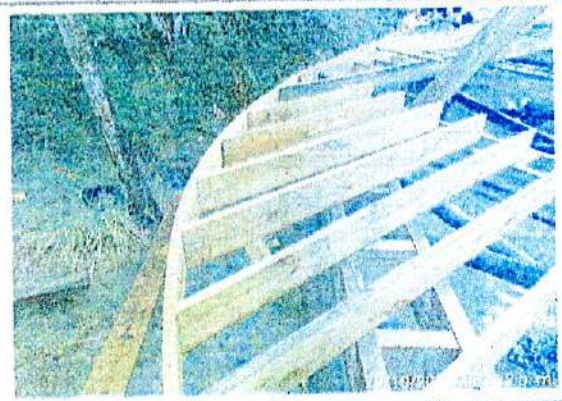


FOTO 4 | 20/10/2022 Instalación viguetas estación III

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 60	Código:
		Página 1 de 3
Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UFA DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	



FOTO 5 — 21/10/2022 Instalación de barandas modulo 16

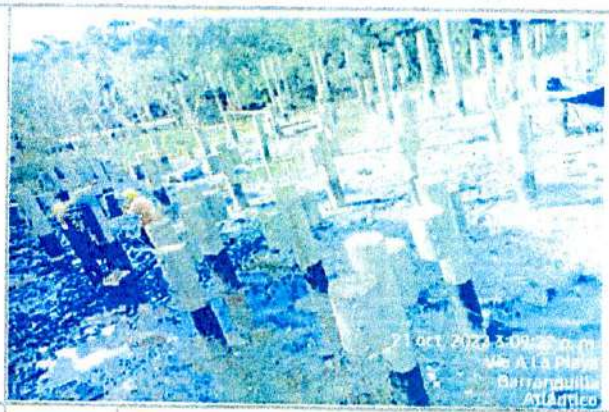


FOTO 6 — 21/10/2022 Corte de Pilotes e instalación de tacos módulos 11,12 y estación pluvita

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los módulos 41 y 42 en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (Módulo 41, 42): 0 pilotes. Acumulado: 739 pilotes. Están pendientes por hincar 16 pilotes para culminar con esta actividad (2 modulo 41 y 14 del modulo 42).

Pilotes Agua (pasarelas 6m): Finalizado. Acumulado 639 pilotes.

El Contratista esta semana continuó con la instalación de las viguetas (Estación III, modulo 22 y 23), instalación de piso deck en módulo 10, instalación de barandas módulo 16 y 17, instalación de vigas de cubierta en modulo 2 y corte e instalación de tacos en los módulos 11, 12 y 13 por lo que hay seis (6) frentes trabajando en la construcción de la plataforma. Sin embargo, los avances durante la semana no son muy significativos debido a las frecuentes lluvias que están afectando la zona del proyecto.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra, a la fecha no se ha dado inicio a las siguientes actividades: Riostras en pasarela de 3m, en la construcción de las edificaciones en madera solo se ha iniciado la instalación de las columnas en cruz pero hay 9 actividades sin iniciar, por lo que el Contratista viene mostrando retrasos en estas actividades, los cuales son totalmente imputables a éste. En el comité de obra del 20 de octubre 2022, el Contratista informa la próxima semana estará llegando a Barranquilla los primeros muros de las edificaciones para iniciar el ensamble con un tiempo estimado de 2 meses por edificación, por lo que se espera que la estación III pueda estar terminadas en el mes de diciembre 2022. Para el caso de las demás edificaciones el Contratista verificará la implementación de frentes independientes para finalizar antes de lo programado las edificaciones. Igualmente se presenta un retraso bastante considerable en la construcción del canil de descolgeración, ciclorruta, ampliación de box coulvert y accesos, pero estas actividades están sujetos al permiso de intervención de la vía con la ANI que aun está en proceso de suscripción del convenio, que se espera se pueda firmar a finales de este mes.

El Contratista se encuentra implementado en su totalidad el PMA. La Interventoría remitió las observaciones del presupuesto de la red contraincendios y del sistema de Voz y Datos.

La Entidad Contratante mediante oficio DIP-01031 de fecha 6 de Octubre de 2022, solicita realizar algunos ajustes a la propuesta realizada por el Contratista para el traslado del cuarto eléctrico y el tanque de agua potable. Igualmente define las cotas de implantación del parqueadero con la estructura del pavimento a construir y solicita realizar los modificaciones correspondientes a las redes eléctricas e hidrosanitarias.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A.	NOMBRE: Ing. Fabian Suarez	NOMBRE: Ing. Pedro Gutiérrez B.	Elaborado:
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	CARGO: Gerente de Proyectos	CARGO: Director de Interventoría	24-oct-22

EDUMAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 60	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


Contrato Nº:	EDU-561-2021	**Valor Inicial:**	$ 82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	**Valor Total Inicial:**	$	82.464.262.620,00
Fecha de Inicio:	1/09/2021	**Valor Adiciones:**		
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	**Valor Actualizado:**	$	82.464.262.620,00
Prórroga No 1	6 meses	**Valor Facturado:**	$ 27.448.520.611,39	**33,29%**
Prórroga No 2	10 meses	**Valor por Pagar:**	$ 82.464.262.620,00	**100,0%**
Suspensiones	N/A			
Reinicios	N/A			
Plazo Actualizado:	30/04/2023	**ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
Plazo en Semanas:	87 semanas	ANTICIPO	NA	
		ACTA No.1	$ 1.628.531.995,79	**1,97%**
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.2	$ 1.365.320.628,62	**1,66%**
Contrato Nº:	EDU-566-2021	ACTA No.3	$ 1.399.878.857,78	**1,70%**
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA No.4	$ 5.566.544.118,72	**6,75%**
Fecha de Inicio:	1/09/2021	ACTA No.5	$ 3.838.560.382,20	**4,65%**
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	ACTA No.6	$ 3.461.952.945,32	**4,20%**
Suspensiones	N/A	ACTA No 7	$ 3.411.534.139,78	**4,14%**
Reinicios	N/A	ACTA No 8	$ 3.201.796.207,74	**3,88%**
Prórroga No 1	6 meses	ACTA No 9	$ 3.574.401.335,44	**4,33%**
Prórroga No 2	10 meses			
Plazo Actualizado:	30/04/2023			


SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	**37,00%**	**20,00%**	-17,00%	**21,61%**	**21,13%**	$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	**39,00%**	**21,00%**	-18,00%	**22,30%**	**21,17%**	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	**41,00%**	**22,00%**	-19,00%	**22,98%**	**21,73%**	$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	**43,00%**	**23,00%**	-20,00%	**23,66%**	**25,07%**	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	**45,00%**	**24,00%**	-21,00%	**24,58%**	**25,39%**	$ 20.933.618.186,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022	**47,00%**	**25,00%**	-22,00%	**25,50%**	**26,04%**	$ 21.471.925.010,83	0,54%
51	15/08/2022	21/08/2022	**49,00%**	**26,00%**	-23,00%	**26,41%**	**28,13%**	$ 23.194.305.714,11	1,72%
52	22/08/2022	28/08/2022	**51,00%**	**27,00%**	-24,00%	**27,33%**	**28,91%**	$ 23.843.634.035,45	1,58%
53	29/08/2022	4/09/2022	**52,00%**	**28,00%**	-24,00%	**28,55%**	**29,05%**	$ 23.957.263.245,29	0,50%
54	5/09/2022	11/09/2022	**54,00%**	**28,00%**	-26,00%	**29,77%**	**29,79%**	$ 24.566.019.017,21	0,02%
55	12/09/2022	18/09/2022	**56,00%**	**29,00%**	-27,00%	**31,00%**	**30,07%**	$ 24.796.853.052,97	-0,93%
56	19/09/2022	25/09/2022	**58,00%**	**30,00%**	-28,00%	**32,22%**	**30,70%**	$ 25.319.782.611,95	-1,52%
57	26/09/2022	2/10/2022	**59,00%**	**31,00%**	-28,00%	**33,34%**	**33,29%**	$ 27.448.520.611,39	-0,05%
58	3/10/2022	9/10/2022	**61,00%**	**32,00%**	-29,00%	**34,46%**	**33,59%**	$ 27.695.798.119,18	-0,87%
59	10/10/2022	16/10/2022	**63,00%**	**32,00%**	-31,00%	**35,58%**	**33,75%**	$ 27.831.743.114,74	-1,83%
60	17/10/2022	23/10/2022	**65,00%**	**33,00%**	-32,00%	**36,69%**	**33,93%**	$ 27.979.609.230,80	-2,76%
61	24/10/2022	30/10/2022	**66,00%**	**34,00%**	-32,00%	**37,81%**	**34,69%**	$ 28.608.425.053,24	-3,12%
62	31/10/2022	6/11/2022				**39,46%**			
63	7/11/2022	13/11/2022				**41,10%**			
64	14/11/2022	20/11/2022				**42,75%**			
65	21/11/2022	27/11/2022				**44,39%**			
66	28/11/2022	4/12/2022				**45,75%**			
67	5/12/2022	11/12/2022				**47,11%**			
68	12/12/2022	18/12/2022				**48,48%**			
69	19/12/2022	25/12/2022				**49,84%**			
70	26/12/2022	1/01/2023				**51,20%**			
71	2/01/2023	8/01/2023				**53,59%**			
72	9/01/2023	15/01/2023				**55,98%**			
73	16/01/2023	22/01/2023				**58,37%**			
74	23/01/2023	29/01/2023				**60,76%**			
75	30/01/2023	5/02/2023				**62,74%**			
76	6/02/2023	12/02/2023				**64,72%**			

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 60	CODIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

77	13/02/2023	19/02/2023				66,70%			
78	20/02/2023	26/02/2023				68,68%			
79	27/02/2023	5/03/2023				70,66%			
80	6/03/2023	12/03/2023				74,25%			
81	13/03/2023	19/03/2023				77,83%			
82	20/03/2023	26/03/2023				81,41%			
83	27/03/2023	2/04/2023				85,00%			
84	3/04/2023	9/04/2023				88,75%			
85	10/04/2023	16/04/2023				92,50%			
86	17/04/2023	23/04/2023				96,25%			
87	24/04/2023	30/04/2023				100,00%			





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA			EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Interventoría:	5 Personas		3 Cabrias	
Contratista:	1 Director.		1 Bobcat	
	1 Residente		2 Barcazas	
	1 Especialista Ambiental		1 Grúa	
	1 Especialista Estructural		1 Retrocargador	1
	22 Ayudantes.		Bomba	1
	2 Comisión de Topografía		Telehandler	
	1 Especialista Hidráulica	1		
	Trabajadora Social	1		
	Profesional Siso	1		
	Vigilante			

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites de los permisos ante la ANI para poder intervenir la vía concesionada
2. Ajuste a las cotas finales de ubicación del tanque de agua potable, cuarto técnico y parqueadero por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	**OBRAS PRELIMINARES**			
5513	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,25	11,00
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,50	20,00
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e instalación valla informativa	UND		1,00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**			
3	**PILOTAJE EN MADERA**			
CM-04	Suministro e instalación pilote diámetro 20	ML		6.507,62
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML		8.449,41
CM-06	Suministro e instalación arriostramientos D15	ML		2.244,00
CM-07	Suministro e instalación arriostramientos D17	ML	304,90	2.562,70
4	**PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA**			
CM-08	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x30, incluye complemento central	ML		2.401,03
CM-09	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x36, incluye complemento central	ML		2.690,21
CM-10	Suministro e instalación entrepiso-sección curva, incluye viguetas, frisos y listón de deck			192,31
CM-11	Suministro e instalación entrepiso-sección recta, incluye viguetas, frisos y listón de deck	M2	260,36	3.571,09
5	**BARANDAS EN MADERA**			
CM-12	Suministro e instalación baranda - sección curva, incluye paral estructural, pasamanos y marco con barrotes			47,48
CM-13	Suministro e instalación baranda - sección recta, incluye paral estructural, pasamanos y marco con barrotes		152,85	406,37
6	**EDIFICACIONES EN MADERA**			
CM-21	Suministro e instalación columna en cruz pórtico 45x45, incluye anclaje al pilote	ML		150,00
CM-22	Suministro e instalación viga laminada pórtico - 13X50, incluye anclaje a columna	ML	20,92	71,72
7	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			

EDWOR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 60			CÓDIGO: Página 1 de 3
Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			
19,01	PMA	GLB		0,145

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	24/10/2022 Instalación de viguetas modulo 23

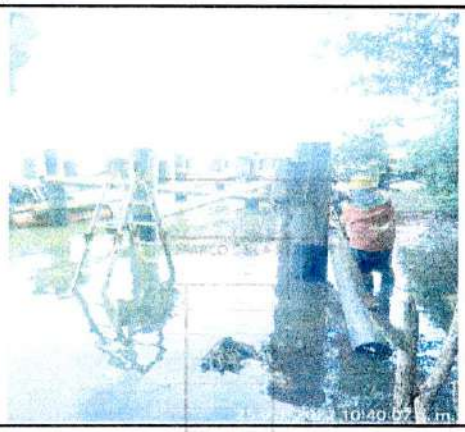


FOTO 2	25/10/2022 Instalación de riostras de 17 cm Modulo 11 y 12

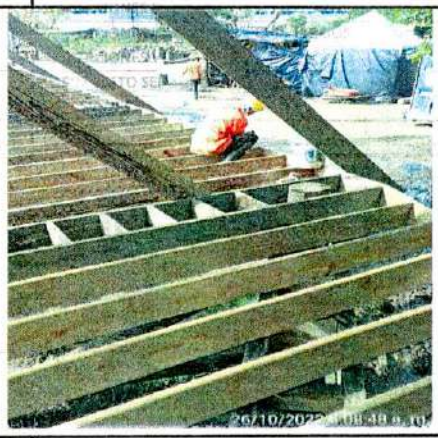


FOTO 3	26/10/2022 Instalación viguetas Estación III



FOTO 4	27/10/2022 Instalación vigas de cubierta Modulo 2

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 60	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



FOTO 5 — 27/10/2022 Instalación de barandas modulo 1,2,3,4



FOTO 6 — 29/10/2022 Instalación viguetas modulo 24

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los módulos 41 y 42 en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se reinicia con hincado de pilotes:
Pilotes Tierra (Módulo 41, 42): 0 pilotes. Acumulado: 729 pilotes. Están pendientes por hincar 16 pilotes para culminar con esta actividad (2 modulo 41 y 14 del modulo 42). Durante la semana llegaron los pilotes faltantes por hincar y los pilotes correspondientes para la construcción de las columnas del loop de aves.

Pilotes Agua (pasarelas 6m): Finalizado. Acumulado 639 pilotes.

El Contratista esta semana continuó con la instalación de las viguetas (Estación III, modulo 23 y 24), instalación de piso deck en módulo 15, instalación de barandas módulo 18, 19 y 20, instalación de vigas de cubierta en modulo 2 y instalación de riostras en los módulos 11 y 12 y 13 por lo que hay seis (6) frentes trabajando en la construcción de la plataforma.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra, a la fecha no se ha dado inicio a las siguientes actividades: Riostras en pasarela de 3m, en la construcción de las edificaciones en madera solo se ha iniciado la instalación de las columnas en cruz pero hay 9 actividades sin iniciar, por lo que el Contratista viene mostrando retrasos en estas actividades, los cuales son totalmente imputables a éste. En el comité de obra del 20 de octubre 2022, el Contratista informa la próxima semana estará llegando a Barranquilla los primeros muros de las edificaciones para iniciar el ensamble con un tiempo estimado de 2 meses por edificación, por lo que se espera que la estación III pueda estar terminadas en el mes de diciembre 2022. Para el caso de las demás edificaciones el Contratista verificará la implementación de frentes independientes para finalizar antes de lo programado las edificaciones. Igualmente se presenta un retraso bastante considerable en la construcción del carril de desaceleración, ciclorruta, ampliación de box coulvert y accesos, pero estas actividades están sujetos al permiso de intervención de la vía con la ANI que aun está en proceso de suscripción del convenio, que se espera se pueda firmar a finales de este mes.

El Contratista se encuentra implementado en su totalidad el PMA. La Interventoría remitió las observaciones del presupuesto de la red contraincendios y del sistema de Voz y Datos.

La Entidad Contratante mediante oficio DIP-01031 de fecha 6 de Octubre de 2022, solicita realizar algunos ajustes a la propuesta realizada por el Contratista para el traslado del cuarto eléctrico y el tanque de agua potable. Igualmente define las cotas de implantación del parqueadero con la estructura del pavimento a construir y solicita realizar los modificaciones correspondientes a las redes eléctricas e hidrosanitarias.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A	NOMBRE: Ing. Fabian Suarez	NOMBRE: Ing. Pedro Gutierrez B.	Elaborado:
CARGO: Ing. Residente de Interventoria	CARGO: Gerente de Proyectos	CARGO: Director de Interventoria	31-oct-22

ANEXO No. 2

OFICIOS RECIBIDOS

uf1 mallorquín	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [X] ENVIADA [ ]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	EDU-566-2021
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
SUPERVISOR:	DIEGO RADA ALTAHONA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
5/10/2022	CR-504-1186-CONSORCIO JCO MALLORQUIN-2022-10-05	PREOSUPUESTO DEL SISTEMA RED CONTRAINCENDIO	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
10/10/2022	CR-504-1476-CONSORCIO JCO MALLORQUIN-2022-10-10	REMISION PLANOS	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
11/10/2022	CR-504-1478-CONSORCIO JCO MALLORQUIN-2022-10-10	ACTA DE OBRA NO. 09	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
18/10/2022	CR-504-1518-JCO MALLORQUIN-2022-10-18	RESPUESTP VOZ Y DATO MALLORQUIN	JCO MALLORQUIN	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
18/10/2022	CR-504-1519-CONSORCIO JCO MALLORQUIN-2022-10-18	RESPUESTO AMBIENTAL AJUSTADO	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
27/10/2022	CR-504-1578-CONSORCIO JCO MALLORQUIN-2022-10-26	DOCUMENTACION ACTUALIZADA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Firma:

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA

GERENTE DE INTERVENTORÍA Y/O DIRECTOR

C 1 0 0 3

Recepcion

000 43

De: Consorcio UF1 Mallorquin Interventoria <consorcio.uf1mallorquin@gmail.com>
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 11:53 a. m.
Para: recepcion@inproyectos.com
Asunto: Fwd: Presupuesto RCI con anexos
Datos adjuntos: PRESUPUESTO RCI.rar

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

---------- Forwarded message ---------
De: **JCO MALLORQUIN** <consorciojcomallorquin@gmail.com>
Date: jue, 18 ago 2022 a las 11:41
Subject: Presupuesto RCI con anexos
To: Consorcio UF1 Mallorquin Interventoria <consorcio.uf1mallorquin@gmail.com>, <cynthia.villegas@inproyectos.com>, Fabián Suárez Herrera <fabian.suarez@inproyectos.com>
Cc: Jhorvis De Luque <jdeluque@grupojacur.com>, Javier Velez <jvelez@grupojacur.com>

Buenos días.

señores.
CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Por medio de la presente adjuntamos presupuesto del Sistema de Red Contra Incendios para su revisión y aprobación.

--
Gracias por la atención.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Cordialmente,

Consorcio UF1 MALLORQUÍN

uf1 mallorquin

000 44

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, 08 de octubre de 2022

JCO-090-2022

ING | INGENIERÍA DE PROYECTOS

Asunto: JCO-090-2022 REMISION PLANOS Fecha: 10/10/2022 11:12:37

No Radicado: R-0001476-2022 Folios: 1

Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabián Jovanny Suárez Herrera, Pedro Antonio Gutiérrez Vishal

Señores

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Atn. Fabian Suarez Herrera

Calle 77B Nº 57-103 Of 907 Ed. Green Towers

Barranquilla, Atlántico

REF: CONTRATO DE OBRA Nº EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. – REVISION DE PLANOS Y DISEÑOS.

Estimados señores:

Por medio de la presente se hace remisión del plano donde se presentan las cotas tomadas en campo de la zona del parqueadero para los fines pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

ADALBERTO VIVERO CORONEL

Gerente de Proyectos

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, 08 de octubre de 2022
JCO-089-2022

ING | INGENIERÍA DE PROYECTOS

Asunto: JCO-089-2022 ACTA DE OBRA NO. 09 Fecha: 10/10/2022 11:36:02
No Radicado: R-0001478-2022 Folios: 2
Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabián Jovanny Suárez Herrera, Pedro Antonio Gutierrez Vichal

Señores
CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Atn. Fabian Suarez Herrera
Calle 77B Nº 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
Barranquilla, Atlántico

REF: CONTRATO DE OBRA Nº EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. – REVISIÓN DE PLANOS Y DISEÑOS.

Estimados señores:

Por medio de la presente se hace remisión del Acta parcial de obra N° 9 del contrato en referencia con el siguiente contenido:

Documentos entregados en medio físico:

- Acta parcial de obra N° 9 debidamente firmada por contratista.
- Flujo de inversión del proyecto.
- Pre acta N° 9.
- Memoria de cantidades.

Documentos entregados en medio magnético:

- Documentos contractuales y otros.
- Informe de obra septiembre de 2022.
- Informe social septiembre de 2022.
- Informe ambiental septiembre de 2022.
- Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo septiembre de 2022.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

- Certificado de calibración de equipos de topografía.
- Certificado de aportes a la seguridad social.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Gerente de Proyectos

Recepcion

000 46

De: Consorcio UF1 Mallorquin Interventoria <consorcio.uf1mallorquin@gmail.com>
Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 7:37 a. m.
[redacted]ra: recepcion@inproyectos.com
[redacted]nto: Fwd: Presupuesto voz y dato Mallorquin
Datos adjuntos: Diagrama de Gabinetes Proyecto Ciénaga Mallorquin (Telecomunicaciones, IoT, Sonido).pdf; Planos 1 Telcomunicaciones - IoT - Sonido_ECOPARQUE-UF1 DF-3.0 CE .01 (Proyecto Ciénaga Mallorquín) .pdf; Planos 1 Telecomunicaciones - IoT - Sonido_ECOPARQUE-UF1 DF (1).dwg



---------- Forwarded message ---------
De: **JCO MALLORQUIN** <consorciojcomallorquin@gmail.com>
Date: sáb, 15 oct 2022 a las 9:51
Subject: Re: Presupuesto voz y dato Mallorquin
To: Cynthia Villegas <cynthia.villegas@inproyectos.com>, Consorcio UF1 Mallorquin Interventoria <consorcio.uf1mallorquin@gmail.com>, Fabián Suárez Herrera <fabian.suarez@inproyectos.com>
Cc: Jhorvis De Luque <jdeluque@grupojacur.com>, Javier Velez <jvelez@grupojacur.com>

Buenos dias.

Adjunto respuesta a las observaciones presentadas.

El lun, 10 oct 2022 a las 8:05, Cynthia Villegas (<cynthia.villegas@inproyectos.com>) escribió:
Buenos dias.

Adjunto observaciones del especialista sobre los planos de Voz y Datos

Atentamente,


Cynthia Villegas Andrade
Ingeniera de Proyectos
INGENIERIA DE PROYECTOS
www.inproyectos.com
Calle 77B No. 57 - 103 Oficina 907
Edificio Green Towers
Telefax: +57 (5) 368 6110 - 368 6111
Barranquilla, Colombia
"35 años de Ingeniería con Calidad"

---------- Forwarded message ---------
De: **Hernando Gomez** <hgomezcasas@gmail.com>
Date: lun, 10 oct 2022 a la(s) 00:28
Subject: Re: Presupuesto voz y dato Mallorquin

To: Cynthia Villegas <cynthia.villegas@inproyectos.com>
Cc: Fabián Suárez Herrera <fabian.suarez@inproyectos.com>

Ing. Fabian Suarez
Ing. Cynthia Villegas

En los Planos de Redes LAN debe tenerse en cuenta la siguiente información:
1.- Localizacion de los RACK en cada Centro de Datos, indicando dimensión del RACK , equipos pasivos y equipos activos.
2.- El cable de fibra óptica debe indicarse en planos que especificación tiene y las derivaciones de la Fibra Óptica no se pueden hacer en una caja de paso

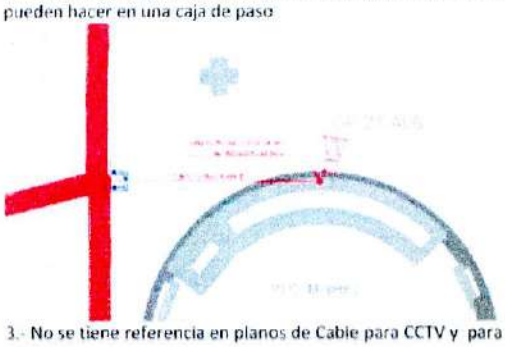

3.- No se tiene referencia en planos de Cable para CCTV y para sonido, no se tiene referencia en planos del cable a utilizar.
4.- Los planos no están referenciados a que proyecto corresponden y deben estar firmados por un ingeniero con matricula profesional responsable del Diseño de los planos
5.- Indicar las longitudes de cada tramo para determinar la atenuación de señal o se requieren equipos para amplificar en el caso de CCTV y Sonido.
6.- Indicar en planos la especificación de los postes

Falta información en los planos de Telecomunicaciones, Sin Diseño de acuerdo con la Normatividad no es posible revisar el Presupuesto, porque no tiene soporte técnico para determinar cantidades y especificaciones del material.

Cordialmente
Ing. Hernando Gomez
Especialista en Interventoria.

El jue, 6 oct 2022 a las 14:24, Cynthia Villegas (<cynthia.villegas@inproyectos.com>) escribió:
Hola Ingeniero Hernando
Le adjunto los planos actualizados de Voz y Datos para sus comentarios

Atentamente,

Cynthia Villegas Andrade
Ingeniero de Proyectos

INGENIERIA DE PROYECTOS
Calle 77B No. 57 - 103 Oficina 907
Edificio Green Towers
Telefax: +57 (5) 3686110 - 368 6111
Barranquilla, Colombia
"35 años de Ingeniería con Calidad"

--------- Forwarded message ---------
De: **JCO MALLORQUIN** <consorciojcomallorquin@gmail.com>
Date: jue, 6 oct 2022 a la(s) 11:12
Subject: Re: Presupuesto voz y dato Mallorquin
To: Cynthia Villegas <cynthia.villegas@inproyectos.com>
Cc: Jhorvis De Luque <jdeluque@grupojacur.com>, Javier Velez <jvelez@grupojacur.com>

Buenos dias.

Adjunto los planos actualizados con la información solicitada.

El lun, 19 sept 2022 a las 12:13, JCO MALLORQUIN (<consorciojcomallorquin@gmail.com>) escribió:
Buenos dias Cynthia.

te adjunto planos completos entregados por EDUBAR, así como también las memorias de cálculo y memorias de cantidades. Además, adjunto cotizaciones que quedaron pendientes por enviar.

Convergentic - Oferta de Servicios y Equipos pa...

Propuesta Técnica y Económica Ecoparque Cién...

El lun, 19 sept 2022 a las 7:35, Cynthia Villegas (<cynthia.villegas@inproyectos.com>) escribió:
Hola Mellisa buenos días:

Me puedes ayudar con esta información, yo mande las que encontre en la carpeta de Edubar pero el diseñador me dice que esta incompleta a ver que tienes tu para completarle.

Atentamente,

Cynthia Villegas Andrade
Ingeniera de Proyectos
INGENIERIA DE PROYECTOS
Calle 77B No. 57 - 103 Oficina 907
Edificio Green Towers
Telefax: +57 (5) 3686110 - 368 6111
Barranquilla, Colombia
"35 años de Ingeniería con Calidad"

--------- Forwarded message ---------
De: **Hernando Gomez** <hgomezcasas@gmail.com>

Date: dom, 18 sept 2022 a la(s) 11:55
Subject: Re: Presupuesto voz y dato Mallorquin
To: Cynthia Villegas <cynthia.villegas@inproyectos.com>

Ing. Cynthia Villegas
Proyecto Mallorquin

Faltan planos en donde se indique el Cableado de Comunicaciones tales como CCTV, Audio, Datos, Acometida, puntos de Wifi
Presentan Proyecto Sin Cables solamente presenta tuberias.

Presentar la Arquitectura de comunicaciones indicando Enlaces y la localización de Racks y Equipos Activos PROPUESTOS.

Cordialmente
Ing. Hernando Gomez
Especialista Electrico de Interventoria.

El sáb, 10 sept 2022 a las 12:09, Cynthia Villegas (<cynthia.villegas@inproyectos.com>) escribió:
Aqui esta el correo inge del 5 de septiembre, me confirma por favor que le llego

Atentamente,

Cynthia Villegas Andrade
Ingeniera de Proyectos
INGENIERIA DE PROYECTOS
www.inproyectos.com
Calle 77B No. 57 - 103 Oficina 907
Edificio Green Towers
Telefax: *+57 (5)* 3686110 - 368 6111
Barranquilla, Colombia
"35 años de Ingenieria con Calidad"

---------- Forwarded message ---------
De: **Cynthia Villegas** <cynthia.villegas@inproyectos.com>
Date: lun, 5 sept 2022 a la(s) 15:09
Subject: Fwd: Presupuesto voz y dato Mallorquin
To: Hernando Gomez <hgomezcasas@gmail.com>

Hola Ingeniero buenas tardes:

Adjunto el presupuesto presentado por el contratista para el componente de voz y datos. Estan pendientes las cotizaciones.

Atentamente,

Cynthia Villegas Andrade
Ingeniera de Proyectos
ING INGENIERIA DE PROYECTOS
www.inproyectos.com
Calle 77B No. 57 - 103 Oficina 907
Edificio Green Towers
Telefax: +57 (5) 3685110 - 3685111
Barranquilla, Colombia
"35 años de Ingeniería con Calidad"

---------- Forwarded message ---------
De: **JCO MALLORQUIN** <consorciojcomallorquin@gmail.com>
Date: jue, 1 sept 2022 a la(s) 16:46
Subject: Presupuesto voz y dato Mallorquin
To: Consorcio UF1 Mallorquin Interventoria <consorcio.uf1mallorquin@gmail.com>, Cynthia Villegas <cynthia.villegas@inproyectos.com>, Fabián Suárez Herrera <fabian.suarez@inproyectos.com>
Cc: Jhorvis De Luque <jdeluque@grupojacur.com>, Javier Velez <jvelez@grupojacur.com>

Buenos días.

señores.
CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Por medio de la presente adjuntamos presupuesto de *"VOZ Y DATOS"* para su revisión y aprobación.

Las cotizaciones serán enviadas en el transcurso de la semana.

--
Gracias por la atención.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Gracias por la atención.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

--
Gracias por la atención.

Atentamente,

Gracias por la atención.

Atentamente,

CONSORCIO ICO MALLORQUIN

Cordialmente,

Consorcio UF1 MALLORQUÍN

uf1 mallorquin

000 49

Recepcion

De: Consorcio UF1 Mallorquin Interventoria <consorcio.uf1mallorquin@gmail.com>
Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 11:10 a. m.
Para: recepcion@inproyectos.com
Asunto: Fwd: PRESUPUESTO AMBIENTAL AJUSTADO
Datos adjuntos: Presupuesto ambiental oct 17 de 2022.xlsx; Cotiza PA 028-2022 Cga de Mallorquin Corr AGUA (1).pdf

ING | INGENIERÍA DE PROYECTOS
Asunto: PRESUPUESTO AMBIENTAL AJUSTADO Fecha: 18/10/2022 14:06:31
No Radicado: R-0001619-2022 Folios:
Destinatario: Cynthia Lorena Villegas Andrade, Daniela Rodriguez, Fabián Jovanny Suárez Herrera, Liliana Gallardo, Pedro Antonio Gutierrez Vishal

---------- Forwarded message ---------
De: **JCO MALLORQUIN** <consorciojcomallorguin@gmail.com>
Date: mar, 18 oct 2022 a las 10:34
Subject: PRESUPUESTO AMBIENTAL AJUSTADO
To: Consorcio UF1 Mallorquin Interventoria <consorcio.uf1mallorquin@gmail.com>, Liliana Gallardo <liliana.gallardo@inproyectos.com>, Cynthia Villegas <cynthia.villegas@inproyectos.com>
Cc: Jhorvis De Luque <jdeluque@grupojacur.com>, carlos leonardo dussan garcia <dcarlosd5@hotmail.com>, Javier Velez <jvelez@grupojacur.com>

Buenos días.

señores.
CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Se adjunta presupuesto ambiental de proyecto, con el ajuste en el precio de la Caracterización Fisicoquímica, para su revisión y aprobación.

--
Gracias por la atención.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

--
Cordialmente,

Consorcio UF1 MALLORQUÍN

uf1 mallorquín

PROTECCION AMBIENTAL E.U.

CONSULTORIA SANITARIA Y AMBIENTAL

NIT. 806.016.171 - 1

CIUDAD: BARRANQUILLA
EMPRESA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN
FECHA: SEPTIEMBRE 22 DE 2022
OBJETIVO: TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICOS CIENAGA MALLORQUIN

COTIZACION No. PA 028-2022

VARIABLES		METODO	No. CAMPANAS	ESTACIONES	Vr. UNIT.	SUBTOTAL
FISICOQUIMICOS	Temperatura	Electrométrico	1	5	$ 5.000	$ 25.000
	pH	Electrométrico	1	5	$ 7.500	$ 37.500
	Conductividad	Electrométrico	1	5	$ 7.500	$ 37.500
	Salinidad	Electrométrico	1	5	$ 7.500	$ 37.500
	Oxigeno Disuelto	Electrométrico	1	5	$ 7.500	$ 37.500
	SST	Gravimétria	1	5	$ 22.600	$ 113.000
	DBO_5	Incubación 5 dias	1	5	$ 52.000	$ 260.000
	Nitrogeno Amoniacal	Colorimetria	1	5	$ 39.000	$ 195.000
	Nitritos	Colorimetria	1	5	$ 22.500	$ 112.500
	Nitratos	Reducción por Cd/Colorimetria	1	5	$ 40.800	$ 204.000
	NKT	Colorimetria	1	5	$ 55.000	$ 275.000
	Nitrogeno Total	Cálculo	1	5	$ 0	$ 0
	Ortofosfatos	Colorimetria	1	5	$ 31.500	$ 157.500
	Fosoro Total	Colorimetria	1	5	$ 33.000	$ 165.000
	Coliformes Fecales		1	5	$ 62.000	$ 310.000
	Coliformes Totales		1	5	$ 56.500	$ 282.500
	Análisis de Resultados (Opcional)		1	-	$ 600.000	$ 600.000
	SUBTOTAL FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS					$ 2.849.500
HIDROBIOLOGICOS	Fitoplancton		1	5	$ 232.000	$ 1.160.000
	Zooplancton		1	5	$ 232.000	$ 1.160.000
	Macroinvertebrados Bentónicos		1	5	$ 232.000	$ 1.160.000
	Análisis de Resultados (Opcional)		1	-	$ 1.800.000	$ 1.800.000
	SUBTOTAL HIDROBIOLOGICOS					$ 5.280.000
TOTAL LABORATORIO						$ 8.129.500
TOMA DE MUESTRA (1 DIA)			1	-	$ 900.000	$ 900.000
TRANSPPORTE EN LANCHA			1	-	$ 300.000	$ 300.000
TRANSPPORTE TERRESTRE			1	-	$ 400.000	$ 400.000
Vr. BASICO						$ 9.729.500
IVA (19%)						$ 1.848.605
TOTAL						$ 11.578.105

NOTA: La toma de muestra y analisis de muestras serán realizados por laboratorio acreditado ante el IDEAM
Forma de Pago: Anticipo 50% y 50% una vez entregado el informe de resultados

GAMALIEL MEJIA M.
Representante Legal

ES DEBER DE TODOS PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Bosque - Urb. Buena Vista MB - L49 TELFAX: 6743865 CEL. 3107327155 - 3015112589
Pag Web: proteccionambientaleu.org - E-mail: gammemon@yahoo.es - Cartagena de Indias D.T. y C.

Recepcion

De: Consorcio UF1 Mallorquín Interventoría <consorcio.uf1mallorquin@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 26 de octubre de 2022 4:41 p. m.
[illegible]a: recepcion@inproyectos.com
[illegible]nto: Fwd: Remisión documentación actualizada de componente de "Voz y Datos" del proyecto
Datos adjuntos: CCR1036-12G-4S_210529.pdf; DS_6100Series.pdf; Diagrama de Gabinetes Mallorquin.pdf; 1_ECOPARQUE-UF1 DF-3 0 CE_01.pdf; DS_6200Series.pdf; FIBRA_OPTICA_EXTERIOR_ARMADA_LEGRAND.pdf; HPE ProLiant DL20 Gen10 Server-a00053820enw.pdf; FortiGate_300E.pdf; 1_ECOPARQUE-UF1 DF (1).dwg

ING | INGENIERÍA DE PROYECTOS
Asunto: DOCUMENTACION ACTUALIZADA Fecha: 26/10/2022 17:33:55
No Radicado: R-0001578-2022 Folios: 2
Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabian Jovanny Suárez Herrera, Pedro Antonio [illegible]

---------- Forwarded message ---------
De: **ICO MALLORQUIN** <consorcioicomallorquin@gmail.com>
Date: mié, 26 oct 2022 a las 16:01
Subject: Remisión documentación actualizada de componente de "Voz y Datos" del proyecto
To: Cynthia Villegas <cynthia.villegas@inproyectos.com>, Consorcio UF1 Mallorquín Interventoría <consorcio.uf1mallorquin@gmail.com>, Fabián Suárez Herrera <fabian.suarez@inproyectos.com>
Cc: Jhorvis De Luque <jdeluque@grupojacur.com>, Javier Velez <jvelez@grupojacur.com>

Buenas tardes.

Se hace remisión de la siguiente documentación según las últimas observaciones recibidas al componente de Voz y Datos:

1. Planos en AutoCad y PDF donde se muestran las rutas del cableado, su especificación y demás componentes con sus respectivas convenciones
2. Diagramas de los Racks
3. Fichas técnicas de los equipos y FO

Gracias por la atención.

[illegible]ntamente,

CONSORCIO ICO MALLORQUIN

Cordialmente,

Consorcio UF1 MALLORQUÍN

uf1 mallorquín

ANEXO No. 3

OFICIOS ENVIADOS

uf1 mallorquin	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [ ] ENVIADA [X]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	EDU-566-2021
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
SUPERVISOR:	DIEGO RADA ALTAHONA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
4/10/2022	CINP-504-144-4010	INFORME SEMANAL NO. 56	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR SA
5/10/2022	CINP-504-145-4035	RECIBO DE SU CORREO RADICADO NO. R-0001186-2022 DE 18 DE AGOSTO DE 2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
5/10/2022	CINP-504-146-4039	ACTA DE INTERVENTORIA NO. 08	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR SA
10/10/2022	CINP-504-147-4133	REMITIR ACTA DE OBRA NO. 09 Y SOPORTES	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
13/10/2022	CINP-504-148-4158	INFORME SEMANAL NO. 57	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR SA
13/10/2022	CINP-504-149-4180	INFORME MENSUAL NO. 13	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR SA
18/10/2022	CINP-504-150-4285	INFORME SEMANAL NO. 58	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EBUBAR SA
20/10/2022	CINP-504-151-4296	INSTALACION DE VIGAS LAMINADAS	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
25/10/2022	CINP-504-152-4347	INFORME SEMANAL NO. 59	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR SA
26/10/2022	CINP-504-153-4351	ENTREGA DEL AJUSTE DEL PRESUPUESTO AMBIENTAL	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Firma:

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA

GERENTE DE INTERVENTORÍA Y/O DIRECTOR

0003

uf1 mallorquín
CONSORCIO

000 53

Barranquilla, 4 de octubre de 2022

CINP – 504 – 144–4010

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 56 correspondiente al periodo 26 de septiembre al 2 de octubre de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 – 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

000 54

Barranquilla, 5 de octubre de 2022
CINP–504–145–4035

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

Acusamos recibo de su correo electrónico con radicado No. R-0001186-2022 del 18 de agosto de 2022 cuyo asunto es *"Presupuesto RCI con anexos"*.

Una vez revisada la documentación por parte de la Interventoría se remite el informe del especialista con las observaciones encontradas.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

CC. Ing Diego Rada – Supervisor Edubar

Elaboró: DRA-CVA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 5 de octubre de 2022

CINP – 504 – 146–4039

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el Acta de Interventoría No. 8 y sus anexos del Contrato de la Referencia.

1. Formato informe de gestión No 8
2. Acta de recibo parcial No 8
3. Acta de recibo parcial a satisfacción
4. Factura electrónica No. 8
5. Copia de Resolución de la DIAN
6. RUT
7. Certificación Bancaria
8. Copia del Contrato y Prorroga No 1
9. Pago de planilla de seguridad social
10. Certificación de aportes
11. Copia CC Representante legal
12. Certificado junta central de contadores, tarjeta profesional y CC contador.
13. Acta de obra/acta de recibo parcial
14. Copia de estampilla pagadas

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

000 56

Barranquilla, 10 de octubre de 2022
CINP–504–147–4133

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

Acusamos recibido de su comunicado JCO-089-2022 de fecha 8 de octubre de 2022 en el cual se remiten el Acta de obra No. 9 y sus soportes:

- Acta parcial de obra No. 9
- Preacta No. 9
- Memorias de obra acta No. 9
- Informe de obra septiembre 2022
- Programa de inversiones

En respuesta a los documentos enviados, se hace devolución debidamente firmada el acta y se notifica que la Interventoría una vez revisado los adjuntos emite la No objeción de los mismos.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Director de Interventoría

Adjunto: Lo mencionado

CC. Ing Diego Rada – Supervisor Edubar

Elaboró: DRA-CVA
Aprobó: PGB

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

000 57

Barranquilla, 11 de octubre de 2022

CINP – 504 – 148–4158

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 57 correspondiente al periodo 2 al 9 de octubre de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

uf1 mallorquín
CONSORCIO

000 53

Barranquilla, 12 de octubre de 2022

CINP – 504 – 149–4180

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe mensual en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe mensual No. 13 correspondiente al periodo 1 al 30 de septiembre de 2022

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

000 59

Barranquilla, 18 de octubre de 2022

CINP – 504 – 150–4285

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 58 correspondiente al periodo 10 al 16 de octubre de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 19 de octubre de 2021
CINP – 504 – 151 – 4296

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

De acuerdo a nuestro compromiso de supervisión, control y seguimiento al Contrato de la Referencia, en cuanto a las actividades de trabajos en alturas que se estén desarrollando en la instalación de vigas laminadas para la cubierta del módulo #2, se evidenciaron trabajadores que no cuentan con los certificados para realizar trabajos en alturas, la cual es una actividad de alto riesgo; las siguientes personas son las que cuentan con los certificados vigentes para realizar estas labores:

- Francisco Julián Pamplona Leal
- Juan Carlos Bermúdez Ramírez
- Nevardo Mendivelso
- Pedro Pamplona Suarez
- José Gregorio Atencio Sierra
- Luis Alberto Núñez Hernández
- Nerio Arturo González

Si el Contratista requiere otras personas en la realización de las actividades de trabajo en alturas se deben capacitar y presentar los debidos soportes que avalen dicha formación, por otro lado se debe contar con los registros de inspección de EPP específicos para trabajo en alturas, realizar el análisis de trabajo seguro (ATS) y el permiso de trabajo en alturas (PDT), un coordinador en al turas y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Elaboró: CBN
Aprobó: FSH

uf1 mallorquín
CONSORCIO

000 61

Barranquilla, 24 de octubre de 2022

CINP – 504 – 152–4347

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 59 correspondiente al periodo 17 al 23 de octubre de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

000 62

Barranquilla, 25 de octubre de 2022
CINP–504–153–4351

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

Acusamos recibo de su correo electrónico del 18 de octubre de 2022, con el cual hacen entrega del ajuste del Presupuesto Ambiental para el Contrato de la Referencia, en su ítem de Caracterización Fisicoquímica.

Revisada esta información, la Interventoría encuentra que se ajusta a los requerimientos del contrato, por lo que se permite emitir la No Objeción de la misma.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de Proyectos

Elaboró: LGP
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

ANEXO 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	sábado, 1 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Modulo # 42
COMENTARIOS:	Hincada de pilotes		

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	lunes, 3 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Modulo 18
COMENTARIOS:	Instalacion de viguetas		

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	martes, 4 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Modulo # 2
COMENTARIOS:	Capacitacion Orden y aseo "Cuidado del mangle"		

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 5 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Drone
COMENTARIOS:	Foto Aerea		

FOTO No. 5



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	jueves, 6 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	frente # 3
COMENTARIOS:	Verificacion cotas de cortes		

FOTO No. 6



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 7 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Modulo # 19
COMENTARIOS:	Instalacion de viguetas		

	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 7



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	sábado, 8 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Frente # 2
COMENTARIOS:	Instalacion de tornillos laminas		

FOTO No. 8



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	lunes, 10 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Frente # 3
COMENTARIOS:	Hincado de pilotes		

FOTO No. 9



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	martes, 11 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Frente # 3
COMENTARIOS:	Hincado de pilotes modulo 42		

FOTO No. 10



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 12 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Estacion # 3
COMENTARIOS:	Instalacion de tacos entre vigas laminadas		

FOTO No. 11



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	jueves, 13 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Modulo 21
COMENTARIOS:	Instalacion de viguetas		

FOTO No. 12



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 14 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Modulo 15
COMENTARIOS:	Instalacion de barandas		

	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 13



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	sábado, 15 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 23
COMENTARIOS:	Instalacion de viguetas		

FOTO No. 14



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	martes, 18 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 2
COMENTARIOS:	Montaje de vigas		

FOTO No. 15



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	martes, 18 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 12 y 13
COMENTARIOS:	Instalacion de tacos		

FOTO No. 16



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 19 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Estacion 3
COMENTARIOS:	Instalacion de frisos		

FOTO No. 17



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 19 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Estacion 3
COMENTARIOS:	Foto aerea		

FOTO No. 18



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	jueves, 20 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	modulo 11
COMENTARIOS:	Instalacion de tacos		

uf1 mallorquín	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 19



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 21 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 10
COMENTARIOS:	Instalacion de deck		

FOTO No. 20



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	sábado, 22 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 13
COMENTARIOS:	Corte de pilotes		

FOTO No. 21



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	lunes, 24 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 11
COMENTARIOS:	Instalacion de riostras		

FOTO No. 22



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	martes, 25 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Campamento
COMENTARIOS:	Charla area social		

FOTO No. 23



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 26 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 15
COMENTARIOS:	Instalacion de pies de amigos para parales de barandas		

FOTO No. 24



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	jueves, 27 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 12
COMENTARIOS:	Instalacion de viga 13x50		

	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 25



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 28 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 1
COMENTARIOS:	Instalacion de barandas		

FOTO No. 26



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	sábado, 29 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 1
COMENTARIOS:	Instalacion de vigas rotondas		

FOTO No. 27



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	sábado, 29 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 24
COMENTARIOS:	Instalacion de frisos		

FOTO No. 28



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	sábado, 29 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 16
COMENTARIOS:	Instalacion de pies de amigos		

FOTO No. 29



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	sábado, 29 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 12
COMENTARIOS:	Instalacion de riostras		

FOTO No. 30



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	sábado, 29 de octubre de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulos 11
COMENTARIOS:	Instalacion de riostras		

ANEXO 5

GESTIÓN AMBIENTAL

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)


FECHA O PERIODO:	OCTUBRE DE 2022
PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
ESPECIALIDAD:	AMBIENTAL
PROFESIONAL/ ESPECIALISTA:	LILIANA GALLARDO P.
ASUNTO:	INFORME No. 14

DESARROLLO DEL TEMA


El presente informe reporta el seguimiento a la Gestión Ambiental realizado por la Interventoría, desarrollada durante el período comprendido entre 01 al 31 de octubre de 2022, en ejecución del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 adjudicado al Consorcio JCO Mallorquín.

Al tenor de lo anterior expuesto es claro que, para la realización de los informes, la Interventoría se basó en los anexos entregados por el Contratista de Obra, y a los formatos del PEGSA que desde la Entidad se exige. De igual manera estos anexos soportan la Gestión Ambiental realizada por el Contratista de Obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental.

LISTA DE VERIFICACION DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

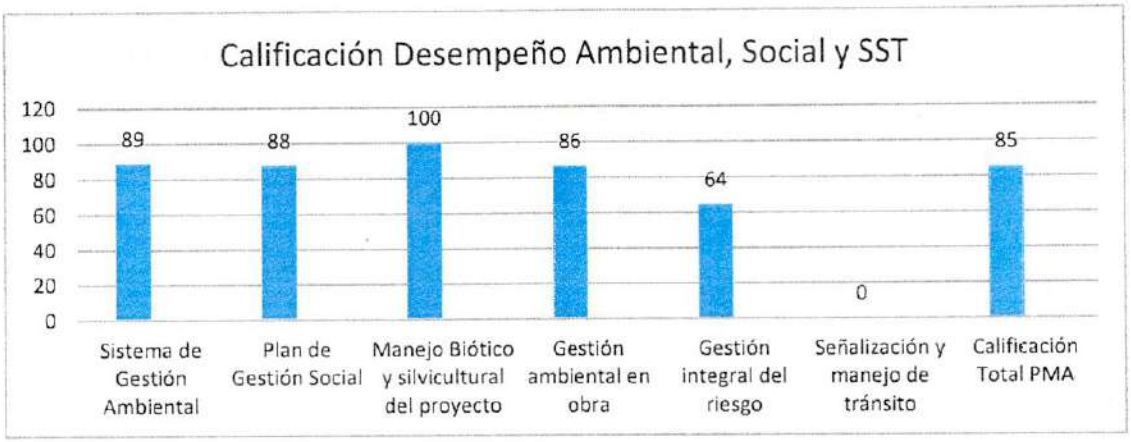

Durante el periodo tratado el Contratista de Obra tuvo un promedio de calificación de la implementación del PMA del 85%. El promedio de las áreas temáticas estuvo por encima del 60%. Cabe mencionar que el área temática de señalización y manejo de tránsito no aplica para este periodo, ya que no se han iniciado las actividades en la vía debido a que la ANI no ha otorgado el permiso para la intervención de esta.

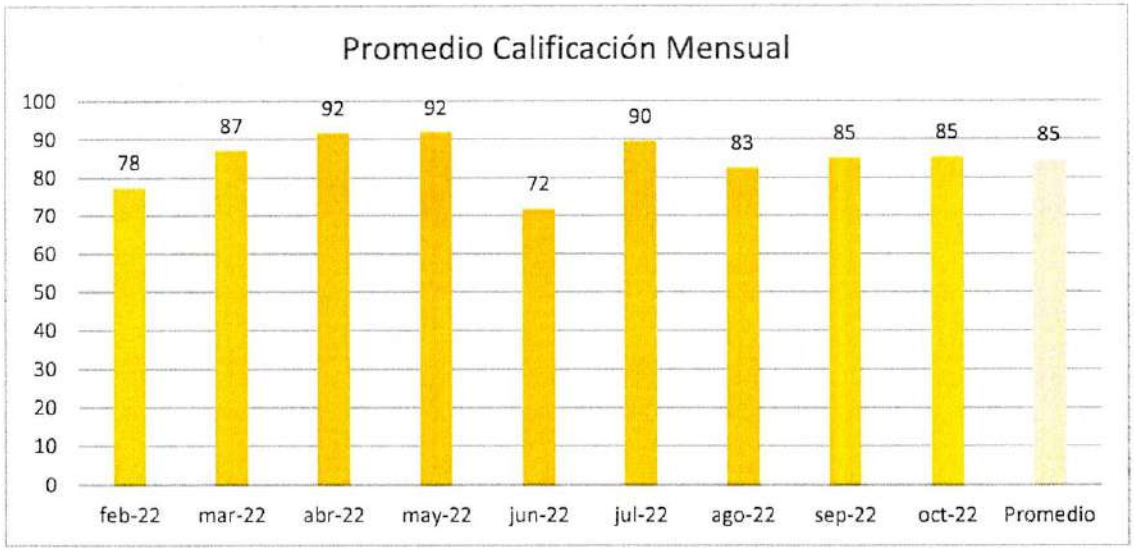

El promedio acumulado desde el mes de febrero en las calificaciones es del 85%.

Ver Formato Lista de Verificación del Desempeño Ambiental

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental elaborado para la totalidad del proyecto. El Consorcio JCO Mallorquín, elaboró un Plan de Manejo Ambiental ajustando las fichas de dicho documento a las características del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar. Este fue revisado y aprobado por la Interventoría.

Los programas estipulados por el Contratista para el manejo ambiental de la obra se presentan a continuación:

FMA-1: Programa para el Manejo de Emisiones Atmosféricas, Material Particulado y Ruido
FMA-2: Programa para el Manejo Integral de Residuos Ordinarios, Peligrosos y Especiales
FMA-3. Programa para el Manejo de Materiales de Construcción
FMA-4: Programa para el Manejo de Vertimientos y Gestión del Recurso Hídrico
FMA-5: Programa para el Control de Sedimentos y Manejo del Suelo
FMA-6: Programa de Señalización
FMB-1: Programa para el Manejo de la Cobertura Vegetal
FMB-2: Programa para la Protección de la Flora
FMB-3: Programa para la Protección de la Fauna Acuática
FMB-4: Programa para la Protección de la Fauna Terrestre
FMB-5: Programa para la Protección y Conservación de Hábitats

EQUIPO AMBIENTAL DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Carlos Dussan	Especialista Ambiental	Consorcio JCO Mallorquín
Liliana Gallardo	Especialista Ambiental	Consorcio UF1 Mallorquín

PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES

Proveedores de Materiales

Tipo de Material	Proveedor	Acto Administrativo	Vigencia	Título Minero
Agregados pétreos	Valores y Contratos S.A.	Resolución No. 860 de 2015 Resolución No. 284 de 2019	Vida útil del proyecto	Contrato de Concesión No. 10429C1
Agregados Pétreos	SERVICS S.A.S.	Resolución No. 157 de 2016	Vida útil del proyecto	NI7-10301
Agregados Pétreos	Luis Ramos De La Hoz	Resolución No. 077 de 2016	Vida útil del proyecto	Contrato de Concesión No. L685 KH5-14071

Gestores Externos Prestadores de Servicios (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, RESPEL, RCD y otros)

Empresa	Actividad	Acto administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad Otorgante
RECITRAC S.A.S.	Manejo, recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento, recuperación de residuos peligrosos o desechos peligrosos	Resolución 0625 de 2009 Resolución 0880 de 2010 Resolución 1263 de 2018	Vida útil del proyecto	DAMAB
SAKATECK	Suministro de baños portátiles con recolección y transporte de residuos industriales y RAEE en los vehículos	Resolución No. 2996 de 2020	Enero de 2022	Barranquilla Verde

COMPONENTE GESTION AMBIENTAL DE OBRA

Capacitaciones

Durante el periodo realizaron las siguientes charlas al personal de la obra:

- ✓ Manejo de Residuos Líquidos
- ✓ Plan de Manejo Ambiental
- ✓ Manejo de Sustancias Químicas
- ✓ Emisiones Atmosféricas
- ✓ Plan de Arqueología
- ✓ Protección Fauna
- ✓ Protección Ecosistemas

Ver anexo No. 1

FMA-1: Programa para el Manejo de Emisiones Atmosféricas, Material Particulado y Ruido

Durante el periodo tratado no realizaron acopio de materiales de construcción que puedan generar material particulado. Solo cuentan con el acopio de los pilotes de madera, los cuales no se encuentran acopiados en zonas verdes. **Ver fotografías No. 3, 4, 5, y 6.**

FMA-2: Programa para el Manejo Integral de Residuos Ordinarios, Peligrosos y Especiales

El Contratista de Obra instaló el punto ecológico en el campamento. Este está conformado por tres tanques con el código de colores y debidamente rotulados. **Ver fotografía No. 1.**

FMA-3. Programa para el Manejo de Materiales de Construcción

Cuentan con proveedores legalmente autorizados para la compra de los materiales de construcción. A la fecha solo tienen acopiados los maderos de los pilotes.

Las áreas de almacenamiento cuentan con un acceso seguro y señalizado y por fuera de zonas verdes.

FMA-4: Programa para el Manejo de Vertimientos y Gestión del Recurso Hídrico

A la fecha para las actividades de obra no es necesario la utilización de agua, por lo que no se genera agua residual de este tipo.

El Contratista cuenta, para el manejo de las aguas residuales domésticas, con tres (3) baños portátiles. El proveedor de estos es la empresa SAKATECH, la cual está debidamente autorizada para esta actividad. **Ver fotografías No. 2 y 8 y anexo No. 2**

FMA-5: Programa para el Control de Sedimentos y Manejo del Suelo

Actualmente la actividad que se está realizando es la de hincado de pilotes, instalación de riostras, deck, vigas y barandas. Estas actividades no generan turbiedad en el cuerpo de agua.

FMA-6: Programa de Señalización

El Contratista de Obra instaló la valla informativa del proyecto, la cual está ubicada dentro del lote del proyecto.

FMB-1: Programa para el Manejo de la Cobertura Vegetal

A la fecha no se ha realizado descapote en el frente de obra.

El Consorcio realizó un inventario forestal y solicitó ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico el Permiso de Aprovechamiento Forestal. La Corporación, mediante el Auto 737 de diciembre 18 de 2021, por medio del cual admite la solicitud e inicia el trámite de autorización.

El Contratista de Obra, por cambio en los diseños de construcción, solicitó el desistimiento de la solicitud de aprovechamiento forestal ante la CRA. La Corporación admitió esta solicitud por medio del Auto 288 de 2022.

Mediante la Resolución No. 513 de 2022, la Corporación resuelve un recurso de reposición contra el Auto 288 de 2022, por medio del cual acepta el desistimiento presentado por el Consorcio y realiza una nota crédito a favor de estos para ser aplicada para la nueva solicitud que presente el Consorcio ante esta Autoridad.

FMB-2: Programa para la Protección de la Flora

Se comenzaron actividades de obra en áreas donde existe el ecosistema de manglar. A la fecha no se ha presentado afectación alguna a este. El Contratista de Obra realiza charlas al personal de la obra con respecto al cuidado del mismo.

Durante el periodo tratado en el informe, el Contratista de obra junto con la comunidad realizó una jornada de limpieza en los mangles.

FMB-3: Programa para la Protección de la Fauna Acuática

El Consorcio realiza charlas al personal que labora en el frente de obra en temas sobre el manejo y conservación del recurso hídrico e hidrobiológico. **Ver anexo No. 1**

FMB-4: Programa para la Protección de la Fauna Terrestre

Han realizado actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna afectada directamente por las actividades realizadas en el frente de obra. Esta actividad fue realizada por un Biólogo.

Para el manejo con los trabajadores en el frente, les ofrecen charlas y mantienen la prohibición de maltrato, tráfico y/o comercialización de especies animales. **Ver anexo No. 1**

FMB-5: Programa para la Protección y Conservación de Hábitats

El Consorcio realiza charlas al personal que labora en el frente de obra en temas para la protección y conservación de hábitats. **Ver anexo No. 1**

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

- Revisión de la documentación presentada por el Contratista de Obra.
- Elaboración de informes.
- Realizar seguimiento y control de las actividades en el frente de obra.
- Solicitar al Contratista las acciones correctivas pertinentes en la implementación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
- Asistencia a las reuniones convocadas por la entidad contratante y contratista de obra.

REUNIONES SOCIO-AMBIENTALES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo tratado en este informe no se realizó comité socio-ambiental.

FIRMA:



NOMBRE: **LILIANA GALLARDO P.**

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

REGISTRO FOTOGRAFICO




Fotografía 1. Punto Ecológico Campamento




Fotografía 2. Baños Portátiles Campamento



Fotografía 3. Acopio de Materiales Campamento

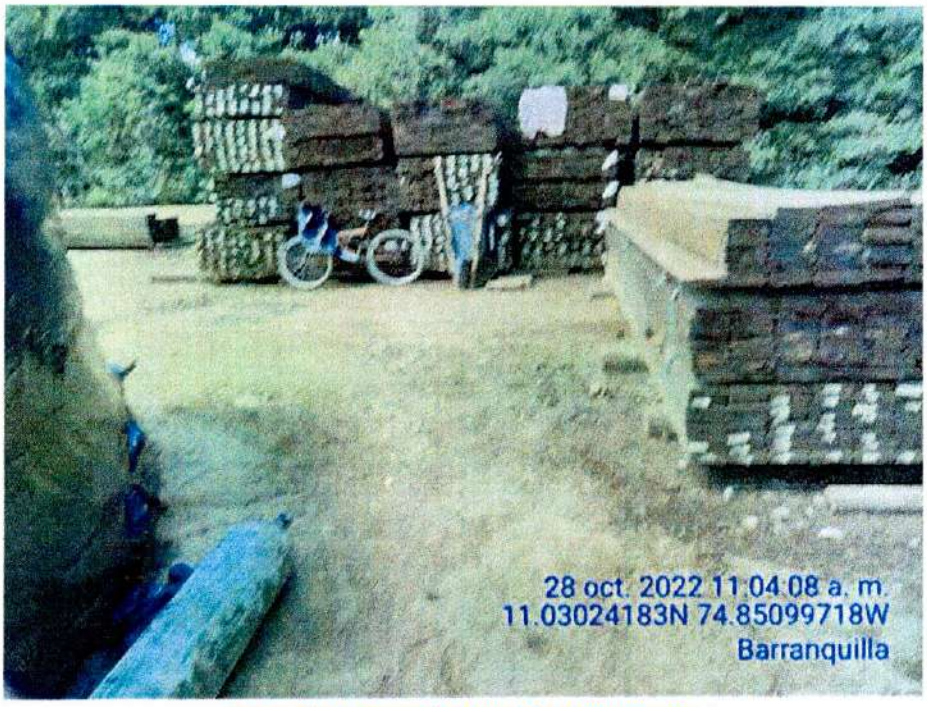

Fotografía 4. Acopio de Materiales Campamento

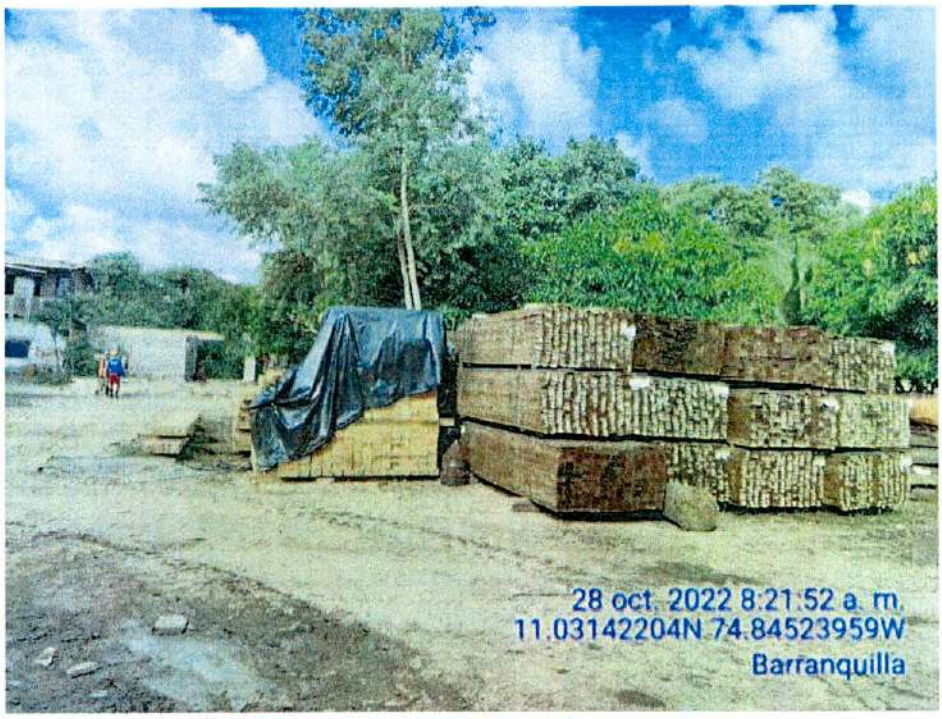

Fotografía 5. Acopio de Materiales Campamento



Fotografía 6. Acopio de Materiales Campamento



Fotografía 7. Acopio de Materiales Campamento



Fotografía 8. Baño Portátil Frente Tierra



Fotografía 9. Acopio de Materiales Frente Tierra

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

FORMATO LISTA DE VERIFICACION DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código	
EDUMAR	SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL Y SST DE LOS CONTRATOS	Versión	V1
		Fecha	29/12/2020

Contrato EDU-561-2021

Contratista CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato Interventoria EDU-566-2021


Presupuesto total de obra $ 82.464.264.620


Proyecto SELECCIÓN ABIERTA No SA-06-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Interventoria CONSORCIO UF 1 MALLORQUIN **Periodo** 1 10 2022 **al** 31 10 2022

Presupuesto total del PMA $ 662.124.857 **Participación PMA en obra** 0,80

	Área temática	Und	Valor de referencia	AÑO 2022											
				FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
SG-01	Sistema de Gestión Ambiental	%	25	78	89	94	94	94	94	89	89	89			
PGS-02	Plan de Gestión Social	%	15	63	77	83	85	83	79	81	88	88			
MBS-03	Manejo Biótico y silvicultural del proyecto	%	10	100	100	100	100	15	100	100	100	100			
GAO-04	Gestión ambiental en obra	%	25	64	76	84	84	79	84	84	86	86			
GIR-05	Gestión integral del riesgo	%	20	84	94	97	97	89	92	59	64	64			
PMT-06	Señalización y manejo de tránsito	%	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Calificación Total PMA	%	100	78	87	92	92	72	90	83	85	85	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Monto pagado por ejecución del PMA														
	Valor aportes pagados en seguridad social														

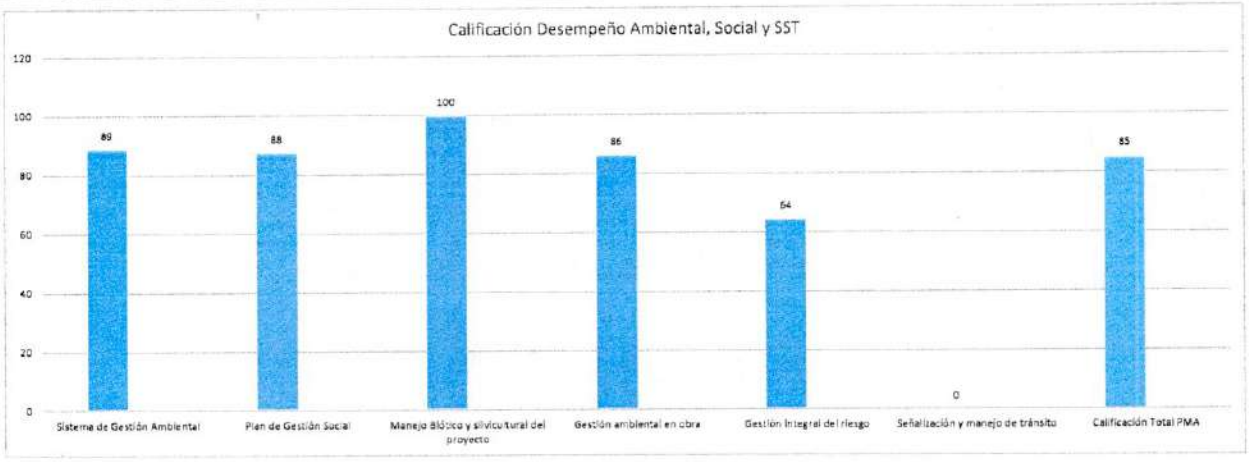

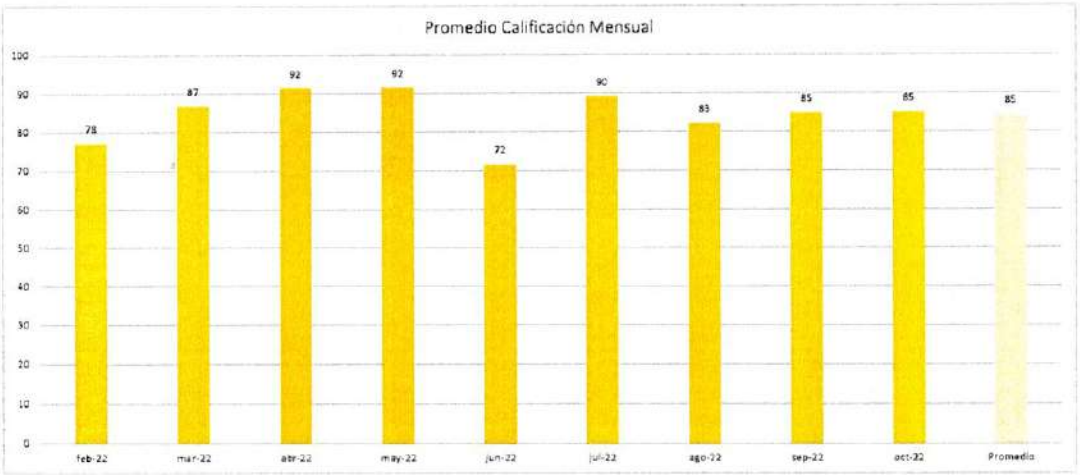

	LISTA DE VERIFICACION DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	CODIGO			
		VERSION			

NOMBRE DEL PROYECTO	SELECCIÓN ABIERTA No SA-06-2021 - INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA	CONSORCIO ICO MALLORQUIN
INTERVENTORIA	CONSORCIO UF 1 MALLORQUIN
NUMERO DEL CONTRATO OBRA	ECU-561-2021 — NUMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA — ECU-566-2021
PERIODO DE EVALUACIÓN	OCTUBRE DE 2022

M-01 : SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación 100%	50%	0%	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
GA 01-1	El contratista entregó el plan de manejo ambiental (PMA) ajustado y probado por parte de la autoridad ambiental dentro de los terminos definidos en el contrato	Se cumplen los requerimientos.	N.A.	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-2	Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos del PMA que son responsabilidad del contratista y en la fecha asignada	Entregó los formatos en la fecha indicada	Se entregan los formatos con mas de una semana de retraso	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-3	El concesionario entregó el plan de contingencia para el control de derrame de hidrocarburos en cuerpos de agua (Ciénaga de Mallorquín)	Se cumplen los requerimientos.	N.A.	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-4	Se publicaron los comunicados de prensa con la del plan de manejo de transito y desvios y avisos pertinentes sobre el proyecto, cumpliendo con los especificaciones del PMA.	Brigada de aseo trabaja tiempo completo	N.A.	No se cumple	-	-	-	-		
GA 01-5	El contratista entregó el plan de manejo trafico (PMT) aprobado por parte de la autoridad competente dentro de los terminos definidos en el contrato y se encuentra vigente durante el periodo de ejecución.	Se cumplen los requerimientos.	N.A.	No se cumple	-	-	-	-		No han presentado el PMT, ya que se encuentran en solicitud de permiso de la ANI
GA 01-6	El contratista entregó dentro del PMA las fichas de la gestión Social dentro de los términos definidos en el contrato y remitió de manera mensual la programación de actividas.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente	No se cumple los requerimientos.	100	100	100	100	100	
GA 01-7	El contratista entregó el plan de gestión de riesgo aprobado por la oficina de gestión del riesgo y entregó soportes de la implementación de forma mensual.	Se cumplen los requerimientos	Se cumple parcialmente	No se cumple los requerimientos.	50	50	50	50	50	
GA 01-8	El contratista debe dar cumplimiento a los compromisos de comité socio-ambiental en las fechas establecidas en las respectivas actas.	Cumple	Cumple parcialmente	No se cumple	50	50	50	50	50	
GA 01-9	El contratista deberá presentar un informe mensual a la interventoría, donde se relacione la gestión realizada durante el periodo, con el fin de demostrar la efectividad y eficiencia de las medidas ambientales	Se entregó el Informe socioambiental en las fechas establecidas	Se cumple parcialmente	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-10	El contratista entregó el cronograma de actividades de la gestion social, ambiental y de SST, ajustado al cronograma de obra. Se entregó el % de cumplimiento de las actividades del cronograma aprobado.	Se cumple el requerimiento	N.A.	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-11	El contratista cuenta con los permisos y licencias vigentes requiridas en la ejecución del proyecto.	cuenta con el 100% de permisos vigentes	no cuenta con uno de los permisos requeridos	No cuenta con permisos	100	100	100	100	100	
							CALIFICACION TOTAL (A)		99	

PGS-02 FICHAS DE GESTION SOCIAL

Items	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación 100%	50%	0%	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
GS 02-1	Realizó todas las reuniones de socialización del proyecto (Inicio y cierre de obra) programadas	Cumple con el requerimiento	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones	100	100	100	100	100	
GS 02-2	Realizó todas las reuniones generales Informativas de Avance de Obra de acuerdo a la frecuencia acordada con la Interventoría.	Realizó todas las reuniones exigidas	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones	100	100	100	100	100	
GS 02-3	Entregó evidencia mensual de las reuniones con la comunidad (actas y registros de asistencia).	Realizó todas las reuniones exigidas	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones	100	100	100	100	100	
GS 02-4	El contratista entregará a la interventoría para aprobación la programación de actividades de la gestión social, de forma mensual, cualquier cambio a esta se deben ser notificada con anticipación.	cumplio con el requerimientos	cumplio parcial con el requerimientos	no cumplio con el requerimientos	100	100	100	100	100	
GS 02-5	Se entregaron los volantes estipulados en el PMA, cumpliendo con las especificaciones exigidas, en la cantidad y plazos establecidos por la interventoría, y de acuerdo al cronograma (programación de actividades) y frentes de obra	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% - 80% de los volantes.	Entregó menos del 80% de los volantes.	100	100	100	100	100	
GS 02-6	Se instaló la valla informativa del proyecto	Se instalaron todas las vallas.	Se dejo de instalar una valla	Se dejó de instalar dos o más valla.	100	100	100	100	100	
GS 02-7	El contratista realizó las reuniones intermedias de acuerdo a lo estipulado en el PMA	Si las realizó.	dejó de realizar una reunión	No las realizó	100	100	100	100	100	
GS 02-8	El contratista instaló carteleras en el área influencia directa de la obra. Estas permanecieron en la obra y fueron reemplazadas en caso de deterioro.	Colocó todas las carteleras	Dejo de colocar o reemplazar una cartelera	Dejo de colocar o reemplazar dos o más carteleras	100	100	100	100	100	
GS 02-9	Realizó el inventario inicial de predios para conocer el número de actas de vecindad a realizar.	Realizó la actividad	Realizó parcialmente el inventario	No realizó la actividad	-	-	-	-		No aplica
GS 02-10	Levantó las Actas de Vecindad en cada frente de obra de acuerdo a lo estipulado en el PMA.	Levantó todas las actas de vecindad requeridas	Se levanto entre el 99% -80% de las actas de vecindad	levantó menos del 80 % de las actas de vecindad	-	-	-	-		No aplica
GS 02-11	Verificó y atendió todas las quejas interpuestas por la comunidad por averías en inmuebles de acuerdo a lo estipulado en el PMA	Verificó y atendió todas las quejas.	Verificó y atendió entre el 89% - 80% de las quejas	Atendió menos del 80% de las quejas.	-	-	-	-		No se ha recibido quejas para el periodo
GS 02-12	Levantó actas de cierre de acuerdo al Inventario inicial realizado en el área de influencia del proyecto.	Levantó la totalidad de actas de cierre.	N.A.	No levantó de actas de cierre	-	-	-	-		En caso de requerirse, se rellia una vez se terminen las actividades técnicas del proyecto.
GS 02-13	Recibió, atendió y solucionó las PQRS manifestadas por la comunidad, de acuerdo al trámite requerido, entregó soportes de la gestión de PQRS.	Solucionó el 100% de las quejas y reclamos.	Solucionó entre el 99 al 80 % de las quejas	Solucionó menos del 80% de las quejas	-	-	-	-		No se presentaron PQRS
GS 02-14	El contratista lleva un registro de la gestión de PQRS mes a mes y se presenta en el informe mensual.	Solucionó el 100% de las quejas y reclamos.	Solucionó entre el 99 al 80 % de las quejas	Solucionó menos del 80% de las quejas.	100	100	100	100	100	Presenta el formato de recepción de PQRS
GS 02-15	Conformó el Comité Comunitario de Obra y realiza reuniones mensuales.	Instaló el Comité Comunitario de Obra.	Se instaló el comité con retraso considerable	No instaló el Comité Comunitario de Obra.	0	0	0	0	0	
GS 02-16	Elaboró y distribuyó piezas informativas o plegable pedagógico de contenido de sostenibilidad y cuitura ciudadana.	Elaboró pegable pedagógico.	N.A.	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GS 02-17	Realizó los talleres pedagógicos para el cuidado y Sostenibilidad dirigido a la comunidad y/o organizaciones sociales asententes en el área de influencia del proyecto	Realizó la totalidad de los talleres.	N.A.	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GS 02-18	El contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la interventoría y será ejecutado durante todo el transcurso de las actividades constructivas. En caso de requerir ajustes el plan se notificará a la interventoría con las respectivas justificaciones técnicas de caso.	Cumple con el requerimiento.	N.A.	no se cumple con el requerimiento	100	100	100	100	100	
GS 02-19	Contrató el 10 % o más de la mano de obra no calificada pertenece a población vulnerable según lo definido contractualmente.	Cumple con el requerimiento.	Contrató entre el 9% y el 20% del personal con domicilio en el AMB.	No contrató de acuerdo a las especificaciones del programa	50	50	50	50	50	El Contratista cuenta con el 46 % de MONC, cumpliendo con el requisito. Actualmente se encuentran en espera del certificado por parte del CCI; envió transatitud de gestión.
GS 02-20	Se contrató 5 mujeres inscritas en el centro de oportunidades del distrito pertenecientes a la nomina de mano de obra no calificada (M.O.N.C).	Cumple con el requerimiento.	Contrató entre el 9% y el 1% del personal con domicilio en el AID.	No contrató de acuerdo a las especificaciones del programa	50	50	50	50	50	El Contratista ha solicitado la vinculación de una mujer para el cargo de carpintero, pero no han encontrado el personal con la experiencia exigida.
GS 02-21	Se realizó la promoción de vinculación de mano de obra local, a través de las reuniones informativas sostenidas con la comunidad, se presentaron los actas correspondientes.	Cumple con el requerimiento.	N.A.	No contrató de acuerdo a las especificaciones del programa	100	100	100	100	100	
							CALIFICACION TOTAL (B)		88	

MBS-03 MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO

Items	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación 100%	50%	0%	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
MBS 03-1	El Contratista antes del inicio de las actividades de obra actualizó, el inventario forestal levantado previamente para el proyecto.	Se cumplen los requerimientos.	Se entregó el inventario luego de iniciadas las labores de tala	No entrega cumpliendo el inventario forestal dentro de los términos de calidad y cronograma previsto	100	100	100	100	100	
MBS-03-2	Tratamientos silviculturales cuentan con aprobación de autoridad ambiental	Se cumplen los requerimientos.	El permiso de la autoridad ambiental fue dado despues de instalar labores de tala	No cumple	-	-	-	-		El Contratista solicitó retiro de la solicitud de permiso de aprovechamiento por cambio de diseño
MBS-03-3	Se cumplió con los requerimientos exigidos en el Permiso de Aprovechamiento forestal	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este item	No cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS 03-4	Se protegió los individuos arboreos existentes en el área de construcción	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este item	No cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS-03-5	Residuos vegetales son retirados dentro del tiempo estipulado por la Autoridad Ambiental.	Se cumplen los requerimientos.	Se observa sitio con incumplimiento	Se observa más de un sitio con incumplimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS-03-6	Como medida de compensación del daño o pérdida de árboles, el Constructor deberá sembrar árboles, considerando especies aprobadas por la autoridad ambiental y ubicación según diseño. Se sembraron los árboles de compensación en los términos establecidos en el permiso de aprovechamiento forestal.	Se cumple	Se cumple parcialmente este item	No se cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS 03-7	Se realizó capacitación de personal de obra sobre protección de fauna domestica y silvestre presente en el area.	Se cumple	Se cumple parcialmente este item	No se cumple	100	100	100	100	100	
							CALIFICACION TOTAL (C)		100	

GAO 04 GESTION AMBIENTAL DE OBRA

GAO 04-1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-1.1	Se realizó la capacitación y sensibilización del personal operativo del contratista para el manejo y control de derrames de hidrocarburos en la Ciénaga de Mallorquín. Sensibilización semanal. Entregar evidencia.	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-1.2	Se realizaron limpiezas periódicas de los baños portátiles ubicados en obra	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-1.3	Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales al cuerpo de agua y/o su disposición directa sobre el suelo.	Se cumple	NA	No se cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-1.4	El contratista entregó certificados de disposición de limpieza de baños portátiles	Se cumple	NA	No se cumple	100	100	100	100	100	
								CALIFICACION TOTAL (D)	100	

GAO 04-2 MANEJO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION- RCD -

GAO 04-2.1	Las vías de acceso de entrada y salida de la obra deben permanecer limpias de escombros materiales de construcción y residuos en general. El contratista realizó limpieza de las vías.	las vías de entrada y salida de la obra se cuentran limpias y despejadas	por lo menos una vía no cumple con el requerimiento	no cumple con el requerimiento.	100	100	100	100	100	
GAO 04-2.2	Los escombros deben ser protegidos (con elementos tales como plásticos, lonas impermeables o mallas) o humectados para controlar la dispersión por el viento, pueden permanecer en la zona de acopio temporal hasta 24 horas después que de su generación y luego transportados a los sitios autorizados para su disposición final. El Contratista debe llevar el registro de los volúmenes generados indicando el factor de esponjamiento, tipo de material y cualquier otro tipo de información pertinente a igual que cumplir con el almacenamiento temporal en punto de generacion	Los escombros son retirados dentro del plazo. Se lleva el registro de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente.	se lleva registro de generacion pero no son retirados en el tiempo definido.	Los escombros no fueron retirados y no se llevan registros de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente.	-	-	-	-	-	Durante el periodo tratado no generaron escombros
GAO 04-2.3	El Contratista no debe utilizar las zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto para la disposición temporal de materiales utilizados para la obras.	No se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto	N.A.	Se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto	100	100	100	100	100	
GAO 04-2.4	Las volquetas destinadas al transporte de escombros y materiales de construcción no deben ser llenadas por encima del borde superior más bajo del platón y deben ser cargadas con lonas debidamente amarradas externamente 30 cm por debajo del nivel del platón, se controla el cargado de las volquetas al salir de la obra.	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento	N.A.	No cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-2.5	No se deben modificar los diseños originales de los contenedores o platones de las volquetas para aumentar su capacidad. Solo se permite la adecuación del platón con láminas metálicas soldadas siempre y cuando no excedan la capacidad y estabilidad establecida por el fabricante del vehículo.	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento	N.A.	No cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-2.6	La disposición final de escombros se hace únicamente en los sitios con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales vigentes. El contratista entrega de manera mensual la certificación otorgada por el sitio de disposición Final o escombrera autorizada en la cual conste el volumen dispuesto durante el periodo.	Se cumple con los requerimientos	N.A.	No cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-2.7	El contratista deberá disponer de puntos ecológicos, tanques debidamente marcados y señalizados, para almacenar residuos de construcción, tal como se indica en el PMA.	Cumple con lo estipulado en el PMA	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con lo estipulado en el PMA	100	100	100	100	100	
GAO 04-2.8	El contratista deberá entregar a la interventoría previo al retiro y disposición final de los escombros el registro de generador de RCD y la inscripción del proyecto la documentación pertinente que demuestre la legalidad del sitio o escombrera para su aprobación.	Se cumple con los requerimientos	N.A.	No cumple con lo estipulado en el PMA	100	100	100	100	100	Durante el periodo tratado en el informe no se han generado RCD
GAO 04-2.9	El contratista lleva registro mensual de la generación y aprovechamiento de RCD.	Se cumple con los requerimientos	N.A.	No se cumplen los requerimientos	100	100	100	100	100	Durante el periodo generaron residuos de madera, los cuales fueron aprovechados en otras actividades de la obra
								CALIFICACION TOTAL (D1)	100	

GAO 04 -3 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04 -3.1	Los materiales finos almacenados temporalmente en los frentes de trabajo deben estar protegidos contra la acción eólica del agua, aire y su contaminación, los materiales gruesos fueron se humedecidos según se requiera. Los materiales empleados en la obra no deben generar deslizamiento del flujo vehicular y peatonal. En caso de presentarse esto, deben tomarse las correctivos de forma inmediata.	Todos los frentes de trabajo cumplen	No se cumple entre uno y tres frentes de trabajo	Por lo menos tres frentes de trabajo no cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.2	En caso de que el Contratista requiera realizar mezcla de concretos y cementos en zonas verdes en los frentes de obra, estas serán inspeccionadas por la interventoría y se deben realizar sobre una plataforma metálica o Geotextil, y en todo caso asegurar que el lugar permanezca en óptimas condiciones	Cumple el requerimiento en todos los casos.	No se cumple entre uno y dos frentes de trabajo	Se observó más de dos sitio que no cumple el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.3	No se deben presentar derrames de mezclas de concreto en los frentes de obra. Se debe elaborar un reporte del incidente a la interventoría ambiental y de las acciones correctivas adoptadas en caso de presentarse.	No se evidencian derrames en los frentes de obra. En el evento de ocurrencia de derrames se entregan los reportes al día	Se evidencian derrames en los frentes de obra entre uno y tres casos	Se evidencian derrames en los frentes de obra en más de tres casos y no se han entregado los reportes de estos al día siguiente a	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.4	Se prohíbe el lavado de la olla de los vehículos mezcladores en el frente de obra, en vías aledañas, zonas verdes o duras. Se habilitó un sitio impermeabilizado para la limpieza del canal alrededor del vehículo mezclador y se realiza en sitio autorizado.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	N.A.	No cumple con los requerimientos y procedimientos.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.5	Los materiales procesados, como ladrillos, concretos hidráulicos y los materiales de construcción, deben contar con los permisos y licencias ambientales y mineros exigidos por las normas. Esta documentación debe ser entregada a la interventoría para su respectiva aprobación previo al suministro.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	se cumple parcialmente	no se cumplio con el requerimiento.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.6	Los acopios de materiales no se encuentran obstruyendo pasos peatonales o espacio público.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	se cumple parcialmente	no se cumplio con el requerimiento.	100	100	100	100	100	
GAO 04 -3.7	El acopios de materiales en obra se encuentra ordenados por clase y tipo de material.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	se cumple parcialmente	no se cumplio con el requerimiento.	100	100	100	100	100	
								CALIFICACION TOTAL (D2)	100	

GAO 04 -4 Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04 -4.1	El campamento o campamentos no se podrán instalar en espacios públicos que no hagan parte del frente de obra.	Los campamentos no están en el espacio público	Uno o dos campamentos se encuentran en espacio público	Más de dos campamentos está en el espacio público	100	100	100	100	100	
GAO 04 -4.2	El campamento deberá contar con las instalaciones mínimas necesarias que aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores. Debe estar dotado de una unidad de primeros auxilios con camilla, botiquín portátil con todos los elementos necesarios y extintor.	Cumple con los requerimientos	No se cumple con una o dos condiciones	No cumple con dos o mas condiciones requeridas	100	100	100	100	100	
GAO 04 -4.3	Se deberá colocar recipientes en un punto del campamento debidamente protegidos contra la acción del agua para la disposición de las basuras que se originen, las cuales deberán ser diferenciadas por colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente y posteriormente ser evacuados por los carros recolectores de basuras.	Cumple con los requisitos de manejo de residuos generados en el campamento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No existen recipientes o los que existen se encuentran averiados.	100	100	100	100	100	
GAO 04 -4.4	El campamento debe estar señalizado adecuadamente, debe tener visible la ruta de evacuación, debe estar dotados de baños, punto de hidratación, zona de descanso, primeros auxilios, protección contra incendios, y allí deben reposar el plano de ruta de evacuación y teléfonos de emergencia.	Cumple con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con dos o mas condiciones requeridas	50	50	50	50	50	
								CALIFICACION TOTAL (D3)	88	

GAO 04-5 Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-5.1	El programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos debe ser realizado con la frecuencia que requiera el tipo y edad del equipo. El Contratista debe entregar mensualmente los registros de este mantenimiento en el informe SST.	Cumple con los requerimientos.	Se evidenció una o dos maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la interventoría	Se evidenció tres o más maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la interventoría	0	0	0	0	0	
GAO 04-5.2	El contratista entregó para verificación copia del certificado de revisión tecnomecánica, tarjeta de propiedad, SOAT, Manifiesto de importación, permisos de modificación y licencia de operador o conductor, certificado de idoneidad de los operadores en el informe mensual.	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con el requerimiento	0	50	50	50	37,5	
GAO 04-5.3	Todos los vehículos y maquinarias , que laboran en la obra se encuentra en buenas condiciones de luces, frenos, pito de reverse, extintor, estado físico de las llantas. Y se entregó registro preoperacional diario en el informe SST	Cumple con los requerimientos.	Faltó por revisar uno o dos vehículos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la interventoría	Faltó por revisar tres o más vehículos	50	50	50	50	50	
GAO 04-5.4	La maquinaria que se parquea en los frentes de obra debe ser encerrada para evitar accidentes con tres líneas de cinta plástica. Los sitios de parqueo deben ser autorizados previamente por la interventoría Ambiental.	Se cumplen los requerimientos.	Uno o dos días no cumplieron con los requerimientos	Dos (2) o más sitios no cumplieron con los requerimientos.	-	-	-	-	-	
GAO 04-5.5	Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento Preventivo de vehículos y maquinaria en las vías. La reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento y en las frentes de trabajo, en los mantenimientos realizados se llevó a cabo instalando protección en el área a intervenir con material de polietileno y con previa autorización de la interventoría.	Cumple con los requerimientos.	Se reparó y/o lavó uno o dos vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados	Se reparó y/o lavó dos o más vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados	50	50	50	50	50	
								CALIFICACION TOTAL (D4)	34	

GAO 04-6 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-6.1	No se podrán realizar vertimientos de aguas residuales domésticas a las calles o sistemas de drenaje pluvial.	Cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Existen vertimientos de agua residual o aceites no autorizados.	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.2	Se realizó el mantenimiento de las cabinas de servicio sanitario instaladas en los diferentes frentes de construcción o campamentos usados por el personal de la obra, con una frecuencia mínima de 2 veces por semana.	Cumple los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.3	El manejo y disposición de aceites usados deberá realizarse con las empresas autorizadas. Se entregó la certificación de entrega a gestor autorizado.	Cumple los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.	NA	NA	NA	NA		Durante el periodo trata de no hicieron entrega de aceites usados
GAO 04-6.4	El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de obra (equipo diferente a volquetas y vehículos con placa), se realizó mediante la utilización de un vehículo adecuado para tal fin.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.5	Si se requirió mantenimiento correctivo de la maquinaria pesada justamente empresas y chequeo de niveles de aceites y líquidos), el contratista utilizó material de polietileno que cubre la totalidad del área donde se realizó esta actividad, de forma tal que se evitó contaminación del suelo por derrames accidentales.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-6.6	Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales al cuerpo de agua y/o su disposición directa sobre el suelo.	Cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se evidenció vertimiento	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.7	Los productos químicos se encuentran con etiqueta que facilita información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deben observarse para los trabajadores.	Todos los productos químicos están debidamente etiquetados	Se cumple parcialmente este requerimiento	Existen tres o mas productos químicos que no fue el suestado adecuadamente	50	50	50	50	50	
GAO 04-6.8	El contratista cuenta con la matriz de compatibilidad de sustancias químicas y se mantuvo disponible las fichas técnicas de seguridad de sustancias químicas utilizadas y almacenadas en el campamento y las socializó en los entrenamientos de inducción del personal.	Se tienen las fichas técnicas en la obra y en el campamento o sitio donde se almacenan los compuestos químicos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No existen fichas técnicas accesibles a los trabajadores de la construcción o los que manejan directamente los químicos	50	50	50	50	50	
GAO 04-6.9	La obra cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento de sustancias químicas, aceites y combustibles, dotado con señalización y un dique de contención, igualmente se cuenta con los elementos para el control de derrames.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	50	50	50	50	50	
							CALIFICACION TOTAL (GO5)		79	

GAO 04-7 Manejo de Estructuras y Aseo

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-7.1	Se cuenta con una brigada de limpieza, dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento de la misma. En el evento en que la interventoría detecte que la brigada o alguno de sus miembros o equipo está desarrollando otras labores, estas se deberán suspender para dedicarse a las de aseo y limpieza.	Existe y opera la brigada de limpieza acorde con el Componente A	Se cumple parcialmente este requerimiento	No opera la brigada de limpieza	0	0	0	0	0	No cuentan con el BOAL, pero realizan limpieza
GAO 04-7.2	Se observa que se realiza limpieza general diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo.	Se cumple con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Más de dos sitios de disposición se encuentra cerca de la zona de tráfico y/o no está protegido	50	50	50	50	50	
GAO 04-7.3	Se recogieron los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en la zona donde se realizan las obras. Estos materiales se colocaron en canecas y se trasladaron [si se necesario] temporalmente en un sitio previsto para tal efecto hasta ser recogido por la empresa de recolección de basura. El material susceptible de recuperarse se clasificó y se depositó en canecas previstas para tal fin para su posterior reutilización.	Se cumplen todos los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumplen todos los requerimientos	50	50	50	50	50	
GAO 04-7.4	No se presentó acumulación de basura y otros desechos sólidos domésticos en lugares públicos (vías, zonas verdes, el aire libre, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	100	100	100	100	100	
GAO 04-7.5	Los residuos especiales que se generaron del uso de soldaduras, soldaduras (pequeñas PVC), impermeabilizantes, sellantes sobrantes y artículos, fueron recolectados en bolsas separadas y entregados a los gestores autorizados. Se entregó certificación de la disposición final.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
							CALIFICACION TOTAL (GO6)		50	

GAO 04-8 Manejo de Aguas Superficiales

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-8.1	El contratista no realizó vertimientos líquidos o sólidos a las aguas de escorrentía y/o cuerpo de aguas en el sector del proyecto durante una lluvia.	Se cumple con los requisitos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
							CALIFICACION TOTAL (GO7)		100	

GAO 04-9 Manejo de Excavaciones y Rellenos

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-9.1	Al momento de hacer las excavaciones se encontró piezas arqueológicas, y dio la orden de suspender el desarrollo de la obra sobre la zona e informó al ICAHN (Instituto colombiano de arqueología y de historia Natural), para que evalúe la situación y determine el momento de continuar con la obra.	No se encontraron hallazgos. Se nos pendieron las labores encontrar un posible hallazgo	Se cumple parcialmente este requerimiento	Las labores no se suspendieron de manera inmediata.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-9.2	El contratista previamente antes de iniciar las excavaciones identificó la existencia de redes y ubicó los ejes de las tuberías y redes enterradas sobre el terreno.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.	100	100	100	100	100	
GAO 04-9.3	Las excavaciones fueron señalizadas de forma apropiada para evitar accidentes. En caso de deterioro de las señales, estas fueron reemplazadas.	Se señalizaron de manera adecuada todas las excavaciones	por lo menos una o dos excavaciones estuvieron sin señalizar	Estuvieron al menos tres excavaciones sin señalizar	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-9.4	Se garantizó la seguridad y estabilidad del talud, en todas las excavaciones que requirieron de entibado por su profundidad. El personal que contó con línea de vida y elementos de seguridad definidos en la norma aplicable.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-9.5	Los materiales de excavación fueron retirados del borde de la excavación, se mantuvo una distancia mínima de 1m para el acopio de los materiales a reutilizar en el relleno de zanjas. Durante este tiempo, se mantuvieron debidamente señalizados.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
							CALIFICACION TOTAL (GO8)		100	

GAO 04-10 Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-10.1	Las zonas donde se desarrollan intervenciones de obra, fueron aisladas con el cerramiento perimetral aprobado, este cuenta con una altura mínima de dos metros de altura.	Cumple con la medida	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con la medida	100	100	100	100	100	
GAO 04-10.2	Para minimizar las emisiones de material particulado las zonas descubiertas de acabados fueron humectadas. Para tiempo seco (días de no lluvia), y dependiendo el tipo de suelo y la eficiencia de humectación, se debe realizar humedecimientos por lo menos 2 veces al día, sobre las áreas descubiertas y de acopios.	Se realizan los humedecimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se realizan los humedecimientos.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-10.3	La velocidad de las volquetas y de la maquinaria no superó los 30 km/h con el fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas.	Cumple con la velocidad propuesta.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con la medida	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-10.4	No se realizaron quemas a cielo abierto.	Cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GAO 04-10.5	Se mantuvo restringido el uso continuo de cornetas, clacón o bocinas de todos los vehículos que laboran en la obra.	Los vehículos y equipo cumplen con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con los requerimientos	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-10.6	Los acopios de materiales temporales autorizados en los frentes de obra fueron protegidos de la acción del viento. En esta sección se utilizó un sistema de humectación o cerrado de acuerdo con el tipo de material.	Se protegen los sitios temporales de acopio de los materiales	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
							CALIFICACION TOTAL (GO9)		100	

GAO 04-11 – Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-11.1	Previo al inicio de las actividades de construcción, se debió dictar charlas al personal que laborará en la obra, sobre el tipo de elementos arqueológicos e históricos que se podrían encontrar en el área y el procedimiento a seguir si se llegasen a presentar.	Cumple con los requisitos sobre charlas y procedimiento a seguir sobre el manejo de elementos de tipo arqueológico.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos	100	100	100	100	100	
GAO 04-11.2	Durante las actividades de excavación se realizará un seguimiento permanente, en busca de elementos arqueológicos, en toda el área de intervención directa. De no encontrarse vestigios o restos arqueológicos se puede seguir con la operación normal de la actividad.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
GAO 04-11.4	En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el constructor actuará de conformidad con el artículo 6°, inciso 3, de la Ley 397 de 1997 el cual dice "...quien de manera fortuita encuentre bienes integrantes del patrimonio arqueológico deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o policivas más cercanas, las cuales tienen como obligación informar el hecho al Ministerio de Cultura dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del aviso". Se suspendió de forma inmediata la suspensión de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos yacimientos.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
GAO 04-11.5	Se consultó con el ICAHN sobre la entrega de los materiales arqueológicos y especificó en el informe el lugar donde éstos reposan (acta o constancia de entrega). De igual forma, el ICAHN asesoró a las Casas de Cultura y Museos Regionales en la tarea de conservación y almacenamiento del material entregado, de acuerdo con los resultados y productos de los proyectos de los cuales provienen.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
								CALIFICACION TOTAL(GO10)	100	
								CALIFICACION TOTAL(D-GSO)	86	

GIR 05 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

GIR 05-1 – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GIR 05-1.1	El contratista definió los EPP en la matriz de peligro por puestos de trabajo, y fueron suministrados a todo el personal de obra, fue controlado el porte y uso de los mismos por parte del personal encargado.	Todos los trabajadores tienen los EPI correspondientes al puesto de trabajo	una o tres personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo	más de 3 personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.2	Para cada actividad a ejecutar en un área específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que se analicen los posibles riesgos de afectación del personal, asociados a la ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser presentado en el informe mensual socio ambiental.	Cumple requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple Requerimiento	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.3	El contratista entregó el programa de capacitación y remitió los soportes de ejecución de estas actividas en el informe socio ambiental	Cumple requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple Requerimiento	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.4	El contratista entregó la evaluación de los estandares mínimos según la Resolución 312 de 2019.	Se cumple con el requerimiento		No cumple Requerimiento	0	0	0	0	0	
GIR 05-1.5	Todo el personal que labora en la obra, está afiliados una EPS, AFP y ARL. El Contratista implementó un formato de registro de cada empleado que indique: nombre, lugar de residencia, teléfono, edad, sexo, estado civil, identificación, labor que desarrolla, EPS a la cual está afiliado (fecha de afiliación) y la fecha de afiliación a la ARL. Los registros de esta actividad fueron entregados en el informe mensual socio-ambiental.	Se cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento.	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.6	El Contratista debe entregó a la Interventoría para revisión y aprobación el cronograma y la programación para efectuar el plan de trabajo anual. Mensualmente entregó el reporte de las actividades realizadas por el Contratista para dar cumplimiento a esta obligación.	El plan se entregó y se está cumpliendo con la programación.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con el requerimiento	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.7	Se entregó y se tiene actualizada la matriz IPER, debe ser entregada a la interventoría para revisión y aprobación y debe atender las observaciones en un plazo no mayor a una (1) semana. Los riesgos deben ser revisados y renovados mensualmente y de dicha revisión se debe establecer un plan de acciones correctivas.	Se está cumpliendo con la programación. En el evento que algún registro de inspección no sea entregado en el informe de gestión socioambiental, este deberá ser entregado a la	se cumple parcialmente este requerimiento, los registros se entregaron después de la entrega del informe en un tiempo no mayor a tres días	se cumple con el requerimiento aunque de tres días de la entrega del informe.	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.8	Se dispone dentro del campamento de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP del personal contratista.	Cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con el requerimiento	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.9	Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los accidentes y las lesiones ocurridas en los frentes de obra fueron notificados a la interventoría (en horario diurno antes de una hora y en horario nocturno, a las 8:30 a.m. del día siguiente).	Se cumplió con el plazo establecido para informar a interventoría. Se entregó el formato de reporte e investigación de accidentes y lesiones.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.10	Todas las personas (del Contratista) antes de entrar a laborar en los frentes de obra fueron debidamente entrenadas. Implementó un programa de inducción de entrenamiento en SST. Se entregó el registro del entrenamiento dado a los trabajadores del contratista que laboran en la obra y debidamente firmado por el trabajador, con su respectiva evaluación del entrenamiento.	Se cumple con el requerimiento. En el evento que algún	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.11	El Contratista realizó exámenes médicos de ingreso de los trabajadores . El examen médico de ingreso fue consistente con el puesto de trabajo al cual será asignado el trabajador. Estos resultados fueron entregados a la interventoría en el informe mensual socio ambiental.	A todos los trabajadores se les ha realizado el examen médico de ingreso de acuerdo con el puesto de trabajo asignado.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.12	Se realizaron los exámenes médicos periódicos ocupacionales y de reubicación de los trabajadores de cuerdo al profesiograma.	A todos los trabajadores de los Contratista se les ha realizado el examen médico periodico de acuerdo con el puesto de trabajo asignado	NA	Se evidenció que a uno o más trabajadores de los contratistas presentes en la obra no se les realizó el examen médico periodico de acuerdo con el	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
GIR 05-1.13	El Contratista debe presentar el Plan de Estímulos dirigido a todos los trabajadores en relación con el uso de los EPP. Los registros de esta actividad fueron entregados y actualizados en el informe mensual de gestión socioambiental.	Se mantiene el plan de estímulos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se incumple con el requerimiento	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.14	Los baños serán ubicados en la zona de trabajo de acuerdo con el número de trabajadores presentes en cada frente, a fin de cumplir con el requisito de 1 baño por cada 20 personas	Cumple con el requerimiento.	falta uno o dos baños	Faltan más de dos (2) baños	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.15	Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los accidentes y las lesiones ocurridas en los frentes de obra fueron notificados a la interventoría (en horario diurno antes de una hora y en horario nocturno, a las 8:30 a.m. del día siguiente).	Cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos ya los registros de lesiones y accidentes no fueron entregados a la interventoría.	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.16	Se mantuvo actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.17	El contratista realizó las labores de alto riesgo y diligenció el respectivo permiso de trabajo autorizado por el personal correspondiente (SST), en donde se debe tener en cuenta el personal está capacitado para desarrollar la labor. Los permisos fueron entregados en el informe socioambiental	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.18	Las zonas de almacenamiento de sustancias se mantuvieron adecuadamente señalizadas para evitar el ingreso a personal no autorizado y para que el personal adopte las medidas de seguridad necesarias (No fumar, no correr cerca de las sustancias, utilizar elementos de protección personal, etc.). Estas sustancias se deben almacenar en sitios especiales en el almacén, donde no estén cerca o en contacto con otros elementos que puedan resultar contaminados, como agua potable.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.19	El contratista conformó el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST), se entregaron los soportes realizados por este en el informe socio ambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.20	El contratista conformó el comité de convivencia laboral (COCOLA), se entregaron los soportes realizados por este en el informe socio ambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	100	100	100	100	100	
								CALIFICACION TOTAL (E1)	79	

GIR 05-2 – PLAN DE CONTINGENCIA

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GIR 05-2.1	El Contratista entregó a la interventoría para revisión y aprobación, el Plan de Contingencia y Emergencias.	El Contratista entregó el Plan de Contingencia debidamente ajustado.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GIR 05-2.2	El Contratista determinó las amenazas potenciales que se podrían generar por sucesos naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de prevención y control y en el caso de presentarse una contingencia se active los mecanismos de prevención y acción del plan.	El Contratista implementó las medidas de prevención y control	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	50	50	50	50	50	
GIR 05-2.3	El Contratista identificó y mantuvo publicado el listado de las instituciones que están presentes en el área de influencia de la obra, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo, para ser vinculadas al Plan de Contingencia y Emergencias.	El Contratista entrega el registro de las instituciones que pueden prestar apoyo al Plan de Contingencia	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	0	0	0	0	0	
GIR 05-2.4	El Contratista divulgó e incentivó la participación del personal del proyecto, en las actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso educativo permanente.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	0	0	0	0	0	
GIR 05-2.5	Se mantuvieron disponibles, completos , en buen estados, señalizados y accesibles los equipos de control de emergencias en la obra.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GIR 05-2.6	Se conformó el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos operativos. El contratista en entregó soporte mensual del requerimiento.	El Contratista acta de conformación y capacitación y los procedimientos operativos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	50	50	50	50	50	
GIR 05-2.7	Se realizaron simulacros periódicos de emergencia conforme a la programación (simulando las condiciones de emergencias en diferentes escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y protección de bienes con una frecuencia bimensual), involucrando a todo el personal participante, algunas empresas públicas y representantes de la comunidad del área de influencia.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	50	50	50	50	50	Realizaron un simulacro del cual no informaron a la interventoría de esta, no presentaron guión del simulacro, se realizaron despues de la jornada laboral no participaron todos los trabajadores.
								CALIFICACION TOTAL (E2)	50	
								CALIFICACION TOTAL (E1 + E2)	64	

PMT DE SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO										
PMT 06-1: IMPLEMENTACION DE PMT										
Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
PMT 06-1.	Se cuenta con los permisos vigentes requeridos para el cierre parcial o total de vías y/o de cargue o descargue de materiales.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-2.	La señalización fue ubicada en sitios visibles, con dimensiones estandarizadas, vallas de tamaño adecuado y aplicación de pinturas fluorescentes de conformidad con lo establecido por el PMT. Las vallas son de material resistente y fueron reemplazadas cuantas veces se requiera en caso de deterioro.	Las señales y vallas cumplen	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-3.	Los taludes de excavación en el frente de obra fueron aislados totalmente (por cinta o malla) y se fijaron avisos preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando. Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra contó con señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, flashes, lucecitas, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre las colombinas, cinta reflectiva, canecas pintadas con pintura reflectiva, etc. Las mismas fueron reemplazadas cuantas veces se requirió, en caso de pérdida, robo o deterioro	Se cumple con los requisitos de señalización	Se cumple parcialmente este requerimiento	Tres frentes de excavación no cumplen con los requisitos de señalización	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-4.	La ubicación diaria de materiales en espacio público, no interfieren con el tráfico peatonal o vehicular. Los materiales ubicados fuera del área de obra fueron demarcados y acordonados de tal forma con cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta reflectiva.	Todos los sitios cumplen los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Si por lo menos dos sitios no cumplen con los requisitos	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-5.	Cuando se realicen cierres totales, además de la delimitación e información descrita anteriormente, se debe contar con dispositivos en las esquinas tales como barricadas y barreras, que garanticen el cierre total de la vía por el tiempo requerido. El uso de escombros y materiales en las esquinas para impedir el paso de los vehículos, solo se permite si es complemento de una señalización diseñada al Manual de Inventario del IMMAS, se encuentre cubierto. Las barreras deben tener un mínimo de 2 m de longitud 55 cm de alto y 50 cm de ancho.	Todos los cierres totales cumplen con las medidas	Se cumple parcialmente este requerimiento	Más de dos sitios no cumplen con los requisitos	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-6.	Se colocaron todos los elementos indicados en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado	Se utilizan elementos de iluminación adecuados para señal nocturna	Se cumple parcialmente este requerimiento	Por lo menos tres sitios sin señal luminosa o con uso de antorchas	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-7.	El contratista previo a la construcción de cualquier sector del proyecto informó a la ciudadanía y a los medios de la obra por lo menos con ocho días de antelación mediante volantes informativos los demás cierres de vías, los cuales fueron aprobados por la Secretaría de Tránsito y Seguridad vial.	Se da aviso previo de las obras en el plazo establecido mediante volantes u otro medio informativo.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se informa	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-8.	En el evento en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o viviendas, dicho paso se deben garantizar de tal forma que los habitantes de las viviendas puedan ingresar a las mismas sin ningún tipo de complicación. En caso de que ese impostes garantizar el acceso al parqueo, el contratista debe comunicarle al responsable del predio.	Se cumple con los requerimientos	Uno o dos pasos temporales a garaje o vivienda no se habilitaron	Más de dos paso temporal a garaje o vivienda no se habilitaron	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-9.	El tránsito alternado sobre un mismo carril deberá ser controlado mediante auxiliares de tráfico, los cuales deben estar dotados de chaleco reflectivo y estos usaran señales de PARE y SIGA para dirigir la circulación de vehículos. La visibilidad del auxiliar de tráfico y su señalización deben permitir a los conductores una respuesta oportuna a sus indicaciones.	El tránsito alternado es manejado acorde con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-10.	El contratista debera entregar el reporte de la implementacion del PMT de forma mensual, junto con informe de inversion de las reservas de las provisionales del PMT.	Se cumple con los requerimientos	N.A.	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para este periodo
								CALIFICACION TOTAL (F)		
								DESEMPEÑO AMBIENTAL MENSUAL: (A+B+C+D+E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11+E12+F)		85

ANEXO No. 1

Asistencia a Charlas

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

REGISTRO DE CAPACITACION O ENTRENAMIENTO

VERSIÓN: 3
FECHA: 18/07/18

TEMA: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS / PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

DOCENTE: ING CARLOS DUSSAN FECHA: OCT/03/2022

LUGAR: PREDIO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Jaime Vélez C	Director		X	
2	Melissa Ramírez Alhumada	Ingeniera Administrativa	Melissa Ramírez Alh.	X	
3	PEDRO RAMOS	MAESTRO		X	
4	[illegible]	OFICIAL	[illegible]	X	
5	Oscar Dario Cano	Residente SST		X	
6	[illegible]	Oficios Varios		X	
7	NAYLON		NAYLON	X	
8	Hector Valencia	AYUDANTE	Hector V.	X	
9	Hader Tafur	AYUDANTE	Hader	X	
10	Jaime Benitez	Cadenero	Jaime Benitez	X	
11	[illegible]	Ayudante	[illegible]	X	
12	CARLOS Zuñiga	CONDUCTOR	[illegible]	X	
13	MANUEL - HENRY	AY	MAQUEFILIACION	X	
14	[illegible]	Ayudante		X	
15	Mario Gomez	Topografo	Mario Gomez	X	
16	[illegible]			X	
17	DENIS R MORALES	AYUDANTE	DENIS R	X	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	
19	EGIDIO DELAROZ	AYUDANTES	Egidio	X	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: FRP - 02 VERSIÓN: 3 FECHA: 18/07/18

TEMA: EMISIONES ATMOSFÉRICAS / PLAN DE ARQUEOLOGÍA / PROTECCIÓN FALDA

DOCENTE: ING CARLOS DIESSEN FECHA: 07/10/2022

LUGAR: FRENTE DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	PEDRO [illegible]	MAESTRO		✓	
2	[illegible]	[illegible]		✓	
3	[illegible]	[illegible]		✓	
4	Melissa Ramirez Ahumada	Ing. Administrativa		✓	
5	MARLON			✓	
6	[illegible]	Residente SSI		✓	
7	Hadis Toledo	Ayudante		✓	
8	[illegible]	Conductor		✓	
9	[illegible]	Oficio Varios		✓	
10	[illegible]	P.V		✓	
11	[illegible]	Ayudante		✓	
12	[illegible]	Ayudante		✓	
13	[illegible]	Carpintero		✓	
14	[illegible]	[illegible]		✓	
15	[illegible]	AYUDANTE		✓	
16	[illegible]	[illegible]		✓	
17	[illegible]	TOPOGRAFO		✓	
18	[illegible]	AYUDANTE		✓	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO

VERSION: 2
FECHA: 18/07/18

TEMA: PROTECCIÓN A ECOSISTEMAS / PROTECCION A FAUNA
DOCENTE: ING CARLOS DESSÁN FECHA: 00/29/2022
LUGAR: FRENTE DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Melissa Ramirez Alvarado	Ing. Administrativa	Melissa Ramirez A.	X	
2	Diego Ruiz Bonilla	Residente SST		X	
3	Jose Diaz	Dueño		X	
4	Julio Hernandez Gomez	Oficial Civil		X	
5	PEDRO ZAMBRANA	MAESTRO		X	
6	HECTOR MANUEL	AYudante	Hector M.	X	
7	[illegible]	Brigadista	[illegible]	X	
8	Jairo Blanco	Conductor	Jairo Blanco	X	
9	[illegible]	AY	[illegible]	X	
10	MARLON	M1	MARLON	X	
11	Delis Zuñiga	Conductor	[illegible]	X	
12	Marlon Gomez	Topografo	[illegible]	X	
13	Wadis Falcon	ayudante	[illegible]	X	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	
16	[illegible]	ayudante	[illegible]	X	
17	DENISER MORALES	AYUNTE	DENISER	X	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

ANEXO No. 2

Certificado SAKATECH

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

Codigo: F3PC03
Versión: 01

SAKATECH

Barranquilla, 29 OCTUBRE DE 2022

CERTIFICACIÓN

SAKATECH S.A.S. identificado con NIT 901.216.902-5, certifica que realiza TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL de aguas residuales provenientes de mantenimiento de baños portátiles a la empresa **CONSORCIO JCO MARLLORQUÍN** identificado con NIT 901.501.273-2 ubicado en la Ciénaga de Mallorquín.

SAKATECH S.A.S. cuenta con autorización otorgada por CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO (C.R.A.) bajo las RESOLUCIONES NO. 4189 del 19 de junio 2020. Se certifica que se recogió **uno coma nueve 1.9 Metros cúbicos (m3) correspondiente a tres (3) baños portátiles del periodo de 1 OCTUBRE – 29 OCTUBRE 2022.** La disposición final se realiza en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la empresa AGUACARIBE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. identificado con NIT 901.231.847-0 ubicada en GALAPA.

Contamos con personal capacitado y equipos necesarios para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

SAKATECH NIT. 901.216.902-5

Ing. Santiago Pérez Moscote
Gerente

ANEXO 6

COMITÉS DE OBRA

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 33 (VIRTUAL) Pág 1 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

OBJETO CONTRATO: Intervenciones necesarias para la ejecuciónde los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la ciénagade mallorquín en la ciudad de Barranquilla

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN — Barranquilla

FECHA: 6 Octubre/22 — EDU-561-2021

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
DIEGO RADA ALTAHONA	EDUBAR / SUDERVISOR	
IVAN LOPEZ Q.	EDUBAR.	
MERCEDES MUNOZ A.	SDOP.	
JHONNIS DE LUQUE	JCO MALLORQUIN.	
CYNTHIA VILLEGAS A.	INTERVENTORIA.	
DANIELA RODRIGUEZ	INTERVENTORIA.	

II. OBJETO DE COMITE

Hacer seguimiento al estado de avance de las Obras y recibir y dar respuestas a requerimientos de las partes Contratante-Contratista e Interventoria

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	RESPONSABLE	CUMPLE/NO CUMPLE

IV. ORDEN DEL DIA

1) NUEVA DISTRIBUCION DE TANQUE DE AGUA Y PARQUEADERO: EDUBAR.

MEDIANTE OFICIO. DIP-01031 DE FECHA 6 DE OCTUBRE/22 DONDE OB

ENTREGAN ALGUNOS LINEAMIENTOS ACERCA DE LA NUEVA UBICACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y COTAS DE PARQUEADERO ASI:

- EN LA ZONA IZQUIERDA SE DEBE MOVER UN POCO MAS LA UBICACION DEL TANQUE PARA QUE LA VIA DE ACCESO TENGA UN ANCHO FINAL DE 3.50 m
- EN LA ZONA DERECHA SOSTITUIR PARQUEADEROS 17 y 18 POR UNO DE MOTOS Y BICICLETAS YA QUE NO PERMITEN REALIZAR MANIOBRAS DE VEHICULOS EN ESE ESPACIO
- NIVEL DE PISO TERMINADO COTA + 1,68 EN PARQUEADERO. SE DEBE DEFINIR LA ESTRUCTURA DE CONTENCION DEL RELLENO

2) REVISION RCI Y UOZ Y DATOS: LA INTERVENTORIA REMITIO OBSERVACIONES DE AMBOS COMPONENTES Y SE ESPERA LA ENTREGA DE LOS AJUSTES

3) PERMISOS ANI: EDGAR INFORMA QUE YA DURANTE LA PROXIMA SEMANA SE CARGUE EN SECOP EL CONVENIO

4) RESULTADOS ENSAYOS PLATINAS: CONTRATISTA INFORMA QUE SE ENTREGARAN LA PROXIMA SEMANA. EL PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PLATINAS SE ENTREGARA EL 11 DE OCTUBRE.

5) SELLADO DE NUDOS: SE SOLICITA AL CONTRATISTA INICIAR EL TRATAMIENTO DE LOS NUDOS QUE PRESENTA EL DECK Y RETIRAR AQUELLAS PARTES QUE ESTEN POR ENCIMA DE LA NORMA. Y SE SOLICITA INICIAR LA APLICACION DE LA PINTURA.

6) CRONOGRAMA DE EDIFICACIONES: A FINALES DE OCTUBRE LLEGAN LOS PRIMEROS MUROS DE EMSAMBLE. LA CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION ES DE 2 MESES ES DECIR LA ESTACION III ESTARIA PARA FINALES DE DICIEMBRE

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 33 (VIRTUAL) Pág 1 de	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

7) AVANCE DE OBRA: SE ESTAN FABRICANDO LAS PLATINAS DOBLES PARA EL IZADO Y ARMADO DE LAS COLUMNAS DEL LOOP. ESTAN PENDIENTES 29 PILOTES DE MODULOS 40, 41, 42, DECK ESTA INSTALADO HASTA MODULO 9. SE SOLICITA AMPLIAR FRENTES DE TRABAJO EN CORTE, RIOSTRAS, VIGAS PARA PASARELA DE 3m.

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA

VI. PROXIMA REUNIÓN

FECHA 20 (DIA) 10 (MES) 2022 (AÑO)

000 87

uf1 mallorquin	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 34 (VIRTUAL Pág 1 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

OBJETO CONTRATO: Intervenciones necesarias para la ejecuciónde los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la ciénagade mallorquín en la ciudad de Barranquilla

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN — Barranquilla

FECHA: OCTUBRE 20/22 — EDU-561-2021

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
DIEGO RAMA ALTAHONA	SUPERVISOR EDUBAR	
JUAN JOREZ R.	EDUBAR.	
MERCEDES UÑO	SDOP	
FABIAN SUAREZ	INTERVENTORIA	
CYNTHIA VILLEGAS	INTERVENTORIA	
DANIELA RODRIGUEZ	INTERVENTORIA.	
JHORVIS DE LUQUE	JCO MALLORQUIN	
MELISA RAMIREZ	JCO MALLORQUIN	

II. OBJETO DE COMITE

Hacer seguimiento al estado de avance de las Obras y recibir y dar respuestas a requerimientos de las partes Contratante-Contratista e Interventoria

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	RESPONSABLE	CUMPLE/NO CUMPLE

IV. ORDEN DEL DIA

1) PERMISOS ANI: EDUBAR INFORMA QUE SE SUBSANARON TODAS LAS OBSERVACIONES Y SE ESPERA QUE ESTA SEMANA ESTE EN SECOP.

2) VISITAS PROGRAMADAS: ERIBAR SOLICITA QUE A PARTIR DE DICIEM... SE INICIEN VISITAS DEL PUBLICO PROGRAMADAS Y SOLICITA AL CONTRATISTA REMITIR LAS CONDICIONES PARA DICHA VISITA.

3) FRENTES DE OBRA: LA INTERVENTORIA SOLICITA ABRIR NUEVOS FRENTES DE OBRA PARA MITIGAR EL RETRASO ASI: CORTE DE PILOTES DEL MODULO 34 A 50, CORTE DE TACOS E INSTALACION MODULO 34 A 50, RIOSTRAS Y VIGAS LAMINADAS MODULO 34 A 50, ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES.

4) PARQUEADERO: LA ENTIDAD SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR PROPUESTA PARA LA SOLUCION DE CONTENCION DE LA ESTRUCTURA DEL PARQUEADERO

5) ACABADOS DECK Y PLATINAS: EL CONTRATISTA INFORMA QUE SE PROGRAMA EL INICIO DE ESTA ACTIVIDAD A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE

6) RETOMAR INSTALACION DE GEO MEMBRANA: SE SOLICITA AL CONTRATIS... RETOMAR LA INSTALACION DE GEOMEMBRANS EN LOS PILOTES Y RIOSTRAS DE LA PASARELA DE 1,5 m.

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 34 CUIRPUM Pág 3 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA

VI. PROXIMA REUNIÓN

FECHA 18 11 2022
DIA MES AÑO

ANEXO 7

INDICADORES DE CALIDAD

uf1 mallorquin

CONSOLIDADO INDICADORES DE PROCESOS/PROYECTOS

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

INDICADOR	META	FRECUENCIA	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	PROMEDIO
Actividades Ejecutadas / Act Programa	90,00%	Mensual	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**100,00%**
Presentacion oportuna de informes	90,00%	Mensual	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**100,00%**
No. Producto no conforme	Max 3	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
Indice de Quejas	0	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00%**
Evaluación del Desempeño	>34	Durante el Proyecto															Para realizar en Nov/22
Encuesta de Satisfacción	> 12	Durante el Proyecto															Para realizar en Nov/22
Eficacia de Acciones Correctivas y de Mejora	80%	Mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

000033

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	MEDICION INDICADOR :	1 de Octubre – 31 de Octubre de 2022

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

No.	ACTIVIDAD	APLICA SI/NO	CUMPLIO	NO CUMPLIO	OBSERVACION
1	Control sobre los documentos contractuales (polizas, contratos, otro si, etc)	SI	X		
2	Revisión y aprobación de las actas de obra	SI	X		
3	Seguimiento al Programa de Inversiones	SI	X		
4	Revisión y aprobación de análisis de precios no previstos	SI	X		
5	Control del personal asignado por el ejecutor	SI	X		
6	Control estado diario del tiempo	SI	X		
7	Control a equipos y dispositivos de medición	SI	X		
8	Registro fotografico de los avances y eventos diarios de la obra	SI	X		
9	Seguimiento y control al avance de obra (Ejecutado Vs. Programado)	SI	X		
10	Exigencias al contratante de la documentación (Diseños, Planos, etc) que se generen durante el desarrollo del proyecto	SI	X		
11	Seguimiento y control sobre los pagos de aportes parafiscales y seguridad social del contratista	SI	X		
12	Control sobre los metodos constructivos empleados en cada una de las actividades	SI	X		
13	Verificación de medidas y cuantificación de cantidades de obra	SI	X		
14	Control Topografico del proyecto (verificación de trazados y nivelación)	SI	X		
15	Verificación de la calidad de los materiales	SI	X		
16	Reuniones de Comité de Obra	SI	X		
17	Seguimiento a la Matriz de Planificación del Servicio	SI	X		
18	Elaboración Informe Mensual de Interventoría	SI	X		
19	Reuniones de Calidad	N.A.			En Comité de Obra
20	Encuesta de Retroalimentación del cliente	N.A.			
21	Auditorias interna de Calidad	N.A.			
22	Auditorias Externa	N.A.			
23	Evaluación de desempeño de personal interventoria	N.A.			
	TOTAL				

PERIODO		
1 de Octubre – 31 de Octubre de 2022	18	ACTIVIDADES
No. Actividades que aplican en el periodo	18	
No. Actividades que cumplieron en el periodo	18	
No. Actividades que no cumplieron en el periodo	0	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	
META	90%
	100,00%

INFORME DE INDICADORES

FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR:	ACT. EJECUTADAS / ACT. PROGRAMADAS
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Octubre – 31 de Octubre de 2022



Resultado del indicador en el periodo:	100,00%
Comparación del resultado con la meta:	90%
Se dio cumplimiento al indicador	
Comparación del resultado con el histórico:	
Se mantiene	
Clasificar los motivos del no cumplimiento:	
No aplica	
Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:	
No aplica	

MEDICION INDICADOR: 1 de Octubre – 31 de Octubre de 2022

PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMES INTERVENTORIA Y/O ESTUDIO

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.


No.	INFORME	CUMPLIO	FECHA ENTREGADA	FECHA ESPERADA	OBSERVACION
1	Informe Semanal No. 57	SI	10/10/2022	10/10/2022	
2	Informe Semanal No. 58	SI	18/10/2022	18/10/2022	
3	Informe Semanal No. 59	SI	24/10/2022	24/10/2022	
4	Informe Semanal No. 60	SI	31/10/2022	31/10/2022	
5	Informe Mensual No. 14	SI	11/11/2022	11/11/2022	

PERIODO 1 de Octubre – 31 de Octubre de 2022	
No. Informes presentados en el periodo	5
No. Informes entregados a tiempo	5
No. Informes atrasados	0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	
META	**90%**
100,00%	

INFORME DE INDICADORES	FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR:	PRESENTACION OPORTUNA DE INFORMES
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Octubre – 31 de Octubre de 2022

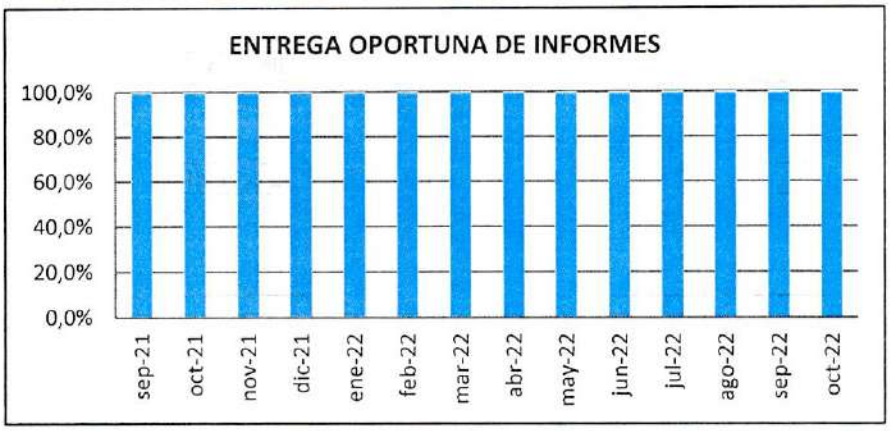

Resultado del indicador en el periodo:	100%
Comparación del resultado con la meta:	90%

Se cumplió con el objetivo de entrega de informes.

Comparación del resultado con el histórico:

Se presentó cumplimiento en este corte

Clasificar los motivos del no cumplimiento:

NA

Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:

NA

INFORME DE INDICADORES

FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR:	CANTIDAD DE PRODUCTO NO CONFORME
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Octubre – 31 de Octubre de 2022

100%



Resultado del indicador en el periodo:	0
Comparación del resultado con la meta:	0%

Se cumplió con el objetivo de entrega de informes.

Comparación del resultado con el histórico:

Se presentó cumplimiento en este corte

Clasificar los motivos del no cumplimiento:

NA

Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:

NA

INFORME DE INDICADORES	FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE QUEJAS
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Octubre – 31 de Octubre de 2022



Resultado del indicador en el período:	0
Comparación del resultado con la meta:	0
Se da cumplimiento sin novedad	
Comparación del resultado con el histórico:	
Se cumple con el indicador	
Clasificar los motivos del no cumplimiento:	
NA	
Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:	
NA	

ANEXO 8

GESTIÓN SOCIAL

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

FECHA O PERIODO:	OCTUBRE DE 2022
PROYECTO:	CONTRATO EDU- 566 – 2021 INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
ESPECIALIDAD:	SOCIAL
PROFESIONAL/ ESPECIALISTA:	MARIELA VILORIA M.

DESARROLLO DEL TEMA

EQUIPO SOCIAL DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Isabella Monterrosa	Especialista Social	Consorcio JCO Mallorquín
Mariela Viloria	Especialista Social	Consorcio UF1 Mallorquín

COMPONENTE GESTION SOCIAL DE OBRA

Proyecto No. 1. Atención Comunitaria

OBJETIVO DEL PROYECTO

Este programa permite mantener un contacto directo con todas las personas de la zona de influencia directa.

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**		

ACTIVIDADES DEL MES

- El contratista mantiene un Profesional Social para la atención comunitaria.
- Se adecuó un correo electrónico para recepción de quejas, reclamos y/o sugerencias. - resocialmallorquin@gmail.com-; Por este medio no se han recibido solicitudes por parte de las comunidades del AID
- El horario de atención comunitaria es de Lunes a Viernes desde las 8.30 a.m. Hasta las 5.00 p.m.
- Para el periodo no se generaron PQRS referentes al proyecto.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Cumplir con la atención de quejas y reclamos	No. de PQRS recibidas/ No. PQRS atendidas	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 2. Comunicación y Divulgación

OBJETIVO DEL PROYECTO

Este programa permite mantener informada a la comunidad con respecto a todo lo relacionado con el proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación		

ACTIVIDADES DEL MES

Reuniones informativas

Para el periodo, se llevó a cabo reunión informativa dirigida a las asociaciones pesqueras del barrio Las Flores, la cual fue precedida por la entidad contratante EDUBAR.

Se conto con el apoyo de la Profesional Social del JCO Mallorquín, quien a su vez expuso a los presentes respecto al impacto social del proyecto en el sector del barrio Las Flores. *Ver anexo -1*



Piezas Divulgativas

- Para el periodo, el contratista elaboró folleto informativo, el cual contiene información importante del proyecto: Esta actividad fue dirigida a los habitantes del corregimiento de la Playa y el barrio las Flores
- Para el periodo, se elaboró y publico cartelera informativa, la cual fue ubicada en el barrio Las Flores- vivienda de la señora *Evelyn Mejía Ariza*; en esta se condensó información relevante de la Unidad Funcional 1, al igual que sus respectivos avances.

Ver Anexo -.2

Entrega de folleto y publicación de cartelera informativa





SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
Descripción del Indicador	**Indicador**	**Periodicidad de evaluación**	**Registro de Cumplimiento**
Cumplir con las convocatorias y reuniones programadas	No. de reuniones programadas/ No. reuniones realizadas	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 3. Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos

OBJETIVO DEL PROYECTO

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	

ACTIVIDADES DEL MES

- Hasta la fecha no ha sido necesario realizar levantamientos de actas de vecindad, el entorno donde se desarrolla la obra se compone de vegetación y cuerpos de agua.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Elaboración de actas de vecindad si el caso lo amerita	No. de actas de vecindad iniciales/actas de vecindad de cierre	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 4 Programa de Cultura Ambiental y Participación Comunitaria

OBJETIVO DEL PROYECTO

Este programa permite mantener un contacto directo con todas las personas de la zona de influencia directa.

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**			

ACTIVIDADES DEL MES

Talleres

Se llevaron a cabo tres (3) jornadas de capacitación, dirigida a los trabajadores del consorcio JCO Mallorquín.

ACTIVIDAD	POBLACIÓN	LUGAR
Taller limpieza Mallorquín	Trabajadores de Obra	Unidad Funcional Mallorquín
Taller Medio Ambiental el Mangle de Mallorquín	Trabajadores de Obra	Unidad Funcional Mallorquín
Taller Resolución de Conflictos	Trabajadores de Obra	Unidad Funcional Mallorquín

Ver anexo No. 3



SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
Descripción del Indicador	**Indicador**	**Periodicidad de evaluación**	**Registro de Cumplimiento**
Realizar jornadas de educación ambiental	No. de talleres programados/No. De talleres realizados	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 5. Generación de Empleo

OBJETIVO DEL PROYECTO

Dar prioridad a la contratación de mano de obra no calificada MONC, y mano de obra calificada, MOC, proveniente del AID del proyecto.


TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	


ACTIVIDADES DEL MES

Fueron realizadas las solicitudes mediante el centro de oportunidades, para personal de carpintería. Hasta la fecha no se cuenta con estas contrataciones, debido a que no ha sido posible encontrar el personal con una hoja de vida idónea para el desarrollo de esta labor.

GENERACION DE EMPLEO	
Personal Mano de Obra Calificada	6
Personal Mano de Obra No Calificada	74
Total, Personal	80

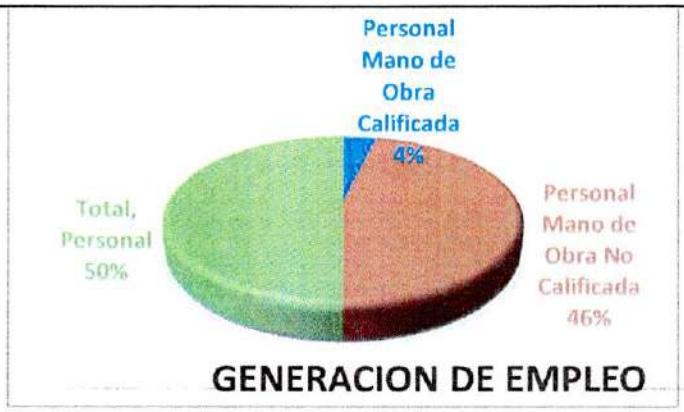

PERSONAL POR SEXO	
Hombres	77
Mujeres	3

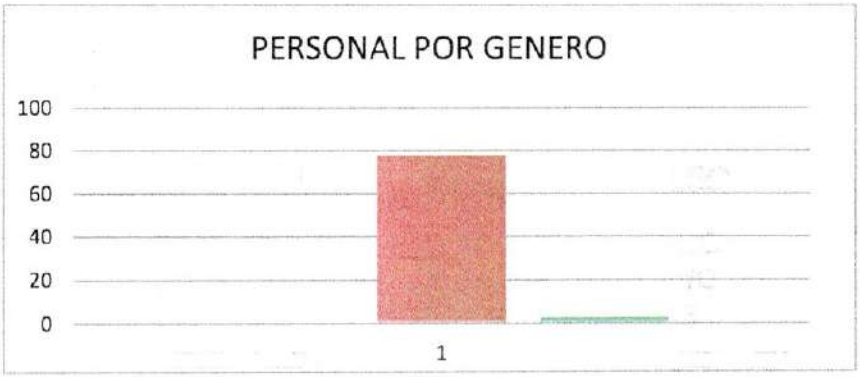

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento

Realizar la contratación de mano de obra local	No. De convocatorias/No. de contrataciones	Mensual	Informe Mensual Entrega de la certificación del Centro de Oportunidades

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

- Elaboración de informes.
- Realizar seguimiento y control de las actividades desarrollas por la gestión social del contratista de obra.
- Revisión y aprobación de informe mensuales elaborados por la gestión social del contratista.

FIRMA:
NOMBRE: **MARIELA VILORIA**

000 99

REGISTRO FOTOGRAFICO

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

uf1 mallorquín

DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS
REGISTRO FOTOGRAFICO

Contratista	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Objeto	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Contrato No	EDU-561-2021		

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA	06/10/2022		
UBICACIÓN	BARRANQUILLA	SECTOR	LAS FLORES
COMENTARIOS	SOCIALIZACION CARTELERA INFORMATIVA		

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA	JUEVES, 6 DE OCTUBRE DE 2022		
UBICACIÓN	BARRANQUILLA	SECTOR	LAS FLORES
COMENTARIOS	ENTREGA DE FOLLETO INFORMATIVO		

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA			
UBICACIÓN	BARRANQUILLA	SECTOR	LAS FLORES
COMENTARIOS	ENTREGA DE FOLLETO INFORMATIVO		

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA			
UBICACIÓN	BARRANQUILLA	SECTOR	LAS FLORES
COMENTARIOS	CARTELERA INFORMATIVA		

Anexo 1
Lista de Asistencia Reunión informativa

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.502.278-2

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.502.278-2	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO: FAM VERSION: 1 FECHA: 12/02/22

PROYECTO: Capina 2 Mallorquín (Reunión Convocada por Edilmar)
LUGAR: Casa de la Cultura las flores
FECHA: 21-10-22 HORA DE INICIO: 9:30 Am HORA FIN: 11:40 Am

ASISTENTES

	C.C.	Tel.	Firma
Soporte	[illegible]	[illegible]	
ASPIRE	[illegible]	[illegible]	
Mayoraza	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Fotografo UAC	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	32164649	3133143648	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Apoyo Logistico	[illegible]	[illegible]	
Escopeta	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Manelin Ochoa	83891529	3686111	
Liliam Galindo	32797520	3686111	
[illegible]	1143140224	3153057144	
Yandira Ibarra	31601125	3018030999	
[illegible]	92.121.252	3005760716	

000101

Anexo 2
Entrega de Piezas Divulgativas

FP-34-00
(24/04/2013)

INFORME TECNICO
PROFESIONAL Y/O
ESPECIALISTAS

ufl mallorquín
CONSORCIO

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

CONTROL DE VOLANTES Y COMUNICADOS

CÓDIGO: FAN-22
VERSIÓN: 1
FECHA: 10/02/22

PROYECTO: Enfoque UF1 ciénaga de Mallorquín (Mallorquín a tu casa) FECHA: 11/10/22

LUGAR: Corregimiento la Playa TIPO DE VOLANTE: Informativo

No.	No. VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA
1	01	Dylan Martínez	Cll 13 # 6 - 110	3152057114	dylan martinez
2	01	Cristian José	Cll 12 - 4 - 140	3243210577	
3	01	David Dennys	Cll 13-6.114	3242903285	
4	01	Marcelo Navarro	Cl 13 - 6 - 124	3242873608	
5	01	Carlos Alvarez	Cll 12 # 7-52	3115830701	
6	01	Sara Vergara F	Calle 12 # 7-14		
7	01		Cll 16 19-19.	3015454520	
8	01	Lucila Palacio	12 c 792		Lucila Palacio
9	01	Urbano Cuello	Cll 13 7-143	3242822410	Urbano
10	01	Karla de Luna	Cll 9.907	3012462241	
11	01	Luis Cabrera H	Cra 8 cll 8 # 131	3007123167	
12	01	Katia Pinto Cotes	Calle 12 # 10 # 27.	3244242465	
13	01	Nelson Ojeda Arellano	Calle 12 # 10-47	3012260241	Nelson Ojeda
14	01	Jhonny Carlos Molina	Calle 12 # 10-37	3024647021	
15	01	Julio Peñaloza G	Calle 10 # 10 60	3014259617	
16	01	Alcy Toro L	Cl 12 # 10-27	3116328744	
17	01	Ramiro Navarro	Cll 9 - 404		
18	01				
19	01				

OBSERVACIONES: las Personas del Corregimiento la playa. Se encontraban muy abiertos a recibir información del avance del mes de octubre

FP-34-00 (24/04/2013)

INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS

uf1 mallorquín CONSORCIO

CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

CONTROL DE VOLANTES Y COMUNICADOS

CÓDIGO: FAM-22
VERSIÓN: 1
FECHA: 09/09/12

PROYECTO: Fabricar Mallorquin Unidad Empresarial Uno. FECHA: 22/12/22

LUGAR: Barrio Las Flores TIPO DE VOLANTE: Informativo - Aviso de obra

No.	No. VOLANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FIRMA
1	01	Ezaud Sanguino	Cll H 109 - 12	3022947556	Ezaud S.
2	01	Limmis Pons	Cr 12 H 13-28	3022079028	Limmis P.
3	01	José Acosta Rico	Los H Mz E-9	3003631526	
4	01	Jesus Ojeda	Calle 12 # 10-52	3044116641	
5	01	Anderson Parra	Cra 13H 91C00	3116911211	
6	01	Omar Lopez M	Calle 19C # 102-28	3014731481	
7	01	Juan Hernandez	Calle 75B # 41-87	324304 n33	
8	01	Yeiver Garay	Calle 16 # 10-33	3013459460	
9	01	Erick Parra	Calle 2B 95 17	3052847658	
10	01	Henry Arroyave	Cra 8 H 89 9	3107285829	Henry U
11	01	Karina Gutierrez	Cr 88 # 109-14	3005644281	
12	01	Angie Vidal Arco	Calle 106 - # 80-33	3012947663	
13	01	Luis David Padilla	Cra 12 # 12-20	3-5273 0836	
14	01	Humberto Rincon	Calle 106 # 130-24	3006631114	
15	01	EVELYN MEJIA	Calle 11 # 92-15	3045930983	EVELYN MEJIA
16	01				
17	01				
18	01				
19	01				

OBSERVACIONES:

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, 06 de octubre de 2022
JCO-068-2022

Señores
ING INGENIERIA DE PROYECTOS

Calle 77B No. 57 - 103 Oficina 907
Edificio Green Towers
Telefax: *+57 (5)* 356 2375 - 368 6111
Barranquilla, Colombia.

REF: CONTRATO DE OBRA Nº EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. – REVISION DE PLANOS Y DISEÑOS.

Estimados señores:

Por medio de la presente notifico que yo Evelyn Mejía Ariza identificado con el número de cedula 1140816182 notifico y afirmo el recibido el día 6 de octubre del presente año una cartera informativa sobre avances técnicos y componentes correspondientes a la unidad funcional número uno del eco parque Mallorquín por la psicóloga social Isabella Monterroza Vásquez identificada con el número de cedula 100 568 0047 y está quedara en mi poder hasta el día 31 de octubre del 2022 y colgada fuera de mi domicilio ubicado en la calle 11#82-15 del barrio Las Flores.

EVELYN MEJIA ARIZA

1140816182

Sur-norte Via a La Playa
Email: resocialmallorquin@gmail.com

Anexo 3

Asistencia Talleres

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.503.273-2

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.503.273-2	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO SAM VERSION 1 FECHA: 12/02/22

PROYECTO: Cooparque Mallorquín (Limpieza Mallorquín)
LUGAR: Campamento Mallorquín OFI
FECHA: 22/2/22 HORA DE INICIO: 7:30 Am HORA FIN: 9:45 Am

ASISTENTES

Nombre	Cedula	Telefono	Cargo
[illegible]	1.[illegible]503	3216505744	[illegible]
Darlis Fernandez	12.623.242	3114408280	Operario
[illegible] Zapata	1143130159	1-6349621	[illegible]
Julian Hamilton	1070823998	3103411231	Julian Hamilton
Energy [illegible]	3741 88 [illegible]	3043898888	[illegible]
Moises Arteaga	1044433.379	3126697397	Moises Arteaga
[illegible]	1001916625	304-336-7425	[illegible]
[illegible]	92435726	3138103448	[illegible]
[illegible]	1007608013	3003952066	[illegible]
Marlon Taludo	84685.250	3017980846	Auxiliar
Isabella Monterrosa V	1007566847	3116926417	Operativo

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273 2

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273 2	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO:FAM VERSION:1 FECHA: 22/02/22

PROYECTO: Cronograma Mallorquín
LUGAR: Campamento Mallorquín OFI
FECHA: 22/6/22 HORA DE INICIO: 7:30 Am HORA FIN: 9:45 Am

ASISTENTES

Nombre	Cedula	Nº celular	firma
[illegible]	12340503	3216565244	[illegible]
Carlos Fermate	12.623.242	3114008286	[illegible]
[illegible] Zapata	[illegible]	3006314221	[illegible]
Julian Pamplona	1076873498	3103411231	Julian Pamplona
Energy Echeverria	3741881	3043858288	[illegible]
Moises Pantoja	1044433379	3128897397	Moises Pantoja
[illegible]	1001976[illegible]	321-336-7475	[illegible]
Luis Carlos [illegible]	72433726	3138103448	[illegible]
[illegible]	1007608013	3203952066	[illegible]
Hader Tafur	8.405.250	3017980846	Hader
Isabella Montero	100 566 0047	3116486427	[illegible]

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT. 901.501.273-2

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT. 901.501.273-2	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO: AM VERSION: 1 FECHA: 12/02/22

PROYECTO: Con-Parque Mallorquín UF1 (Resolución de Conflictos)

LUGAR: Campamento UF1

FECHA: 25/10/22 HORA DE INICIO: 1:40 pm HORA FIN: 2:30 pm

ASISTENTES

Nombres	Cedula	Numero Cel.	Firma
Carlos Tarazona	12643.242	311 480 9236	
Roberto Montalvo	900 568 00 47	311-648-6469	
Paola Burgos Mejia	1 281 093 836	3002624167	
Luis Mendoza G.	1002782080	3004424758	
[illegible]	1234190021	3045949633	
[illegible]	1140505	3116585844	
[illegible]	1140844	3502160688	
[illegible]	72483770	3137803448	
[illegible]	1041423379	3128873997	
[illegible]	32478481	3043858828	
[illegible]	1010865496	1029411281	
Jesus Julio [illegible]	1001916690	321-336-7075	
Hader Toledo	8.485.250	3017980846	
[illegible]	3744 [illegible]	[illegible]	

ANEXO 9

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO 10

BITÁCORA

000108

-Instalación de tacos entre vigueros en eje 6' el cual no fue completado el día de hoy.

-Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Leydis V.

Interventoría

01- OCTUBRE - 2022 SÁBADO

Clima: seco por la mañana y tarde.

Se inician actividades a las 8:00 AM.

PERSONAL FRENTE #3

1- Operador
4- Ayudantes
2- Oficios varios
1- Topógrafo
1- Cadenero

PERSONAL ESTACIÓN 3

1- Vigilante
2- Maestros de obra
1- Oficial
10- Ayudantes

EQUIPO FRENTE #3

Estación total - 4 horas
1- Cabria - 4 horas

EQUIPO ESTACIÓN 3

2- plantas electricas - 5h
1- cortador - 3 horas
1- Telehandler - 0 horas
2- motosierras - 1 hora
30- herramientas menores

Pilotes frente #3

#	Prof.	rechazo	Local.
16A	8,9m	0m	mod 42
16B	8,9m	0m	mod 42.

Se hincaron dos pilotes en el frente #3 sin presentar rechazo. En el frente #2 no se realizó hincado, el personal se encontraba moviendo el equipo.

Estación III: Se realizan actividades de instalación de viguetas módulo 18, instalación de ángulos módulo 18 y instalación de tacos entre viguetas eje 6' y 7'

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

02 DE OCTUBRE DE 2022 - DOMINGO

No se realizan actividades el día de hoy.

RESIDENTE CONTRATISTA — RESIDENTE INTERVEN.

03 DE OCTUBRE DE 2022 - LUNES

clima: seco por la mañana y por la tarde

se inician actividades a partir de 8:00 AM.

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL FRENTE #3
1-Operador	1-Operador
2-Ayudantes	4-Ayudantes
3-Oficios varios	1-Topógrafo
1-Topógrafo	1-Cadenero
1-Cadenero	1-Inspector

PERSONAL ESTACIÓN III

2-Maestros de obra
1-Oficial
8-Ayudantes
1-Operador telehandler
1-Vigilante

EQUIPOS FRENTE #2	EQUIPOS ESTACIÓN III
1-Cabria - 8 horas	1-Telehandler - Dañado
1-Estación total - 8 horas	2-motosierra - 4 horas
EQUIPOS FRENTE #3	2-plantas eléctricas - 8 horas
1-Cabria - 8 horas	1-Cortador - 4 horas
1-Estación total - 8 horas	35-herramientas menores - 8h.

PILOTES FRENTE #2				PILOTES FRENTE #3			
#	prof.	rechazo	local.	#	prof.	rechazo	local.
80A	8m	0m	mod 40	—	—	—	—

En el frente #2 se hincó un pilote sin presentar rechazo mientras que en el frente #3 el personal de hinca se encontraba enderezando la torre.

-Estación III: continua instalación de viguetas en módulo 18, instalación de cenefas eje 8' e instalación de frisos módulo 17

RESIDENTE CONTRATISTA — RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

04 DE OCTUBRE DE 2022 - MARTES

clima: seco por la mañana y por la tarde

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL ESTACIÓN III
- 1 Operador	1 - Vigilante
3 - Ayudantes	1 - Operador telehandler
3 - Oficios varios	2 - Maestros de obra
1 - Topógrafo	3 - Oficiales
1 - Cadenero	11 - Ayudantes.
1 - Inspector	

PERSONAL FRENTE #3

1 - Operador
3 - Ayudantes
3 - Oficios varios
1 - Topógrafo
1 - Cadenero

EQUIPOS FRENTE #2	EQUIPOS ESTACIÓN III
1 - Cabria - 8 horas	2 - Plantas eléctricas - 8 horas
1 - Estación total - 8 horas	30 - Herramientas menores - 8 horas
EQUIPOS FRENTE #3	1 - Telehandler - Dañado
1 - Cabria - 8 horas	1 - Cortador - 5 horas
1 - Estación total - 8 horas	2 - Motosierras - 2 horas

PILOTES FRENTE #2

#	prof	rechazo	local	
80C	8m	0m	mod 40	
80B	11m	0m	mod 40	

PILOTES FRENTE #3

#	prof.	rechazo	local	
14A	8,9m	0m	mod 42.	

En el frente #2 se hincó dos pilotes sin presentar rechazo y en el frente #3 un solo pilote, sin presentar rechazo. Solo se logra hincar un pilote porque la torre estaba abierta y la pesa se salía cuando golpeaba.

Estación III: continúa instalación de viguetas módulos 18 y 19 e instalación de tacos en módulo #22

En los frentes de corte en agua se continúa trabajando en el módulo 8 instalando deck y en el módulo 2.

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

05 DE OCTUBRE DE 2022 - MIÉRCOLES

Clima: nublado por la mañana y por la tarde.
Se inician actividades a partir de las 8:00 AM.

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL E. III
1 - Operador	1 - Operador	1 - vigilante
3 - Ayudantes	3 - Ayudantes	1 - O. telehandler
6 - Oficios varios	1 - Topógrafo	2 - Maestros de obra
1 - Inspector	1 - Cadenero	3 - Oficiales
1 - Cadenero		9 - Ayudantes
1 - Topógrafo		

EQUIPOS FRENTE #2	EQUIPOS ESTACIÓN III
1 - Cabria 1300kg - 8 horas	1 - Telehandler - 8 horas
1 - Estación total - 6 horas	2 - Motosierra - 5 horas
EQUIPOS FRENTE #3	2 - Cortadores - 3 horas
1 - Cabria 1500kg - 8 horas	30 - Herramientas menores - 8 hora
1 - Nivel - 4 horas	2 - Plantas eléctricas - 8 horas

PILOTES FRENTE #2				PILOTES FRENTE #3			
#	prof.	rechazo	local	#	prof	rechazo	local
79A	8m	0m	mod40	14B	8,9 m	0m	mod 42.

-En el frente #2 se hincó un pilote sin presentar rechazo. En el frente #3 se hincó un pilote sin presentar rechazo, la topografía del contratista estuvo marcando los niveles de corte en los módulos 34, 35 y 36; adicionalmente, el equipo lo trasladan a un nuevo punto del módulo 42 distanciado para continuar con el hincado.
- Estación III: mecánicos le realizan arreglos al Telehandler con el fin de quedar operativo nuevamente. Se instalan 12 columnas en cruz y se continúa instalando tacos entre viguetas en módulo 22.

Cynthia Villa
RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE OBRA

06 DE OCTUBRE DE 2022 - JUEVES

clima: nublado por la mañana y por la tarde con lluvia moderada de 2:16 PM a 4:00 PM y lluvia fuerte de 12:34 a 1:00 pm para un total de 2 horas y 50 minutos de lluvia.

Powered by CamScanner

Se inician actividades a partir de las 8:00 AM.

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL ESTACIÓN III
3- Ayudantes	1 -Operador	2 - Maestros de obra
1- Operador	4 - Ayudantes	3 - Oficiales
5- Oficios varios	1 - Topógrafo	9 - Ayudantes
1- Topógrafo	1 - Cadenero	1 - Vigilante
1- Cadenero		1 - Operador telehandler

EQUIPOS FRENTE #2	EQUIPOS ESTACIÓN III
1 - Estación total - 8 horas	1 - Telehandler - 4 horas
1 - Cabria - 8 horas	1 - Cortador - 4 horas
EQUIPOS FRENTE #3	2 - Motosierras - 2 horas
1 - Cabria - trabajos de soldadura	2 - Plantas eléctricas - 6 horas
1 - Estación total - 8 horas	30 - Herramientas menores - 6,3 h

PILOTES FRENTE #2				PILOTES FRENTE #3			
#	Prof.	rechazo	Local.	#	prof.	rechazo	local.
798	11m	0m	mod 40	—	—	———	———
79C	8m	0m	mod 40				

-En el frente #2 se hincaron dos pilotes en el módulo 40 sin presentar rechazo. En el frente #3 no se hincaron pilotes por trabajos de soldadura, movimiento del equipo y lluvia.

-Estación III: instalación de tacos entre vigas laminadas en módulo 21, instalación de frisos en módulo 18 y se realizan trazados y nivelaciones en estación #3 para iniciar con instalación de deck.

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE OBRA

07 DE OCTUBRE DE 2022 - VIERNES

Clima: nublado por la mañana y por la tarde, lluvia moderada de 7:30 am - 3:00 pm para un total de 7 horas y 30 minutos. se inician actividades a las 3:00 pm cuando cesa la lluvia.

PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Operador	———	2 - maestros de obra
3 - Ayudantes		3 - Oficiales
1 - Cadenero		9 - Ayudantes
		1 - vigilante
		1 - O. Telehandler

Powered by CamScanner

EQUIPOS FRENTE #2

EQUIPOS FRENTE #3

1 - Cabria

EQUIPOS ESTACIÓN III

2 - Plantas eléctricas - 1 hora
2 - motosierras - 1 hora
1 - Telehandler - 0 horas
1 - Cortador - 2 horas
30 - Herramientas menores - 2 horas

PILOTES FRENTE #2

#	Prof.	rechazo	Local
—	—	———	———

PILOTES FRENTE #3

#	Prof.	rechazo	Local
168	8,9m	0m	mod 42.

- En el frente #2 no se hincó ningún pilote, se realizan movimientos del equipo hacia módulo 42.
- En el frente #3 se comienza a laborar a las 2:30 pm, se hinca un pilote sin presentar rechazo.
- En estación III: continúa instalación de viguetas en módulo 19, se sigue la nivelación y trazado, e instalación de tacos entre vigas laminadas en módulo #21.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

08 DE OCTUBRE DE 2022 - SÁBADO

clima: seco por la mañana y por la tarde
se inician actividades a las 8:00 AM

PERSONAL FRENTE #2

PERSONAL FRENTE #3

2 - Operadores
7 - Ayudantes
1 - Topógrafo
2 - Cadeneros

PERSONAL ESTACIÓN III

2 - Maestros de obra
3 - Oficiales
10 - Ayudantes
1 - Vigilante

EQUIPOS FRENTE #2

EQUIPOS FRENTE #3

1 - Cabria - 2 horas

EQUIPOS ESTACIÓN III

2 - motosierras - 4 horas
1 - Cortador - 3 horas
2 - Plantas eléctricas - 6 horas
30 - Herramientas menores - 6 horas
1 - Telehandler - 0 horas

En el frente #2 no se realiza hincado, el equipo queda fuera de servicio hasta nuevo aviso. En el frente #3 el equipo presenta daños, se pasa el aceite a donde debe ir el combustible

Powered by CamScanner

000111

se suspende a las 10:00 AM para arreglos. En estación III se instalan tacos entre vigas laminadas y se realiza nivelación y trazados. En los módulos 15 y 16 se realiza nivelación y alineación de frisos.

RESIDENTE INTERVENTORÍA — RESIDENTE OBRA

09 DE OCTUBRE DE 2022 – DOMINGO

NO se programan actividades este día.

RESIDENTE INTERVENTORÍA — RESIDENTE DE OBRA

10 DE OCTUBRE DE 2022 – LUNES

Clima nublado por la mañana y por la tarde, se presentan lluvias moderadas desde la 1:14 pm hasta las 2:05 pm. Se inician actividades a partir de las 8:00 AM.

PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL ESTACIÓN III
2 - Operadores	2 - Maestros de obra
5 - Ayudantes	3 - Oficiales
3 - Oficios varios	11 - Ayudantes
2 - Cadeneros	1 - Vigilante
2 - Topógrafos	

EQUIPOS FRENTE #3	EQUIPOS ESTACIÓN III
1 - Cabria - 4 horas	1 - Cortador - 8 horas
2 - Estaciones totales - 8 horas	2 - Plantas eléctricas - 7 horas
1 - Nivel - 8 horas	2 - Motosierras - 3 horas
	30 - Herramientas menores - 8 horas

PILOTES FRENTE #3

#	prof.	rechazo	local.
15C	8,9m	0m	mod 42
16A	8,9m	0m	mod 42

En el frente #3 se hincaron dos pilotes sin presentar rechazo. En el módulo 17 se realiza una nivelación y alineación de frisos En estación III se están instalando tacos entre las vigas laminadas, nivelación y trazados.

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

11 DE OCTUBRE DE 2022 - MARTES

clima: seco por la mañana y nublado por la tarde, lluvia moderada de 1:45 a 3:04 pm

se inician actividades a partir de las 8:00 am

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL FRENTE #3	ESTACIÓN III
1- Operador	1- Operada	2- maestros de obra
3- Ayudantes	4- Ayudantes	3- Oficiales
4- Oficios varios	1- Topógrafo	13- Ayudantes
1- Topógrafo	1- Cadenero	1- vigilante
1- Cadenero		
1- Inspector		

EQUIPOS FRENTE #2	EQUIPOS FRENTE #3	EQUIPOS ESTACIÓN 3
1- Cabria -5 horas	1- Cabria -5 horas	1- Cortador -5 horas
	2- Estaciones totales	2- Plantas electricas-8
	1- Nivel - 0 horas	2- Motosierras - 3 horas
		30- H. menores - 8 horas

PILOTES FRENTE #3

#	Prof.	rechazo	local
14E	8,9m	0m	Mod 42.
14D	8,9m	0m	mod 42.

En el frente #2 no se realiza hincado, se moviliza el equipo hacia el módulo 42.

En el frente #3 se hincaron dos pilotes sin presentar rechazo.

Se continúa con la instalación de frisos en módulo 17.

En la estación 3 se cortan parales para barandas y continua la instalación de tacos entre vigas laminadas. Fin deck en mod 8.

Cynthia Villegas.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

12 DE OCTUBRE DE 2022 - MIÉRCOLES

clima: seco por la mañana y por la tarde.

se inician actividades a las 8:00 AM.

PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL ESTACIÓN #3
1- Oficios varios	2- Maestros de obra
6- Ayudantes	3- Oficiales
2- Operadores	13- Ayudantes
	1- vigilante
	1- Operador telehandler.

Powered by CamScanner

EQUIPOS FRENTE #3	EQUIPOS ESTACIÓN #3
2 - Estaciones totales - 8 horas	2 - Motosierras - 5 horas
1 - Nivel - 8 horas	2 - plantas eléctricas - 8 horas
1 - cabria - 8 horas	1 - Cortador - 4 horas
	1 - Telehandler - 1 hora
	35 - Herramientas menores - 8 horas

PILOTES FRENTE #3

#	prof.	rechazo	Local.
13C	8,9m	0m	mod42
13B	8,9m	0m	mod42
13A	8,9m	0m	mod42

En el frente #2 no se realizan trabajos. En el frente #3 se hincaron tres pilotes en el módulo 42 sin presentar rechazo.

- En estación 3 se continúa con la instalación de tacos entre vigas laminadas.
- Se inician labores de instalación de barandas en módulo 15.
- Instalación de viguetas en módulo 20.
- Instalación de ángulos en módulo 21.
- Instalación de vigas transversales en módulo 23.
- Instalación de tacos entre vigas laminadas en módulo 25.
- En el módulo 9 se inicia instalación de ~~piso deck~~.

RESIDENTE INTERVENTORÍA — RESIDENTE DE OBRA

13 DE OCTUBRE DE 2022 - JUEVES

Clima: nublado por la mañana y por la tarde, lluvia moderada de 11:40 am a 12:16 pm y lluvia fuerte 12:23 pm a 3:50 pm

Se inician actividades a partir de las 8:00 AM

PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL ESTACIÓN # 3
5 - Ayudantes	2 - Maestros de obra
2 - Operadores	3 - Oficiales
1 - Oficios varios	16 - Ayudantes
1 - Topógrafo	1 - Vigilante
1 - Cadenero	

EQUIPOS FRENTE #3	EQUIPOS ESTACIÓN #3
1 - Estación total - 4 horas	1 - Cortador - 5,2 horas
1 - Nivel - 4 horas	2 - Motosierras - 4 horas
1 - Cabria - 4 horas	35 - Herramientas menores - 5,2 horas
	2 - plantas eléctricas - 5,2 horas

Powered by CamScanner

PILOTES FRENTE #3

#	prof.	rechazo	local	
12B	8,3m	0m	mod 42	
12A	8,9m	0m	mod 42	

El frente #2 sigue fuera de servicio. En el frente #3 se hincaron dos pilotes en el módulo 42 sin presentar rechazo.

- En estación 3 se inicia instalación de viguetas
- módulo 21: instalación de viguetas
- módulo 22: instalación de ángulos
- módulo 26: instalación de tacos entre vigas laminadas
- módulo 15: instalación de barandas

Cynthia Villegas.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

28 DE OCTUBRE DE 2022 - VIERNES

clima: nublado por la mañana y seco por la tarde

se inician actividades a las 8:00 am.

PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Inspector	2 - Maestros de obra
2 - Operadores	3 - Oficiales
3 - Torreros	13 - Ayudantes
3 - Ayudantes	1 - vigilante
1 - Oficial	
1 - Cadenero	
1 - Oficios varios	

EQUIPOS FRENTE #3	EQUIPOS ESTACIÓN 3
1 - Cabria - 8 horas	1 - cortador - 8 horas
1 - Estación total - 8 horas	4 - Plantas eléctricas - 8 horas
	2 - Motosierras - 8 horas
	35 - Herramientas menores - 8 horas

PILOTES FRENTE #3

#	prof.	rechazo	local	
11A	8,3m	0m	mod 42	
11B	8,3m	0m	mod 42	

En el frente #2 sigue fuera de servicio el equipo. En el frente #3 se hincaron dos pilotes en el mod 42 sin presentar rechazo.

- Estación 3: continúa instalación de viguetas.
- módulo 15: continúa instalación de barandas
- módulo 20: continúa instalación de viguetas
- módulo 27: instalación de tacos entre vigas laminadas.

Powered by CamScanner

RESIDENTE INTERVENTORÍA RESIDENTE DE OBRA

15 DE OCTUBRE DE 2022 - SÁBADO

Clima seco por la mañana.

Se inician actividades a las 8:00 am

PERSONAL FRENTE #3

No había personal.

PERSONAL ESTACIÓN 3

4 - Oficiales

15 - Ayudantes

1 - vigilante

-En el frente #3 no se realizaron actividades, no hay pilotes.

-En estación #3, se continúa instalando vigas laminadas y viguetas en el módulo 23.

-En el frente #2 se mueve el equipo a terreno firme para ser desarmado.

PERSONAL FRENTE #2

1 - Inspector

2 - Operadores

3 - Ayudantes

2 - torreros

1 - Oficios varios

- Se termina de instalar deck en módulo 9.

RESIDENTE INTERVENTORÍA RESIDENTE DE OBRA

16 DE OCTUBRE DE 2022 - Domingo

No se programan actividades en ningún frente de trabajo.

RESIDENTE INTERVENTORÍA RESIDENTE DE OBRA

17 DE OCTUBRE DE 2022 - LUNES FESTIVO

No se programan actividades en ningún frente de trabajo.

RESIDENTE INTERVENTORÍA RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

18 DE OCTUBRE DE 2022 - MARTES

Clima: nublado por la mañana y por la tarde, se presentan lluvias fuertes desde las 8:12 am - 8:53 am, 11:04 am - 12:00 pm y de 12:55 pm - 1:52 pm.

Se inician actividades a las 8:00 am

PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Torrero	2 - Maestros de obra
3 - Ayudantes	3 - Oficiales
2 - Oficios varios	16 - Ayudantes
	1 - vigilante
EQUIPOS FRENTE #3	- En el frente #3 se continúa desarmando el equipo.
1 - Cabria - 6 horas	
EQUIPOS ESTACIÓN 3	- Continúa instalación de viguetas en estación 3.
1 - Cortador - 5,3 horas	
4 - Plantas eléctricas - 5,3 horas	- Instalación de vigas laminadas en módulo 27 y 28
35 - Herramientas menores - 5,3 horas	
2 - Motosierras - 3 horas	- Instalación de viguetas módulo 22

- Instalación de barandas módulo 15.
- Instalación de ángulos módulo 23.

Cynthia Villegas — RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

19 DE OCTUBRE DE 2022 - MIERCOLES

Clima: seco por la mañana y por la tarde.

se inician actividades desde las 8:00 am

PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Operador	2 - Maestros de obra
2 - Torreros	3 - Oficiales
2 - Ayudantes	1 - Vigilante
2 - Oficios varios	16 - Ayudantes
EQUIPOS FRENTE #3	EQUIPOS ESTACIÓN 3
1 - Cabria - 5 horas	2 - Motosierras - 8 horas
8 - Herramientas menores - 5 horas	1 - Cortador - 8 horas
	4 - Plantas eléctricas - 8 horas
	35 - Herramientas menores - 8 horas

En el frente #3 se desarma y traslada lo que resta del equipo.

Powered by CamScanner

- Estación 3: instalación de frisos.
- módulo 16: Instalación de barandas
- módulo 24: instalación de ángulos
- módulo 29: instalación de tacos entre vigas ~~terminadas~~

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

20 DE OCTUBRE DE 2022 - JUEVES

clima: seco por la mañana y nublado por la tarde, lluvia fuerte de 1:40pm a 2:40pm.

Se inician actividades a las 8:00 am.

PERSONAL FRENTE #2

1 - Operador
1 - Cadenero
4 - Ayudantes
1 - Oficios varios

PERSONAL ESTACIÓN 3

2 - Maestros de obra
3 - Oficiales
1 - Vigilante
1 - Topógrafo
1 - Cadenero
16 - Ayudantes

EQUIPOS FRENTE #2

1 - Cabria - Desmonte - 8 horas

EQUIPOS ESTACIÓN 3

4 - plantas eléctricas - 7h
1 - Cortador - 5 h
2 - Motosierras - 3h
40 - Herramientas menores - 7h

- En el frente #2 se continúa desarmando el equipo. En el frente #3 aún no se retoman trabajos por falta de pilotes.
- En estación 3 se continúa instalando frisos
- En módulo 16 y 17 se continúa con la instalación de barandas

- En módulo 30 se instalan tacos entre ~~vigas terminadas~~

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

21 DE OCTUBRE DE 2022 - VIERNES

clima: nublado por la mañana y por la tarde, lluvia fuerte de 11:09 am - 11:50 am y 1:30 pm - 2:00 pm.

Se inician actividades a las 8:00 am.

Powered by CamScanner

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Operador	1 - Vigilante
4 - Ayudantes	2 - Maestros de obra
1 - Oficios varios	3 - Oficiales
	16 - Ayudantes

EQUIPOS FRENTE #2
1 - Cabria - Desmonte - 8h
8 - Herramientas menores - 8h

EQUIPOS ESTACIÓN 3
2 - Motosierras - 4 horas
1 - Cortador - 4 horas
4 - Plantas eléctricas - 6,5 h
35 - Herramientas menores - 6,5h

- En el frente #2 se continúa desarmando y trasladando el equipo.
- En el frente #3 aún no hay pilot
- módulo 15: instalación de geomembranas en pilotes y riostras.
- módulo 17: instalación de parales para barandas.
- módulo 21: instalación de frisos.
- módulo 23: instalación de viguetas
- módulo 30: instalación de tacos entre vigas laminadas
- módulo 10: finaliza instalación de deck.
- módulo 2: se termina de instalar viga laminada de 13x50 para cubierta

RESIDENTE INTERVENTORIA | RESIDENTE DE OBRA

22 DE OCTUBRE DE 2022 - SÁBADO

clima: nublado por la mañana
se inician actividades a las 8:00 am

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL ESTACIÓN 3
No había personal de trabajo en el frente.	2 - Topógrafos
	1 - Cadenero
	1 - Vigilante
	2 - Maestros de obra
	3 - Oficiales
	16 Ayudantes.

EQUIPOS FRENTE #2
1 - Cabria - 0 horas

EQUIPOS ESTACIÓN 3
2 - motosierras - 4 horas
4 - Plantas eléctricar - 4h
1 - Cortador - 4 horas
40 - Herramientas menores - 4 horas

- En el frente no se realizan actividades
- módulo 17: continúa instalación de parales de barandas
- módulo 21: instalación de friss

Powered by CamScanner

000115

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

23 DE OCTUBRE DE 2022 – DOMINGO

NO se programan actividades este día

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

24 DE OCTUBRE DE 2022 – LUNES

clima: nublado por la mañana y por la tarde, lluvia fuerte desde 1:19 pm a 2:08 pm y de 3:00 pm a 3:31 pm.

PERSONAL FRENTE # 2
1 - Operador
2 - Ayudantes

PERSONAL ESTACIÓN 3
2 - Maestros de obra
1 - Vigilante
3 - Oficiales
17 - Ayudantes

EQUIPOS FRENTE #2
1 - Cabria - 8 horas
1 - E Oxicorte - 8 horas

EQUIPOS ESTACIÓN 3
2 - motosierras - 6,4 h
4 - Plantas eléctricar - 6,4 h
1 - Cortador - 6,4 h
40 - Herramientas menores - 6,4 h

- En el frente #2 se continúa desarmando y trasladando el equipo y se cortan tornillos con equipo de oxicorte
- Estación 3: se continúa instalando viguetas, refuerzo de pernos y columnas.
- módulo 17: Instalación de parales para baranda
- módulo 22: instalación de pernos en vigueta reforzada
- módulo 23: instalación de viguetas
- módulo 28: corte de pilotes
- módulo 30: instalación de tacos entre vigas laminadas

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

25 DE OCTUBRE DE 2022 – MARTES

clima: nublado por la mañana y por la tarde, lluvia moderada de 8:10 am - 8:49 am y 11:46 am a 12:45 pm, lluvia fuerte desde 1.59 pm a 2:15 pm para un total de 1 hora y 54 minutos se inician actividades a las 9:00 am

Powered by CamScanner

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Operador	2 - Maestro de obra
2 - Ayudantes	3 - Oficiales
1 - Inspector	1 - Vigilante
2 - Topógrafos	15 - Ayudantes
2 - Cadeneros	

EQUIPOS FRENTE #2	EQUIPOS ESTACIÓN 3
1 - Cabria - 8 horas	2 - motosierras - 4 horas
8 - Herramientas menores - 8 h	4 - Plantas eléctricas - 6 horas
2 - Niveles - 0 horas	40 - Herramientas menores - 6 horas
	1 - Cortador - 4 horas

- Frente #2: se continúa desarmando y trasladando equipo y no se continúa marcando las cotas de corte programadas
- Estación 3: se continúa con la instalación de viguetas y fri
- módulo 18: instalación de parales para barandas
- módulo 23: instalación de viguetas
- módulo 31 y 32: instalación de tacas entre vigas laminadas
- módulo 33: instalación de vigas laminadas

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE OBRA

26 DE OCTUBRE DE 2022 - MIÉRCOLES

clima: seco por la mañana y por la tarde.
se inician actividades a las 8:00 am.

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Operador	2 - Maestros de obra
2 - Ayudantes	3 - Oficia
2 - Topógrafos	1 - vigilante
2 - Cadeneros	15 - Ayudantes

EQUIPOS FRENTE #2	EQUIPOS ESTACIÓN 3
1 - Cabria - Desmonte - 8h	2 - motosierras - 5 horas
8 - Herramientas menores - 8 h	40 - Herramientas menores - 8 horc
2 - Niveles - 5 horas	1 - Cortador - 8 horas
	4 - plantas eléctricas - 8 horas

- En el frente #2 se continúa desarmando y trasladando el eq
y se terminan de marcar las cotas de corte hasta el módulo 30

Powered by CamScanner

- Estación 3: se continúa instalando frisos.
- módulo 18: continúa instalación de parales para barandas.
- módulo 15: se instalan tacos de refuerzos de pie amigos para parales de baranda e instalación de pie amigos
- módulo 21: instalación de frisos y viguetas
- módulo 11: instalación de riostras ϕ17,24 riostras.
- módulo 2: instalación vigas laminadas 13x50 para cubierta

RESIDENTE INTERVENTORIA | RESIDENTE DE OBRA

27 DE OCTUBRE DE 2022 - JUEVES

clima: seco por la mañana y por la tarde.
se inician actividades a las 8:00 am

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Operador	1 - Vigilante
2 - Ayudantes	2 - Maestros de obra
3 - Topógrafos	3 - Oficiales
3 - Cadeneros	15 - Ayudantes
EQUIPOS FRENTE #2	**EQUIPOS ESTACIÓN 3**
1 - Cabria - 8 horas	2 - motosierras - 4 horas
8 - Herramientas menores - 8 h	1 - Cortador - 7 horas
3 - Nivel - 8 horas	4 - Plantas electricas - 8 horas
	46 - Herramientas menores - 8 horas

- En el frente #2 continúa desarmándose y trasladando el equipo, se verifican y corrigen cotas de corte marcadas por las comisiones topográficas del contratista en el módulo 36.
- En estación 3, no se realizan actividades.
- módulo 15: instalación de pie de amigos
- módulo 19: instalación de parales para barandas
- módulo 22: corte de pernos
- módulo 23: instalación de frisos
- módulo 24: instalación de viguetas
- módulo 30: corte de pilotes
- módulo 11: instalación de riostras ϕ17,18 riostras
- módulo 12: instalación de riostras ϕ17,6 trabajadas por el día.

RESIDENTE INTERVENTORIA | RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

28 DE OCTUBRE DE 2022 - VIERNES

Clima: seco por la mañana y por la tarde
se inician actividades a las 8:00 am.

PERSONAL FRENTE #2	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Operador	3 - Oficiales
1 - Inspector	2 - Maestros de obra
2 - Ayudantes	1 - Vigilante
4 - Oficios varios	14 - Ayudantes
1 - Topógrafo	
2 - Cadeneros	

EQUIPOS FRENTE #2	EQUIPOS ESTACIÓN 3
1 - Cabria - 8 horas	4 - Plantas eléctricas - 8 horo
8 - Herramientas menores - 8h	1 - Cortador - 8 horas
7 - Nivel - 6 horas	2 - Motosierras - 3 horas
	40 - Herramientas menores - 8

- Frente #2: se continúa desarmando y trasladando el equipo. se verifican las cotas de corte marcadas por las comisiones topográficas del contratista.
- Estación 3: no se realizan actividades.
- módulo 16 y 17: instalación de tacos para refuerzo de pie amigos de parales para barandas.
- módulo 17: Instalación de parales para barandas
- módulo 21: instalación de frisos
- módulo 25: instalación de ángulos
- módulo 1: instalación de barandas
- módulo 2: corte de vigas laminadas 13X50
- módulo 12 y 13: instalación de riostras ϕ 17, 18 riostras instaladas.
- módulo 30, 31, 32 y 33: corte de pilotes.

Magaliza Villegas A.
RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA

29 DE OCTUBRE DE 2022 - SÁBADO

clima: seco por la mañana y por la tarde
se inician actividades a las 8:00 am

Powered by CamScanner

000117

PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Operador	1 - Vigilante
4 - Ayudantes	2 - Maestro de obra
4 - Oficios varios	3 - Oficiales
1 - Inspector	15 - Ayudantes
2 - Topógrafos	
2 - Cadeneros	

EQUIPOS FRENTE #3	EQUIPOS ESTACIÓN 3
1 - Cabria - 5 horas	2 - Motosierras - 4 horas
8 - Herramientas menores - 5h	4 - plantas eléctricas - 5 horas
2 - Niveles - 5 horas	1 - Cortador - 4 horas
	45 - Herramientas menores - 5h

- FRENTE #3: se moviliza equipo a punto de hincado y se continúa verificación de cotas de corte del módulo 42-48.
- Estación 3 no se realizan actividades.
- Módulo 15: corte de tacos para pie amigos
- Módulo 16: instalación de pie amigos
- Módulo 20: instalación de parales para barandas
- Módulo 23: instalación de frisos
- Módulo 24: instalación de frisos
- Módulo 25: instalación de ángulos
- Módulo 11: instalación riostras ϕ15 (4 unidades)
- Módulo 13: instalación de riostras ϕ17 (4 unidades)

RESIDENTE INTERVENTORÍA — RESIDENTE OBRA

30 DE OCTUBRE DE 2022 — DOMINGO

NO se programan actividades el día de hoy

RESIDENTE INTERVENTORÍA — RESIDENTE DE OBRA

31 DE OCTUBRE DE 2022 — LUNES

clima: seco por la mañana y por la tarde

se inician actividades a las 8:00am

Powered by CamScanner

PERSONAL FRENTE #3	PERSONAL ESTACIÓN 3
1 - Operador	1 - vigilante
1 - inspector	3 - Oficiales
4 - Ayudantes	2 - Maestros de obra
4 - Oficios varios	14 - Ayudantes
2 - Topógrafos	
2 - Cadeneros	

EQUIPOS FRENTE #3	EQUIPOS ESTACIÓN 3
1 - Cabria - 8 horas	1 - Cortador - 8 horas
8 - Herramientas menores - 8 h	4 - Plantas eléctricas - 8 horas
2 - Niveles - 0 horas	2 - Motosierras - 0 horas
	40 - Herramientas menores - 8h

PILOTES FRENTE #3

#	prof.	rechazo	local
12C	8,3m	0m	M42

- En el frente # 3 se hinca un pilote sin presentar rechazo y s verifica cotas de corte M49 y M5
- módulo 15: inicia instalación de piso deck
- módulo 17: instalación de pie de amigos
- módulo 20: instalación de paraler para barandas
- módulo 25: instalación de ángulos
- módulo 11 instalación riostras ϕ 15, 24 riostras instaladas
- módulo 13: instalación riostras ϕ 17, 22 riostras instalada
- módulo 2: instalación vigas laminadas 13x50, 14,86 ml
- módulo 1: instalación barandas

RESIDENTE INTERVENTORÍA

RESIDENTE OBRA

Powered by CamScanner

uf1 mallorquín

ANEXO 11

INFORME Y ASPECTOS SST

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	000139 FP-34-00 (24/04/2013)

FECHA O PERIODO:	OCTUBRE DE 2022
PROYECTO:	CONTRATO EDU - 566 – 2021 INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
ESPECIALIDAD:	SST
PROFESIONAL/ ESPECIALISTA:	CRISTHIAN BENAVIDES NEGRETE

DESARROLLO DEL TEMA

El presente informe reporta el seguimiento a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la Interventoría, desarrollada durante el período comprendido entre 01 al 31 de octubre del 2022, en ejecución del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 adjudicado al Consorcio JCO Mallorquín.

Al tenor de lo anterior expuesto es claro que, para la realización de los informes, la Interventoría se basó en los anexos entregados por el Contratista de Obra, y a los formatos del PEGSA que desde la Entidad se exija. De igual manera estos anexos soportan la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el Contratista de Obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas del Plan de Gestión del Riesgo y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. INDUCCIÓN RE-INDUCCIÓN.

Para el periodo reportado el Contratista manifiesto la realización de las inducciones, se presentó registros de asistencia, pero no se evidenció la evaluación de la inducción.

Las inducciones deben ser encaminadas a conocer los temas relevantes del sistema de gesto de seguridad y salud desarrollado para el proyecto, dentro de los cuales se debe hace referencia a: Políticas SST, Políticas de alcohol y Drogas, Objetivos y Metas, Responsabilidades en el sistema, Reglamento

Interno, COPASST, Emergencias, Brigada, etc. Dentro de los temas de la inducción se debe incluir lo referente al protocolo de bioseguridad y las medidas para la prevención de COVID-19, sus variantes y medidas para prevenir su propagación.

2. EXÁMENES OCUPACIONALES

Para el desarrollo del programa de medicina preventiva y del trabajo el contratista de obra realiza al personal que ingresa a laborar los respectivos exámenes ocupacionales de ingreso dando así cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.
El objetivo de este programa es conocer el estado de salud físico y mental de los potenciales y actuales empleados, permitiendo al empleador contar con una adecuada organización del recurso humano y un ambiente laboral sano, para poder desempeñar las actividades que le sean asignadas, los exámenes ocupaciones se deben realizar de acuerdo a un profesiograma el cual es un documento técnico - administrativo que organiza la interrelación, interactuación e interdependencia de un puesto de trabajo desde los puntos de vista: de Gestión del Talento Humano, el de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que existen y los que cumplen los trabajadores.

Dentro de los beneficios que tiene la implementación de un profesiograma es en cuanto a la contratación de personas que ocuparan puestos vacantes:

- Permite la inducción y contratación adecuada.
- Clasifica los puestos y los ubica de acuerdo a una estructura técnico – administrativa.
- Permite la actualización de manera periódica de la GTH.
- Permite que las personas contratadas y no contratadas no se vean perjudicadas.
- Sirve como herramienta para obtener los índices de SST, de manera especial los índices proactivos.
- Cumple con la normativa legal.

El Contratista no reporto ingresos durante el periodo.

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se presentaron los siguientes equipos durante el periodo

EQUIPO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	OPERADOR
CABRIA 1500 KG – En zona húmeda	Artefacto utilizado para levantar pesos para hincado de pilotes	Roger Alvarado
TELEHANDLER CAT TH103	Levantamiento de carga	Carlos Manuel Pertuz Cabarcas

Fuente: Autor

4. VEHÍCULOS

El contratista cuenta con un vehículo para la logística y apoyo del proyecto.

5. ACTIVIDADES DE INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y CHARLAS

Capacitaciones y Charlas

El presente programa de capacitación está orientado a contribuir a la gestión estratégica de la prevención del riesgo, y a su vez es una herramienta de orientación y acompañamiento, dirigido a los trabajadores en las actividades de dragado, teniendo como resultado, trabajadores sensibilizados, dispuestos a aportar con responsabilidad el autocuidado, para prevenir accidentes y enfermedades de tipo laboral inherentes a su actividad. Se presentaron evidencias en la realización de actividades de sensibilización y prevención referente a temas de SST, El Contratista se apoyó para la realización de las charlas y capacitaciones con personal de la ARL.

FECHA	TEMA
03-10-2022	Actos y Condiciones Inseguras
08-10-2022	Primeros Auxilios
10-10-2022	Importancia del uso de los EPPs
15-10-2022	Primeros Auxilios
22-10-2022	Búsqueda y Rescate
24-10-2022	Autocuidado, conservación visual identificación de peligros
24-10-2022	Prevención en Riesgo Mecánico
25-10-2022	Inducción

FECHA	TEMA
31-10-2022	Seguridad en Campo

Fuente: COSORCIO JCO MALLORQUIN

6. PERSONAL ACTIVO EN EL PROYECTO DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo trabajado se conto con el siguiente personal que se registra a continuación:

ITEM	C.C	NOMBRES	CARGO
1	7.693.002	CARLOS LEONARDO DUSSAN GARCIA	INGENIERO AMBIENTAL
2	1.143.130.109	DEIVIS RICARDO ZUÑIGA CASTRO	CONDUCTOR
3	8.706.660	JAVIER ENRIQUE VELEZ CAMARGO	DIRECTOR DE OBRA
4	1.123.991.100	JHORVIS JOVAN DE LUQUE ARIZA	INGENIERO RESIDENTE
5	72.340.503	JOSE GREGORIO ATENCIO SIERRA	OFICIOS VARIOS
6	72.215.192	LUIS ALBERTO NUÑEZ HERNANDEZ	OFICIOS VARIOS
7	1.140.888.631	MELISSA RAMIREZ AHUMADA	INGENIERA ADMINISTRATIVA Y CALIDAD
8	1.129.572.070	EDER ENRIQUE AGAMEZ SALAS	OPERADOR
9	1.098.648.986	DIANA MARCELA DAZA BECERRA	SST
10	1.005.680.047	ISABELLA STEFANIA MONTERROZA VASQUEZ	PSICÓLOGA SOCIAL
11	1.134.190.011	NERIO ARTURO GONZALEZ	OFICIOS VARIOS
12	79.244.484	PEDRO PAMPLONA SUAREZ	MAESTRO
13	1.020.825.448	FRANCISCO JULIAN PAMPLONA LEAL	OFICIAL DE OBRA
14	1.122.627.267	JOSE HERLEY RODRIGUEZ RAMIREZ	OFICIAL DE OBRA
15	11.444.618	JUAN CARLOS BERMUDEZ RAMIREZ	OFICIAL DE OBRA
16	80.470.077	NEVARDO MENDIVELSO	OFICIAL DE OBRA
17	85.487.023	DAIRO ALBERTO ALVAREZ VEGA	OFICIAL DE OBRA
18	12.448.524	JESUS ENRIQUE FREYLE ALTAHONA	AYUDANTE DE OBRA
19	1.044.433.834	GERMAN JUNIOR ECHEVERRIA BARRAZA	AYUDANTE DE OBRA
20	1.083.432.476	MARLON RAFAEL MERIÑO HERAZO	AYUDANTE DE OBRA
21	1.143.160.286	JHONATAN PIER MONTERO REYES	OFICIAL DE OBRA

af1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	000121 FP-34-00 (24/04/2013)

ITEM	C.C	NOMBRES	CARGO
22	12.623.242	CARLOS ARTURO FERNANDEZ PEÑA	ALMACENISTA
23	1.001.916.650	JESUS ANTONIO JULIO JINETE	AYUDANTE DE OBRA
24	8.485.250	HADER JOSE TOLEDO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA
25	3.747.881	ENERGIO ECHEVERRIA MARRIAGA	AYUDANTE DE OBRA
26	85.127.978	RONALD DARIO MUÑOZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA
27	72.310.604	EUGENIO ENRIQUE DE LA HOZ ECHEVERRIA	AYUDANTE DE OBRA
28	72.228.891	DARWUIN JOSE ECHEVERRIA BLANCO	OFICIAL DE OBRA
29	72.295.835	LUIS ALBERTO POLO ECHEVERRIA	AYUDANTE DE OBRA
30	85.126.442	JULIO CESAR MUÑOZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA
31	1.126.241.553	LUIS DAVID PACHECO ALMANZA	AYUDANTE DE OBRA
32	72.311.012	ONACIS ENRIQUE TORRES SOLANO	AYUDANTE DE OBRA
33	72.244.663	MIGUEL ANGEL BARRANCO ALTAHONA	OFICIAL DE CARPINTERIA
34	1.143.452.529	RONBINSON DE JESUS CABALLERO DE LA HOZ	AYUDANTE DE OBRA
35	73.430.296	DIOMAR BUELVAS BUELVAS	AYUDANTE DE OBRA
36	1.129.510.098	ELVIS YESID PALENCIA SARIEL	AYUDANTE DE OBRA
37	4.993.994	ENOT GREGORIO SALAMANCA SANJUANELO	AYUDANTE DE OBRA
38	1.007.199.359	GEOVANNY OROZCO CHAMORRO	AYUDANTE DE OBRA
39	1.140.844.701	JAIDER DE LA ROSA CARPIO	AYUDANTE DE OBRA
40	1.066.521.696	JASIER JAVIER ANAYA VILORIA	AYUDANTE DE OBRA
41	72.433.726	LUIS CARLOS CANTILLO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA
42	1.045.713.541	MARLON ORLANDO DISCUVICHE SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA
43	1.003.563.945	OMAR DANIEL MEJIA HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA
44	1.002.012.730	DIOFANOL DE LA HOZ BARRIOS	AYUDANTE DE OBRA
45	1.044.433.379	MOISES DAVID PANTOJA FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA
46	72.309.785	ARTURO ENRIQUE ALBARRACIN ECHEVERRIA	AYUDANTE DE OBRA
47	1.044.427.512	HECTOR LEONARDO NARVAEZ MORA	AYUDANTE DE OBRA
48	72.009.190	LUIS GABRIEL MENDOZA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA
49	1.081.785.769	JOAQUIN GUILLERMO COLON BOLAÑO	AYUDANTE DE OBRA
50	1.043.849.358	ANDRES PASTRANA PEÑALOZA MEJIA	AYUDANTE DE OBRA

ITEM	C.C	NOMBRES	CARGO
51	1.045.765.840	VICTOR MANUEL GONZALEZ IBAÑEZ	OFICIAL DE CARPINTERIA
52	1.010.021.192	ELVIZ ENRIQUE MARTINEZ VELEZ	AYUDANTE DE OBRA
53	7.595.499	CARLOS MANUEL PERTUZ CABARCAS	OPERADOR
54	73.126.027	ANDRES BELTRAN ARTEAGA	GERENETE
55	73.269.466	ALBEIRO ALFONSO LLERENA OSPINO	OPERADOR
56	85.372.581	FRANCISCO JAVIER CHAMORRO URANGO	
57	92.275.796	JOSE FULGENCIO CONTRERAS MONTERROZA	INSPECTOR DE OBRA
58	1.004.131.184	RAMON ALBERTO GARCIA FERRER	AYUDANTE
59	1.002.235.350	RUBEN DARIO GUERRERO VILLANUEVA	
60	8.498.166	WEIMAR RAFAEL SANJUAN URBINA	
61	73.106.539	WILFRIDO JOSE PEREZ DIAZ	OPERADOR
62	1.080.013.243	ALEXANDER LLANOS RODRIGUEZ	
63	72.180.928	HENRY CABRERA MONTES	CONDUCTOR
64	72.145.959	JOSE MIGUEL SALAS ORTIZ	SOLDADOR
65	1.045.690.629	CESAR ARTURO DE LA HOZ OJEDA	OFICIOS VARIOS
66	1.044.425.957	GENISER RAFAEL MORALES DE LA ROSA	OFICIOS VARIOS
67	1.007.187.391	JASSIR ENRIQUE MARENCO ROJANO	
68	73.268.775	ELIECER RAFAEL JIMENEZ TORRES	
69	17.973.819	SILVIO ELIAS DIAZ MARTINEZ	AYUDANTE
70	1143264518	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CASTRO	
71	9.160.527	ROGER ALVARADO RODRIGUEZ	
72	73100355	JAIME GOMEZ CARDOLE	
73	12687835	JOSE FRANCISCO MORALES	
74	1.042.436.241	MANUEL ANTONIO LLANOS GUERRERO	
75	1.002.132.080	LUIS ALBERTO MUÑOZ GUAVITA	
76	1.044.426.754	JONATHAN JOSE BARRAZA MERIÑO	
77	72.428.270	MIGUEL ANTONIO SANDOVAL LLANOS	
78	72.168.118	ARLEY ISAAC OLASCOAGA CAFIEL	CONSERJE

ITEM	C.C	NOMBRES	CARGO
79	1.044.427.512	HECTOR LEONARDO NARVAEZ MORA	CONSERJE
80	1.045.743.508	JULIO MARIO SANTOMINGO PEREZ	CONSERJE
81	73.560.926	EDILBERTO ENRIQUE MELENDEZ CABALLERO	CONSERJE
82	1.129.503.887	MAURICIO ENRIQUE BOHORQUEZ RODRIGUEZ	CONSERJE
83	1.140.875.232	MANUEL ANTONIO BRIEVA PASO	TOPOGRAFO
84	1.047.216.296	MARCOS ANTONIO GOMEZ MARTINEZ	TOPOGRAFO
85	1.143.426.441	JAIME DE JESUS ATENCIO SIERRA	CADENERO
86	1.080.670.317	JAVIER ENRIQUE RUIZ PADILLA	CADENERO

Fuente: Autor

7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

A la fecha se evidencio personal laborando en actividades los cuales han contado con el suministro de los EPP y dotación requerida para realizar de forma normal y segura sus actividades en el proyecto, el Contratista ha mostrado la entrega de los mismos se evidenciaron en los respectivos registros presentado en el informe mensual, dentro de los consumibles se destacan por bioseguridad los tapabocas los cuales fueron suministrados de acuerdo a las necesidades y cuando por recomendaciones de Interventoría se realizó.

De igual forma el tema de los guantes deteriorados se suministraron y la Interventoría evidencio en oportunidades el suministro de los consumibles, la Interventoría evidencio en varias ocasiones personal sin EPP o estos deteriorados, no se evidencio el seguimiento por parte del responsable hasta que Interventoría evidencio estas faltas.

8. INSPECCIONES

Durante la ejecución de las actividades del proyecto se realizó inspección a los equipos que se tienen en los frentes de trabajo. Se evidencio extintores, camilla, botiquín, se ha solicitado al Contratista realizar inspecciones pre-operacionales de todos los equipos que se tengan en los frentes de trabajo para validar su estado operativo y sus próximos mantenimientos, garantizando su estado operativo.

9. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PROYECTO

De igual manera la Interventoría realizó la supervisión del personal y sus actividades en el periodo el Contratista ha completado las afiliaciones del nuevo personal y planillas de seguridad social del personal vinculado al proyecto.

10. IDENTIFACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

El Contratista cuenta con un procedimiento y la matriz para la identificación de peligros, valoración y control de riesgos los cuales se presentan por las actividades desarrollas en el proyecto, por consiguiente, es necesario aplicar los controles necesarios para la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

11. ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Durante el periodo ejecutado se presentaron dos accidentes laborales y un incidente un accidente laboral se describe a continuación.

El señor Johan Carpio Barraza el pasado 09 de agosto de 2022 siendo aproximada mente las 4:30 pm el trabajador se encontraba realizando apoyo en la actividad de instalación de troncos, cuando el ayudante se dispone a instalar la viga de madera laminada, como no estaba bien asegurada (solo con puntillas de acero) y el viento estaba fuerte, se cayó y cuando cae golpea la escalera metálica tipo tijera de 5 peldaños, la cual al caer le golpea el brazo izquierdo al trabajador, lo cual generó dolor e inflamación.

Desde el inicio del proyecto hasta la fecha van siete (7) accidentes de trabajo reportados con treinta y cuatro (34) días perdidos a causa de las incapacidades.

12. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Durante la ejecución de las actividades se pueden presentar situaciones de emergencias a las cuales se les debe prestar el apoyo con el suministro de

elementos para su atención oportuna, el Contratista describe sus planes operativos normalizados en los siguientes:

- ✓ Procedimiento en caso de emergencia
- ✓ Procedimiento en caso de huracanes y tornados
- ✓ Procedimiento en caso de vendavales
- ✓ Procedimiento en caso de atentado terrorista
- ✓ Procedimiento en caso de colapso estructural
- ✓ Procedimiento en caso mordedura de incendio
- ✓ Procedimiento en caso de evacuación
- ✓ Procedimiento en caso de lesiones y primeros auxilios
- ✓ Procedimiento en caso de accidente de tránsito y vehículos
- ✓ Procedimiento en caso de sismo

13. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

De acuerdo al virus que se ha presentado a nivel mundial el Contratista estable unas medidas para la prevención y propagación del COVID-19 las cuales son:

- Entrega de Tapabocas al personal
- Campañas de limpieza en los equipos
- Socialización de protocolos de actuación frente al COVID 19
- Adecuación de los puntos de lavados de manos
- Manejo de los residuos
- Temas de prevención

Durante el tiempo de ejecución de actividades se ha evidenciado la adecuación de los puntos de lavado de manos, se ha evidenciado la instalación de infografías referentes a la prevención de COVID-19.



Para las actividades de alturas no se cuenta con todo el personal que realiza esta actividad con el curso de alturas



Se evidencio mala operación en actividad de izaje donde los tragadores están colocando las manos directas no emplean vientos para manipular estas cargas y no cuentan con certificados de aparejadores.
