INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

Periodo de 27-09-2022 a 25-11-2022

Fecha de Presentación. 06-12-2022

INTRODUCCIÓN

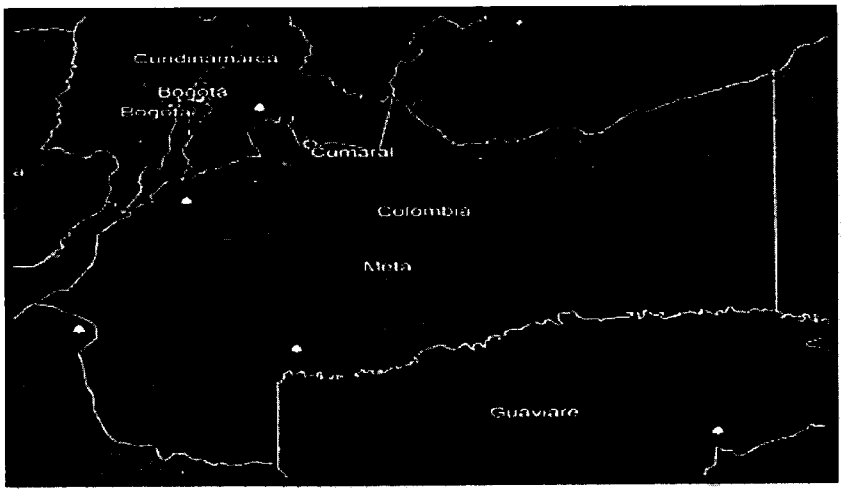
CONTRATISTA: **ABR INGENIEROS CIVILES S.A.S.**
SUPERVISOR: **FRANCIS DARLEY MOSQUERA NOVOA**

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO. SAMC-005-2022

OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICION No. 1	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META	$240.243.593,00	$32.998.436,00	$273.242.029,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN GENERAL



municipio de Cumaral

LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001



localización genera municipio de Cumaral, meta
fuente: Google earth

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	SAMC-005-2022
TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
CONTRATISTA:	ABR INGENIEROS CIVILES S.A.S. R/L HERNAN AUGUSTO BUITRAGO ARDILA - C.C. 79.536.219 DE BOGOTA D.C.
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META"
CONDICIONES INICIALMENTE PACTADAS	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($240.243.593,00).
PLAZO DE EJECUCION:	TREINTA (30) DÍAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR INICIAL:	MÓNICA JOHANA GÓMEZ MAHECHA – C.C. DE 1.119.889.419 DE CUMARAL, META – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2022

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

NUEVO SUPERVISOR ASIGNADO:	FRANCIS DARLEY MOSQUERA NOVOA – CC. 17.266.993 DE CUMARAL, META – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (DECRETO 118 DEL 18/10/2022).
MODIFICACIÓNES REALIZADAS	
PRÓRROGA 1:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
VIGENCIA DE LA PRÓRROGA 1:	27 DE OCTUBRE DE 2022 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTA DE PRORROGA 1:	26 DE OCTUBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR ADICIÓN 1:	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 32.998.436,00)
FECHA DE ACTA DE ADICION:	24 DE NOVIEMBRE DE 2022
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE PESOS ($273.242.029,00)

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

REGISTRO PRESUPUESTAL.

los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Registro Presupuestal Valor Inicial.

NO.	FECHA	RUBRO	VALOR
761	29/08/2022	24.02.0600-2022502260001-2.3.2.02.02.005-54211-98.0-1.0	$ 240.243.593,00

Registro Adición No. 1

NO.	FECHA	RUBRO	VALOR
1064	28/11/2022	24.02.0600-2022502260001-2.3.2.02.02.005-54211-98.0-1.0	$ 32.998.436,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,1	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	963,00	$ 10.190	$ 9.430.264
1,2	CORTES PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0,10 M)	ML	1199	$ 13.957	$ 16.081.800
1,3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE TRASCIEGO Y CARGUE MECÁNICO)	M3	43,00	$ 307.174	$ 12.693.351
1,4	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	64,00	$ 408.524	$ 25.125.860
1,5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0-2,00M (INCLUYE TRASCIEGO)	M3	24,00	$ 72.402	$ 1.669.880
1,6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	43,00	$ 948.834	$ 39.208.667
1,7	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	581,00	$ 4.632	$ 2.586.236
1,8	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	43,00	$ 67.048	$ 2.770.625
1,9	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3	43,00	$ 133.082	$ 5.499.347
1,10	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 36 KG/CM2 O 3.6 MPa, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	64,00	$ 1.089.613	$ 67.015.558
1,11	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60)INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	6.439,00	$ 8.547	$ 52.887.802
1,12	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	21,00	$ 261.345	$ 5.274.203
ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS					
NP 1	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION.	M3	-	$ 125.572,17	$ -
NP 2	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	-	$ 2.263,01	$ -
NP 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ACELERANTE PARA CONCRETO	KG	-	$ 12.532,92	$ -
				SUB TOTAL OBRAS	**240.243.593**

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

MODIFICACIÓN No. 1 Y ADICION No. 1 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022


CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación y Adición No. 1					
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.1	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	755.36	10,190.00	7,697,118.00
1.2	CORTES PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0,10 M)	ML	351.14	13,957.00	4,900,861.00
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE TRASCIEGO Y CARGUE MECÁNICO)	M3	39.98	307,174.00	12,280,817.00
1.4	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	76.60	408,524.00	31,292,938.00
1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0-2,00M (INCLUYE TRASCIEGO)	M3	153.69	72,402.00	11,127,463.00
1.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	39.98	948,834.00	37,934,383.00
1.7	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	570.36	4,632.00	2,641,908.00
1.8	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	24.09	67,048.00	1,615,186.00
1.9	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3	57.10	133,082.00	7,598,982.00
1.10	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 36 KG/CM2 O 3.6 MPa, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	76.60	1,089,613.00	83,464,356.00
1.11	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	5,000.05	8,547.00	42,735,427.00
1.12	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	31.00	261,345.00	8,101,695.00
ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS					

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

NP 1	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION.	M3	76.60	125,572.17	9,618,828.00
NP 2	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	1,587.21	2,263.01	3,591,872.00
NP 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ACELERANTE PARA CONCRETO	KG	689.40	12,532.92	8,640,195.00
SUB TOTAL OBRAS			**100.00%**		**273,242,029**

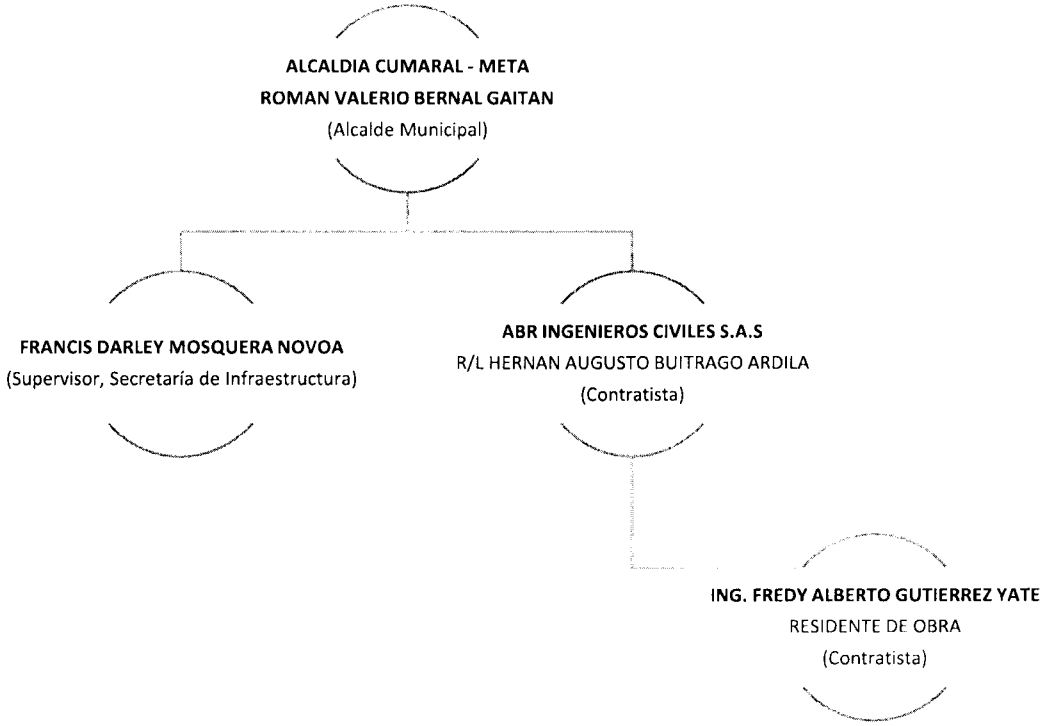ORGANIGRAMA



DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El veintinueve (29) DE AGOSTO DE 2022, el MUNICIPIO DE CUMARAL, suscribió el contrato de obra pública SAMC-005-2022 con la empresa CONSTRUMAJ S.A.S. cuyo representante legal es el señor GIOVANNI LUCHINI LUCHINI

Se estableció como valor inicial del contrato la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (240.243.593,00)

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

El día 21 DE SEPTIEBRE DE 2022, CONSTRUMAJ S.A.S. identificada con Nit. 901.563.205-7 y representada legalmente por el señor GIOVANNI LUCHINI LUCHINI identificado con cedula de ciudadanía No. 79.746.335 de Bogotá, radico la solicitud de CESION TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES a ABR INGENIEROS CIVILES S.A.S. identificada con Nit. 901.200-712-2 y representada legalmente por el ingeniero HERNAN AUGUSTO BUITRAGO ARDILA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.536.219 de Bogotá D.C., para revisión y/o aprobación por parte del Municipio de Cumaral (Meta)

El día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, el MUNICIPIO DE CUMARAL, autorizó la cesión del contrato de obra No. SAMC-005-2022 a ABR INGENIEROS CIVILES S.A.S. identificada con Nit. 901.200-712-2reprsentada por el señor HERNAN AUGUSTO BUITRAGO ARDILA.

El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 se suscribió el acta de inicio al contrato SAMC-005-2022, estableciendo como fecha de inicio el día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, y como fecha de terminación el día 26 DE OCTUBRE DE 2022

El día 20 DE OCTUBRE DE 2022 el contratista manifiesta a través de oficio las situaciones de atraso que se han generado en el desarrollo de las actividades del contrato de obra objeto de la referencia, teniendo en cuenta los días de lluvia que se vienen presentando a causa de la temporada invernal en el municipio de Cumaral.

El día 21 DE OCTUBRE DE 2022 se realiza comité en el cual el contratista entrega informe con los respectivos soportes publicado por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), La entidad manifiesta que analizados los documentos alegados por el contratista y siendo conocedores de la situación presentada, existe justificación técnica para viabilizar la prórroga No. 1 por lo cual, se dará continuación al trámite administrativo para la formalización de la ampliación de plazo elaborando y suscribiendo los documentos correspondientes

El día 26 DE OCTUBRE DE 2022 se firma acta de prorroga No. 1 al contrato SAMC-005-2022, ya que La supervisión es conocedora de las situaciones y retrasos presentados a causa de las constantes lluvias y que el contratista menciona en el comité y por ende dio la viabilidad al trámite respectivo en lo que compete a la ADICION DE TIEMPO, para cumplir con el objeto del mencionado proyecto.

El día 31 DE OCTUBRE DE 2022 el contratista manifiesta a través de oficio la solicitud de realizar comité con el fin de expones las distintas situaciones presentadas durante la ejecución ya que se han generado variaciones en las cantidades contractuales y otras actividades adicionales que no fueron contempladas y que son importantes para la ejecución correcta del proyecto.

El día 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 se realiza comité en el cual el contratista entrega informe con los respectivos soportes, una vez revisadas la entidad manifiesta que analizados los documentos alegados por el contratista y siendo conocedores de la situación presentada, existe justificación técnica para viabilizar la modificación y adición No. 1 por lo cual, se dará continuación al trámite administrativo para la formalización de la ampliación de plazo elaborando y suscribiendo los documentos correspondientes

El día 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 se firma acta de Modificación No. 1 y Adición No.1 al contrato SAMC-005-2022.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

BREVE RESUMEN DE ACTIVIDAD

Dentro de las actividades desarrolladas por el contratista son las siguientes.

Durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista ha venido ejecutando las actividades correspondientes a los ítems descritos en la propuesta económica realizando además el control de calidad de los materiales utilizados como lo son los certificados de materiales, ensayos de laboratorios de densidades sobre el material de relleno suministrado y ensayos a la flexión del concreto. Se ha evidenciado que ABR INGENIEROS CIVILES SAS, realiza la respectiva señalización de cada sitio intervenido y levantando constantemente los polines y la cinta de peligro para evitar que se presente accidentes y daños prematuros a las placas recientemente fundidas, alcanzando así un porcentaje físico a la fecha del (**79.28%**), con respecto a lo programado del (**79.16%**), evidenciando un superávit del **(0,11%)** .

Control de personal de obra: se ha evidenciado al momento del ingreso, se verifica las afiliaciones del personal a seguridad social, y los epp´s para el inicio de cada una de las actividades.

La administración ha estado presente en obra y ha constatado las mediciones de las cantidades de obra presentadas en este corte, tomando control de calidad de los concretos fundidos, con el fin de poder llevar el control de calidad de dichos concretos. Adicional a ello se lleva la bitácora de obra donde se plasma el avance de obra diario.

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1			**PRESENTE ACTA No. 1**		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.1	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	723,60	10,190.00	7,373,484.00
1.2	CORTES PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0,10 M)	ML	251.75	13,957.00	3,513,675.00
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE TRASCIEGO Y CARGUE MECÁNICO)	M3	39.98	307,174.00	12,280,817.00
1.4	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	54.96	408,524.00	22,452,479.00
1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0-2,00M (INCLUYE TRASCIEGO)	M3	118.32	72,402.00	8,566,605.00
1.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	39.98	948,834.00	37,934,383.00

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

1.7	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	570.36	4,632.00	2,641,908.00
1.8	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	3.80	67,048.00	254,782.00
1.9	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3	56.78	133,082.00	7,556,396.00
1.10	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 36 KG/CM2 O 3.6 MPa, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	54.96	1,089,613.00	59,885,130.00
1.11	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	3,588.58	8,547.00	30,671,593.00
1.12	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	26.00	261,345.00	6,794,970.00
ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS					
NP 1	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION.	M3	54.96	125,572.17	6,901,446.00
NP 2	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	1,587.21	2,263.01	3,591,872.00
NP 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ACELERANTE PARA CONCRETO	KG	494.64	12,532.92	6,199,284.00
	SUB TOTAL OBRAS		**79.28%**		**216,618,824**


DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

MES	SEMANAL PROYECTADO	ACUMULADO PROYECTADO	SEMANAL EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO
27/09/2022	$ 259,384	$ 259,384	$ 259,384	$ 259,384
3/10/2022	$ 13,869,838	$ 14,129,222	$ 13,869,838	$ 14,129,222
10/10/2022	$ 18,348,422	$ 32,477,643	$ 18,348,422	$ 32,477,643
17/10/2022	$ 18,348,422	$ 50,826,065	$ 18,348,422	$ 50,826,065
24/10/2022	$ 18,348,422	$ 69,174,486	$ 18,348,422	$ 69,174,486
31/10/2022	$ 18,348,422	$ 87,522,908	$ 72,293,652	$ 141,468,138
7/11/2022	$ 18,348,422	$ 105,871,329	$ 18,787,672	$ 160,255,810
14/11/2022	$ 26,502,886	$ 132,374,215	$ 18,787,672	$ 179,043,481

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

21/11/2022	$ 36,589,649	$ 168,963,864	$ 18,787,672	$ 197,831,153
28/11/2022	$ 47,329,744	$ 216,293,607	$ 18,787,672	$ 216,618,824
5/12/2022	$ 36,349,602	$ 252,643,209		
10/12/2022	$ 20,598,820	$ 273,242,029		

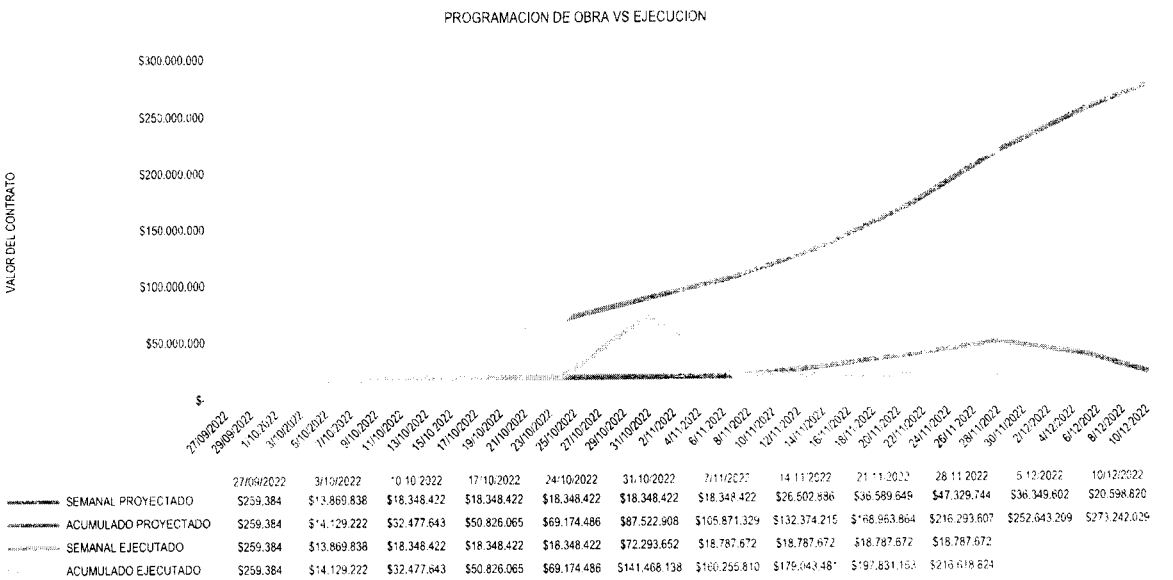

RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LAS PÓLIZAS (CUADRO DE CADA GARANTÍA GENERADA).

Según Acta de Aprobación de Cesión del Contrato:

SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 30-44-101049069					
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO No.	VIGENTE
	DESDE	HASTA			
Cumplimiento del Contrato	26/09/2022	26/02/2023	$24.024.359.30	0	VIGENTE
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	26/09/2022	20/10/2025	$48.048.718.60	0	VIGENTE
Estabilidad y Calidad de la Obra.	Si ampara 3 años, 0 meses y 0 días.		$24.024.359.30	0	VIGENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 30-40-101017538					
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO No.	VIGENTE
	DESDE	HASTA			
Predios Labores y Operaciones	26/09/2022	26/10/2022	$200.000.00	0	VIGENTE
Daño emergente y lucro cesante	26/09/2022	26/10/2022	$200.000.00	0	VIGENTE
Perjuicios extrapatrimoniales	26/09/2022	26/10/2022	$200.000.00	0	VIGENTE

Según Ajuste del Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones laborales del Contrato:

SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 30-44-101049069					
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO No.	VIGENTE
	DESDE	HASTA			
Cumplimiento del Contrato	26/09/2022	26/02/2023	$24.024.359.30	1	VIGENTE
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	26/09/2022	26/10/2025	$48.048.718.60	1	VIGENTE
Estabilidad y Calidad de la Obra.	Si ampara 3 años, 0 meses y 0 días.		$24.024.359.30	1	VIGENTE

Actualización de acuerdo con Acta Modificatoria de Prorroga No 01 del Contrato:

SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 30-44-101049069					
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO No.	VIGENTE
	DESDE	HASTA			
Cumplimiento del Contrato	26/09/2022	12/04/2023	$24.024.359.30	2	VIGENTE
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	26/09/2022	12/12/2025	$48.048.718.60	2	VIGENTE
Estabilidad y Calidad de la Obra.	Si ampara 3 años, 0 meses y 0 días.		$24.024.359.30	2	VIGENTE
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 30-40-101017538					
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO		VIGENTE
	DESDE	HASTA			

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

				ANEXO No.	
Predios Labores y Operaciones	26/09/2022	12/12/2022	$200.000.00	1	VIGENTE
Daño emergente y lucro cesante	26/09/2022	12/12/2022	$200.000.00	1	VIGENTE
Perjuicios extrapatrimoniales	26/09/2022	12/12/2022	$200.000.00	1	VIGENTE

Actualización de acuerdo con Acta Modificatoria por Adición No 01 al Contrato:

SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 30-44-101049069					
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO No.	VIGENTE
	DESDE	HASTA			
Cumplimiento del Contrato	26/09/2022	12/04/2023	$27.324.202.90	3	VIGENTE
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	26/09/2022	12/12/2025	$54.648.405.80	3	VIGENTE
Estabilidad y Calidad de la Obra.	Si ampara 3 años, 0 meses y 0 días.		$27.324.202.90	3	VIGENTE
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 30-40-101017538					
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO No.	VIGENTE
	DESDE	HASTA			
Predios Labores y Operaciones	26/09/2022	12/12/2022	$200.000.00	1	VIGENTE
Daño emergente y lucro cesante	26/09/2022	12/12/2022	$200.000.00	1	VIGENTE
Perjuicios extrapatrimoniales	26/09/2022	12/12/2022	$200.000.00	1	VIGENTE

CONTROL DE PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA

MES DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	PENSION	SALUD	ARL
FREDY ALBERTO GUTIERREZ YATE	86.071.041	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	COLPENSIONES	COMPEN SAR	SURA

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

MES DE OCTUBRE 2022


NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	PENSION	SALUD	ARL
FREDY ALBERTO GUTIERREZ YATE	86.071.041	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	COLPENSIONES	COMPENSAR	SURA
OSWALDO DE JESUS ORTIZ DIAZ	1.119.894.982	AYUDANTE	PROTECCION	NUEVA EPS	BOLIVAR
GINNA FERNANDA LUNA BELTRAN	1.119.890.239	SISO	PORVENIR	SALUD TOTAL	BOLIVAR
RICARDO ANTONIO LEAL URREGO	17.349.220	MAESTRO	COLPENSIONES	FAMISANAR	BOLIVAR
JUAN ESTEBAN NIÑO VALENCIA	1.121.950.268	INGENIERO AUXILIAR	PROTECCION	SALUD TOTAL	BOLIVAR
YEFFERSON JOSE DELGADO GAMBOA	80.238.390	AYUDANTE	PORVENIR	NUEVA EPS	BOLIVAR
DIEGO ALEJANDRO LEAL MOSQUERA	1.121.968.490	AYUDANTE	PORVENIR	FAMISANAR	BOLIVAR
JOSE WILSON FORERO SUAREZ	3.272.618	AYUDANTE	PROTECCION	CAJA COPI	BOLIVAR
YESID FELIPE RINCON ROJAS	1.121.957.291	INGENIERO AUXILIAR	PORVENIR	SALUD TOTAL	BOLIVAR

Teniendo en cuenta la normatividad vigente, sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y arl) correspondiente al respectivo periodo así: septiembre y octubre meses que componen la parcial. los valores se reportan sin intereses de mora).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



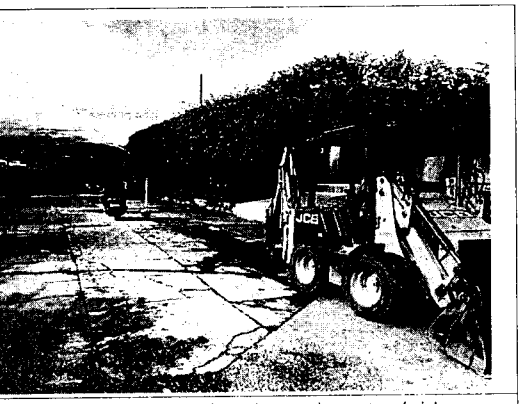
Demolición mecánica de pavimento rígido










Demolición mecánica de pavimento rígido

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

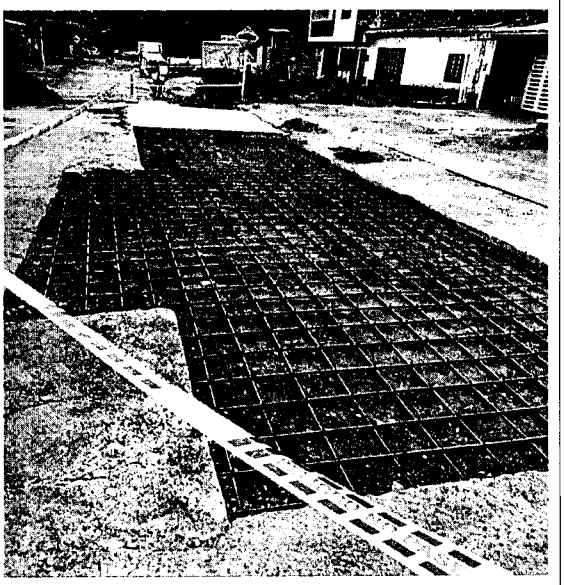CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

	
Retiro de escombros	Cortes en pavimento
	
Cortes a traves de cortadora en pavimetos	Acero de refuerzo en zonas a fundir

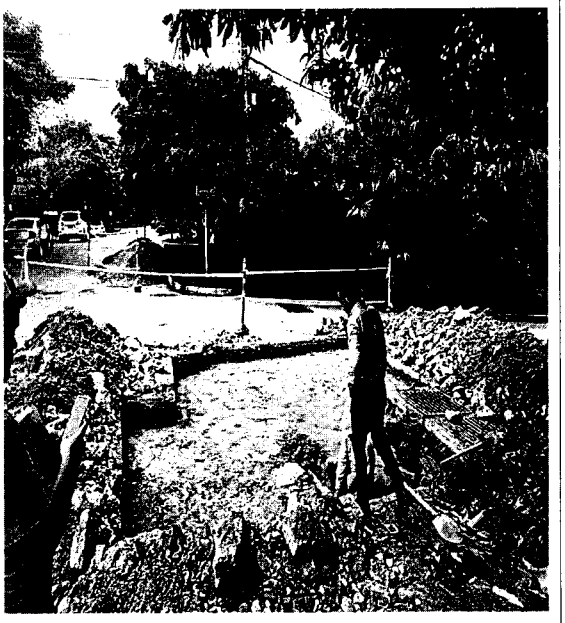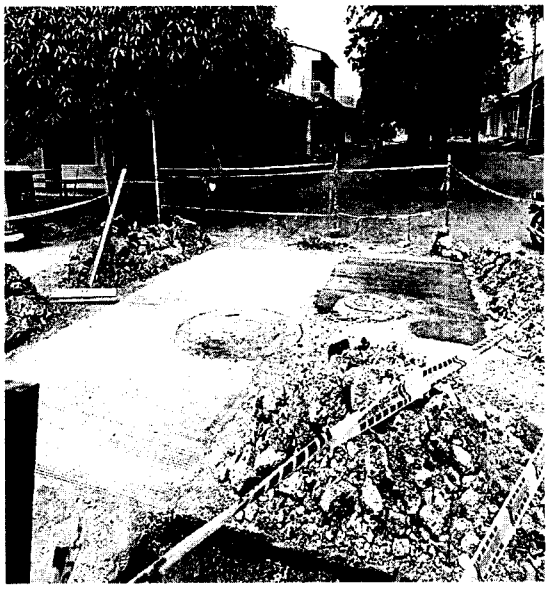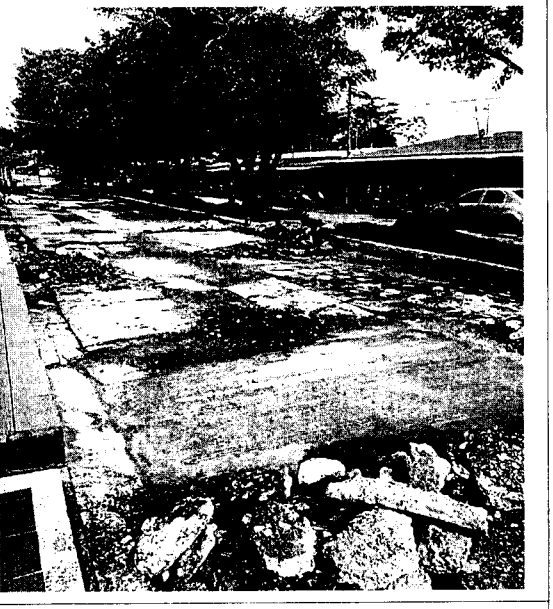
	
Señalizacion de areas a intervenir y fundida de placas	Excavaciones, rellenos y compactacion de zonas a intervenir
	
Fundida de placa	Fundida de placa

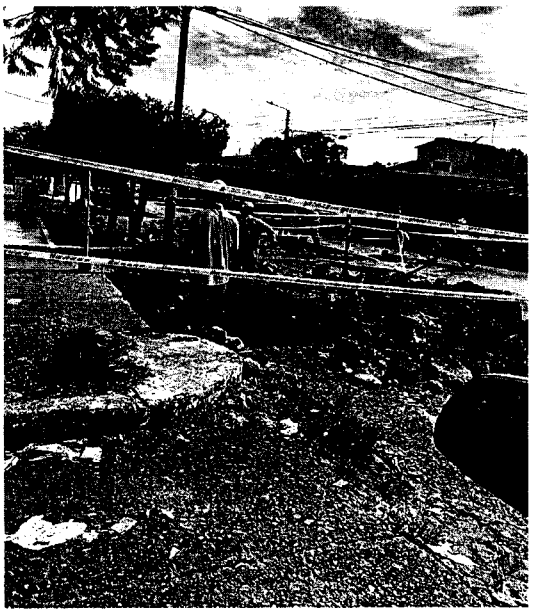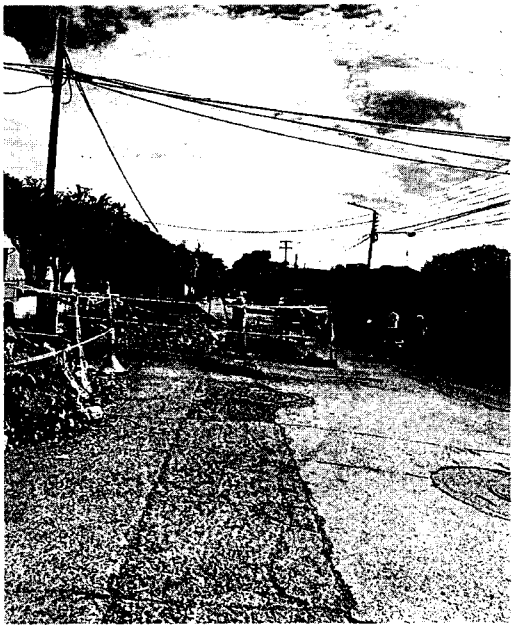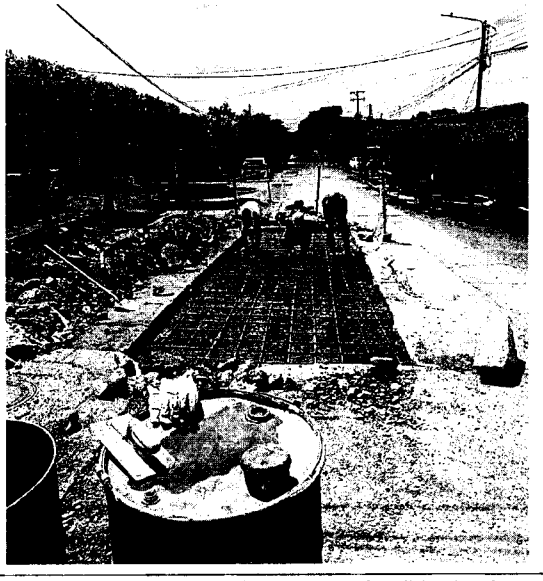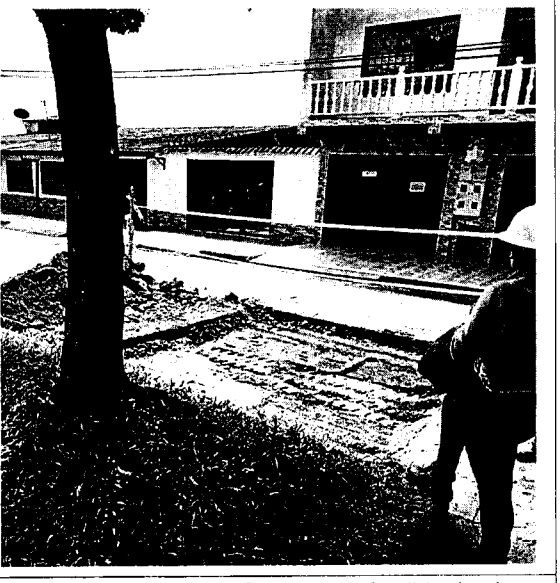	
Relleno y compactacion para fundida de placas en pavimento rigido	Relleno y compactacion para fundida de placas en pavimento rigido
	
Amarre de acero de refuerzo para fundida de placa	Amarre de acero de refuerzo para fundida de placa

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

	
Verificacion de espesores para aplicación de asfalto	Compatacion de asfalto
	
Verificacion de temperatura par aplicación de material	Riego de materias asfaltico

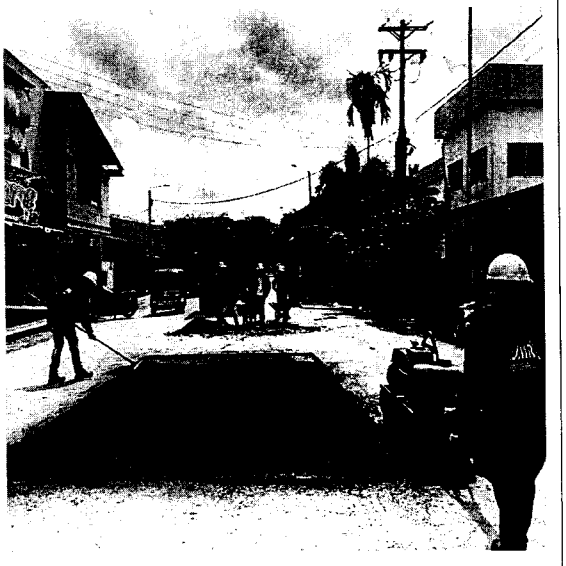


Riego y compatacion de pavimento flexible



Verificacion de cantidades ejecutadas



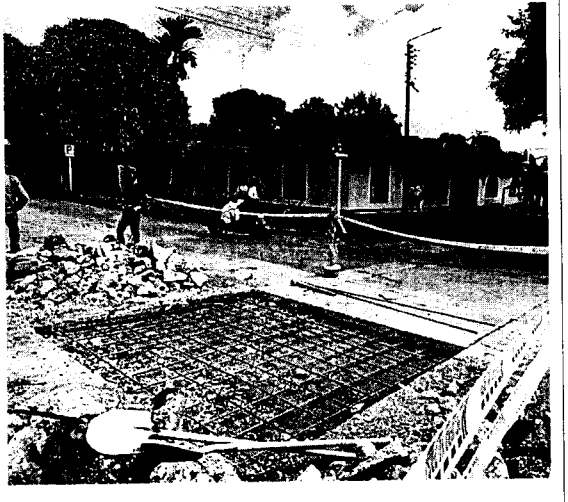Verificacion de cantidades ejecutadas



Verificacion de espesores y aceros para aplicación de concreto

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 1

CONTRATO No. SAMC-005-2022 PROYECTO No. 2020502260001

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	(%)
VALOR TOTAL PARCIAL No. 1	$216.618.824,00	27/09/2022 al 25/11/2022	79,28%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Saldo por ejecutar)	$56.623.205,00	26/11/2022 al 10/12/2022	20,72%
VALOR INICIAL CONTRATO	$240.243.593,00	26/09/2022	87,92%
VALOR ADICION No.1	$ 32.998.436,00	24/11/2022	12,08%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 273.242.029,00	Del 24/11/2022	100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Acta Parcial de Obra No 01 se presenta con el 79.28% de avance fisico ejecutado en obra, el cual equivale a un valor de $216.618.824,00; este es valorado esto hasta el 25 de noviembre de 2022.
- Con base a lo anterior la supervisión se permite aprobar el pago parcial No. 1 del contrato por un valor de doscientos dieciséis millones seiscientos dieciocho mil ochocientos veinticuatro pesos m/cte ($216.618.824,00).

Para constancia de lo anterior, se firma bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los seis (06) dias del mes de diciembre de 2022.

cordialmente;

ING. FRANCIS DARLEY MOSQUERA NOVOA
Secretario de Infraestructura

ACTIVIDAD	PROYECTO	REVISO	APROBO / VO.BO
NOMBRE	LUIS EDUARDO TERREROS ROJAS	ELIAS VANEGAS TORRES	FRANCIS DARLEY MOSQUERA NOVOA
CARGO	Contratista – Profesional en ingenieria civil	Contratista – Apoyo a la Gestion	Secretario de infraestructura
FIRMA			
