INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 05 al 10 de septiembre de 2022 - Semana 9

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
9	35,00%	0,00%	11,54%	0,00%
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

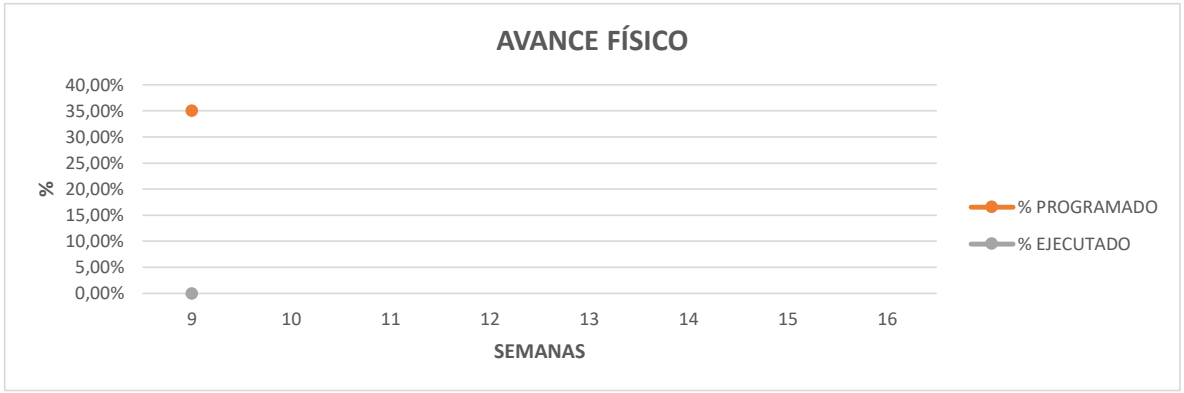

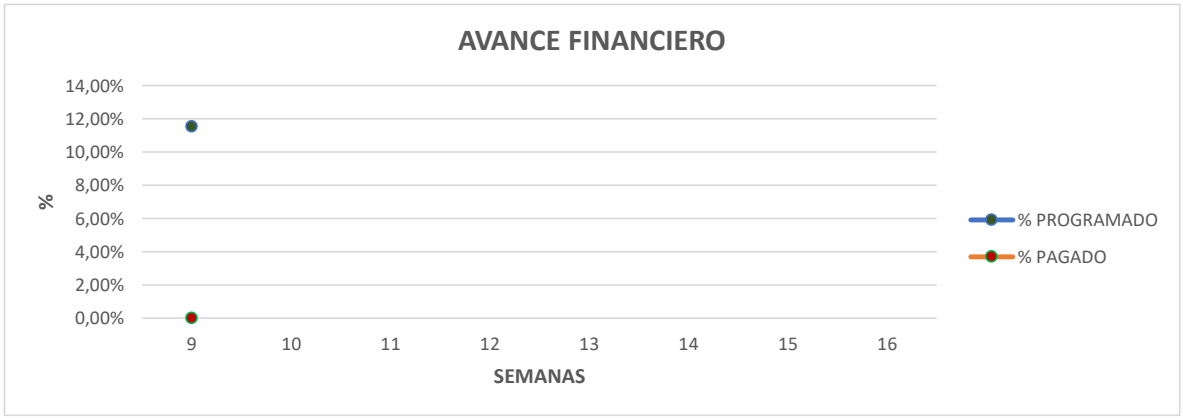

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:

La supervisión del proyecto manifiesta que se deben empezar actividades de obra civil.
El contratista manifiesta respecto al caso de la aprobación del proyecto serie 3 en ENEL CODENSA el cual tiene un tiempo de aprobación considerable aprox 3 meses.
La supervisión solicita nuevamente la entrega del cronograma inicial de acuerdo a la fecha de acta de inicio, realizando la respectiva justificación de los atrazos del no comienzo de la obra con sus respectivos soportes de las evidencias.
Se presento la factibilidad renovada con las condiciones a cumplir, se solicitaron las curvas de protección a ENEL CODENSA por llamada telefónica, que estaran proximas a llegar para completar los datos, presentar el proyecto de serie 3, y poder radicarlo para su aprobación.
Por medio de una presente se cito a los representantes leales tanto del Consorcio Tocancipa IT como Ingelco proyectos E.U para el día 8 de septiembre, donde se van a tratar temas relacionados con los contratos.
Se recibio la respuesta del oficio No. SI-1021 remitida por Ingelco a la secretaria de infraestructura, aceptando la propuesta del nuevo residente de interventoria (Ing. Victor Gonzalo Pulido Cuadros) donde cumple con la experiencia requerida por la entidad.

3. ESTADO DEL TIEMPO :

El estado del tiempo en la categoria lluvioso tuvo un total de 20 horas, seco 11 horas y tiempo nublado 17 horas.
Las lluvias se han presentado durante toda la semana.

4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:

Contratista remite a interventoria el plan de calidad y bioseguridad de obra, se revisa las actividades faltantes y se da la aprobación para su posterior revisión por parte de la supervisión.

5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:

No se ha trabajado en obra.

6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

La mayor parte del porcentaje del contrato es de suministro de equipos y un menor porcentanje de obra civil con varios items pendinetes a aprobar.
Se debe entregar cronograma inicial ajustado a la fecha de acta de inicio, informes semanales y mensuales pendientes.
El 06 de septiembre de 2022 el contrato No. CTO 459 MT 2022 recibio una segunda notificación por presunto incumplimiento, donde Ingelco Proyectos E.U da respuesta a este oficio SI-1021 el 07 de septiembre, con lo siguiente:

La documentación relacionada con el contrato de obra No. CTO 440 MT de 2022, se adjuntó y se envió tanto al correo de la supervisión como también se entregó en la alcaldía con radicado No 5912 del 29 de agosto de 2022. La razón por la cual se hizo fue por lo conversado en los comités de obra anteriores en donde la Ing. Sonia manifestó que toda la documentación se debía enviar al correo de la supervisión como también debía ser radicada en la alcaldía.

En cuanto al Plan de Calidad brindamos las disculpas por no revisarlo nuevamente en los documentos adjuntos del contratista ya que ese documento ya lo habíamos revisado por parte de la interventoría y comunicado que estaba erróneo y se debía correguir.

La documentación relacionada con el contrato de obra No. CTO 459 MT de 2022, se adjuntó y se envió tanto al correo de la supervisión como también se entregó en la alcaldía con radicado No 5912 del 29 de agosto de 2022.

En cuanto a las entregas por parte de la interventoría a la supervisión, se han realizado de acuerdo a las entregas por parte del contratista para su respectiva revisión, aprobación y posteriormente su remisión a la supervisión, en este momento se han entregado los protocolos de bioseguridad, el plan de calidad, balance financiero el cual está en espera de los ajuste por parte del contratista de acuerdo a las observaciones emitidas por la interventoría, y el cronograma ajustado al acta de inicio, se actualizaron las pólizas y se subieron al SECOP II, se han entregado las actas de reunión las cuales quedan pendientes las firmas, tambien se emitieron llamados de atención al contratista por no entregar los documentos, se actualizo las hojas de vida por cambio de personal y su respectiva aprobación.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
