INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 26 septiembre al 01 de octubre de 2022 - Semana 12

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
9	35,00%	0,00%	11,54%	0,00%
10	38,89%	0,00%	12,46%	0,00%
11	42,78%	0,00%	13,73%	0,00%
12	46,67%	0,00%	14,82%	0,00%
13				
14				
15				
16				

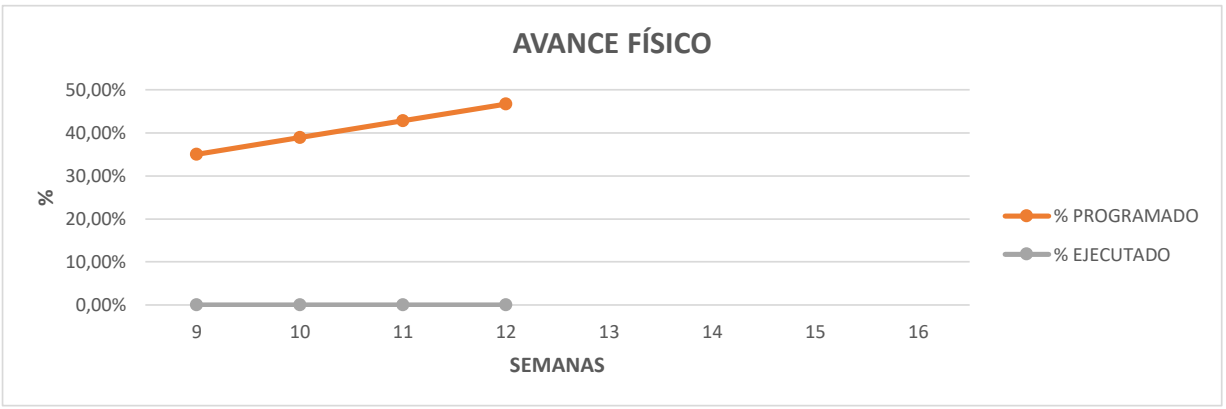

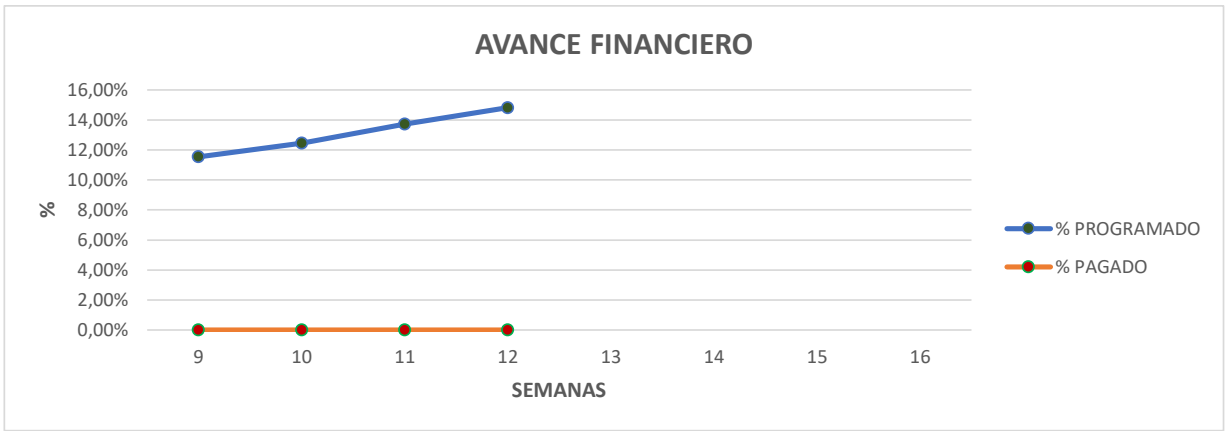

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:

El contratista de obra se compromete a entregar nuevamente el balance financiero corregido el día 30 de septiembre

La nueva supervisión requiere que se realicé nuevamente la entrega de los protocolos de bioseguridad, plan de calidad, cronograma inicial, plan de seguridad y salud en el trabajo, informes semanales y mensuales de obra e interventoria.

La interventoria programa para el día 3 de octubre la radicación de los documentos solicitados por la supervisión.

3. ESTADO DEL TIEMPO :

El estado del tiempo en la categoria seco tuvo un total de 20 horas, lluvioso 16 horas y tiempo nublado 12 horas.

Las lluvias han disminuido considerablemente.

4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:

No se han presentado avances de la matriz de requisitos legales y matriz de aspectos e impactos para poder aprobarlos y adjuntarlos al informe mensual.

5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:

No se ha trabajado en obra.

6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Como ya son evidentes las actividades necesarias para poner la obra a funcinar que no se encuentran contractualmente en el contrato de obra, las partes acuerdan dar inicio a las actividades civiles el día 3 de octubre de 2022 mientras se avanza con el tramite del modificatorio.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
