INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 03 septiembre al 08 de octubre de 2022 - Semana 13

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
9	35,00%	0,00%	11,54%	0,00%
10	38,89%	0,00%	12,46%	0,00%
11	42,78%	0,00%	13,73%	0,00%
12	46,67%	0,00%	14,82%	0,00%
13	50,56%	0,00%	16,06%	0,00%
14				
15				
16				

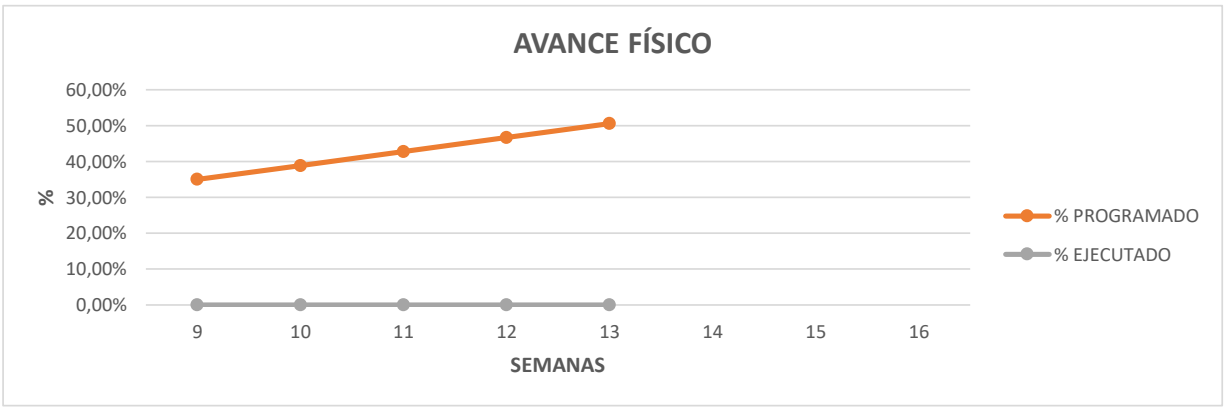

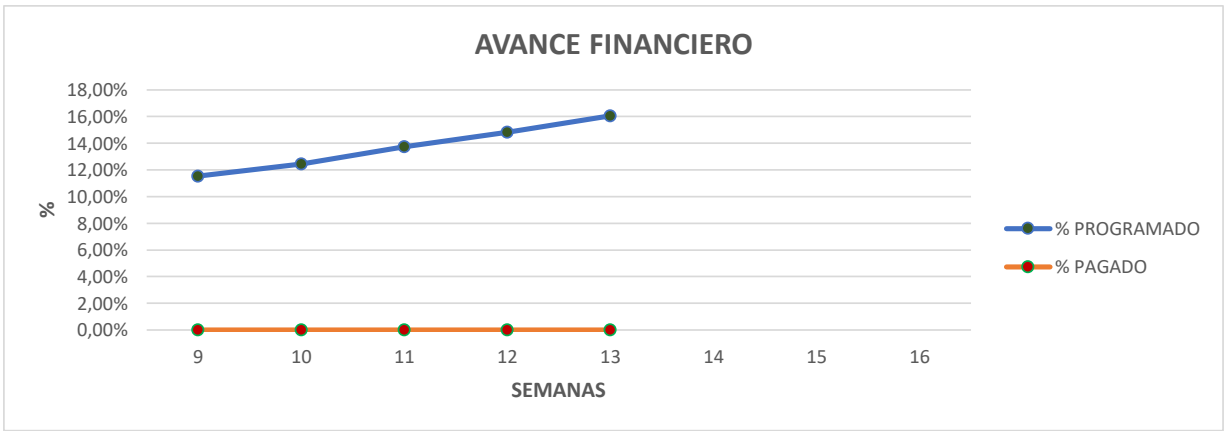

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:

El contratista no ha presentado el balance financiero completo para poder dar aprobación por parte de la interventoria, ya que hacen las cotizaciones de soporte de algunos Items.

Se enviarón las observaciones al balance financiero entregado por el contratista el día 30 de septiembre, donde se manifestó la falta de cotizaciones.

Se presentarón y radicarón los informes semanales del mes de julio y agosto el día 3 de octubre, número de radicado No. 6693

Se radicarón los documentos de protocolos de bioseguridad, plan de calidad y cronograma inicial de obra, número del radicado No. 6725 del día 4 de octubre.

El contratista no inicio actividades de obra, manifestando que estan en el proceso de contratación y afiliación del personal, como tambien en la compra de materiales requeridos para dar inicio.

No se radico la solicitud del modificatorio a la alcaldía, por lo tanto no se ha realizado la aprobación del balance financiero, ya que esta información no esta completa por parte del contratista.

3. ESTADO DEL TIEMPO :

El estado del tiempo en la categoria seco tuvo un total de 19 horas, lluvioso 16 horas y tiempo nublado 13 horas.

Las lluvias han disminuido considerablemente, pero han sido fuertes.

4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:

Se volvio a solicitar al contratista la matriz de requisitos legales y matriz de aspectos e impactos para poder aprobarlos y adjuntarlos al informe mensual.

5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:

No se ha trabajado en obra.

6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

El contratista se compromete a iniciar obra el día 10 de octubre, enviaran las afiliaciones del personal para revisarlas y aprobarlas.

EL contratista de obra entregara los diseños de la caseta para hacer la respectiva revisión y aprobación.

Se estan verificando los archivos de la alcaldía con respecto a los diseños de iluminación, para poder organizar la documentación para tener el certificado RETILAP.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
