INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 10 al 15 de octubre de 2022 - Semana 14

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**% PROGRAMADO**	**% PAGADO**
9	35,00%	0,00%	11,54%	0,00%
10	38,89%	0,00%	12,46%	0,00%
11	42,78%	0,00%	13,73%	0,00%
12	46,67%	0,00%	14,82%	0,00%
13	50,56%	0,00%	16,06%	0,00%
14	53,89%	0,00%	17,41%	0,00%
15				
16				

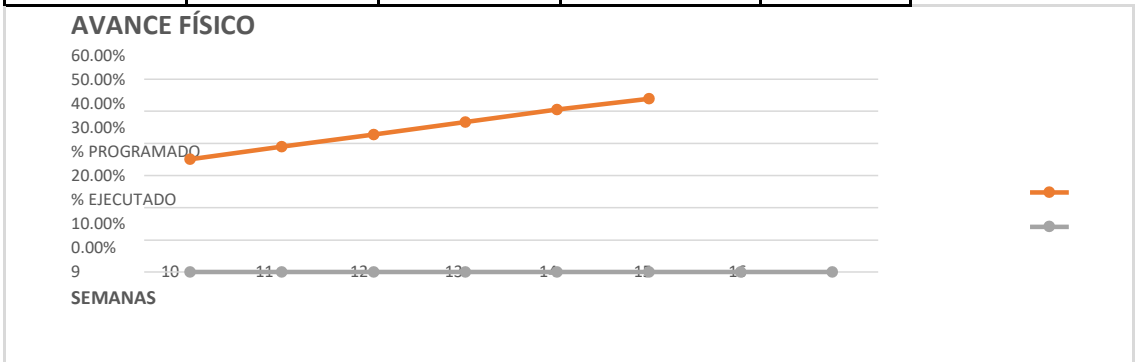

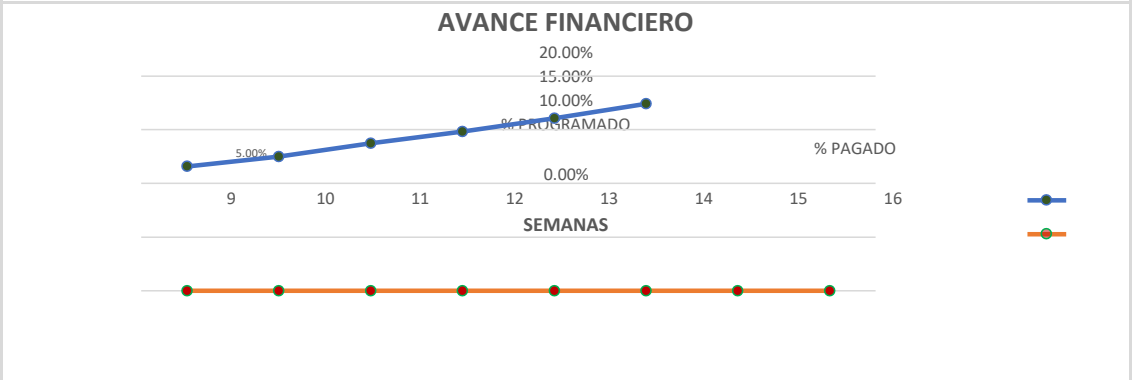

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:

Se procede ha realizar afiliaciones al personal y se hace entrega de las planillas de seguridad social a interventoria.

El contratista de obra hizo entrega de los diseños de la caseta a interventoria el cual se revisó, aprobó y se emitio a la supervisión del proyecto.

Se da inicio a actividades en obra, se arreglo red de acometida de agua potable para dar servicio a los dos edificios de CRIR para la ejecución de obra, donde se tuvo que intervenir cuatro fugas en el tramo no previstas.

3. ESTADO DEL TIEMPO :

El estado del tiempo en la categoria lluvioso tuvo un total de 9 horas, nublado 18 horas y tiempo seco 23 horas.

Las lluvias han disminuido en la semana, pero en los dias jueves y viernes se presentarón fuertes lluvias.

4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:

Se llevo a cabo la entrega de dotación y elementos de protección personal a cada trabajador, se dio la respectiva charla de seguridad antes de empezar labores en obra, se verifico el uso adecuado de EPP, y la correspondiente inspección a herramientas de trabajo.

Antes de iniciar labores se realizó una pausa activa a los trabajadores, y se recordo la importancia de los elementos de protección personal.

5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:
De los materiales ingresados que se encuentran en obra ya se tiene el certificado de calidad de cada uno de ellos.
6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:
Se envio un oficio el día 13 de octubre a la supervisión del proyecto, programando una reunión en sitio para poder dar claridad a los siguientes temas que se presentarón en obra:
1. En la red hidráulica interna se presentarón fugas en diferentes tramos, el tema es preocupante, ya que a la hora de instalar el sistema hidroneumático se podrian presentar muchas más, se solicita la información si el contratista anterior aún esta dentro de las garantias para poder dar solución, o por lo contrario el contrato actual debe hacer dichas reaparaciones.
2. El tanque subterráneo que esta destinado para el almacenamiento de agua potable, esta presentando fisuras en los muros, se solicita la información si el contratista anterior aún esta dentro de las garantias para poder dar solución, o por lo contrario el contrato actual debe hacer dichas reparaciones, ya que se requiere hacer perforaciones para los anclajes de las dovelas.
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO







