INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 15 al 19 de noviembre de 2022 - Semana 19

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
17	65,56%	16,39%	47,40%	0,00%
18	69,44%	17,36%	50,74%	0,00%
19	73,33%	18,32%	52,36%	0,00%
20				
21				
22				
23				
24				

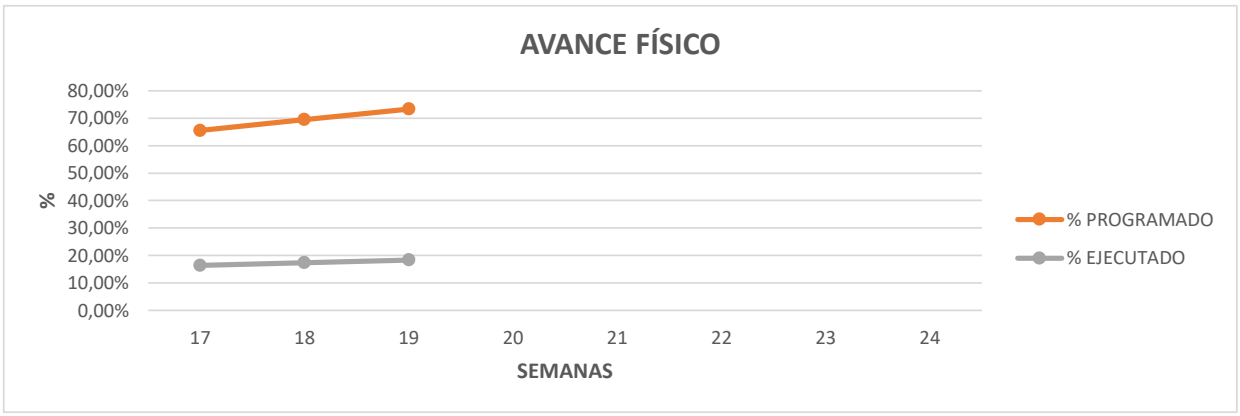

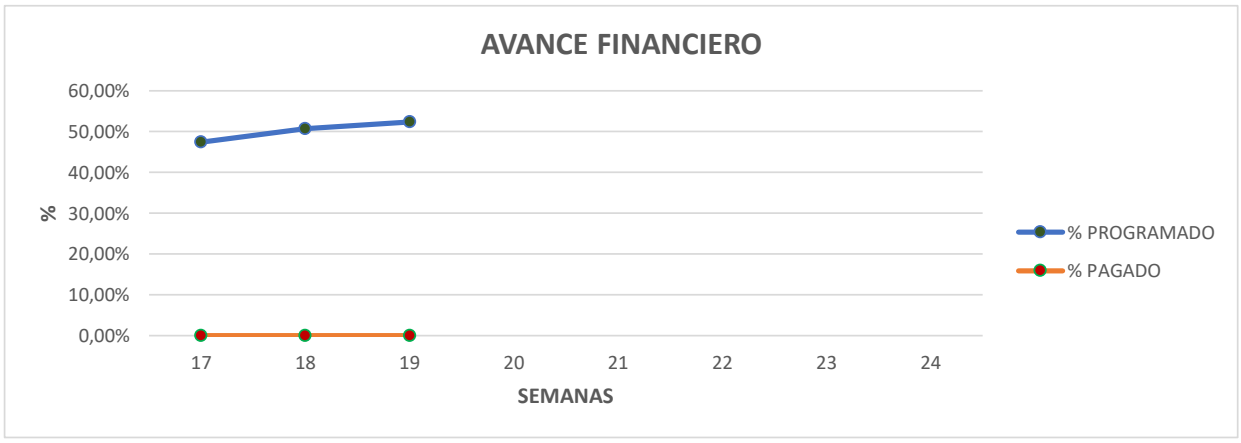

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:
Se identifica una nueva fuga en el tramo de red principal de agua potable que pasa paralelo al edificio del CRIR costado oriente, se empezo a excavar, el tubo no se encontraba unido, se colocaron dos accesorios, se realizo una prueba y quedo solucionado. Foto 1. 2. 3. 4. Se realizarón compras por parte de obra de accesorios hidraulicos como: pegante, limpiador, uniones, codos, y semicodos para arreglar las fugas presentadas en el CRIR.
3. ESTADO DEL TIEMPO :
El estado del tiempo en la categoria nublado tuvo un total de 26 horas, seco 8 horas y tiempo lluvioso 7 horas.
Las lluvias han disminuido considerablemente, pero han sido fuertes.
El día 14 de noviembre día festivo.
4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:
Se dio charla de seguridad antes de empezar labores en obra, se verifico el uso adecuado de EPP, y la correspondiente inspección de herramientas de trabajo, se diligenciarón los formatos de relación de personal, inspección de equipos y herramientas.
Antes de iniciar labores se realizó una pausa activa a los trabajadores, y se recordo la importancia de los elementos de protección personal.
5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:
En los labores realizados en la semana no se realizo control de calidad de equipos.
6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:
Se tomo la decisión de realizar una brecha para desaguar el agua lluvia que se estanca en las cajas electricas, ya que esa agua se va hacia el cuarto de maquinas donde iran ubicadas las bombas. El agua daña los aislamientos del cable que van por estas, estos no estan diseñados para estar en contacto con agua, por esta razón se debe mantener las cajas desocupadas o sin agua, donde el contratista de obra se compromete a poner esta actividad en el balance financiero.
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Ubicación de filtración de agua



Foto 2. Excavación en terreno



Foto 3. Tubo sin unión



Foto 4. Tubo intervenido y solucionado
