INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 21 al 26 de noviembre de 2022 - Semana 20

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
17	65,56%	16,39%	47,40%	0,00%
18	69,44%	17,36%	50,74%	0,00%
19	73,33%	18,32%	52,36%	0,00%
20	77,22%	19,29%	55,03%	0,00%
21				
22				
23				
24				

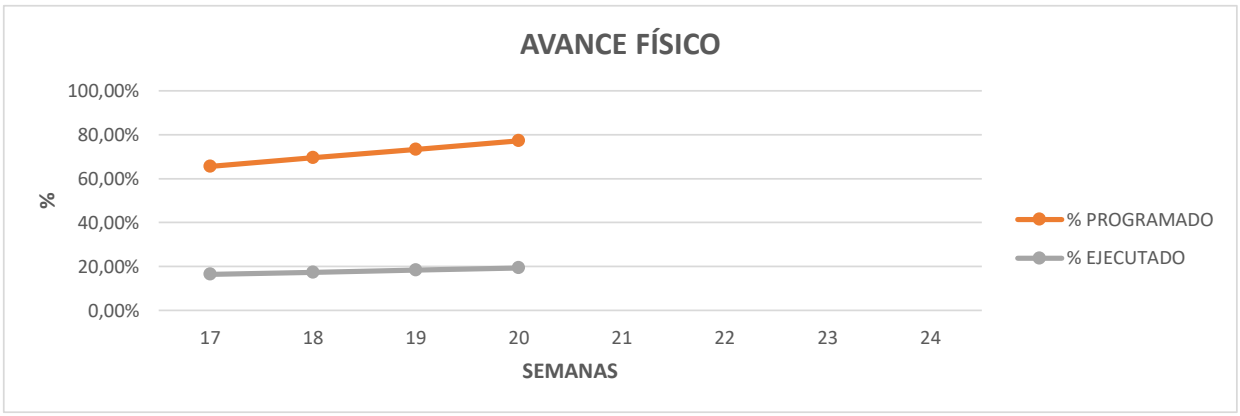

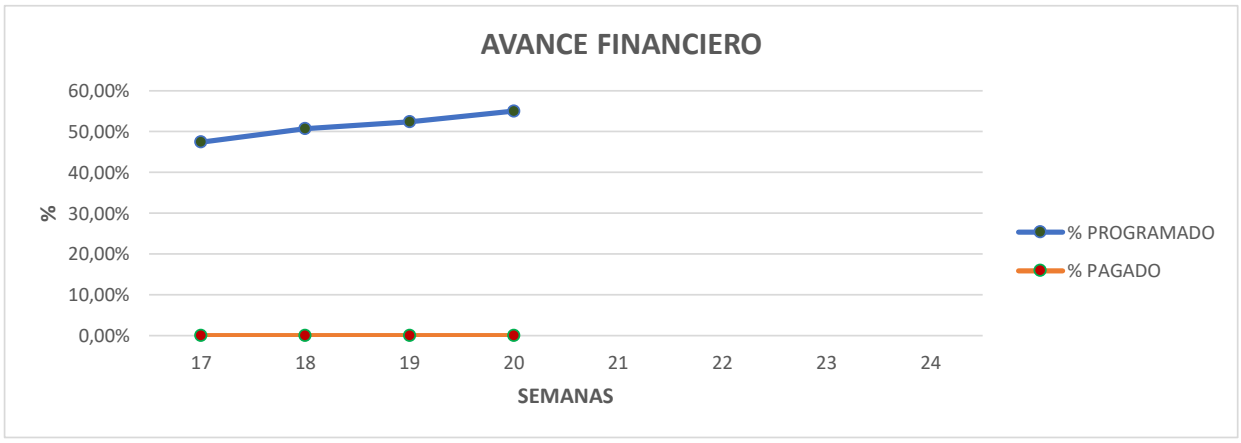

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:
Las fugas presentadas anteriormente en el perimetro del CRIR y en el edificio de alojamiento fueron probadas para verificar arreglo y quedarón solucionadas.
El día martes llego la planta electrica de la misma referencia que esta en el contrato, esta pendiente que llegue la UPS y los cables para empezar con la parte electrica. Foto 1. 2.
Se afino la placa del tanque subterraneo para la red contra incendio. Foto 3. 4.
se sigue ejecutando el balance financiero por parte del contratista de obra.
3. ESTADO DEL TIEMPO :
El estado del tiempo en la categoria nublado tuvo un total de 30 horas, lluvioso 11 horas y tiempo seco 9 horas.
Las lluvias han disminuido considerablemente, pero han sido fuertes.
4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:
Se dio charla de seguridad antes de empezar labores en obra, se verifico el uso adecuado de EPP, y la correspondiente inspección de herramientas de trabajo, se diligenciarón los formatos de relación de personal, inspección de equipos y herramientas.
Antes de iniciar labores se realizó una pausa activa a los trabajadores, y se recordo la importancia de los elementos de protección personal.
5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:
Se verifica que el equipo llegado a obra sea el mismo al que se encuentra aprobado en el contrato inicial.
6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:
En la proxima semana ya se empezara a ejecutar las actividades relacionadas a toda la parte electrica.
Se envio un llamado de atención al contratista solicitando las razones por la cual no ha presentado los informe mensual de octubre el cual se debe presentar los primeros (10) días de cada mes el cual lleva un retraso de 15 días a la fecha, como tampoco ha presentado el balance financiero con los ítems a adicionar el cual lo debía presentar en la siguiente semana después de la reunión que se hizo el día 3 de noviembre en el CRIR.
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Planta electrica



Foto 2. Planta electrica



Foto 3. Afinado de placa tanque subterraneo de red contra incendios



Foto 4. Afinado de placa tanque subterraneo de red contra incendios
