jvcingenieriasas@gmail.com
info@camacon.co
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

FDLB-336-0080

Bogotá, 25 de octubre de 2022

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nº de Radicado: 0078
Centro de Costos: 104-Bosa
Recibido Por: JuanDiego Gómez
Destinatario: AYM CONSULTORIA
Anexos: Lo Enunciado
Fecha: 26/10/2022

Señores:
AYM CONSULTORIA S.A.S
Carrera 15A #121-12 Oficina 318
Bogotá D.C.

Ref.: FDLB-336-2022 "REMISION DE INFORMES, VIDEOS Y FOTOS DE CCTV DE REDES SANITARIAS Y PLUVIALES CON EL FIN DE HACER UNA EVALUACION DEL ESTADO DE LAS TUBERIAS"

Asunto: ENTREGA INFORMES CCTV SANITARIO Y PLUVIAL PARA LOS CIV 7002710, CIV 7002819, CIV 7002589, CIV 7004396, CIV 7004408 Y CIV 7004416

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta lo pactado, remitimos mediante archivo adjunto los siguientes documentos correspondientes a los informes, videos y fotos de CCTV de los CIV 7002710, 7002819, 7002589, 7004396, 7004408 Y 7004416 ubicados en el barrio el Remanso e Islandia Bosa del contrato FDLB – 336:

- Anexo 1 Cuadro de resumen y recomendaciones general
- Anexo 2 Video inspección CCTV Sanitario CIV 7002710
- Anexo 3 Video inspección CCTV Sanitario contraflujo CIV 7002710
- Anexo 3 Video inspección CCTV Pluvial CIV 7002710
- Anexo 4 Fotos inspección CCTV Sanitario CIV 7002710
- Anexo 5 Fotos inspección CCTV Sanitario contraflujo CIV 7002710
- Anexo 6 Fotos inspección CCTV Pluvial CIV 7002710
- Anexo 7 Reportes de inspección Sanitario CIV 7002710
- Anexo 8 Reportes de inspección Pluvial CIV 7002710

- Anexo 9 Reportes de inspección Sanitario contraflujo CIV 7002710
- Anexo 10 Video inspección CCTV Sanitario CIV 7002819
- Anexo 11 Video inspección CCTV Pluvial CIV 7002819
- Anexo 12 Fotos inspección CCTV Sanitario CIV 7002819
- Anexo 13 Fotos inspección CCTV Pluvial CIV 7002819
- Anexo 14 Reportes de inspección Sanitario CIV 7002819
- Anexo 15 Reportes de inspección Pluvial CIV 7002819
- Anexo 16 Video inspección CCTV Sanitario CIV 7002589
- Anexo 17 Video inspección CCTV Pluvial CIV 7002589
- Anexo 18 Fotos inspección CCTV Sanitario CIV 7002589
- Anexo 19 Fotos inspección CCTV Pluvial CIV 7002589
- Anexo 20 Reportes de inspección Sanitario CIV 7002589
- Anexo 21 Reportes de inspección Pluvial CIV 7002589
- Anexo 22 Video inspección CCTV CIV 7004396, Reportes de inspección CIV 7004396, video inspección CCTV CIV 7004408, reportes de inspección CIV 7004408, video inspección CCTV CIV 700441, reportes de inspección CIV 7004416.

Se diagnosticó un grado estructural y un grado de mantenimiento según el QUICK RATING de PACP para las tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial, donde se evidencian que las tuberías de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial presentan visibilidad de los agregados que la componen, y presenta ausencia de algunas partes en el tramo inspeccionado, se recomienda hacer un cambio de las tuberías de redes de alcantarillado sanitario y pluvial o una atención programable inmediata.

Justificación: En atención al PMT aprobado por la SDM solicitamos se acepten cambios al mismo toda vez que al dar inicio a las obras se realizó una inspección de redes de alcantarillado por solicitud de la Empresa de Acueducto de Bogotá para determinar si se hace necesario realizar cambio o renovación de redes de alcantarillado y así mismo dar estabilidad a las obras de pavimento. La inspección de redes se realizará en todos los CIVs a intervenir, ya que las mismas actualmente se encuentran en concreto y algunas en gres, información suministrada por la EAAB. De acuerdo a un primer informe presentado por nuestro proveedor de inspección de redes con CCTV, INGEEMAC y SEPROMED, se recomienda cambio de redes en el sector de El Remanso e Islandia, cuyo PMT ya fue aprobado por la SDM. Por consiguiente, la implementación del PMT actual no es posible, ya que se debe realizar excavación por el centro de la calzada para la intervención de las redes de alcantarillado. Una vez finalizada la intervención de las redes se procederá a continuar con las explanaciones previstas para las actividades propias de la construcción de la vía y en ese momento implementar el PMT actualmente aprobado.

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

jvcingenieriasas@gmail.com
info@camacon.co
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

A continuación se adjuntan evidencias de lo mencionado anteriormente.

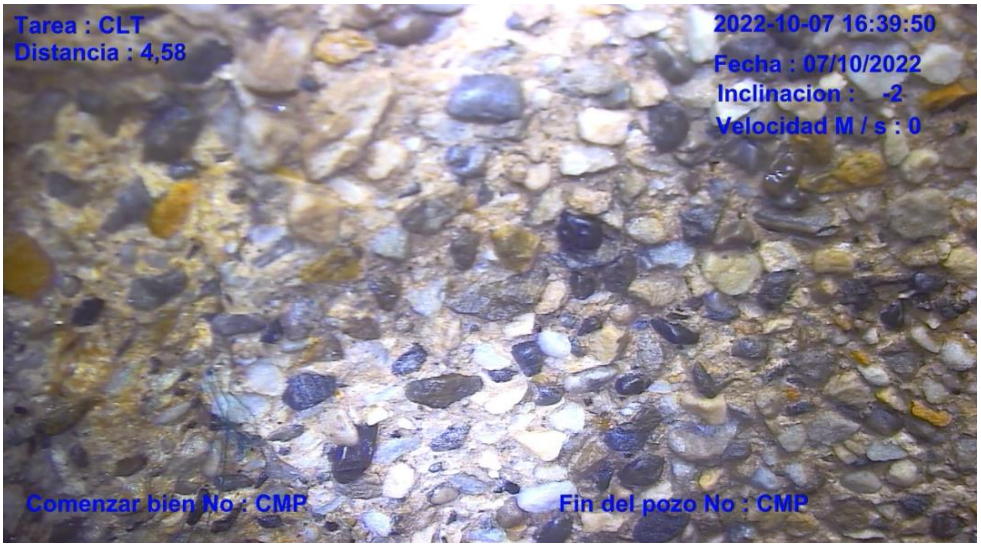


Fig.1 Evidencia de visibilidad de los agregados

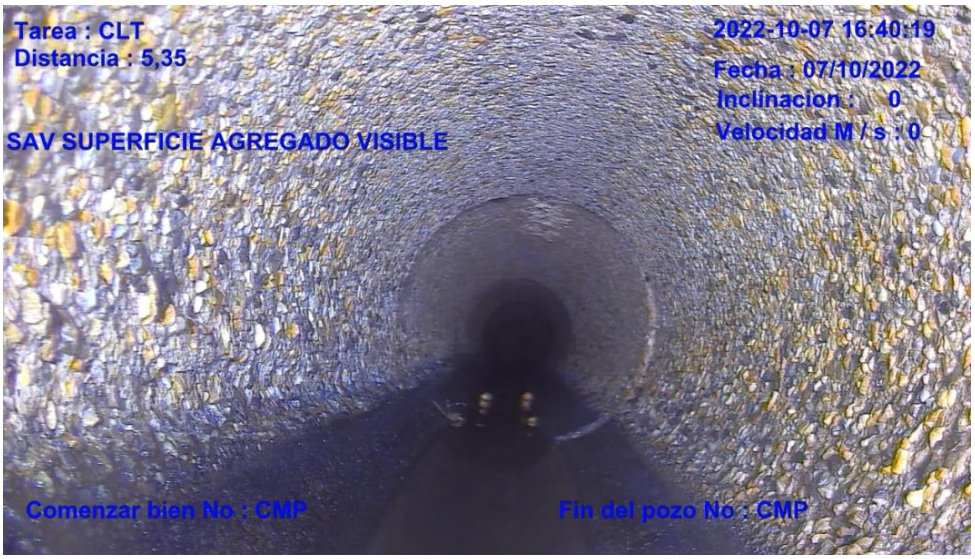


Fig.2 Evidencia de visibilidad de los agregados

jvcingenieriasas@gmail.com
info@camacon.co
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C
NIT. 900.452.410-0



Fig.3 Evidencia de ausencia de partes en el tramo

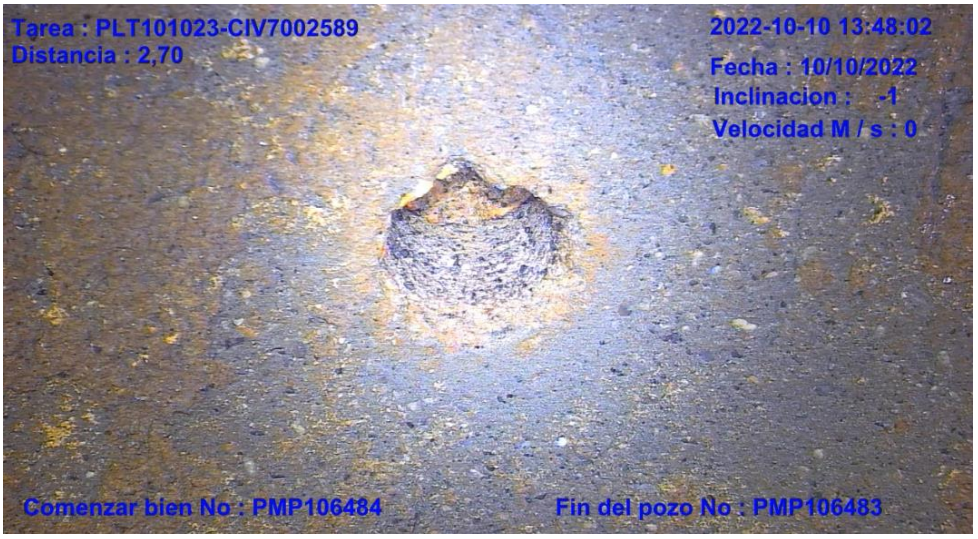


Fig.4 Evidencia de hueco de izaje

jvcingenieriasas@gmail.com
info@camacon.co
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

Sin Otro en Particular, quedamos atentos a sus comentarios.

LUIS FERNANDO ROBLES CRUZ
CONSTRUCTORA CAMACON SAS
