SOTARCO SAS

Ingenieros - Contratistas

Medellín, 20 de noviembre de 2022

Señores
Municipio Sabaneta
Infraestructura

Asunto: descripción de actividades realizadas en otro si número 1 y 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente hacemos una breve descripción de las actividades realizadas.

OTRO SI N° 1

- DESCRIPCION:
  Aplicación de PINTURA EPOXICA EN PISOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, sobre concreto pulido, 2 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color por definir.
- RECOMENDACIONES:
  Se recomienda el hacer limpieza solo con agua por el siguiente mes, para que la pintura termine de tomar su resistencia, también se recomienda el tratar de no hechar en el piso al limpiarlo químicos fuertes por que pueden deteriorar la capa de pintura




SOTARCO SAS

Ingenieros - Contratistas

OTROS SI N° 2

- DESCRIPCION:
  Anclaje de butacos en cementos, incluye (cortes, remate en material y todos los elementos necesarios para su correcta instalación

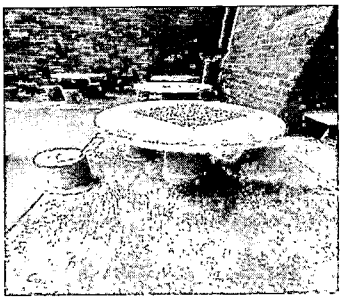

- DESCRIPCION:
  Suministro, e instalación de malla plástica para ventana o equivalente, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
- RECOMENDACIÓN:
  Estar pendiente de que los estudiantes no manipulen esta malla y también estar pendientes cada 2 meses de verificar su estado y hacerle mantenimiento (mantener rígida la malla)




- DESCRIPCION:
  Suministro, e instalación de luminarias led 12w baños de hombres, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento




SOTARCO S.A.S

Ingenieros - Contratistas

- DESCRIPCION:
  Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso "entrada de restaurante escolar" con (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, 2 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color por definir
- RECOMENDACIONES:
  Se recomienda el hacer limpieza solo con agua por el siguiente mes, para que la pintura termine de tomar su resistencia, también se recomienda el tratar de no hechar en el piso al limpiarlo químicos fuertes por que pueden deteriorar la capa de pintura

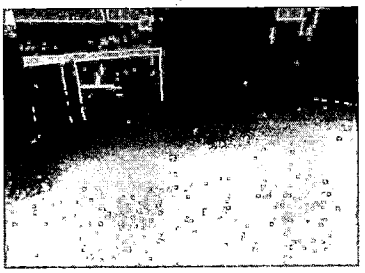

- DESCRIPCION:
  Suministro, transporte y colocación de ventana proyectante en aluminio anodizado color natural, cristal templado de 4 mm, color claro de 0,60 x 0,60, la ventana se divide en 2

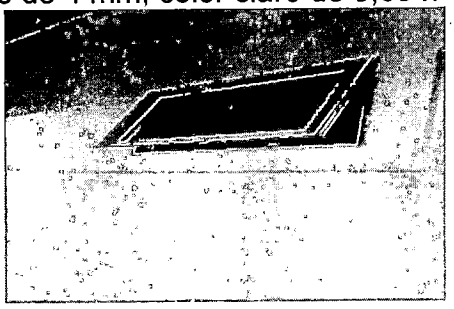

Gracias por su atención.
Cordialmente;

SANTIAGO ANDRES TABORDA
Representante Legal
SOTARCO S.A.S
