
rfeo
Detalles del radicado 20226810138572
Mis Consultas
Mis Planillas de Envio
Solicitar Anulación
RADICACION
Mis Oficios
Mis Memorandos
CARPETAS
Mis Entrada(9)
Mis Oficios(1)
Mis Memorandos(1)
Mis Vistr Buena(0)
Mis Devueltos(0)
Mis Agendados (0)
Mis Informados (35)
Mis Personales (0)
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Radicación:
2022-12-14 08:07 AM
Destinatario:
CONSORCIO ICODE VIAL
Asunto:
REF: CIN-314-2022 OBJETO ???REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL CONCURSO DE MÉRITOS CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C??? ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA NO. 2 DE LOS CONTRATOS CON 313 Y 314 DE 2022.
Dirección:
CALLE 18 # 4-91 OFICIO 307
E-Mail:
CONSORCIOICODEVIAL@GMAIL.COM
Folios:
4
Nivel de Seguridad:
PUBLICO
Tipo de Documento:
ODAS
Descripción de Anexos:
0
ESTADO
Radicado
Digitalizado
Con respuesta (0)
Planilla dependencia (0)
Planilla CDI (0)
Trámite cerrado (archivado)
Enviado (0)
DOCUMENTOS
DOCUMENTO (Anexo/Asociado):
Documento Definitivo:
HISTÓRICO
Usuario Actual:
DIMELZA MENDOZA RUEDA. Area de Gestion de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe
Usuario Radicador:
ADOLFREDO PINEDO CHAVEZ. Area de Gestion de Desarrollo Local - CDI Rafael Uribe Uribe
Registro de consultas:
Ver
Registro de prestamos:
Ver
Fecha
Actividad
Usuario Origen
Usuario Destino
Comentario
2022-12-14 08:08:08 AM
Digitalizacion Radicado/Asoc. Imagen Web
001: ADOLFREDO PINEDO CHAVEZ
001: ADOLFREDO PINEDO CHAVEZ
DEFINITIVO
2022-12-14 08:07:22 AM
Radicacion
001: ADOLFREDO PINEDO CHAVEZ
002: DIMELZA MENDOZA RUEDA
REF: CIN-314-2022 OBJETO ???REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL CONCURSO DE MÉRITOS CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C??? ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA NO. 2 DE LOS CONTRATOS CON 313 Y 314 DE 2022.

Bogotá D.C. 14 de diciembrede 2022

CE-ICOD-CI-344-019

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
Atn: EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
Alcalde Local
Atn: Ing Hector Erira
Apoyo a la Supervisiòn
Ciudad
Copia
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE INGENEIRIA Y SERVICIOS – APIS SAS
Atn: Ing. ROCIO DEL PILAR MELO MARTINEZ
Representante Legal
Calle 23 a bis No 83-25, oficina 402

Ref: CIN-314-2022 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE CONSULTORÍA RESULTANTE DEL CONCURSO DE MÉRITOS CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C"

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 DE LOS CONTRATOS CON 313 Y 314 DE 2022.

Cordial saludo,

En virtud a la solicitud emitida por el consultor el dia 13 de dicimebre de 2022 bajo radicado No. CON-313-2022-011, se solicita una prrorroga del contrato de consultoria e interventoria por un termino de 30 dìas calendario, con el fin de poder terminar a cabalidad y con la mejor calidad el contrato de consultoria CON 313/2022 y CIN 314/2022, bajo los siguientes argumentos:

"El Contratista pone en conocimiento mediante este comunicado y tal como se manifestó en el comité de seguimiento el día 09 de diciembre de 2022, las particularidades que se han presentado en la ejecución del contrato que han imposibilitado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que generan la necesidad inminente de prorrogar por segunda vez el contrato, teniendo en cuenta que se cumplirán los treinta (30) días de la prórroga No1 del contrato solicitados por medio del comunicado CON-313-2022-009 y que a la fecha no se han logrado subsanar en su totalidad las razones expuestas

- Los resultados de laboratorio de las perforaciones que se llevaron a cabo en el sitio presentaron retrasos puesto que las muestras estaban más húmedas de lo normal, por lo anterior los productos contractuales de estudio de suelos, geotecnia y diseños estructurales no se han podido culminar de manera satisfactoria.

En cumplimiento a las obligaciones contractuales descritas en la minuta del CONTRATO DE CONSULTORÍA CON-313-2022, cuyo objeto es: "REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO

COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C", y a los entregables estipulados en desarrollo del mismo, en referencia a entrega de informe de ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA. Se evidencia que no se cuentan con los insumos necesarios para la culminación de esta Etapa dentro del tiempo contractual estipulado.

A partir de lo anterior, la Asociación de Profesionales y Servicios- APIS SAS, solicita un periodo de prórroga de ocho (8) días, con el fin de que lo expuesto a lo largo de este comunicado se logre subsanar y cumplir con la entrega de los productos contractuales.

A partir de lo anterior, se solicita una prórroga del contrato de CONSULTORIA e INTERVENTORIA por un término de 08 días calendario.

Nota 1. Anexamos la programación respectiva.

Quedamos atentos a su pronta respuesta,

Cordialmente,

OSCAR JULIAN MORENO C
REPRESENTANTE LEGAL
ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S.
Copia.
Fondo de Desarrollo Local De Rafael Uribe Uribe.
Atn. Hector Erira
Supervision FDLRUU

CON-313-2022-011

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2022

Señores:
ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S
Atn: Ing. Oscar Julián Moreno C
Representante Legal
Calle 18 No. 4-91 oficina 307, Bogotá.
La Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE CONSULTORÍA CON-313-2022, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C"**

Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA No2. DEL CONTRATO.**

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite comunicado 011 con asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA No2. - CONTRATO DE CONSULTORÍA CON-313-2022,** cuyo objeto es **"REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C",** fundamentada en:

El contratista en su facultad como encargado de la ejecución del contrato de consultoría de la referencia, solicita amablemente sea evaluado y aprobado el periodo de prorroga No.2 para el contrato de consultoría, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Dando alcance a lo establecido en el anexo técnico que hace parte integral del contrato de Consultoría No. CON-313-2022, se definieron los entregables y posibles fechas de entrega de estos, fechas establecidas sujetas a entrega de los insumos para la ejecución de los diseños, como lo son el estudio de redes existente, resultados de ensayos y estudios de suelos.

El Contratista pone en conocimiento mediante este comunicado y tal como se manifestó en el comité de seguimiento el día 09 de diciembre de 2022, las particularidades que se han presentado en la ejecución del contrato que han imposibilitado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que generan la necesidad inminente de prorrogar por segunda vez el contrato, teniendo en cuenta que se cumplirán los treinta (30) días de la prórroga No1 del contrato solicitados por medio del comunicado CON-313-2022-009 y que a la fecha no se han logrado subsanar en su totalidad las razones expuestas

- Los resultados de laboratorio de las perforaciones que se llevaron a cabo en el sitio presentaron retrasos puesto que las muestras estaban más húmedas de lo normal, por lo anterior los productos

contractuales de estudio de suelos, geotecnia y diseños estructurales no se han podido culminar de manera satisfactoria.

En cumplimiento a las obligaciones contractuales descritas en la minuta del CONTRATO DE CONSULTORÍA CON-313-2022, cuyo objeto es: "REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C", y a los entregables estipulados en desarrollo del mismo, en referencia a entrega de informe de ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA. Se evidencia que no se cuentan con los insumos necesarios para la culminación de esta Etapa dentro del tiempo contractual estipulado.

A partir de lo anterior, la Asociación de Profesionales y Servicios- APIS SAS, solicita un periodo de prórroga de ocho (8) días, con el fin de que lo expuesto a lo largo de este comunicado se logre subsanar y cumplir con la entrega de los productos contractuales.


El contratista se encuentra altamente comprometido con la correcta ejecución del contrato de consultoría y espera que se logre dar trámite y solución a lo expuesto anteriormente para lograr llevar a feliz término el contrato de la referencia.

Agradezco la atención y colaboración.

Cordialmente,

Pilar Melo Martínez
Representante Legal

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE PERMITAN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO COLINAS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN**	**80 días?**	**lun 3/10/22**	**sáb 24/12/22**
2	**ACTIVIDADES PREVIAS**	**22 días**	**lun 3/10/22**	**mar 25/10/2**
3	Recopilación y análisis de la información	12 días	lun 3/10/22	vie 14/10/22
4	Visitas técnicas	3 días	mar 4/10/22	vie 7/10/22
5	Valoración de la información recopilada	12 días	vie 7/10/22	jue 20/10/22
6	Informe de actividades previas	5 días	jue 20/10/22	mar 25/10/2
7	PERÍODO DE SUSPENSIÓN	15 días	jue 27/10/22	vie 11/11/22
8	**ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**39 días**	**vie 11/11/22**	**jue 22/12/22**
9	ESTUDIOS GEOLÓGICOS (No contractual)	10 días	vie 11/11/22	mar 22/11/2
10	Estudios topográficos	10 días	vie 11/11/22	mar 22/11/2
11	Apiques horizontales y verticales, ensayos de laboratorio con resultados	20 días	mar 22/11/22	mar 13/12/22
12	Estudio de redes existentes	5 días	sáb 10/12/22	vie 16/12/22
13	Estudio de suelos y diseños geotécnicos	5 días	sáb 10/12/22	vie 16/12/22
14	Diseño estructural	3 días	vie 16/12/22	lun 19/12/22
15	Cantidades de obra y presupuestos	3 días	lun 19/12/22	jue 22/12/22
16	Planos	2 días	lun 19/12/22	mié 21/12/2
17	**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**	**64 días**	**mar 18/10/2**	**vie 23/12/22**
18	Socialización inicial del proyecto	0 días	mar 18/10/2	mar 18/10/2
19	Plan de manejo ambiental para los estudios y dise	4 días	lun 19/12/22	vie 23/12/22
20	Plan de gestión social para los estudios y diseños	4 días	lun 19/12/22	vie 23/12/22
21	Socialización final del proyecto	0 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22
22	ENTREGA FINAL	1 día?	vie 23/12/22	sáb 24/12/22

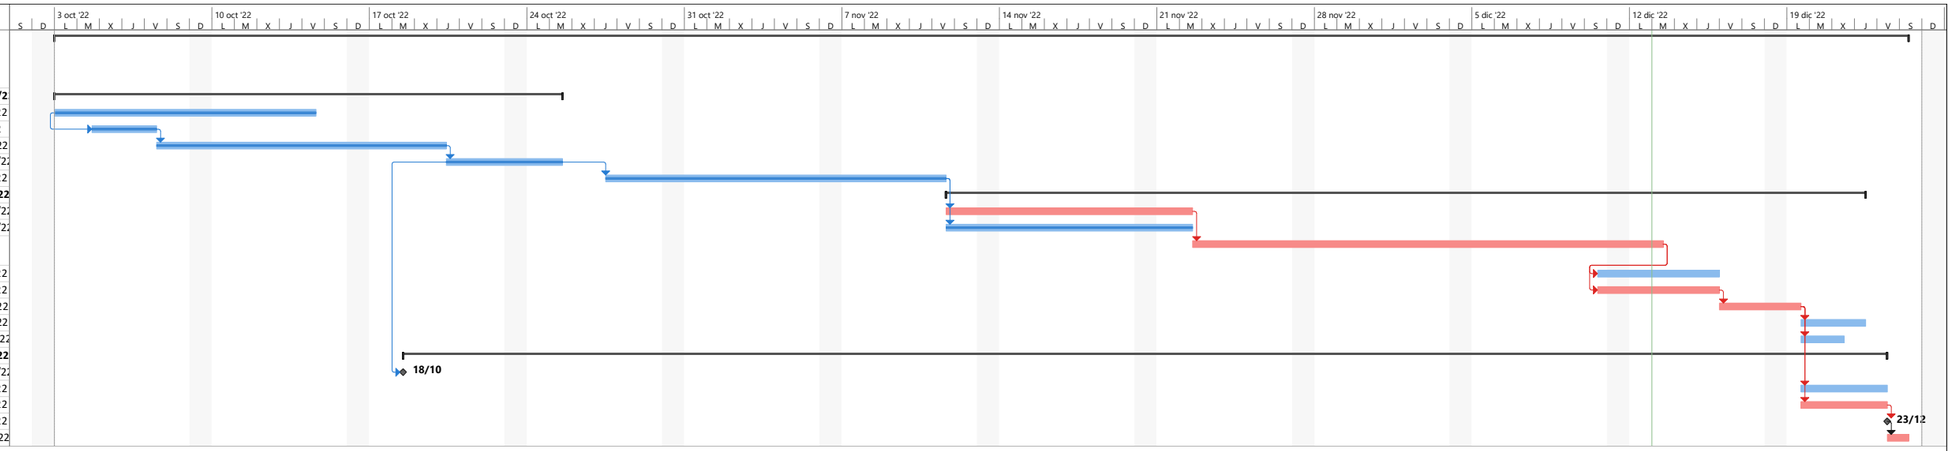

Proyecto: CRONOGRAMAGENE
Fecha: mar 13/12/22

Tarea, Hito, Resumen del proyecto, Hito inactivo, Tarea manual, Informe de resumen manual, solo el comienzo, Tareas externas, Fecha límite, División crítica, Progreso manual
División, Resumen, Tarea inactiva, Resumen inactivo, solo duración, Resumen manual, solo fin, Hito externo, Tareas críticas, Progreso
