CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 9
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 9
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 11
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 13

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**22000944 H4 2022**
Nombre del Contratista:	**BERMORI GRANADA VALENCIA C.C. 76325377**
Periodo informe:	**21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2022**
Nombre de Supervisor:	**MARCO ANDRÉS GUTIÉRREZ**
Nombre del Interventor:	**N/A**
Área perteneciente:	**DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR**

INFORMACION CONTRACTUAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	07 DE JUNIO DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	21 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR INICIAL:	$226.729.465
VALOR ACTUALIZADO:	$226.729.465
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA

2. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENER Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DEL HANGAR DE LA AEROCIVIL UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: Del día 21 septiembre al 20 de octubre del año 2022		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. . Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. De ese diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región se contará con al menos el cinco por ciento (5%) que sean mujeres	Durante el periodo de ejecución el Contratista ha integrado el personal correspondiente para la ejecución de las actividades, personal de la región.	Los mismos se verán reflejados en la cuenta de cobro con sus respetivos soportes.
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante el presente periodo, el Contratista de obra ha iniciado la ejecución de las actividades estimadas dentro de los documentos, de conformidad con lo requerido por la Entidad.	En el momento la Entidad se encuentra revisando el ajuste del cronograma con el fin de actualizar fechas y ruta crítica.
3 . Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante el presente periodo, el Contratista de obra ha desarrollado las actividades siguiendo lo señalado en el contrato, dentro de los requisitos de calidad y ha empleado mano de obra calificada para los trabajos.	
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Durante la ejecución, el Contratista ha preservado los bienes y servicios otorgados por la entidad, para el cumplimiento del alcance contractual.	No se han recibido reclamaciones ni se ha presentado daño alguno.
5 . Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el	Durante el presente periodo no se presentaron reclamaciones.	N/A

objeto del Contrato o sobre sus obligaciones		
6 abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	Durante el presente periodo, no se ha iniciado la ejecución de las actividades en áreas restringidas, aun no se cuentan con los permisos de OPAIN, para los trabajos en plataforma, sin embargo, se revisó la ruta crítica para dar continuidad a la ejecución de actividades en áreas administrativas.	Los permisos de ingreso a OPAIN aún no han sido aprobados. A cargo se encuentra la Doctora Patricia de Castro, del área de comercialización.
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Durante el presente periodo la Entidad se encuentra en mesa de trabajo con el contratista para el perfeccionamiento del documento de Programa de Gerencia de Proyectos.	
8 identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato	Durante el presente periodo se evidencia que el Contratista dispone de personal idóneo para la ejecución de las actividades, procedente de la región.	
9 Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	Durante el presente periodo se evidencia que el Contratista dispone de personal idóneo para la ejecución de las actividades.	
10 . Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	El contratista ha cumplido con lo presentado mediante el presente documento.	
11 Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato	Durante el presente periodo no se han presentado situaciones que modifiquen la estimación de los riesgos previsibles.	
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Durante el presente periodo no se han presentado situaciones que afecten negativamente el contrato.	
13 Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos	Durante el presente periodo, el contratista ha seguido con estricto cumplimiento leyes y	N/A

a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	reglamentos relacionados a la presente obligación.	
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	No se ha presentado modificaciones en el tipo de persona de la empresa: persona natural.	N/A
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	El contratista ha cumplido con sus obligaciones ambientales en el desarrollo del contrato de obra.	
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,	El contratista no se ha visto involucrado en investigaciones penales, en donde se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas.	

accionistas o integrantes del Contratista.		
17. Incorporar como mínimo el cuarenta por cientos (40%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato	Todo el personal presentado en la obra es de nacionalidad colombiana.	
18. Estar en permanente comunicación con el Supervisor del contrato.	Durante el periodo se le solicitó al contratista cortes semanales con la finalidad de medir a detalle el avance del contrato de obra.	
19. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el Supervisor atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	El contratista debe mejorar la oportunidad en que entrega la información que se le solicita, así como la efectiva respuesta a requerimientos administrativos.	
20. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Durante el presente periodo se ha evidenciado personal idóneo.	
21. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	Durante el presente periodo, el contratista se encuentra consolidando los documentos pertinentes para la revisión y evidencia de la presente obligación.	Se evidenciará mediante la Cuenta de cobro N° 1.

22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	No se evidencia incumplimiento a la presente obligación.	
23. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.	Se hace seguimiento y acompañamiento por parte de la administración del HANGAR para la verificación de la presente obligación.	
24. Las demás que disponga la ley y las que sean inherentes al objeto del contrato		El contratista se encuentra trabajando en la presente obligación.

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el presente periodo, el Contratista ha venido superando los impases del inicio, la Entidad se encuentra en revisión de balance financiero, según reunión sostenida el viernes 26 de agosto.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	DAGNOSTICO.			**$ -**
1.1	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN TECNICA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTUA Y REDES ASOCIADAS. INCLUYE SONDEO Y DIAGNOSTICO DE LAS REDES SANITARIAS. EVALUACIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL DE CADA UNO DE LOS APARATOS SANITARIOS. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. EVALUACIÓN E INSPECCIÓN TECNICA DE LA	GLB	-	$ -

	CUBIERTA. DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL. DIAGNOSITCO Y EVALUACIÓN DE LAS REDES DE CLIMATIZACIÓN. EVALUACIÓN INTEGRAL PANELES ELECTRICOS.				
	PINTURA			**$**	**10.553.976,59**
2.1	ESTUCO Y PINTURA INTERIOR A 2 MANOS	M2	296,49	$	10.553.976,59
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA			**$**	**359.731,41**
3.1	LIMPIEZA DE CANALES, DRENAJES Y BAJANTES	ML	12,94	$	359.731,41
	CUBIERTA			**$**	**1.057.906,19**
4.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA	M2	-	$	-
4.2	MANTENIMIENTO GENERAL DE FLANCHE	ML	26,59	$	1.057.906,19
	MANTENIMIENTO PUERTAS			**$**	**11.478.824,00**
5.1	AJUSTE, LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS	UND	7,00	$	1.558.914,00
5.2	ARREGLO DE MANIJAS DE PUERTAS	UND	2,00	$	163.292,00
5.3	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PASADORES	UND	6,00	$	279.924,00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES	UND	2,00	$	219.814,00
5.5	MANTENIMIENTO GENERAL Y REHABILITACIÓN PUERTA DE ACCESO AERONAVES HANGAR. INCLUYE MANTENIMIENTO ALINEACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRACCIÓN, RIEL DE CARGA, CADENAS, ANCLAJES, RUEDAS Y POLEAS Y ARREGLOS METALICOS Y PINTURA.	MANT.	2,00	$	9.256.880,00
	HIDRAULICO			**$**	**1.350.332,00**
6.1	REVISIÓN Y AJUSTE DE VALVULAS SANITARIAS	UND	5,00	$	522.175,00
6.2	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE TAPAREGISTRO	UND	4,00	$	149.056,00
6.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	-	$	-
6.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA PUSH PARA SANITARIOS	UND	1,00	$	283.843,00
6.5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA PUSH PARA ORINALES	UND	1,00	$	272.862,00
6.6	ARREGLO DE FILTRACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	$	122.396,00
6.7	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO SANITARIO (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE)	UND	-	$	-
6.8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO ORINAL (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE)	UND	-	$	-
6.9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO LAVAMANOS (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE)	UND	-	$	-
	ESTRUCTURA LIVIANA			**$**	**3.004.930,45**

7.1	DEMOLICIÓN DE CIELORRASO EN DRYWALL	M2	10,60	$	305.896,50
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, CINTAS, LIJADA, PINTURA Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	M2	7,25	$	755.381,16
7.3	REPOSICIÓN CIELO RASO EN FIBRA MINERAL (IGUAL AL EXISTENTE). INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE, ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN.	M2	16,68	$	1.943.652,79
	ILUMINACIÓN			**$**	**-**
8.1	REPOSICIÓN PANEL LED DE EMPOTRAR IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE Y ACCESORIOS.	UN	-	$	-
8.2	MANTENIMIENTO PANEL LED DE EMPOTRAR EXISTENTE (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	-	$	-
	VARIOS			**$**	**5.125.244,83**
9.1	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA	UND	8,00	$	1.232.472,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA PARA VENTANA. CON BARROTES HORIZONTALES EN ACERO, LACADA EN COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE EN LA FACHADA	M2	14,85	$	3.524.311,83
9.3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REJILLAS DE VENTILACIÓN	UND	3,00	$	183.477,00
9.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE VENTANAS CON SIKAFLEX O SIMILAR	UND	4,00	$	184.984,00
	MANO DE OBRA			**$**	**615.854,00**
10.1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS	HR	-	$	-
10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HR	19,00	$	238.412,00
10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HR	18,00	$	377.442,00
	ITEM NO PREVISTOS			**$**	**41.787.089,08**
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO DE 18W	UN	1,00	$	50.750,00
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DE 100W EXTERIOR	UN	2,00	$	725.000,00
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DE 200W EXTERIOR	UN	2,00	$	1.512.000,00
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA	UN	2,00	$	576.500,00
NP 5	SUMINSTRO E INTALACION PANEL LED DE 1.20 X 30	UN	1,00	$	354.500,00
NP 6	MURO EN DRYWALL ESTUCADO	M2	3,00	$	454.815,75
NP 7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0.90* 2.05 MTS	UN	-	$	-
NP 8	CHAPA DE MANIJA APERTURA DE PUERTA	UN	-	$	-
NP 9	RETIRO DE MANTO Y LAMINAS DE ICOPOR EXISTENTE, TRATAMIENTO DE JUNTAS , TRASLADO PARTE INFERIOR DEL EDIFICIO. S..	m2	70,74	$	2.033.766,89

NP 10	MORTERO 1:3 PARA NIVELAR O CORREGIR PENDIENTES DE LOSA (EN ALGUNAS PARTES DONDE SE EVIDENCIA ESTANCAMIENTO DE AGUA)	m2	33,90	$ 1.101.870,37
NP 11	DEMOLICIÓN DE REPELLO O PAÑETE	m2	14,90	$ 229.430,64
NP 12	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	112,14	$ 11.080.696,26
NP 13	RECORRIDO DE CUBIERTA SELLO TORNILLERIA		611,10	$ 7.653.994,88
NP 14	MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALES	ML	73,22	$ 2.913.310,80
NP 15	RETIRO DE ESCOMBROS VOLQUETA < =10 KM	m3	13,59	$ 1.331.351,02
NP 16	SELLADO DE PISO CONTORNO TERRAZA SELLADOR ELASTICO AUTONIVELANTE PARA CONCRETO	ML	52,99	$ 3.990.297,09
NP 17	MEDIA CAÑA EN MORTERO ZONA DESNIVEL DE PISO	ML	60,07	$ 1.081.344,81
NP 18	RANURADO Y REPARACION DE GRIETAS CON SELLADOR ELASTICO EN MUROS ZONA DE TERRAZA	M2	61,09	$ 3.378.238,46
NP 19	ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR A 2 MANOS	M2	29,94	$ 1.365.020,77
NP 20	MUEBLE INFERIOR COCINA, MADERA TIPO RH COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Altura = 0,90 mts profundidad = 0,60 mts	ML	0,29	$ 657.811,04
NP 21	MUEBLE SUPERIOR COCINA, MADERA TIPO RH COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Altura = 0,60 mts profundidad = 0,40 mts	ML	0,84	$ 1.296.390,29
NP 22	VENTANA EN ALUMINIO 1,00*1,00 MTS VIDRIO 4 MM TRANSPARENTE	un	-	$ -

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Durante el presente proceso no se evidencian observaciones adicionales.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA

5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo.		

7. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

EXAMEN OCUPACIONAL (NO APLICA)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
	X
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

7.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X

8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
2	X	

9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

9.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor actualizado del contrato:

INFORMACION AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO				
No. PAGO	**FECHA DE RADICACIÓN EN C/P**	**VALOR PAGADO**	**% EJECUTADO EN PAGOS**	**SALDO POR PAGAR**
01	pendiente	Aun no se han pagado cuentas		

La cuenta No. 1se encuentra en revisión para aprobación.

9.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	21 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$226.729.465
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	De acuerdo con inclusión de NPs se encuentra en actualización
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	De acuerdo con inclusión de NPs se encuentra en actualización
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	$181.383.572
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	Se ha ejecutado un 80%
% DE ATRASO O ADELANTO	-

9.2. AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

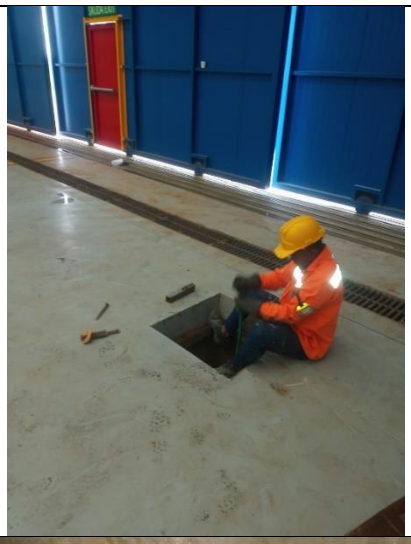
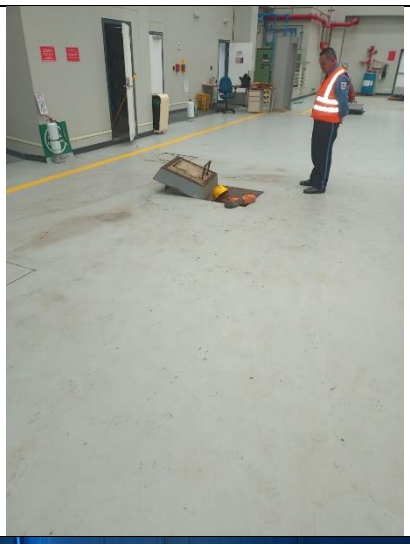
INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	4
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)	120 días / 4 meses
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	80%

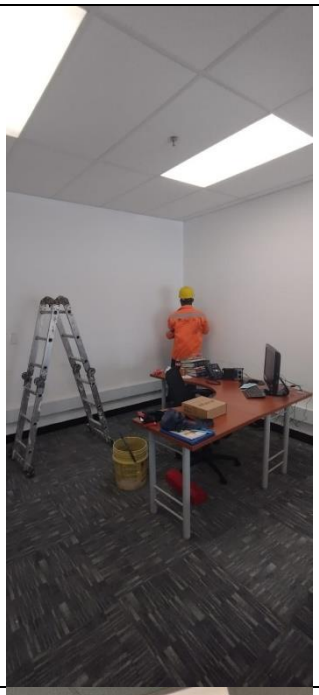
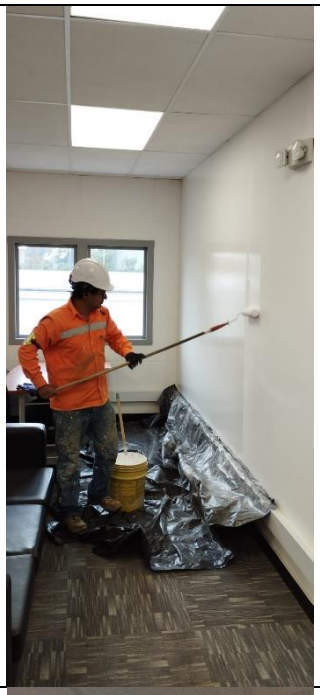
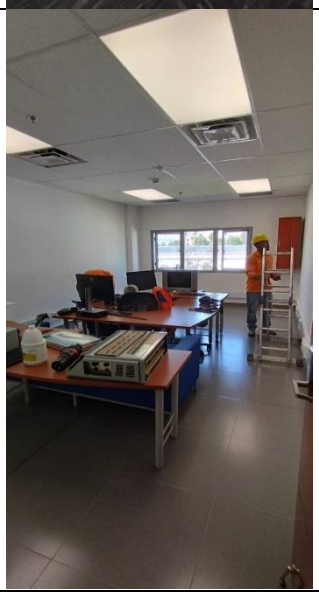
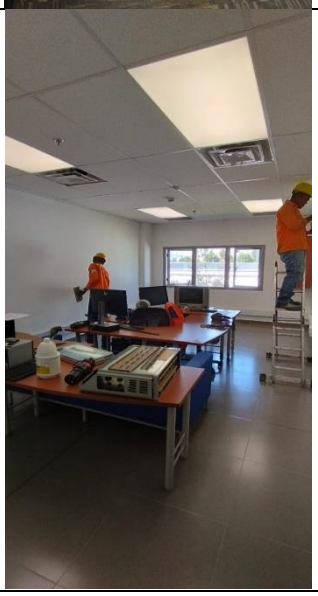
c. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO	**NO APLICA**
SOLICITUD ADICIÓN	**NO APLICA**
SOLICITUD PRORROGA	**NO APLICA**
SOLICITUD MODIFICACIÓN	Solicitud de inclusión de ítems no previstos sin adición del contrato, acta de mayores y menores cantidades.
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA	**NO APLICA**
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURÍDICOS	

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO	**NO APLICA**
SOLICITUD ADICIÓN	**NO APLICA**
SOLICITUD PRORROGA	**NO APLICA**
SOLICITUD MODIFICACIÓN	Solicitud de inclusión de ítems no previstos sin adición del contrato, acta de mayores y menores cantidades.
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURÍDICOS	

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Mantenimiento de cajas de inspección en plataforma de estacionamiento de Hangar.</td></tr>
</table>

	
	
Se aplica la tercera mano de pintura en todas las areas del hangar, adicional se cambian las laminas de cieloraso contempladas dentro del alcance, se realiza el cambio de las luminarias.	

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Se hace la disposición de desechos a puntos autorizados retirandolos del sitio de trabajo.</td></tr>
</table>

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

PAOLA MILENA ORTIZ
APOYO TÉCNICO

HORACIO TRILLOS PEREZ
GESTOR JURÍDICO CONTRACTUAL

MARCO ANDRÉS GUTIÉRREZ FAJARDO
SUPERVISOR
