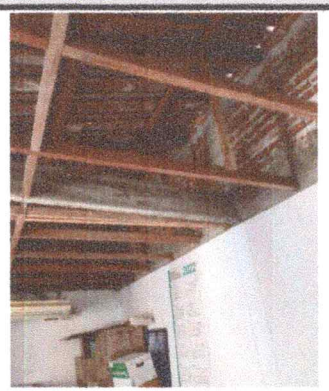
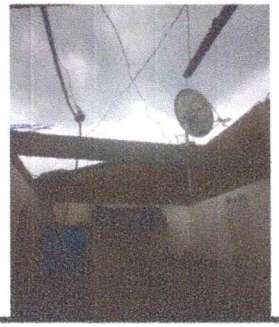
REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

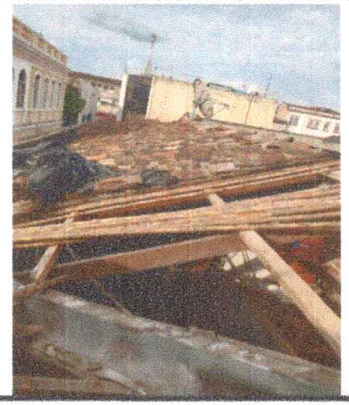
INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 OFICINA DE AGRICULTURA

Item		DESM. ESTRUCTURA MADERA T. BARRO					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	Area (m2)	M3	Observaciones		
DESM. ESTRUCTURA MADERA T. BARRO		12,25	3,1		37,98				
TOTAL					37,98				

Item		DESM. CORREA - VIGA - COLUMNA MADERA					Unidad:	ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
DESM. CORREA - VIGA - COLUMNA MADERA		12,25			5,00	61,25			
		3,1			5,00	15,50	CORREAS		
		3,1			13	40,30			
		4,5			2	9,00	VIGA		
TOTAL						126,05			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

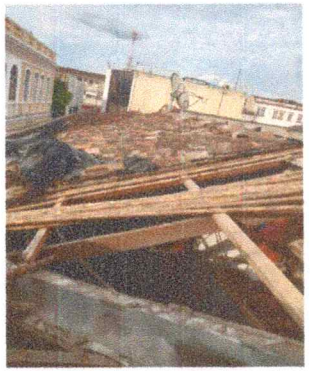
INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 OFICINA DE AGRICULTURA

Item		INSTALACION TEJA BARRO ANTIGUA - RESTAURACION					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
INSTALACION TEJA BARRO ANTIGUA - RESTAURACION		12,25			3,10	37,98			
						90%	34,18		
TOTAL						34,18			

Item		TEJA DE BARRO NORMAL - REPOSICION					Unidad:	UND	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
TEJA DE BARRO NORMAL - REPOSICION					150,00	-			
						-			
TOTAL					150,00	-			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 OFICINA DE AGRICULTURA

Item		ENTRAMADO TEJA BARRO - CAÑABRAVA					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	Area (m2)	M3	Observaciones		
ENTRAMADO TEJA BARRO - CAÑABRAVA		12,25	3,1		37,98				
TOTAL					37,98				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 OFICINA DE AGRICULTURA

Item		ALFAGIA CONCRETO A= 15 - 20 CMS					Unidad:	ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
ALFAGIA CONCRETO A= 15 - 20 CMS		12,25			1,00	12,25			
		3,1			2,00	6,20			
TOTAL						18,45			

Item		SOLAPA LAMINA GALVANIZADA					Unidad:	ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
SOLAPA LAMINA GALVANIZADA		12,25			1,00	12,25			
		3,1			2,00	6,20			
		8,45			1	8,45			
		1,8			1	1,80			
TOTAL						28,70			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BUGA de la Gente

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 OFICINA DE AGRICULTURA

Item		VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10 - 12 X 20 CM					Unidad:	ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10 - 12 X 20 CM		12,25			1,00	12,25			
		3,1			2,00	6,20			
						-			
TOTAL						18,45			

Item		DEMOL.MURO LAD. SOGA					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	Area (m2)	M3	Observaciones		
DEMOL.MURO LAD. SOGA		12,2		0,40	4,88				
		3,05		0,40	1,22				
TOTAL					6,10				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 OFICINA DE AGRICULTURA

Item		SOPORTE BAJOTEJA CHANUL 3"X3"					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	Area (m2)	M3	Observaciones		
SOPORTE BAJOTEJA CHANUL 3"X3"		12,25	3,1		37,98				
TOTAL					37,98				

Item		IMPERME-INMUNIZACION VIGA MADERA 3-4C-RE					Unidad:	ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
IMPERME-INMUNIZACION VIGA MADERA 3-4C-RE		3,1			13,00	40,30			
		4,5			2,00	9,00	VIGAS EXISTENTES		
		12,25			5	61,25			
		3,1			5	15,50	CORREAS		
TOTAL						126,05			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

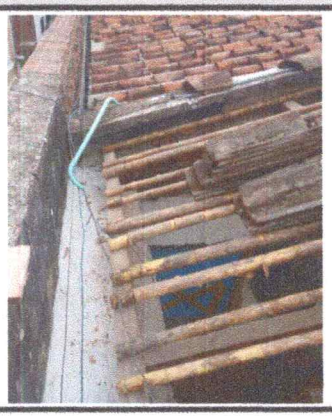
INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 OFICINA DE AGRICULTURA

Item		INSTALACION VIGAS MADERA EXISTENTES					Unidad:	ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
INSTALACION VIGAS MADERA EXISTENTES		3,1			13,00				
		4,5			2,00				
TOTAL					15,00	-			

Item		VIGA CONCRETO AMARRE MURO CULATA 10-12 X 20					Unidad:	ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
VIGA CONCRETO AMARRE MURO CULATA 10-12 X 20		9,66			1,00	9,66			
						-			
						-			
TOTAL						9,66			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 OFICINA DE AGRICULTURA

Item		REPELLO VIGA CANAL - 3 C					Unidad:	ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
REPELLO VIGA CANAL - 3 C		9,66			1,00	9,66			
						-			
						-			
TOTAL						9,66			

Item		IMPERM. MANTO 500 XT. FOIL ALUMINIO					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
IMPERM. MANTO 500 XT. FOIL ALUMINIO		9,66			0,66	6,38			
						-			
						-			
TOTAL						6,38			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 OFICINA DE AGRICULTURA

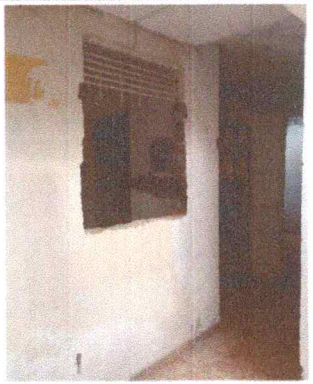
Item		ALFAGIA CONCRETO					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	UNIDAD	LONGITUD TOTAL	Observaciones		
ALFAGIA CONCRETO		4,5			1,00	4,50			
						-			
						-			
TOTAL						4,50			

JAIBER RINCON Q.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SOP
SUPERVISOR CONTRATO

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BUGA de la Gente

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		DEMOL.MURO LAD. SOGA					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	Area (m2)	M3	Observaciones		
DEMOL.MURO LAD. SOGA		0,9	2,4		2,16				
		1,1	1,2		1,32				
					-				
					-				
TOTAL					3,48				

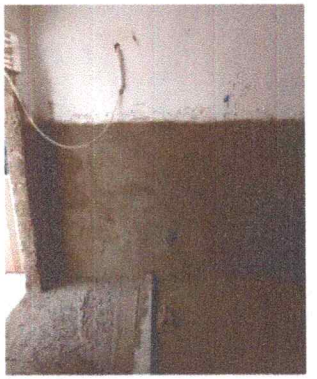
REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		MUR LAD. SOGA SUCIO					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	Area (m2)	M3	Observaciones		
MUR LAD. SOGA SUCIO		2,4	1		2,40				
TOTAL					2,40				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		REPELLO MURO 1:3					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
REPELLO MURO 1:3		2,4	1	2,00	4,80		vano archivo		
		2,4	0,15	2,00	0,72				
		1,2	0,15	2,00	0,36				
		0,9	0,15	3,00	0,41				
TOTAL					6,29				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA								
Item		IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AQOS					Unidad:	M2
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3		
IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AQOS					50,00			
TOTAL					50,00			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		DESM.APARATO SANITARIO					Unidad:	und	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
DESM.APARATO SANITARIO				1,00					
TOTAL				1,00	-				

Item		COMBO SANITARIO ECONOMICO (S+L+G+I)					Unidad:	UND	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
COMBO SANITARIO ECONOMICO (S+L+G+I)				1,00					
TOTAL				1,00	-				


REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		PUNTO SANITARIO PVC 2					Unidad:	UND	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
PUNTO SANITARIO PVC 2				3,00					
TOTAL				3,00	-				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		CANCELACION PTO.SANITARIO					Unidad:	UND	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
CANCELACION PTO.SANITARIO				3,00					
TOTAL				3,00	-				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		CAJA INSPECCION 40x 40 CM					Unidad:	UND	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
CAJA INSPECCION 40x 40 CM				1,00					
TOTAL				1,00	-				

Item		PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2					Unidad:	UND	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2				3,00					
TOTAL				3,00	-				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		VALVULA REGULACION 1/2 METAL					Unidad:	UND	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
VALVULA REGULACION 1/2 METAL				1,00					
TOTAL				1,00	-				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO					Unidad: UND	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones	
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	2,47	1,1		2,72		PISO BAÑO	
	3,2	2,46		7,87		PISO OFICINA	
TOTAL			-	10,59			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

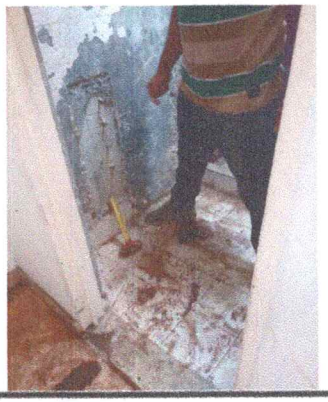
Item		ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD		2,47	1,1		2,72		PISO BAÑO		
		3,21	2,46		7,90		PISO OFICINA		
		1,61	1,8	2,00	5,80				
		1,1	1,8	2,00	3,96				
		0,45	1,8	2,00	1,62				
		0,85	1,8	1,00	1,53		MUROS BAÑO		
TOTAL				-	23,52				



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BUGA de la Gente

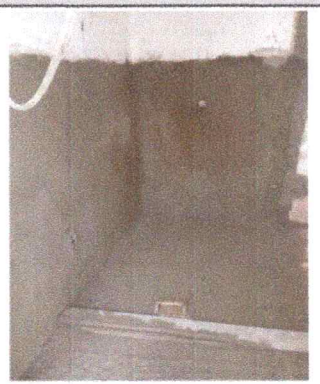
INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		DEMOL.ENCHAPE CERAMICO					Unidad: UND	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones	
DEMOL.ENCHAPE CERAMICO		1,61	1,8	2,00	5,80		PISO BAÑO	
		1,1	1,8	1,00	1,98		PISO OFICINA	
		0,45	1,8	2,00	1,62			
					-			
							MUROS BAÑO	
TOTAL					9,40			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		ALISTADO PISO 4 CM					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
ALISTADO PISO 4 CM		2,47	1,1		2,72		PISO BAÑO		
		3,21	2,46		7,90		PISO OFICINA		
TOTAL				-	10,61				



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BUGA de la Gente

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE					Unidad: UND	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones	
MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE				1,00	-			
					-			
TOTAL				1,00	-			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BUGA de la Gente

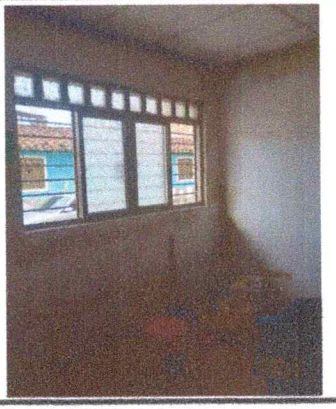
INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		NAVE LAM. ENTAMB. CAL.20 BAT.					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
NAVE LAM. ENTAMB. CAL.20 BAT.		0,9	2,4	1,00	2,16				
					-				
TOTAL				1,00	2,16				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BUGA de la Gente

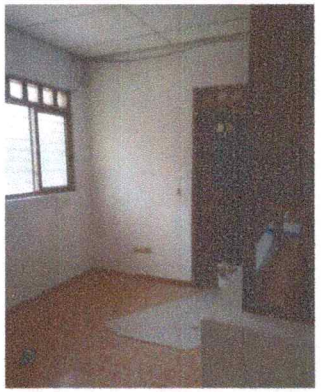
INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		RASQUETEADA-LIJADA-RESANE					Unidad: M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones	
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE					300,00		AREA TOTAL	
							AREA FACHADA	
TOTAL				-	300,00			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BUGA de la Gente

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item	VINILO MURO TIPO 1					Unidad: M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones	
VINILO MURO TIPO 1				300,00		AREA TOTAL	
TOTAL			-	300,00			

Item	GUARDAESCOBA TABLON					Unidad: ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	ML	Observaciones	
GUARDAESCOBA TABLON	11				11	AREA TOTAL	
	12,5				12,5		
TOTAL			-	-	23,50		

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		DESM.CUBIERTA TEJA BARRO					Unidad: M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones	
DESM.CUBIERTA TEJA BARRO		13,5	11		148,50		AREA TOTAL	
		3,21	3,43		11,01		PATIO CENTRAL	
		1,61	2,21		3,56		PATIO LATERAL	
		1,5	11		16,50		AREA LOSA	
TOTAL				-	117,43			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		DESM.CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
DESM.CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO									
TOTAL				-	-				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		DESM,CUBIERTA ACRÍLICO-POLICARBONATO					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
DESM,CUBIERTA ACRÍLICO-POLICARBONATO									
		4	3,43		13,72		PATIO CENTRAL		
		1,5	1,5		2,25		AREA BAÑO		
TOTAL				-	15,97				



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

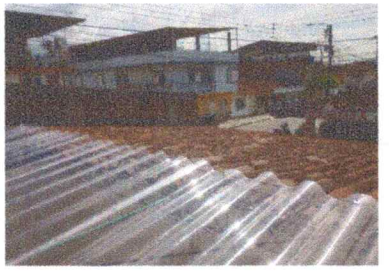
INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		TEJA PLASTICA TRASLUCIDA					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
TEJA PLASTICA TRASLUCIDA									
		4	3,43		13,72		PATIO CENTRAL		
					-				
TOTAL				-	13,72				



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		TEJA BARRO NORMAL					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones		
TEJA BARRO NORMAL		13,5	11		148,50		AREA TOTAL		
		3,21	3,43		11,01		PATIO CENTRAL		
		1,61	2,21		3,56		PATIO LATERAL		
		1,5	11		16,50		AREA LOSA		
					117,43		AREA CUBIERTA		
		%TEJA DE BARRO EN MAL ESTADO		25%	29,36		AREA TEJA DE BARRO A REPONER		
TOTAL				-	29,36				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BUGA de la Gente

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		LAVADA Y LIMPIEZA TEJA					Unidad: M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones	
LAVADA Y LIMPIEZA TEJA		13,5	11		148,50		AREA TOTAL	
		3,21	3,43		11,01		PATIO CENTRAL	
		1,61	2,21		3,56		PATIO LATERAL	
		1,5	11		16,50		AREA LOSA	
TOTAL				-	117,43			

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO					Unidad: M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones	
DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO		13,5	11		148,50		AREA TOTAL	
		3,21	3,43		11,01		PATIO CENTRAL	
		1,61	2,21		3,56		PATIO LATERAL	
		1,5	11		16,50		AREA LOSA	
					117,43		AEREA CUBIERTA	
				18%	21,14		AREA A REPONER	
TOTAL				-				



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 OFICINA DE AGRICULTURA

Item		DESM. CUBIERTA TEJA BARRO					Unidad:	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	ALTURA	Area (m2)	M3	Observaciones		
DESM. CUBIERTA TEJA BARRO		12,25	3,1		37,98				
TOTAL					37,98				

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BUGA de la Gente

INFORME : MEMORIAS ACTA DE COBRO 1 COMISARIA

Item		TEJA FIBRO CEMENTO					Unidad: M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad	Area (m2)	M3	Observaciones	
TEJA FIBRO CEMENTO		13,5	11		148,50		AREA TOTAL	
		3,21	3,43		11,01		PATIO CENTRAL	
		1,61	2,21		3,56		PATIO LATERAL	
		1,5	11		16,50		AREA LOSA	
		1,5	1,5		2,25			
					119,68		AEREA CUBIERTA	
				20%	23,94		AREA A REPONER	
TOTAL						-		

JAIBER RINCON Q.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SOP
SUPERVISOR CONTRATO
