CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°2

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 1207 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

REALIZA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"

PERIODO DEL PRESENTE INFORME

01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1. LOCALIZACIÓN 5
2.2. INVENTARIO Y ESTADO GENERAL DE LA VÍA 9
2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 10
2.4. ESTUDIOS Y DISEÑOS 10
2.5. CANTERAS Y BOTADEROS 12
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 12
3.1. INFORMACIÓN GENERAL 12
3.1.1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 13
3.1.2. VEEDURÍA 13
3.1.2.1. ACTA DE CONFORMACIÓN 13
3.1.2.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 13
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 14
3.3. INFORME DE AVANCE PRESENTADO EN MEDIO FISICO 14
3.3.1. INFORME MENSUAL DE OBRA 14
3.4. AVANCE OBRA PROGRAMADA 16
3.4.1. AVANCE DE OBRA PROGRAMA, EJECUTADA Y ACUMULADA DEL CONTRATO 16
3.4.2. BITACÓRA DE OBRA 24
3.4.3. PRE – ACTAS DE CANTIDADES 24
3.4.4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 24
3.5. ACTOS ADMINISTRATIVOS 24
3.6. INFORME SEMANALES DE INTERVENTORIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA 24
3.7. COPIA DE LAS ACTAS DE COMITÉ TECNICO MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 24
3.8. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DEL CONTRATISTA 25
3.9. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 25
3.10. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA (GASTOS ANTICIPOS, PAGOS PARCIALES, AVANCES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS) 25
3.11. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 26
3.12. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA 26
3.13. DISPONIBILIDAD DE VEHICULO MEDIANTE PROPIEDAD O CONTRATO DE ALQUILER 26

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

3.14. DISPONIBILIDAD DE OFICINA O ALQUILER 27
3.15. CONTRATO DE PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA 28
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 27
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 27
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 28
4.3. CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORIA 29
4.4. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 29
4.5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 29
4.5.1. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES 29
4.5.2. CALIBRACIÓN DE EQUIPO 29
4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 29
4.7. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA 30
5. PAPSO 30
6. CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO – FINANCIERO) 30
7. CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR 30
8. REGISTRO Y SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO DE CADA ITEM 30
9. INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR 30
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 31

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Acta parcial de interventoría N°2 se realiza con el fin de comunicar las actividades realizadas en el marco del contrato de obra N° 1181 de 2022, explicando de forma detallada el seguimiento y control ejercido por la interventoría en las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022 en cumplimiento del contrato de interventoría N° 1207 de 2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR". El informe incluye la información técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, así como el registro fotográfico de las actividades adelantadas hasta la fecha, de igual manera se anexan los documentos soporte de lo actuado en cumplimiento de los compromisos contractuales de la interventoría.


Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN


El proyecto se desarrolla en la zona sur, departamento del Huila, la cual está ubicada entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por los Ríos Las Ceibas y el Río del Oro, con tramo vial de tercer orden, para realizar su respectivo mantenimiento vial.

El contrato de obra N° 1181 de 2022 pretende realizar el "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR", los cuales están relacionados en la siguiente imagen y tabla:

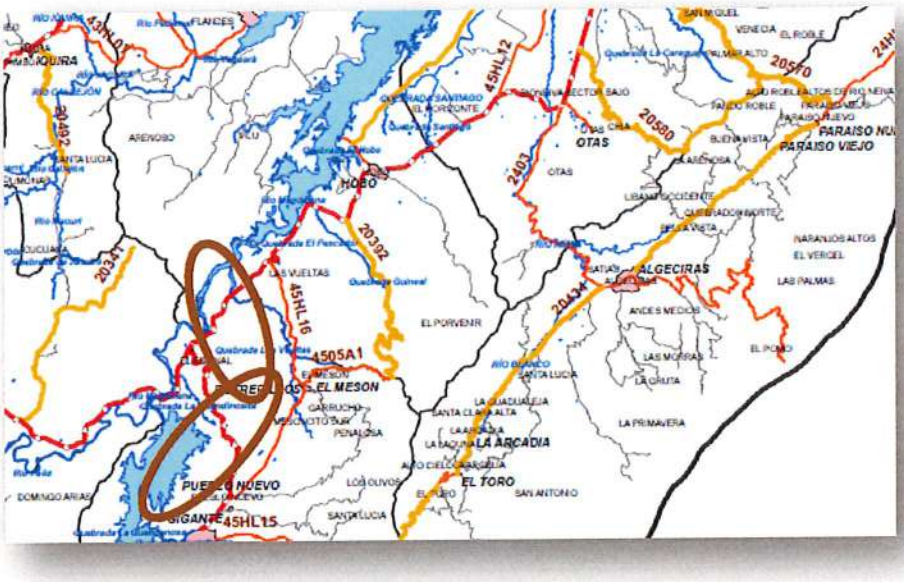


Municipio de Gigante Vías
RUTA 45 – POTRERILLOS (45HL16)
POTRERILLOS – ESTORACAL (4505A1)

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

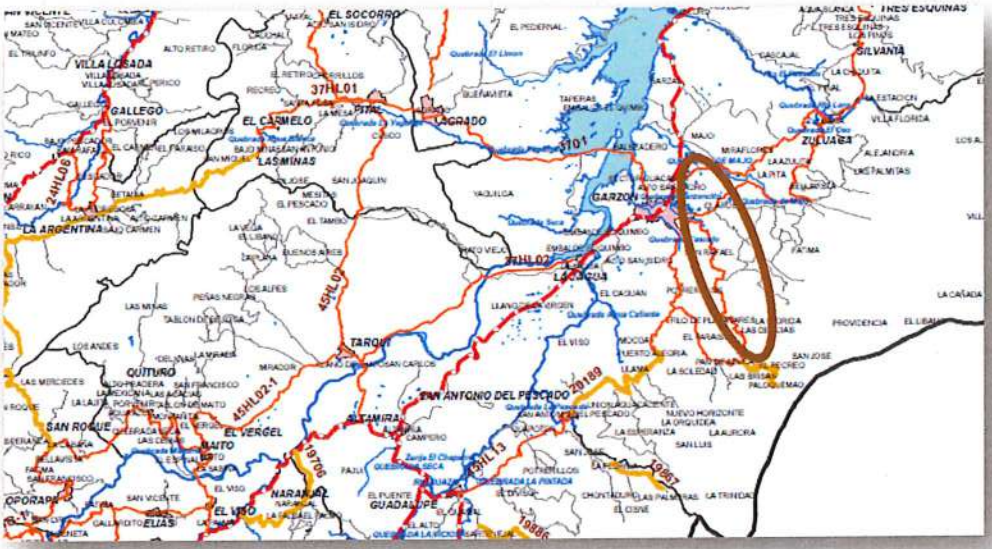


Municipio de Garzón Vías
GARZON - EL RECREO (45HL03)

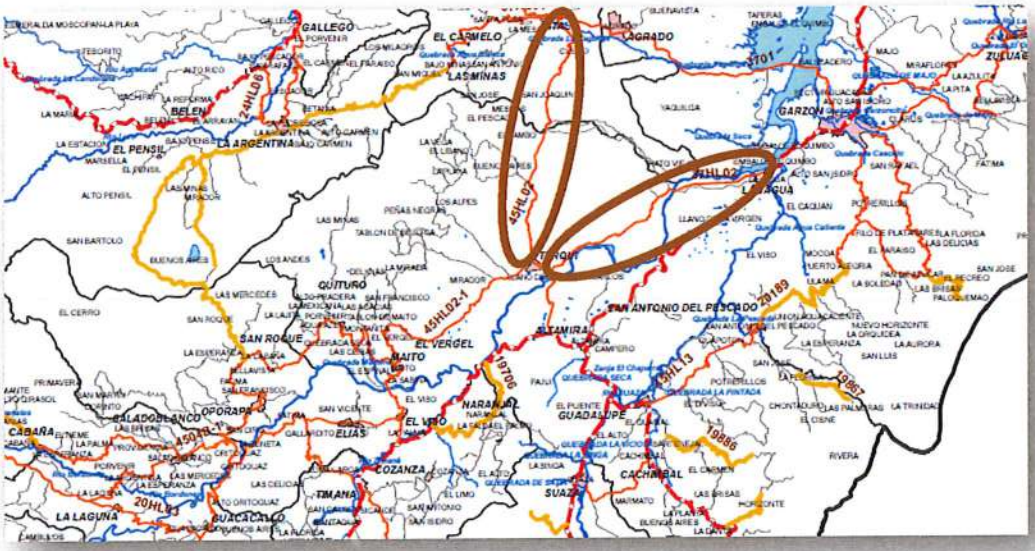


Municipio de Tarqui
CRUCE RUTA 45 - TARQUI - PITAL
(SECTOR TARQUI – PITAL- 45HL02)
TARQUI- LA JAGUA (37HL02)

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

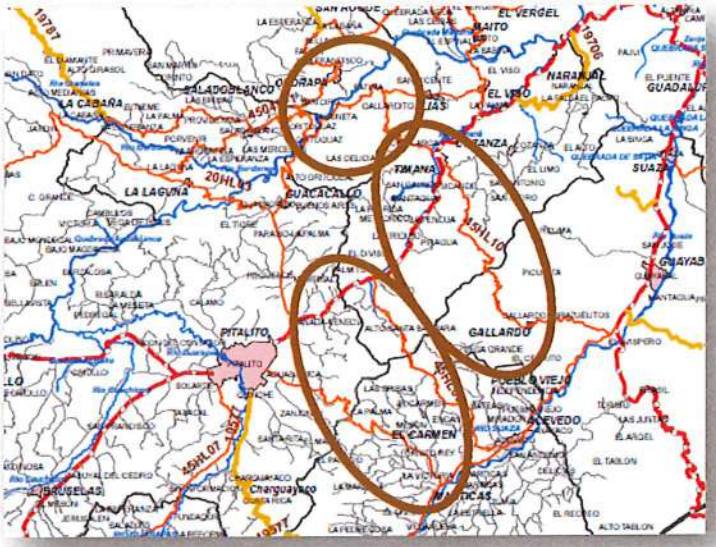

Municipio de Timaná
TIMANÁ - GALLARDO - CRUCE RUTA 20 A (45HL10)
ELIAS -POTRERILLOS - CRUCE ELIAS (45HL11)
RUTA 45 - PARAISO – ACEVEDO (45HL09)

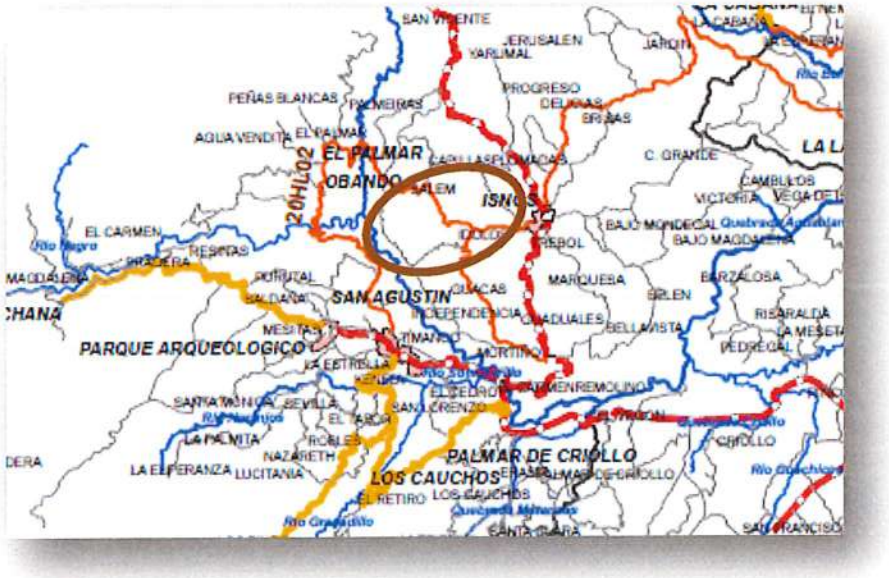

Municipio de Isnos
SUBRAMAL ALTO DE LOS IDOLOS (20HL02-1)

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742



Municipio de Elías
RUTA 45- GUACALLO- ORITOGUAZ - ELIAS- LA PALMA (4504B)



Municipio Saladoblanco
ORITOGUAZ- SALADOBLANCO- LA CABAÑA (4504B-1)
LA LAGUNA – SOLADOBLANCO (20HL03-3)

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742



Municipio de Guadalupe
SAN ANTONIO – GUADALUPE (45HL13)

2.2 INVENTARIO Y ESTADO GENERAL DE LA VÍA

Las obras estan ubicadas sobre vias de segundo y tercer orden a cargo del Departamento del Huila indicadas en el siguiente cuadro:

CÓDIGO	CATEGORÍA	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA VÍA	LONGITUD A INTERVENIR
45HL16	VÍA DE TERCER ORDEN	GIGANTE	RUTA 45-POTRERILLOS	8
20HL02-1	VÍA DE TERCER ORDEN	ISNOS	SUBRAMAL ALTO DE LOS IDOLOS (SAN JOSE ISNOS)	7,00
45HL02	VÍA DE SEGUNDO ORDEN	TARQUI	CRUCE RUTA 45 - TARQUI - PITAL, (SECTOR TARQUI-PITAL)	20,00
45HL09	VÍA DE TERCER ORDEN	ACEVEDO	RUTA 45 – PARAISO - ACEVEDO	21,00
45HL 10	VÍA DE TERCER ORDEN	TIMANA	TIMANÁ -GALLARDO - CRUCE RUTA 20A	27,20
45HL03	VÍA DE SEGUNDO ORDEN	GARZON	GARZÓN-EL RECREO	17,90
37HL02	VÍA DE TERCER ORDEN	TARQUI	TARQUI-LA JAGUA	18,00
4505A1	VÍA DE TERCER ORDEN	GIGANTE	LAS VUELTAS-POTRERILLOS-ESTORACAL, SECTOR POTRERILLOS-ESTORACAL	8,80

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

4504B	VÍA DE TERCER ORDEN	ELIAS	RUTA 45-GUACACALLO-ORITOGUAZ-ELIAS-LA PALMA	12,30
45HL 11	VÍA DE TERCER ORDEN	TIMANA	TIMANÁ-POTRERILLOS-CRUCE ELIAS	8,70
45048-1	VÍA DE TERCER ORDEN	SALADOBLANCO	ORITOGUAZ-SALADOBLANCO-LA CABAÑA-MORELIA-EL PALMAR, SECTOR SALADOBLANCO-LA CABAÑA.	14,00
45HLI3	VÍA DE SEGUNDO ORDEN	GUADALUPE	SAN ANTONIO-GUADALUPE	13,30
2OHL03-3	VÍA DE TERCER ORDEN	SALADOBLANCO	LA LAGUNA-SALADOBLANCO	10,30
			TOTAL	**186,5**

El proyecto a desarrollar representa la mejor alternativa para mitigar las deficiencias que se vienen presentando en las vías secundarias y terciarias de los Municipios de ACEVEDO, ELÍAS, GARZÓN, GIGANTE, GUADALUPE, ISNOS, PITAL, PITALITO, SALADOBLANCO, SUAZA, TARQUI, TIMANA - Departamento del Huila, teniendo en cuenta la localización de tramos críticos que mejorarán ostensiblemente la movilidad y conectividad de vías necesarias para el comercio y desarrollo de las economías locales de cada municipio.

Según la información que administra la Secretaría de Vías e Infraestructura con corte a 31 de diciembre de 2019, a partir de la Resolución 004611 del 25 de septiembre de 2019, se realizó la categorización vial del Departamento, estableciendo que:

- La Red de Primer Orden a cargo del Departamento está compuesta por 318,91 Km, de los cuales 205,54 se encuentran pavimentados, 90,07 km se encuentran en buen estado, 115,47km presentan mal estado y 113,36 km están en afirmado.

- La Red de Segundo Orden a cargo del Departamento, se estableció un total de 323,21km de los cuales hay pavimentados 156,20 km, en buen estado se encuentran 128,55 km, en estado regular 52,14 km, 113,48 en afirmado y exigen mantenimiento periódico permanente.

- Respecto a la Red de Tercer Orden a cargo del Departamento se estableció un total de 689,56km, de los cuales 109,39 km están pavimentados en buen estado, 34,77 km pavimentados en regular estado, 28,93 km en afirmado en buen estado, 451,76 km en afirmado en regular estado y 61,54 en afirmado en mal estado.


2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Estas características se exponen en el ***(ANEXO # 2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO).***

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

2.4 ESTUDIOS Y DISEÑOS

Las metodologías por desarrollar en el presente diseño deben cumplir con la siguiente normativa:

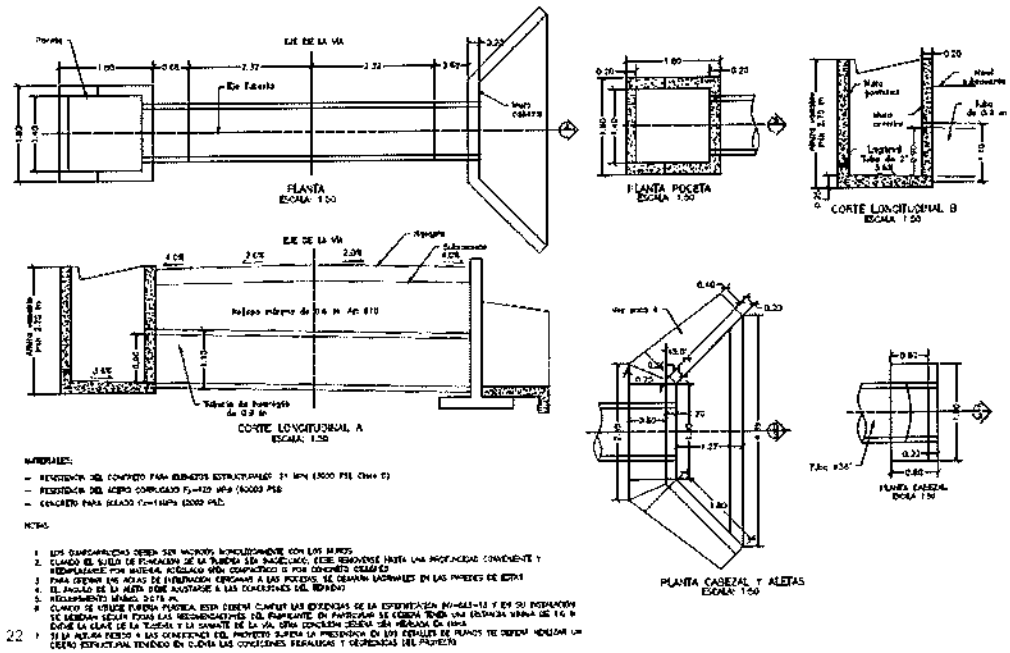

1. Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios.

2. Manual de drenaje para carreteras INVIAS.

3. Manual de diseño de pavimentos de concretos para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito.

4. Para la ejecución del contrato se exigirá el cumplimiento de las Resoluciones 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014, las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías y las especificaciones particulares que pudieran resultar para cada proyecto.

5. Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.

6. Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

7. Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

8. Resolución No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guía de Manejo Ambiental.

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

9. Las demás normatividades vigentes que se deba ser aplicada durante la ejecución del contrato.

2.5. CANTERAS Y BOTADEROS

Las fuentes entregadas por la gobernación y autorizadas por la Interventoría para este informe son nueve (9) entre resoluciones y Actas de reunión extraordinarias del concejo Municipal para la gestión de desastre entregadas por la Gobernación del Huila y quedan pendiente cinco (5) las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA VÍA	FUENTE DE MATERIAL	LONGITUD A INTERVENIR	ACARREO PROMEDIO POR TRAMO
RUTA 45-POTRERILLOS	La Guandimosa recebera 210-3577-501975	8	6,5
SUBRAMAL ALTO DE LOS IDOLOS	El Diamante recebera 210-134-500988	7	17
CRUCE RUTA 45 - TARQUI - PITAL, (SECTOR TARQUI-PITAL)	Acta N°3 de 2022 Municipio de Tarqui, Falta el Acta CMGRD del Pital	20	2,8375
RUTA 45 – PARAISO - ACEVEDO	La Honda	21	4
TIMANÁ -GALLARDO - CRUCE RUTA 20A	Acta CMGRD N°013 de Suaza	27,2	5
GARZÓN-EL RECREO	NO SE TIENE	17,9	5
TARQUI-LA JAGUA	Acta N°3 de 2022 Municipio de Tarqui	18	14
POTRERILLOS-ESTORACAL	Acta N° 7 del 02-09-22	8,8	4
RUTA 45-GUACACALLO-ORITOGUAZ-ELIAS-LA PALMA	NO SE TIENE	12,3	7,3
ELIAS – POTRERILLO – CRUCE ELIAS	NO SE TIENE	8,7	3,8
ORITOGUAZ-SALADOBLANCO-LA CABAÑA	Cedro Res 210-3577-501867	14	3,79
SAN ANTONIO-GUADALUPE	NO SE TIENE	13,3	3,5
LA LAGUNA-SALADOBLANCO	La Cabaña Res – 210-501147	10,3	14

NOTA: A la fecha no se han recibido las 5 licencias faltantes de receberas para iniciar actividades en estos frentes y evitar atrasos en la ejecución.

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

BOTADEROS: Se cuenta con los dos permisos para la disposición final de RCD generados en la obra después de la ejecución de las actividades. (se anexa autorización en el informe de obra).

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra N°	*1181 de 2022*
Objeto del Contrato	*"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"*
Contratista	*CONSORCIO CENTRAL*
Representante Legal	*JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ*
Cedula de Ciudadanía	*79957561 de Bogotá DC*
Dirección:	*CALLE 5 NUMERO 12-25, INT 3 NEIVA-HUILA*
Valor Contrato:	*DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. 2.160.234.436,00 M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS*
Fecha de inicio:	*01 de septiembre de 2022*
Plazo de ejecución:	*Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*
Fecha de terminación:	*30 de noviembre de 2022*

GARANTIAS DEL CONTRATO

POLIZAS

Las pólizas que amparan el contrato de obra 1181 de 2022 fueron expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A N° RC Extracontractual 11-40-101047959 Y Cumplimiento 11-44-101188385.

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

Póliza de RC Extracontractual Derivada de Cumplimiento # 11-40-101047959			
NOMBRE DEL AMPARO	**SUMA ASEGURADA ($)**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Predio, labores y operaciones	$ 300.000.000	13/06/2022	13/09/2022
Contratistas y subcontratistas	$ 300.000.000	13/06/2022	13/09/2022
Vehículos propios y no propios	$ 300.000.000	13/06/2022	13/09/2022
Póliza de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales # 11-44-101188385			
NOMBRE DEL AMPARO	**SUMA ASEGURADA ($)**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Cumplimiento	432.046.888	16/08/2022	16/05/2023
Buen manejo del anticipo	648.070.331	16/08/2022	16/05/2023
Prestaciones Sociales	216.023.444	16/08/2022	16/11/2025
Calidad de la obra	432.046.888	5 años	

3.1.1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Hasta la presente fecha se ha realizado socialización en los municipios de Acevedo y Gigante. (Se anexa copia de actas de socialización, en el informe del Plan de Gestión Integral de Obra).

3.1.2. VEEDURÍA

3.1.2.1. ACTA DE CONFORMACIÓN

A la fecha se han conformado las veedurías ciudadanas en los municipios de Timaná, Isnos y Gigante.

3.1.2.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En el transcurso del mes de octubre no se han entregado actas de recibo a satisfacción de veeduría.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

La obra durante su desarrollo en el periodo del 01 de octubre al 31 de octubre de 2022, se ejecutaron las siguientes actividades:

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

RUTA 20 A - GALLARDO

- Se realiza excavación mecánica para la construcción de alcantarillas 5 y 6 de D=36" localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A - Gallardo.

- Se instala tubería en concreto reforzado de D= 36" para la construcción de las nuevas alcantarillas localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A – Gallardo.

- Se ejecutó el relleno para estructuras localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A - Gallardo con material de recebo, compactado mecánicamente.

- Se realiza corte, figuración e instalación del acero de refuerzo para la construcción de obras de encole y descole localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A - Gallardo según el manual de Colombia Rural.

- Se realiza vaciado de concreto para solado de limpieza en las alcantarillas localizadas en las abscisas K3+000 y K5+500 sentido Ruta 20 A – Gallardo.

- Se realiza vaciado de concreto de 21 MPA para vaciado de poceta de encole, cabezote y aletas para estructura de descoles en las alcantarillas localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A - Gallardo.

NOTA: Se presentaron días de lluvias intensas que afectaron el rendimiento de las obras pero que no afectaron su calidad constructiva.

RUTA 45- PARAISO-ACEVEDO

- Se realiza ampliación de la calzada con un ancho promedio de 4m.
- Conformación de la calzada existente.
- Suministro e instalación de material de recebo en promedio 300m3 compactados.
- Se realiza la extracción de las fuentes de materiales dadas por la Gobernación del Huila.

RUTA 45 – GUACACAYO – ORITOGUAZ – ELIAS - LA PALMA

- Se realiza ampliación de la calzada con un ancho promedio de 4,5m.
- Conformación de la calzada existente.
- Suministro e instalación de material de recebo en promedio 300m3 compactados.
- Se realiza la extracción de las fuentes de materiales dadas por la Gobernación del Huila.

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

TIMANA - GALLARDO - RUTA 20 A

- Se realiza ampliación de la calzada con un ancho promedio de 4,6m.
- Conformación de la calzada existente.
- Suministro e instalación de material de recebo en promedio 300m3 compactados.
- Se realiza la extracción de las fuentes de materiales dadas por la Gobernación del Huila.

3.3. INFORME DE AVANCE PRESENTADO EN MEDIO FISICO

Se ejecutaron las actividades propuestas en los tramos de Timaná, Elías, Acevedo, donde se concluyó que, durante este periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2022 del presente informe acta parcial de interventoría n°2, el CONSORCIO CENTRAL presenta una ejecución del 10,60% que corresponde a $ 229.053.123,00 y con un avance acumulado de 36%

3.3.1. INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA

Se hace entrega del informe mensual de obra del mes de octubre con sus respectivos anexos. ***(ANEXO #3 INFORME MENSUAL DE OBRA)***

3.4. AVANCE OBRA PROGRAMADA

3.4.1. AVANCE DE OBRA PROGRAMA, EJECUTADA Y ACUMULADA DEL CONTRATO

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADA

En la presente tabla se muestra la programación para el mes de octubre

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	DURACION	COMIENZO	FIN	VALOR TOTAL	% INVERSION	% INVERSION ACUMULADA	OCTUBRE																											
	VIAS CENTRO SUR							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ACTA DE INICIO	1 día	mar 16/08/22	mar 16/08/22		0,00%	0,00%																														
	SOCIALIZACIÓN	1 día	mar 16/08/22	mar 16/08/22		0,00%	0,00%																														
	CONFORMACIÓN																																				
1,0	Conformación de calzada existente con adición de materiales	75,0	mié 31/08/22	dom 13/11/22	$ 1.883.237.835,00	87,18%	87,18%		$ 175.768.865,00								$ 175.768.865,00								$ 175.768.865,00								$ 175.768.865,00				
	ALCANTARILLA D=36" VÍA 45HL10, TIMANÁ - GALLARDO - CRUCE RUTA 20A (8 UNIDADES)					**0,00%**	**87,18%**																														

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

1.1	Demolición, remoción y disposición final de estructuras en concreto no reforzado	40 días	mar 23/08/22	sáb 1/10/22	$ 2.328.552,00	0,11%	87,29%					
2.1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material esteril	50 días	mar 23/08/22	mar 11/10/22	$ 9.159.918,00	0,42%	87,71%		$ 1.282.389,00	$ 366.394,00		
3.1	Concreto normal de 140 Kg/cm2, para Solados y Limpieza	50 días	mié 24/08/22	mié 12/10/22	$ 8.938.613,00	0,41%	87,70%		$ 1.251.406,00	$ 536.322,00		
3.2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para alberca y estructura de salida, Incluye formaleta	30 días	mar 30/08/22	mié 28/09/22	$ 53.676.345,00	2,48%	90,18%					
4.1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	40 días	sáb 27/08/22	mié 5/10/22	$ 34.866.048,00	1,61%	91,80%		$ 2.614.956,00			

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

5.1	Suministro e instalación tubería D=36"(incluye anillado interno y externo)	50 días	jue 25/08/22	jue 13/10/22	$ 27.355.152,00	1,27%	93,06%		$ 3.829.721,00	$ 2.188.414,00		
6.1	Relleno vibrocompactado en recebo común	50 días	jue 25/08/22	jue 13/10/22	$ 8.392.200,00	0,39%	93,45%		$ 1.174.908,00	$ 671.376,00		
	ALCANTARILLA D=36 VÍA 37HL02, TARQUI - LA JAGUA (7 UNIDADES)					**0,00%**	**93,45%**					
1.1	Demolición, remoción y disposición final de estructuras en concreto no reforzado	50 días	lun 22/08/22	lun 10/10/22	$ 2.037.483,00	0,09%	93,55%		$ 285.245,00	$ 40.750,00		
2.1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material esteril	60 días	lun 22/08/22	jue 20/10/22	$ 8.014.928,00	0,37%	93,92%		$ 935.075,00	$ 935.075,00	$ 534.328,00	

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

3.1	Concreto normal de 140 Kg/cm2, para Solados y Limpieza	60 dias	lun 22/08/22	jue 20/10/22	$ 8.519.994,00	0,39%	94,31%		$ 993.999,00	$ 993.999,00	$ 568.002,00	
3.2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para alberca y estructura de salida, Incluye formaleta	45 dias	lun 22/08/22	mié 5/10/22	$ 49.665.393,00	2,30%	96,61%		$ 3.311.025,00			
4.1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	45 dias	lun 22/08/22	mié 5/10/22	$ 30.413.124,00	1,41%	98,02%		$ 2.027.544,00			
5.1	Suministro e instalación tubería D=36"(incluye anillado interno y externo)	60 dias	lun 22/08/22	jue 20/10/22	$ 23.010.456,00	1,07%	99,08%		$ 2.684.553,00	$ 2.684.553,00	$ 1.534.032,00	

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

6.1	Relleno vibrocompactado en recebo común	60 días	lun 22/08/22	jue 20/10/22	$ 6.194.895,00	0,29%	99,37%		$ 722.738,00	$ 722.738,00	$ 412.991,00	
	PAPSO					**0,00%**	**99,37%**					
	IMPLEMENTACIÓN PAPSO	90 días	mar 16/08/22	dom 13/11/22	$ 4.423.500,00	0,20%	99,58%		$ 344.050,00	$ 344.050,00	$ 344.050,00	$ 344.050,00
	TOTAL CONTRATO DE OBRA				**$ 2.160.234.436,00**							
	Inversion/Mensual								**$ 197.226.474,00**	**$ 185.252.536,00**	**$ 179.162.268,00**	**$ 176.112.915,00**
	Inversion Acumulada								**$ 1.267.480.891,00**	**$ 1.452.733.427,00**	**$ 1.631.895.695,00**	**$ 1.808.008.610,00**
	Porcentaje /Mensual							**9,89%**	**9,13%**	**8,58%**	**8,29%**	**8,15%**
	Porcentaje acumulado							**49,54 %**	**58,67%**	**67,25%**	**75,54%**	**83,70%**

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

NOTA: Según programación del contrato de obra se tiene una ejecución para el mes de octubre del 11,65% que equivale a $ 251.763.436,00

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

En la presente tabla se muestran las cantidades ejecutadas en el periodo del presente informe mensual:

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO EN EL MES DE OCTUBRE	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"									
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL					$ 1.883.237.835	$ -	$ -		$ 201.955.800,00
1	Conformación de calzada existente con adición de materiales	KM	186,50	$ 10.097.790	$ 1.883.237.835		$ -	20,00	$ 201.955.800,00
ALCANTARILLA D=36" VÍA 45HL10, TIMANÁ - GALLARDO - CRUCE RUTA 20A (8 UNIDADES)							$ -		-
1. DEMOLICIÓN					$ 2.328.552	$ -	$ -		-

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

1,1	Demolición, remoción y disposición final de estructuras en concreto no reforzado	M3	24,00	$ 97.023	$ 2.328.552		$ -	-	-
2. EXCAVACIÓN					**$ 9.159.918**	**$ -**	**$ -**		**$ 4.579.959,00**
2,1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material estéril	M3	226,40	$ 40.459	$ 9.159.918		$ -	113,20	$ 4.579.959,00
3. CONCRETOS					**$ 62.614.958**	**$ -**	**$ -**		**$ 25.609.693,00**
3,1	Concreto normal de 140 Kg/cm2, para Solados y Limpieza	M3	14,40	$ 620.737	$ 8.938.613		$ -	3,8	$ 2.358.801,00
3,2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para alberca y estructura de salida, Incluye formaleta	M3	64,64	$ 830.389	$ 53.676.345		$ -	28,00	$ 23.250.892,00
4. HIERRO DE REFUERZO					**$ 34.866.048**	**$ -**	**$ -**		**$ 8.583.096,00**
4,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	KG	4.704,00	$ 7.412	$ 34.866.048		$ -	1.158,00	$ 8.583.096,00
5. TUBERÍA D=36"					**$ 27.355.152**	**$ -**	**$ -**		**$ 6.838.788,00**
5,1	Suministro e instalación tubería D=36" (incluye anillado interno y externo)	UND	48,00	$ 569.899	$ 27.355.152		$ -	12	$ 6.838.788,00
6. RELLENO					**$ 8.392.200**	**$ -**	**$ -**		$ 4.196.100,00

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

6,1	Relleno vibro compactado en recebo común	M3	120,00	$ 69.935	$ 8.392.200		$ -	60	$ 4.196.100,00
ALCANTARILLA D=36" VÍA 37HL02, TARQUI - LA JAGUA (7 UNIDADES)					**$ -**		$ -		
1. DEMOLICIÓN					**$ 2.037.483**	$ -	$ -	-	-
1,1	Demolición, remoción y disposición final de estructuras en concreto no reforzado	M3	21,00	$ 97.023	$ 2.037.483		$ -		$ -
2. EXCAVACIÓN					**$ 8.014.928**	$ -	$ -	$ -	$ -
2,1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material estéril	M3	198,10	$ 40.459	$ 8.014.928		$ -		$ -
3. CONCRETOS					**$ 58.185.387**	$ -	$ -	$ -	$ -
3,1	Concreto normal de 140 Kg/cm2, para Solados y Limpieza	M3	12,60	$ 676.190	$ 8.519.994		$ -		$ -
3,2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para alberca y estructura de salida, Incluye formaleta	M3	56,56	$ 878.101	$ 49.665.393		$ -		$ -
4. HIERRO DE REFUERZO					**$ 30.413.124**	$ -	$ -	$ -	$ -
4,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	KG	4.116,00	$ 7.389	$ 30.413.124		$ -		$ -
5. TUBERÍA D=36"					**$ 23.010.456**	$ -	$ -	$ -	$ -

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

5,1	Suministro e instalación tubería D=36" (incluye anillado interno y externo)	UND	42,00	$ 547.868	$ 23.010.456		$ -		$ -
6. RELLENO					**$ 6.194.895**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
6,1	Relleno vibro compactado en recebo común	M3	105,00	$ 58.999	$ 6.194.895		$ -		$ -
	IMPLEMENTASIÓN PAPSO				$ 4.423.500		$ -		$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					**$2.160.234.436,00**		**$ -**	**$ -**	**$ 251.763.436,00**

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

3.4.1. BITACÓRA DE OBRA

Se relaciona copia de la bitácora de obra de los tramos intervenidos en el mes de octubre. ***(ANEXO #4 BITACORA DE OBRA)***

3.4.2. PRE – ACTAS DE CANTIDADES

Pre – actas de cantidades se relaciona en el ***(ANEXO #5 PRE-ACTAS DE CANTIDADES)***

3.4.3. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Se hace entrega de las evidencias fotográficas de los tramos intervenidos en el mes de octubre del 2022 anexado en el registro y seguimiento fotográfico de cada ítem.

3.5. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo correspondido desde el 01 de octubre al 31 de octubre de 2022 no se han presentado modificaciones ni suspensiones.

3.6. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Por medio de cada informe semanal se lleva un seguimiento del avance y ejecución de las actividades del presente contrato de obra. ***(ANEXO #6 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA).***

3.7. COPIA DE LAS ACTAS DE COMITÉ TECNICO MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

En el periodo correspondiente del presente informe se realizaron dos (2) comités técnicos evaluando el estado actual del contrato de obra, los asuntos que se trataron son los siguientes:

- Socialización del avance en las obras de mantenimiento intervenidas en el mes de octubre para los diferentes tramos.

- Definición, evaluación y balance de alcantarillas intervenidas con respecto a lo programado.

- Se verifica la viabilidad técnica para la explotación de las fuentes indicadas por la gobernación y la distancia de acarreos de las mismas con respecto a lo contemplado en la proyección del presupuesto del contrato.

(ANEXO #7 COPIA ACTA COMITE).

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

3.8. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DEL CONTRATISTA

En el periodo en cuestión se necesitó ser ejecutadas de forma técnica las actividades desarrolladas por el Contratista, con el fin de obtener un producto o servicio de buena calidad, es dispendioso disponer de maquinaria y equipo adecuado para que estos se establezcan dentro de las tolerancias normativas vigentes y se garantice su funcionamiento.
(ANEXO #8 FORMATO SEGUIMIENTO CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA).

Maquinaria utilizada en obra:

Vibro compactador, motoniveladora, Retroexcavadora, cuatro (4) volquetas.

3.9. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se relaciona el personal que se encuentra en una disposición del 100% en obra para la correcta ejecución de la obra. ***(ANEXO #9 FORMATO SEGUIMIENTO CONTROL DEL PERSONAL EN OBRA)***

3.10. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA (GASTOS ANTICIPOS, PAGOS PARCIALES, AVANCES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

El contratista presenta documentación para el primer pago parcial de anticipo a la interventoría como se relaciona en la siguiente tabla:

ITEM	INVERSION ANTICIPO			
	MES 1	MES 2	TOTAL	% total
Personal (ingenieros, oficina, celador, comunicaciones y otros)	$ 25.000.000	$ 30.000.000	$ 55.000.000	8,49%
Mano de obra	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 20.000.000	3,09%
Herramienta menor	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 10.000.000	1,54%
Suministro y transporte de materiales pétreos, tubería 36", hierro, cemento ,madera, entre otros.	$ 50.000.000	$ 70.000.000	$ 120.000.000	18,52%
Equipos	$ 250.000.000	$ 193.070.331	$ 443.070.331	68,37%
	$ 340.000.000	$ 193.070.331		100%
TOTAL	$ 648.070.331			100%

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

Ejecución de obra

Valor del contrato de obra:	$ 2.160.234.436,00
Valor ejecutado Mes anterior	$ 520.132.519
% de ejecución	24,35%
Valor ejecutado en el presente mes	$ 251.763.436,00
% de ejecución	11,65%
Valor acumulado	$ 771.895.955,00
% acumulado	36%

Hasta la fecha del presente informe Acta parcial de interventoría n°2 se ha realizado el 36% del valor del contrato y debería estar en un 77% de ejecución respecto al cronograma, por lo tanto, presenta un atraso del 41%.

3.11. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

La Interventoría a través de controles e informes diarios de campo, reporta el estado general del tiempo en la zona del proyecto durante el periodo de ejecución entre el 01 de octubre al 31 octubre del 2022. ***(ANEXO #10 FORMATO DE SEGUIMIENTO ESTADO DEL TIEMPO)***

3.12. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA

Para el presente periodo que comprende del 01 de octubre al 31 de octubre del 2022, el contratista CONSORCIO CENTRAL entrega certificación de los pagos de los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales de los empleados del mes de octubre del proyecto **"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"**, ***(ANEXO #11 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA).***

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

3.13. DISPONIBILIDAD DE VEHICULO MEDIANTE PROPIEDAD O CONTRATO DE ALQUILER

MARCA	MARCA	MODELO	AÑO	PROPIETARIO	PLACA
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR INC	120K	2010	GECOLSA CAT	N/A
VIBROCOMPACTADOR	VOLVO	SD70	2008	RODRIGUEZ & LONDOÑO	N/A
VOLQUETA	KENWORTH	T800	2012	KENWORTH DE LA MONTAÑA	STU552
VOLQUETA	INTERNACIONAL	4300	2012	NAVITRANS	STV061
VOLQUETA	INTERNACIONAL	4300	2008	NAVITRANS	TMX941
VOLQUETA	INTERNACIONAL	4300	2008	NAVITRANS	TMX942
RETROEXCAVADORA	HIDROMEK	HMK102B ALPHA	2016	MUÑOZ INGENIERIA SAS	N/A
CARRO TANQUE	VOLKSWAGEN	VW 9,150	2014	TRANSEXIMCAR GA	WCT472
VOLQUETA	KENWORTH	T800	2013	KENWORTH DE LA MONTAÑA	WCO235
VIBROCOMPACTADOR	DINAPAC	CA250	2012	RODRIGUEZ Y LONDOÑO	N/A
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416E	2014	GECOLSA	N/A

3.14. DISPONIBILIDAD DE OFICINA O ALQUILER

El contratista cuenta con oficina propia la cual está ubicada en Calle 5 No. 12 – 25 INT 3 NEIVA – HUILA.

3.15. CONTRATO DE PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INSPECTOR 1: ANDERSON CAMILO VALENCIA HERRERA
INSPECTOR 2: IVAN SANDOVAL
INSPECTOR 3: JUAN DAVID PERDOMO
PROFESIONAL SISO: ELIANA CALDERON

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de Interventoría N°	*1207 de 2022*
Objeto Contrato	*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"*
Valor del Contrato	*$ 157.872.540,00 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE*
Contratista	*Carlos Andrés Chávarro castro*
NIT	*7703837-0*
Representante Legal	*Carlos Andrés Chávarro Castro*
Cédula Ciudadanía	*7.703.837 de Neiva*
Dirección	*Carrera 7 No 16 A 29 Piso 2*
Fecha Inicio	*01 de septiembre de 2022*
Plazo de Ejecución	*Desde la suscripción del acta de inicio y en todo caso hasta la Liquidación del contrato de obra*
Supervisor Contrato Interventoría	*Álvaro Lis Rojas*

GARANTIAS DEL CONTRATO

POLIZAS

Las pólizas que amparan el contrato de obra 1207 de 2022 expedidas por la aseguradora Seguros Mundial, RC Extracontractual NV-100012988 Y Cumplimiento NV-100070372

Póliza de RC Extracontractual # NV-100012988			
NOMBRE DEL AMPARO	**SUMA ASEGURADA ($)**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Amparo básico – predios, laborales y operaciones	200.000.000	15/07/2022	15/10/2022
Patronal	60.000.000		
Contratistas y subcontratista	60.000.000		
Vehículo propio y no propio	60.000.000		
Póliza de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales # NV-100070372			

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

Póliza de RC Extracontractual # NV-100012988			
NOMBRE DEL AMPARO	SUMA ASEGURADA ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
NOMBRE DEL AMPARO	SUMA ASEGURADA ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento	31.574.508,00	15/07/2022	15/04/2023
Buen manejo del anticipo	47.361.762,00	15/07/2022	15/04/2023
Prestaciones sociales	31.574.508,00	15/07/2022	15/10/2025
Calidad del servicio	31.574.508,00	15/07/2022	15/10/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Póliza de RC Extracontractual Derivada de Cumplimiento NV-100012988			
NOMBRE DEL AMPARO	SUMA ASEGURADA ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Predios, labores y operaciones	$ 200.000.000	15/07/2022	15/10/2022
Patronal	$ 60.000.000	15/07/2022	15/10/2022
Contratistas y subcontratistas	$ 200.000.000	15/07/2022	15/10/2022
Vehículos propios y no propios	$ 200.000.000	15/07/2022	15/10/2022
Póliza de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales NV-100070372			
NOMBRE DEL AMPARO	SUMA ASEGURADA ($)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento	31.574.508	01/09/2022	02/06/2023
Buen manejo del anticipo	47.361.762	01/09/2022	02/06/2023
Prestaciones Sociales	31.574.508	01/09/2022	02/12/2025
Calidad del servicio	31.574.508	01/09/2022	02/12/2025

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

La interventoría realizó seguimiento y control de las siguientes actividades ejecutadas durante el presente periodo entre el sector "Ruta 20A – Gallardo":

- Excavación mecánica para la construcción de alcantarillas 5 y 6 de D=36" localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A - Gallardo.

- Instalación de tubería en concreto reforzado de D= 36" para la construcción de las nuevas alcantarillas localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500.

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

- Relleno para estructuras localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 con material de recebo, compactado mecánicamente.

- Corte, figuración e instalación de acero de refuerzo para la construcción de obras de encole y descole localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 según manual de Colombia Rural.

- Vaciado de concreto para solado de limpieza en las alcantarillas localizadas en las abscisas K3+000 y K5+500.

- Vaciado de concreto de 21 MPA para vaciado de poceta de encole, cabezote y aletas para estructura de descoles en las alcantarillas localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500.

La interventoría realizó seguimiento y control de las siguientes actividades ejecutadas durante el presente periodo entre el sector "Ruta 45 – Paraíso – Acevedo":

- Ampliación de calzada con ancho promedio de 4m.
- Conformación de calzada existente.
- Suministro e instalación de material de recebo en promedio 300m3 compactados.
- Extracción de las fuentes de materiales.

La interventoría realizó seguimiento y control de las siguientes actividades ejecutadas durante el presente periodo entre el sector "Ruta 45 – Guacacayo – Oritoguaz – Elías – La palma".

- Ampliación de calzada con un ancho promedio de 4,5m.
- Conformación de la calzada existente.
- Suministro e instalación de material de recebo en promedio 300m3 compactados.
- Extracción de las fuentes de materiales dadas por la Gobernación del Huila.

La interventoría realizó seguimiento y control de las siguientes actividades ejecutadas durante el presente periodo entre el sector "Timaná - Gallardo - Ruta 20 A":

- Ampliación de la calzada con un ancho promedio de 4,6m.
- Conformación de la calzada existente.
- Suministro e instalación de material de recebo en promedio 300m3 compactados.
- Se realiza la extracción de las fuentes de materiales dadas por la Gobernación del Huila.

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

4.3. CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORIA

Se anexa el formato del control diario del equipo de interventoría ***(ANEXO #12 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE INTERVENTORIA).***

4.4. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

En el periodo en cuestión se necesitó ser ejecutadas de forma técnica las actividades desarrolladas por el Contratista, con el fin de obtener un producto o servicio de buena calidad, la interventoría dispone de un Ingeniero residente y un inspector con el fin de verificar los procesos constructivos que se desarrollan en la obra. ***(ANEXO #13 CONTROL DIARIO PERSONAL DE INTERVENTORIA).***

4.5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.5.1. Licencias, permisos y autorizaciones

No aplica este punto ya que está relacionado en el contrato de obra.

4.5.2. Calibración de equipo

Se anexa los documentos de la calibración de los equipos. ***(ANEXO #14. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS).***

4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

Se anexan resultados de laboratorio de la interventoría para resultados de los concretos a los 28 días. ***(ANEXO # 15 LABORATORIOS)***

4.7. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

Dando cumplimiento con lo establecido a las responsabilidades adquiridas por el ING. CARLOS ANDRES CHAVARRO, se realizó la afiliación y pago de los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales del personal técnico administrativo, dispuesto para dar cumplimiento al contrato 1207 de 2022 que se relaciona a continuación. ***(ANEXO #16 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA)***

5. PAPSO

La interventoría manifiesta que de acuerdo a la resolución N° 666 de 2022 del ministerio de salud y protección social, esta actividad no se desarrollará de acuerdo a que la emergencia sanitaria terminó el 30 de junio del 2022 tal como se expone en la resolución anteriormente mencionada y anexa. ***(ANEXO #17 PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA- PAPSO)***

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

6. CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO – FINANCIERO)

Se relaciona el cuadro resumen físico financiero en el ***(ANEXO # 18 AVANCE FISICO – FINANCIERO)***

7. CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR

Se relaciona la correspondencia enviada por el contratista de obra a la interventoría en el ***(ANEXO # 19 CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA)***

8. REGISTRO Y SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO DE CADA ITEM

Se relaciona el registro y seguimiento fotográfico de cada ítem de los tramos intervenidos en el mes de octubre. ***(ANEXO # 20 REGISTRO Y SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO DE CADA ITEM)***

9. INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR

Se relaciona el informe ejecutivo del director en el ***(ANEXO #21 INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR)***

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo del presente informe mensual de interventoría comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2022, el contratista presenta un informe de avance del 11,65% que equivale a $ 251.763.436,00.
- El contratista presenta informe mensual de obra n°2 con un avance acumulado del 36% que equivale a $ 771.895.955,00.
- Se presentan lluvias generando atrasos en la ejecución de las actividades para el mantenimiento de las vías y aplicación de material.
- El presente informe acta parcial de interventoría n°2 presenta actividades de mantenimiento, excavación, concretos, hierro de refuerzo, instalación de tubería D=36", relleno.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTERVENTOR

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Car. 7 16 a 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1815403079	9444300387	N	2022/11/10	2022/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	36	$1,271,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA (1 Afiliados)																						$3,800,000	$658,000			$3,800,000	$475,000			$0	$0			$3,800,000		$92,500		$0	$0		$1,225,500
Centro de Trabajo: NEIVA (1 Afiliados)																						$3,800,000	$658,000			$3,800,000	$475,000			$0	$0			$3,800,000		$92,500		$0	$0		$1,225,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$3,800,000	$658,000			$3,800,000	$475,000			$0	$0			$3,800,000		$92,500		$0	$0		$1,225,500
1	CC	7703837	CHAVARRO CARLOS									A									25-14	30	($1,200,000)	($192,000)	EPS005	30	($1,200,000)	($150,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,200,000)	2.436%	($29,300)	0	$0	$0	No	($371,300)
2	CC	7703837	CHAVARRO CARLOS									C									25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0	14-23	30	$5,000,000	2.436%	$121,800	0	$0	$0	No	$1,596,800
Total			**Afiliados(1)**																			$3,800,000	$658,000			$3,800,000	$475,000			$0	$0			$3,800,000		$92,500		$0	$0		$1,225,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Car. 7 16 a 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1815403079	9444300387	N	2022/11/10	2022/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	36	$1,271,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$658,000	$24,700	$0	$682,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$658,000	$24,700	$0	$682,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,500	$3,500	$0	$96,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$92,500	$3,500	$0	$96,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$475,000	$17,800	$0	$492,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$475,000	$17,800	$0	$492,800
TOTAL				1	$1,225,500	$46,000	$0	$1,271,500

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Car. 7 16 a 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1738822596	9441794093	I	2022/11/10	2022/11/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA (1 Afiliados)																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$29,300		$0	$0		$371,300
Centro de Trabajo: NEIVA (1 Afiliados)																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$29,300		$0	$0		$371,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$29,300		$0	$0		$371,300
1	CC	7703837	CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	2.436%	$29,300	0	$0	$0	No	$371,300
Total			**Afiliados(1)**																			$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$29,300		$0	$0		$371,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Car. 7 16 a 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1738822596	9441794093	I	2022/11/10	2022/11/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$371,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$371,300	$0	$0	$371,300

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 51 No 17C - 05	NEIVA-HUILA	8716627	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1815431574	9444301006	N	2022/11/10	2022/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	36	$1,766,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (6 Afiliados)																							$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000		$382,900		$0	$0		$1,702,900
Centro de Trabajo: OBRA (6 Afiliados)																							$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000		$382,900		$0	$0		$1,702,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)																							$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000		$382,900		$0	$0		$1,702,900
1	CC	1075230027	CALDERON ELIANA								A										230301	30	($1,000,000)	($160,000)	EPS005	30	($1,000,000)	($40,000)	CCF32	30	($1,000,000)	($40,000)	14-23	30	($1,000,000)	6.960%	($69,600)	30	$0	$0	SI	($309,600)
2	CC	1075230027	CALDERON ELIANA								C										230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF32	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	SI	$743,100
3	CC	12127735	CHAVARRO ALVARO								A										25-14	30	($1,000,000)	($160,000)	EPS037	30	($1,000,000)	($40,000)	CCF32	30	($1,000,000)	($40,000)	14-23	30	($1,000,000)	6.960%	($69,600)	30	$0	$0	SI	($309,600)
4	CC	12127735	CHAVARRO ALVARO								C										25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	7723398	GUTIERREZ LUIS								A										25-14	30	($1,000,000)	($160,000)	EPS005	30	($1,000,000)	($40,000)	CCF32	30	($1,000,000)	($40,000)	14-23	30	($1,000,000)	6.960%	($69,600)	30	$0	$0	SI	($309,600)
6	CC	7723398	GUTIERREZ LUIS								C										25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
7	CC	1075313849	PERDOMO JUAN								A										25-14	30	($1,000,000)	($160,000)	EPS005	30	($1,000,000)	($40,000)	CCF32	30	($1,000,000)	($40,000)	14-23	30	($1,000,000)	6.960%	($69,600)	30	$0	$0	SI	($309,600)
8	CC	1075313849	PERDOMO JUAN								C										25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-23	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
9	CC	7722915	SANDOVAL IVAN								A										25-14	30	($1,200,000)	($192,000)	EPS005	30	($1,200,000)	($48,000)	CCF32	30	($1,200,000)	($48,000)	14-23	30	($1,200,000)	6.960%	($83,600)	30	$0	$0	SI	($371,600)
10	CC	7722915	SANDOVAL IVAN								C										25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-23	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
11	CC	1081419215	VALENCIA ANDERSON								A										25-14	30	($1,000,000)	($160,000)	EPS037	30	($1,000,000)	($40,000)	CCF32	30	($1,000,000)	($40,000)	14-23	30	($1,000,000)	6.960%	($69,600)	30	$0	$0	SI	($309,600)
12	CC	1081419215	VALENCIA ANDERSON								C										25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-23	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
Total			**Afiliados(6)**																				$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000		$382,900		$0	$0		$1,702,900

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 51 No 17C - 05	NEIVA-HUILA	8716627	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1815431574	9444301006	N	2022/11/10	2022/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	36	$1,766,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$880,000	$32,900	$0	$912,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$656,000	$24,500	$0	$680,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$8,400	$0	$232,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$382,900	$14,300	$0	$397,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$382,900	$14,300	$0	$397,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$220,000	$8,300	$0	$228,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	$220,000	$8,300	$0	$228,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$220,000	$8,300	$0	$228,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$64,000	$2,400	$0	$66,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$156,000	$5,900	$0	$161,900
TOTAL				6	$1,702,900	$63,800	$0	$1,766,700

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 51 No 17C - 05	NEIVA-HUILA	8716627	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1738811437	9442405150	E	2022/11/10	2022/11/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,930,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (7 Afiliados)																						$6,233,334	$997,400			$6,233,334	$249,400			$6,233,334	$249,400			$6,233,334		$434,000		$0	$0		$1,930,200
Centro de Trabajo: OBRA (7 Afiliados)																						$6,233,334	$997,400			$6,233,334	$249,400			$6,233,334	$249,400			$6,233,334		$434,000		$0	$0		$1,930,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (7 Afiliados)																						$6,233,334	$997,400			$6,233,334	$249,400			$6,233,334	$249,400			$6,233,334		$434,000		$0	$0		$1,930,200
1	CC	1075230027	CALDERON CASTRO ELIANA CONSTANZA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
2	CC	12127735	CHAVARRO SANCHEZ ALVARO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
3	CC	7723398	GUTIERREZ ECHEVERRY LUIS HUMBERTO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
4	CC	1075313849	PERDOMO COLLAZOS JUAN DAVID																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
5	CC	7722915	SANDOVAL CARDOZO IVAN FABRICIO																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF32	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
6	CC	12135722	STERLING PEREZ JULIO CESAR		X																230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF32	1	$33,334	$1,400	14-23	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
7	CC	1081419215	VALENCIA HERRERA ANDERSON CAMILO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
Total	**Afiliados(7)**																					$6,233,334	$997,400			$6,233,334	$249,400			$6,233,334	$249,400			$6,233,334		$434,000		$0	$0		$1,930,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7703837		CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 51 No 17C - 05	NEIVA-HUILA	8716627	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1738811437	9442405150	E	2022/11/10	2022/11/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,930,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$997,400	$0	$0	$997,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$165,400	$0	$0	$165,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$434,000	$0	$0	$434,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$434,000	$0	$0	$434,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$249,400	$0	$0	$249,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$249,400	$0	$0	$249,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$249,400	$0	$0	$249,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$169,400	$0	$0	$169,400
TOTAL				7	$1,930,200	$0	$0	$1,930,200

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

INFORME MENSUAL DE OBRA

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

CONSORCIO CENTRAL

NIT. 901.601.206-8

INFORME ACTA PARCIAL N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 1181 DE 2022

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR.



ELABORADO POR:

CATALINA RESTREPO OSSA

Directora de obra- Consorcio Central

ENTREGADO A:

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

PERIODO: OCTUBRE DE 2022

INFORME TÉCNICO

1. Localización

El proyecto cuenta con diferentes tramos a intervenir en las vías secundarias y terciarias de los Municipios de ACEVEDO, ELÍAS, GARZÓN, GIGANTE, GUADALUPE, ISNOS, PITAL, SALADOBLANCO, SUAZA, TARQUI, TIMANA –del Departamento del Huila

2. Estructura a inspeccionar

- Construcción de cuatro (8) alcantarillas en la vía Timaná-Gallardo-Ruta 20 A.
- Mantenimiento de la vía, conformación de la calzada existente con adición de material, Subramal – Alto de los ídolos, del Municipio de Isnos
- Mantenimiento de la vía, conformación de la calzada existente con adición de material, Ruta 45 - Paraíso - Acevedo, del Municipio de Timaná.
- Mantenimiento de la vía, conformación de la calzada existente con adición de material, Ruta 45 – Potrerillos y Potrerillos Estoracal, del Municipio de Gigante.

3. Visita técnica

Se realiza excavación mecánica para la construcción de Alcantarillas 5 y 6 localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A- Gallardo de D=36" según la cartilla de Colombia rural
Se instala tubería en concreto reforzado de D= 36" para la construcción de las nuevas alcantarillas localizadas en el abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A- Gallardo
Se ejecutó el relleno para estructuras localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A- Gallardo con material de recebo, compactado mecánicamente.
Se realiza corte, figuración e instalación del acero de refuerzo para la construcción de obras de encole y descole localizadas en el abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A- Gallardo según el manual de Colombia Rural
Se realiza vaciado de concreto para solado de limpieza en las alcantarillas localizadas en las abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A- Gallardo

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROYECTOS Y VIAS S A PROVIAS S A identificado(a) con NI 800119086 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JESUS ALFONSO ALVAREZ MACIAS identificado(a) con CC 71631463

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
1948	1768191925	E	2022-11-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30																		$9,900,000	4%	$396,000
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,900,000	16%	$1,584,000
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30																		$9,900,000		$49,500
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30																		$9,900,000		$49,500
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,900,000	6.96%	$689,100
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,900,000	4%	$396,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 07:50.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROYECTOS Y VIAS S A PROVIAS S A identificado(a) con NI 800119086 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para UBUEIMAR DE JESUS ZAPATA RESTREPO identificado(a) con CC 15329119

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
1948	1768191925	E	2022-11-22	EPS	EPS042	COOSALUD EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	14																		$1,120,000	4%	$44,800
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	EPS	EPS042	COOSALUD EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	8													X					$640,000	4%	$25,600
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	EPS	EPS042	COOSALUD EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	8													X					$640,000	4%	$25,600
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	14																		$1,120,000	16%	$179,200
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X					$640,000	16%	$102,400
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X					$640,000	16%	$102,400
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	14																		$1,120,000		$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	8													X					$640,000		$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	8													X					$640,000		$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	14																		$1,120,000		$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	8													X					$640,000		$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	8													X					$640,000		$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	14																		$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	8													X					$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	8													X					$0	0%	$0
1948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	14																		$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	8													X					$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	8													X					$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	14																		$1,120,000	6.96%	$78,000
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X					$640,000	0%	$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CIVCOL S.A.S identificado(a) con NI 900817409 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para VALENTINA VIEDA CERQUERA identificado(a) con CC 1075317530

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30																		$1,650,000	4%	$66,000
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$1,650,000	16%	$264,000
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30																		$1,650,000		$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30																		$1,650,000		$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$1,650,000	0.522%	$8,700
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$1,650,000	4%	$66,000

Este certificado se expide el día 2022-11-21 a las 02:33.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROYECTOS Y VIAS S A PROVIAS S A identificado(a) con NI 800119086 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEJANDRA MARIA TRIANA LLANO identificado(a) con CC 43157174

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp			
1948	1768191925	E	2022-11-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29																		$3,093,334	4%	$123,800
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1													X					$106,667	4%	$4,300
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	29																		$3,093,334	16%	$495,000
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	1													X					$106,667	16%	$17,100
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	29																		$3,093,334		$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	1													X					$106,667		$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	29																		$3,093,334		$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	1													X					$106,667		$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	29																		$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	1													X					$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	29																		$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	1													X					$0	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	29																		$3,093,334	6.96%	$215,300
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	1													X					$106,667	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	29																		$3,093,333	4%	$123,800
1948	1768191925	E	2022-11-22	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	1													X					$106,667	4%	$4,300

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 07:51

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X					$640,000	0%	$0
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	14																		$1,120,000	4%	$44,800
9442861948	1768191925	E	2022-11-22	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X					$560,000	0%	$0
[redacted]1948	1768191925	E	2022-11-22	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	8													X					$400,000	4%	$16,000

Este certificado se expide el día 2022-11-22 a las 07:51.

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CIVCOL S.A.S identificado(a) con NI 900817409 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LAURA FERNANDA BAUTISTA GARRIDO identificado(a) con CC 1075302943

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30																		$1,200,000	4%	$48,000
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$1,200,000	16%	$192,000
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30																		$1,200,000		$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30																		$1,200,000		$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$1,200,000	0.522%	$6,300
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$1,200,000	4%	$48,000

Este certificado se expide el día 2022-11-21 a las 02:32.

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CIVCOL S.A.S identificado(a) con NI 900817409 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LINA MARIA MARTINEZ HORTUA identificado(a) con CC 1070963884

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29																		$1,160,000	4%	$46,400
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1											X							$40,000	4%	$1,600
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	29																		$1,160,000	16%	$185,600
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	1											X							$40,000	16%	$6,400
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	29																		$1,160,000		$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	1											X							$40,000		$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	29																		$1,160,000		$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	1											X							$40,000		$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	29																		$0	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	1											X							$0	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	29																		$0	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	1											X							$0	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	29																		$1,160,000	0.522%	$6,100
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	1											X							$40,000	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	29																		$1,160,000	4%	$46,400
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	0											X							$0	4%	$0

Este certificado se expide el día 2022-11-21 a las 02:31.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CIVCOL S.A.S identificado(a) con NI 900817409 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ identificado(a) con CC 79957561

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30																		$9,950,000	4%	$398,000
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,950,000	16%	$1,592,000
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30																		$9,950,000		$49,800
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30																		$9,950,000		$49,800
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30																		$0	0%	$0
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,950,000	0.522%	$52,000
9442467644	1741371963	E	2022-11-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																		$9,950,000	4%	$398,000

Este certificado se expide el día 2022-11-21 a las 02:31.

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa para vaciado de poceta de encole, cabezote y aletas para estructura de descoles en las alcantarillas localizadas en el abscisas K3+000 y K 5+500 sentido Ruta 20 A- Gallardo
Anunciando lo anterior se presentaron días de lluvias intensas que afectaron el rendimiento de las obras pero que no afectaron su calidad constructiva.

RUTA 45- PARAISO-ACEVEDO
Se realiza ampliación de la calzada con un ancho promedio de 4m, conformación de la calzada existente, suministro e instalación de material de recebo en promedio 300m3 compactados, los cuales se realiza la extracción de las fuentes de materiales dadas por la Gobernación del Huila

RUTA 45-GUACACAYO- ORITOGUAZ- ELIAS-LA PALMA
Se realiza ampliación de la calzada con un ancho promedio de 4,5m, conformación de la calzada existente, suministro e instalación de material de recebo en promedio 300m3 compactados, los cuales se realiza la extracción de las fuentes de materiales dadas por la Gobernación del Huila

TIMANA-GALLARDO RUTA 20 A
Se realiza ampliación de la calzada con un ancho promedio de 4,6m, conformación de la calzada existente, suministro e instalación de material de recebo en promedio 300m3 compactados, los cuales se realiza la extracción de las fuentes de materiales dadas por la Gobernación del Huila

4. Registro fotográfico

- Alcantarillas Timaná – Gallardo- Ruta 20A



Foto 1: vaciado y figuración de acero de refuerzo



Foto 2: Excavación e instalación de tubería de concreto d=36”





Foto3: Excavación, acero y encofrado poceta de encole

- Vía Ruta 45- Paraíso- Acevedo



Foto 4: Conformación de la calzada existente, con adición de material de recebo



Foto 5: Conformación de la calzada existente, con adición de material de recebo

- Vía Timaná Gallardo Cruce Ruta 20



Foto 6: Conformación de la calzada existente, adición de material



Foto 7: Conformación de la calzada existente, adición de material

- Via Ruta 45- Guacacallo – Oritoguaz – Elías – La Palma



Foto 7: Conformación de la calzada existente, adición de material

5.1. AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta las actividades realizadas a lo largo del mes de septiembre del presente año, se genera el siguiente avance físico:

FECHA: 01 A 31 DE OCTUBRE DE 2022	
PROGRAMADO ACUMULADO MENSUAL	EJECUTADO ACUMUULADO MENSUAL
41,49%	36%
$1.655.447.360	$ 777.253.539

Luego de revisar el avance de obra mensual, se observa un atraso del 6% , siendo superior a la programación acumulada en Que obedese a que la fuerte ola invernal que estamos vivendo en los ultimos dias los cuales han ocasionado atrasos en la

ejecucion de las actividades de conformacion de la calzada existente con adicion de material de recebo.

6. Preacta

GOBERNACION DEL HUILA

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

PREACTA DE OBRA OCTUBRE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	OFERTADO		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATO 1181 DE 2022 - OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" DE LA RED VIAL DE SEGUNDA Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONA CENTRO -SUR					
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL					$ 201.955.800,00
1	Conformación de calzada existente con adición de materiales	KM	20,00	$ 10.097.790	$ 201.955.800,00
ALCANTARILLA D=36" VÍA 45HL10, TIMANÁ - GALLARDO - CRUCE RUTA 20A (8 UNIDADES)					
1. DEMOLICIÓN					$ 3.659.708,00
1,1	Demolición, remoción y disposición final de estructuras en concreto no	M3	37,72	$ 97.023	$ 3.659.708,00
2. EXCAVACIÓN					$ 6.035.269,00
2,1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material esteril	M3	149,17	$ 40.459	$ 6.035.269,00
3. CONCRETOS					$ 20.955.363,00
3,1	Concreto normal de 140 Kg/cm2, para Solados y Limpieza	M3	4,81	$ 620.737	$ 2.985.745,00
3,2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para alberca y estructura de salida,	M3	21,64	$ 830.389	$ 17.969.618,00
4. HIERRO DE REFUERZO					$ 7.839.821,00
4,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	KG	1.057,72	$ 7.412	$ 7.839.821,00
5. TUBERÍA D=36"					$ 6.838.788,00
5,1	Suministro e instalación tubería D=36" (incluye anillado interno y externo)	UND	12,00	$ 569.899	$ 6.838.788,00
6. RELLENO					$ 8.277.507,00
6,1	Relleno vibrocompactado en recebo común	M3	118,36	$ 69.935	$ 8.277.507,00
ALCANTARILLA D=36" VÍA 37HL02, TARQUI - LA JAGUA (7 UNIDADES)					$ -
1. DEMOLICIÓN					$ -
1,1	Demolición, remoción y disposición final de estructuras en concreto no reforzado	M3		$ 97.023	$ -
2. EXCAVACIÓN					$ -
2,1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material esteril	M3		$ 40.459	$ -
3. CONCRETOS					$ -
3,1	Concreto normal de 140 Kg/cm2, para Solados y Limpieza	M3		$ 676.190	$ -
3,2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para alberca y estructura de salida,	M3		$ 878.101	$ -
4. HIERRO DE REFUERZO					$ -
4,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	KG		$ 7.389	$ -
5. TUBERÍA D=36"					$ -
5,1	Suministro e instalación tubería D=36" (incluye anillado interno y externo)	UND		$ 547.868	$ -
6. RELLENO					$ 1.381.000,00
6,1	Relleno vibrocompactado en recebo común	M3		$ 58.999	$ -
	IMPLEMENTASIÓN PAPSO		0,31		$ 1.381.000
TOTAL COSTO DIRECTO				$ -	$ 256.943.256,00

Firma:	Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO	Nombre: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA
	REP LEGAL. CONSORCIO CENTRAL
INTERVENTORIA	CONTRATISTA

7. Personal en obra

Para el presente periodo se realizaron las siguientes afiliaciones del personal que se vinculó al contrato 1181 de 2022

LISTADO PERSONAL CONTRACTUAL				
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEDICACIÓN	IBC
1	Catalina Restrepo Ossa	Ingeniero Directora de Obra	100%	$ 5.000.000
2	Jesús Alfonso Alvares Macías	Residente	100%	$ 4.800.000
3	Ubeirmar Zapata Restrepo	Inspector de obra 1	100%	$ 2.400.000
4	Diego Muñoz	Inspector de obra 2	100%	$ 1.800.000
5	Valentina Vieda	Inspector de obra 3	100%	1.650.000
6	Alejandra Triana	Profesional SISO	100%	$ 3.200.000
7	Kelly Bermeo/ María Camila Mayorca	Especialista ambiental	100%	$ 2.000.000
8	Jhon Henry Salazar	Conductor 1	100%	$ 1.200.000
9	Israel Losada Parra	Conductor 2	100%	$ 1.200.000
10	María Camila Salazar	Secretaria	100%	$ 1.200.000
11	Lina María Martínez	Gestora Social	100%	$ 1.200.000

Anexo Seguridad social del personal.

EXAMENES OCTUBRE			
No.	NOMBRE	CARGO	FECHA EXAMEN
1	WILTON GEOVANNY CUESTA AGUILAR	INSPECTOR DE OBRA	3/10/2022
2	JOSE LUIS FORERO CALDON	AYUDANTE DE OBRA	8/10/2022
3	ANGIE LORENA CAPERA TRUJILLO	AUXILIAR TRANSITO	18/10/2022
4	RUBEN JOVEN PEÑA	AUXILIAR TRANSITO	18/10/2022
5	YULIANA CASTILLO BONILLA	AUXILIAR TRANSITO	18/10/2022
6	WALTER MORENO PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	19/10/2022
7	LEONIDAS ZAMBRANO CASTRO	AYUDANTE DE OBRA	19/10/2022
8	LEONIDAS ZAMBRANO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	19/10/2022

8. Conclusiones

- Se encuentra que las actividades de obra se vienen ejecutando conforme los diseños el proyecto y las especificaciones técnicas correspondientes.

- Se presentan lluvias que generan atrasos en la ejecución de las actividades, para el mantenimiento de las vías y aplicación de material de recebo.

- Este mes se vio afectado el rendimiento en los frentes de trabajo dada la ola invernal que se ha venido presentando, por lo que se solicitara un mes más a la entidad contratante con el fin de culminar las actividades pendientes.

- Se evidencia que las cantidades estipuladas contractualmente para la construcción de las alcantarillas es inferior a las ejecutadas en campo, por lo que se requiere realizar un acta de menores y mayores cantidades.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901601206	8	CONSORCIO CENTRAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL NEIVA	CALLE 5 # 12-25	NEIVA-HUILA	3232201853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1749930494	9442601825	E	2022/11/02	2022/11/10	BANCOLOMBIA	8	$8,101,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL NEIVA (14 Afiliados)																						$21,662,710	$3,516,200			$21,662,710	$867,000			$21,732,154	$869,800			$21,662,710		$1,444,000		$0	$0		$6,697,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$245,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$245,300
1	CC	1084869465	PEREZ GONZALEZ ERIKA																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (13 Afiliados)																						$20,662,710	$3,356,200			$20,662,710	$827,000			$20,732,154	$829,800			$20,662,710		$1,438,700		$0	$0		$6,451,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (13 Afiliados)																						$20,662,710	$3,356,200			$20,662,710	$827,000			$20,732,154	$829,800			$20,662,710		$1,438,700		$0	$0		$6,451,700
2	CC	12195336	ANDRADE QUINTERO SEGUNDO																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	1118363588	CAPERA TRUJILLO ANGIE LORENA	X								X									23030 1	12	$441,667	$70,700	EPSIC5	12	$441,667	$17,700	CCF32	12	$441,667	$17,700	14-11	12	$441,667	6.960%	$30,800	12	$0	$0	Si	$136,900
4	CC	1004158490	CASTILLO BOHILLA YULIANA	X								X									23030 1	11	$403,125	$64,500	EPS041	11	$403,125	$16,200	CCF32	11	$403,125	$16,200	14-11	11	$403,125	6.960%	$28,100	11	$0	$0	Si	$125,000
5	CC	1193036199	CUENCA TRUJILLO YULIANA									X									23030 1	30	$1,378,125	$220,500	EPS041	30	$1,378,125	$55,200	CCF32	30	$1,378,125	$55,200	14-11	30	$1,378,125	6.960%	$96,000	30	$0	$0	Si	$426,900
6	CC	1088651141	CUESTA AGUILAR WILTON GEOVANNY	X								X									23030 1	27	$1,631,251	$261,100	EPS005	27	$1,631,251	$65,300	CCF32	27	$1,631,251	$65,300	14-11	27	$1,631,251	6.960%	$113,600	27	$0	$0	Si	$505,300
7	CC	1080187530	FIERRO MARIN CRISTIAN RAFAEL									X									23030 1	30	$2,433,750	$389,400	EPS005	30	$2,433,750	$97,400	CCF32	30	$2,433,750	$97,400	14-11	30	$2,433,750	6.960%	$169,400	30	$0	$0	Si	$753,600
8	CC	83252214	JOVEN PEÑA RUBEN	X								X									23030 1	12	$446,875	$71,500	ESSC62	12	$446,875	$17,900	CCF32	12	$446,875	$17,900	14-11	12	$446,875	6.960%	$31,200	12	$0	$0	Si	$138,500
9	CC	83212062	LOSADA PARRA ISRAEL									X									23030 1	30	$1,597,500	$255,600	EPS037	30	$1,597,500	$63,900	CCF32	30	$1,597,500	$63,900	14-11	30	$1,597,500	6.960%	$111,200	30	$0	$0	Si	$494,600
10	CC	1016013805	MAYORCA MARIA CAMILA		X															X	23030 1	22	$1,466,667	$234,700	EPS037	22	$1,466,667	$58,700	CCF32	22	$1,536,111	$61,500	14-11	22	$1,466,667	6.960%	$102,100	22	$0	$0	Si	$457,000
11	CC	1084260687	MUÑOZ DIEGO ANDRES									X									23030 1	30	$1,837,500	$294,000	EPS005	30	$1,837,500	$73,500	CCF32	30	$1,837,500	$73,500	14-11	30	$1,837,500	6.960%	$127,900	30	$0	$0	Si	$568,900
12	CC	43875952	RESTREPO OSSA NORA CATALINA																		25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF32	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,598,000
13	CC	7686476	SALAZAR PALACIO JHON HENRY									X									25-14	30	$1,648,125	$263,700	EPS005	30	$1,648,125	$66,000	CCF32	30	$1,648,125	$66,000	14-11	30	$1,648,125	6.960%	$114,800	30	$0	$0	Si	$510,500
14	CC	1080182567	SEGURA CABRERA VERONICA									X									23020 1	30	$1,378,125	$220,500	EPS002	30	$1,378,125	$55,200	CCF32	30	$1,378,125	$55,200	14-11	30	$1,378,125	6.960%	$96,000	30	$0	$0	Si	$426,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL MAESTRO FORERO (8 Afiliados)																						$4,362,503	$694,300			$4,362,503	$170,800			$4,508,336	$176,600			$4,362,503		$297,000		$0	$0		$1,338,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

ACTAS DE CANTIDADES

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

ACTA No 2!

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTÒN INTEGRADO	Código : DAC-P-1110-F-07
		Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
	FORMATO: ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 1
		Pagina 1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL

															$ 2.160.234.436
CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	1181	AÑO:	2022			PLAZO INICIAL		PLAZO ADICIONAL		PLAZO TOTAL		ADICIONAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	2	HOJA	1	DE	2								
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL	FECHA DE ACTA		DIA	MES	AÑO									
INTERVENTOR:	CARLOS ANDRES CHAVARRO			7	12	2022		90 días				90 días		V.R. TOTAL	
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"												$ 2.160.234.436	
01/sep/2022	Nº 1 / Nº 2 / Nº 3														

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"													
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL					$ 1.883.237.835,00	$ -	$ -		$ 201.955.800,00		$ 422.087.622,00		$ 624.043.422,00
1	Conformación de calzada existente con adición de materiales	KM	186,50	$ 10.097.790	$ 1.883.237.835,00		$ -	20,00	$ 201.955.800,00	41,80	422.087.622,00	61,80	$ 624.043.422,00
ALCANTARILLA D=36" VÍA 45HL10, TIMANÁ - GALLARDO - CRUCE RUTA 20A (8 UNIDADES)							$ -						$ -
1. DEMOLICIÓN					$ 2.328.552,00	$ -	$ -		$ -		$ 2.190.779,00	0,00	$ 2.190.779,00
1,1	Demolición, remoción y disposición final de estructuras en concreto no reforzado	M3	24,00	$ 97.023	$ 2.328.552,00		$ -		$ -	22,58	2.190.779,00	22,58	$ 2.190.779,00
2. EXCAVACIÓN					$ 9.159.918,00	$ -	$ -		$ -		$ 9.159.918,00		$ 9.159.918,00
2,1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material esteril	M3	226,40	$ 40.459	$ 9.159.918,00		$ -		$ -	226,40	9.159.918,00	226,40	$ 9.159.918,00
3. CONCRETOS					$ 62.614.958,00	$ -	$ -		$ 10.965.783,00		$ 48.977.910,00		$ 59.943.694,00
3,1	Concreto normal de 140 Kg/cm2, para Solados y Limpieza	M3	14,40	$ 620.737	$ 8.938.613,00		$ -	4,81	$ 2.985.745,00	7,32	4.543.795,00	12,13	$ 7.529.540,00
3,2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para alberca y estructura de salida, incluye formaleta	M3	64,64	$ 830.389	$ 53.676.345,00		$ -	9,61	$ 7.980.038,00	53,51	44.434.115,00	63,12	$ 52.414.154,00
4. HIERRO DE REFUERZO					$ 34.866.048,00	$ -	$ -		$ 7.818.252,00		$ 16.413.059,00		$ 24.231.310,00
4,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	KG	4.704,00	$ 7.412	$ 34.866.048,00		$ -	1.054,81	$ 7.818.252,00	2.214,39	16.413.059,00	3.269,20	$ 24.231.310,00
5. TUBERÍA D=36"					$ 27.355.152,00	$ -	$ -		$ 6.838.788,00		$ 13.107.677,00		$ 19.946.465,00
5,1	Suministro e instalación tubería D=36" (incluye anillado interno y externo)	UND	48,00	$ 569.899	$ 27.355.152,00		$ -	12,00	$ 6.838.788,00	23,00	13.107.677,00	35,00	$ 19.946.465,00
6. RELLENO					$ 8.392.200,00	$ -	$ -		$ -		$ 8.373.318,00		$ 8.373.318,00
6,1	Relleno vibrocompactado en recebo común	M3	120,00	$ 69.935	$ 8.392.200,00		$ -		$ -	119,73	8.373.318,00	119,73	$ 8.373.318,00
ALCANTARILLA D=36" VÍA 37HL02, TARQUI - LA JAGUA (7 UNIDADES)													
1. DEMOLICIÓN					$ 2.037.483,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -
1,1	Demolición, remoción y disposición final de estructuras en concreto no reforzado	M3	21,00	$ 97.023	$ 2.037.483,00		$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
2. EXCAVACIÓN					$ 8.014.928,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -
2,1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material	M3	198,10	$ 40.459	$ 8.014.928,00		$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
3. CONCRETOS					$ 58.185.387,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -
3,1	Concreto normal de 140 Kg/cm2, para Solados y Limpieza	M3	12,60	$ 676.190	$ 8.519.994,00		$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
3,2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para alberca y estructura de salida, incluye formaleta	M3	56,56	$ 878.101	$ 49.665.393,00		$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
4. HIERRO DE REFUERZO					$ 30.413.124,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -
4,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	KG	4.116,00	$ 7.389	$ 30.413.124,00		$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -

ACTA PARCIAL 2.

ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	1181	AÑO:	2022				$ 2.160.234.436
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	2	HOJA	2	DE	2	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICIONAL	PLAZO TOTAL	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL	FECHA DE ACTA		DIA	MES	AÑO					
INTERVENTOR:	CARLOS ANDRES CHAVARRO			7	12	2022					
INICIACIÒN	Nº / SUSPENSIÒN / REINICIO	OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"					90 días		90 días	V.R. TOTAL
01/sep/2022	Nº 1 Nº 2 Nº 3										$ 2.160.234.436

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
5. TUBERÍA D=36"					$ 23.010.456,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -
5,1	Suministro e instalación tubería D=36" (incluye anillado interno y externo)	UND	42,00	$ 547.868	$ 23.010.456,00		$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
6. RELLENO					$ 6.194.895,00	$ -	$ -		$ 1.474.500,00	$ -	$ -		$ 1.474.500,00
6,1	Relleno vibrocompactado en recebo común	M3	105,00	$ 58.999	$ 6.194.895,00		$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
	IMPLEMENTASIÓN PAPSO				$ 4.423.500,00		$ -	0,33	$ 1.474.500,00	0,00	0,00	0,33	$ 1.474.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 2.160.234.436,00		$ -		$ 229.053.123,00	$ -	$ 520.310.283,00	$ -	$ 749.363.406,00
ANTICIPO				30%	$ 648.070.330,80		30%	$ -	$ 68.715.937,00	30%	$ 156.093.084,90	30%	$ 224.809.022,00
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN											$ -		
COSTOS DE IMPREVISTOS											$ -		
COSTOS DE UTILIDAD											$ -		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$	-						$ -		
VALOR TOTAL		$			2.160.234.436,00		$ -	$	160.337.186,00	$	364.217.198,10	$	524.554.384,00

EL VALOR TOTAL DEL ACTA PARA EL SECTOR "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"	160.337.186,00

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA
CONTRATISTA
CONSORCIO CENTRAL

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTERVENTOR

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	Gobernación del Huila / HUILA CRECE
	MEMORIA CORTE DE OBRA	

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:	"Mantenimiento A Todo Costo De Vías Y Reposición De Alcantarillas D=36" En La Red Vial De Segundo Y Tercer Orden A Cargo Del Departamento Del Huila: Zonas Centro Y Sur.

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL	CORTE Nº:	2	FECHA :	29/10/2022
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO				
UBICACIÓN:					

ITEM Nº:	1	DESCRIPCION ITEM	Conformación de calzada existente con adición de materiales	UND:	KM

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
ELIAS						
RUTA 45- GUACACALLO-ORITOGUAZ- ELIAS- LA PALMA					0	0
K0+000 AL K7+000	7				7	7
TOTAL						7,00

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	Gobernación del Huila / HUILA CRECE
	MEMORIA CORTE DE OBRA	

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:	"Mantenimiento A Todo Costo De Vías Y Reposición De Alcantarillas D=36" En La Red Vial De Segundo Y Tercer Orden A Cargo Del Departamento Del Huila: Zonas Centro Y Sur.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL			CORTE Nº:	2	FECHA :	29/10/2022
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:							
ITEM Nº:	1	DESCRIPCION ITEM	Conformación de calzada existente con adición de materiales			UND:	KM

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
TIMANA - GALLARDO						
TIMANA- GALLARDO - CRUCE RUTA 20 A						
K0+000 AL K3+000	3				3	3
K 20+470 AL 27+470	7				7	7
TOTAL						10,00

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL
NIT. 901.601.206-8

OBJETO CONTRATO

MEMORIA CORTE DE OBRA

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:	"Mantenimiento A Todo Costo De Vías Y Reposición De Alcantarillas D=36" En La Red Vial De Segundo Y Tercer Orden A Cargo Del Departamento Del Huila: Zonas Centro Y Sur.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL		CORTE Nº:	2	FECHA :	29/10/2022	
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:							
ITEM Nº:	1	DESCRIPCION ITEM	Conformación de calzada existente con adición de materiales			UND:	KM

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
TIMANA						
RUTA 45- PARAISO ACEVEDO						
K18+000 AL K21+000	3				3	3
TOTAL						3,00

TOTAL	20,00

DIRECTORA DE OBRA		Autorizó
Firma		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
		Firma

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	Gobernación del Huila / HUILA CRECE
	MEMORIA CORTE DE OBRA	

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:	"Mantenimiento A Todo Costo De Vías Y Reposición De Alcantarillas D=36" En La Red Vial De Segundo Y Tercer Orden A Cargo Del Departamento Del Huila: Zonas Centro Y Sur.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL			CORTE Nº:	2	FECHA :	29/10/2022
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:	ALCANTARILLA D= 36" VÍA 45HL10, TIMANA GALLARDO- CRUCE 20A (8 UND)						
ITEM Nº:	3.1	DESCRIPCION ITEM	CONCRETO NORMAL DE 140 Kg/cm2, PARA SOLADO Y LIMPIEZA			UND:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
ALCANTARILLA #8 K 25+730						
TUBERIA	6	1,50	0,10	1	0,9	0,9
ESTRUCTURA DE ENTREDA	1,8	1,8	0,10	1	0,32	1,22
ESTRUCTURA DE SALIDA	2,85	3	0,10	1	0,86	2,08
TOTAL K 25+730						2,08

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	Gobernación del Huila HUILA CRECE
	MEMORIA CORTE DE OBRA	

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:	"Mantenimiento A Todo Costo De Vías Y Reposición De Alcantarillas D=36" En La Red Vial De Segundo Y Tercer Orden A Cargo Del Departamento Del Huila: Zonas Centro Y Sur.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL			CORTE Nº:	2	FECHA :	29/10/2022
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:	ALCANTARILLA D= 36" VÍA 45HL10, TIMANA GALLARDO- CRUCE 20A (8 UND)						
ITEM Nº:	3.1	DESCRIPCION ITEM	CONCRETO NORMAL DE 140 Kg/cm2, PARA SOLADO Y LIMPIEZA			UND:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
ALCANTARILLA # 7 K 22+770						
TUBERIA	6	1,50	0,10	1	0,9	0,9
ESTRUCTURA DE ENTREDA	2,5	3,45	0,10	1	0,86	1,76
ESTRUCTURA DE SALIDA	2,8	3,468818	0,10	1	0,97	2,73
TOTAL K22+770						2,73
						4,81

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	
	MEMORIA CORTE DE OBRA	


CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:	"Mantenimiento A Todo Costo De Vías Y Reposición De Alcantarillas D=36" En La Red Vial De Segundo Y Tercer Orden A Cargo Del Departamento Del Huila: Zonas Centro				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL			CORTE Nº:	2	FECHA :	29/10/2022
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:	ALCANTARILLA D= 36" VÍA 45HL10, TIMANA GALLARDO- CRUCE 20A (8 UND)						
ITEM Nº:	3.2	DESCRIPCION ITEM	CONCRETO DE 3000 PSI (210 Kg/cm2), PARA ALBERCA Y ESTRUCTURA DE SALIDA, INCLUYE FORMALETA			UND:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Altura	Ancho			
ALCANTARILLA # 7						
ZARPA	4,95	0,80	0,30	1	1,19	1,19
MURO	1,80	1,78	0,50	1	1,6	2,79
ALETAS	1,90	1,36	0,20	1	0,52	3,31
	1,25	1,48	0,20	1	0,37	3,68
PLACAS ENTREALETAS	2,43	1,57	0,20	1	0,76	4,44
DESCUENTO CUNETA	-0,70	0,38	0,20	1	-0,05	4,39
ESTRUCTURA DE SALIDA						4,39
ZARPA	6,22	0,30	0,80	1	1,49	5,88
MURO	1,80	1,63	0,50	1	1,47	7,35
ALETAS	2,25	1,33	0,20	1	0,6	7,95
	2,14	1,48	0,20	1	0,63	8,58
PLACA ENTRE ALETAS	2,70	0,20	1,91	1	1,03	9,61
						9,61
TOTAL K 5+650					0	**9,61**
						9,61


Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

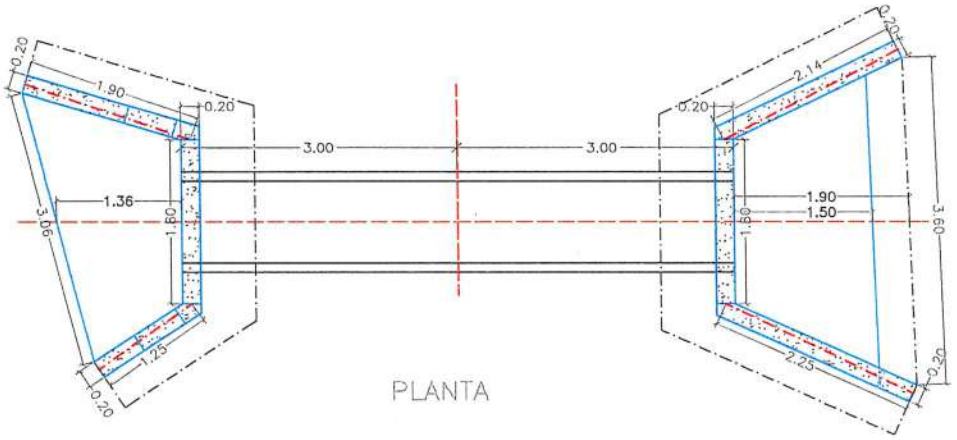


PLANTA



CORTE TUBERIA

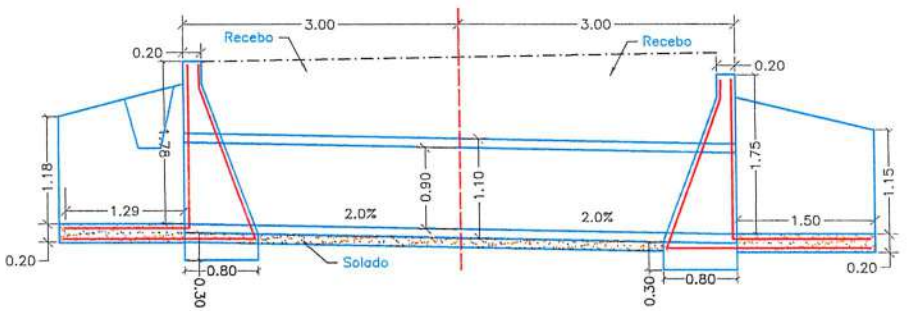


CORTE LONGITUDINAL

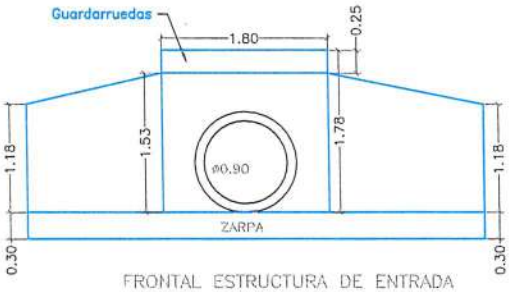

FRONTAL ESTRUCTURA DE ENTRADA





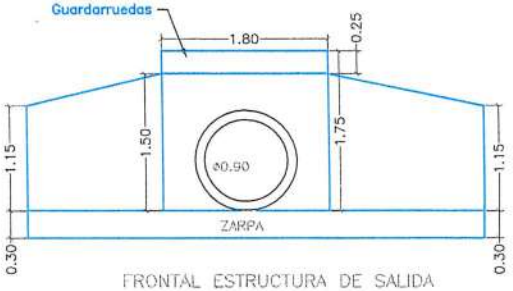

FRONTAL ESTRUCTURA DE SALIDA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE TIMANA

Proyecto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contiene: ALCANTARILLA NUEVA 36" NUMERO 06

Fecha: xxxxxxxx

Escala: xxxxxxxx

Dibujo:

Aprobo:

Diseño: SEGUNDO ANDRADE QUINTERO
Ing. Topográfico – Universidad Surcolombiana

Observaciones:

Fecha: Plano No.: A-3

Archivo:

CONSORCIO CENTRAL
NIT. 901.601.206-8

OBJETO CONTRATO

MEMORIA CORTE DE OBRA

Gobernación del Huila

HUILA CRECE

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:	"Mantenimiento A Todo Costo De Vías Y Reposición De Alcantarillas D=36" En La Red Vial De Segundo Y Tercer Orden A Cargo Del Departamento Del Huila: Zonas				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL			CORTE Nº:	2	FECHA :	29/10/2022
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:	ALCANTARILLA D= 36" VÍA 45HL10, TIMANA GALLARDO- CRUCE 20A (8 UND)						
ITEM Nº:	4.1	DESCRIPCION ITEM	HIERRO FyN= 60000 PSI FIGURADO E INSTALADO			UND:	Kg

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	ϕ PESO	Cant			
ALCANTARILLA # 8 K25+730						
ESTRUCTURA DE ENTREDA						0
POCETA	6,08	4,00	8,00		1,00	48,45
	5,44	4,00	8,00		1,00	43,35
	6,25	4,00	8,00		1,00	49,8
	5,64	4,00	8,00		1,00	44,94
	6,3	3,00	11,00		0,56	38,81
	5,3	3,00	11,00		0,56	32,65
ESTRUCTURA DE SALIDA						0
MURO -ALETAS	4,75	4,00	8		1,00	37,85
	3,85	4,00	8		1,00	30,68
	6,9	4,00	8		1,00	54,98
	7,6	4,00	8		1,00	60,56
	0,9	4,00	8		1,00	7,17
	0,7	4,00	8		1,00	5,58
	6	3,00	11		0,56	36,96
	5,8	3,00	11		0,56	35,73
TOTAL K25 + 730					0	**527,51**

Elaboró:

DIRECTORA DE OBRA


Firma


Autorizó


DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

ALCANTARILLA 8 K 25+730

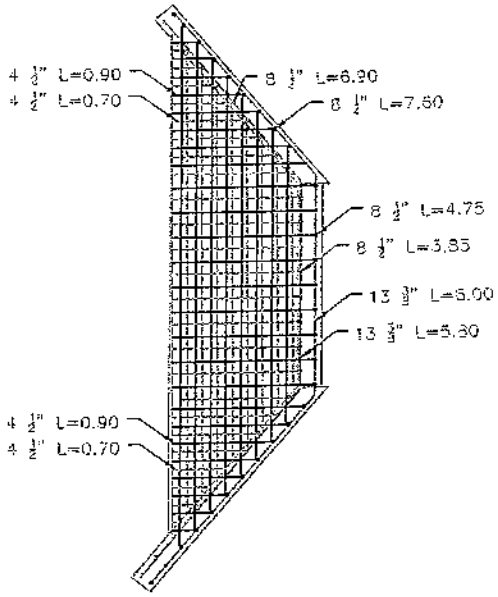

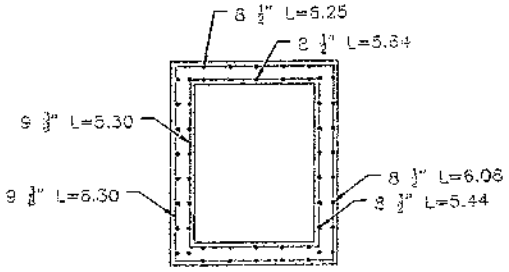

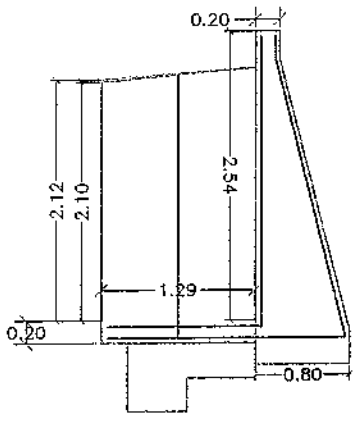

CONSORCIO CENTRAL
NIT. 901.501.206-8

OBJETO CONTRATO

MEMORIA CORTE DE OBRA

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:	"Mantenimiento A Todo Costo De Vías Y Reposición De Alcantarillas D=36" En La Red Vial De Segundo Y Tercer Orden A Cargo Del Departamento Del Huila: Zonas				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL			CORTE Nº:	2	FECHA :	29/10/2022
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:	ALCANTARILLA D= 36" VÍA 45HL10, TIMANA GALLARDO- CRUCE 20A (8 UND)						
ITEM Nº:	4.1	DESCRIPCION ITEM	HIERRO FyN= 60000 PSI FIGURADO E INSTALADO			UND:	Kg

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	ϕ PESO	Cant			
ALCANTARILLA # 7 K22+770						
ESTRUCTURA DE ENTREDA						0
POCETA	5,95	4,00	8,00		1,00	47,41
	5,45	4,00	8,00		1,00	43,43
	4,1	4,00	8,00		1,00	32,67
	3,15	4,00	8,00		1,00	25,1
	2,71	4,00	4,00		1,00	10,8
	2,36	4,00	4,00		1,00	9,4
	2,01	4,00	4,00		1,00	8,01
	2,16	4,00	4,00		1,00	8,61
	5,05	3,00	9,00		0,56	25,45
	4,8	3,00	9,00		0,56	24,19
ESTRUCTURA DE SALIDA	5,45	4,00	8,00		1,00	43,43
MURO -ALETAS	5,8	4,00	8,00		1,00	46,21
	4,2	4,00	8,00		1,00	33,47
	3,25	4,00	8,00		1,00	25,9
	2,38	4,00	4,00		1,00	9,48
	2,08	4,00	4,00		1,00	8,29
	2,38	4,00	4,00		2,00	19,04
	2,23	4,00	4,00		3,00	26,76
	6,3	3,00	4,00		1,00	25,2
	6,05	3,00	9,00		1,00	54,45
TOTAL K22+730	**2,08**				0	**527,3**
						1054,81


Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

ALCANTARILLA 7 K 21+870

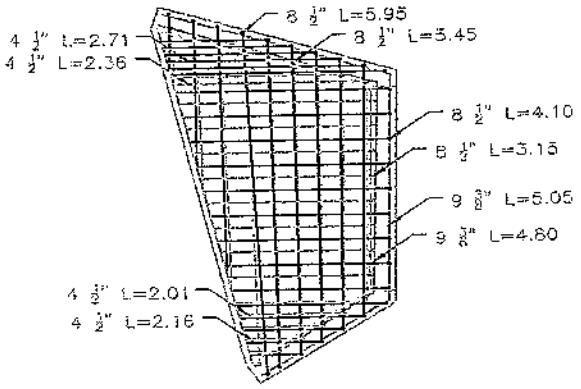

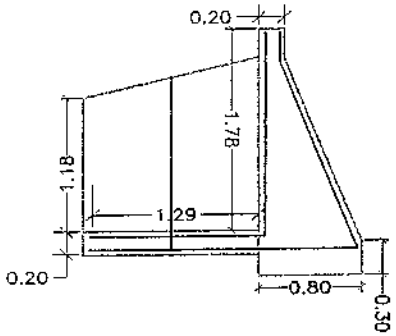

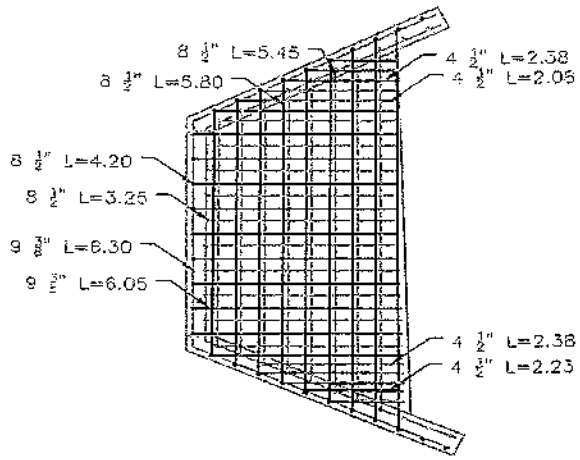

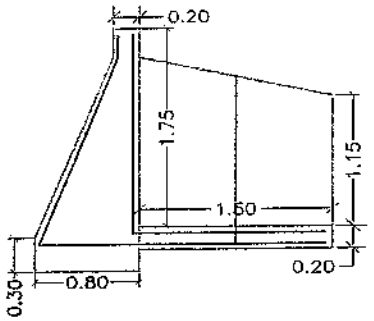

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	Gobernación del Huila / HUILA CRECE
	MEMORIA CORTE DE OBRA	

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:	"Mantenimiento A Todo Costo De Vías Y Reposición De Alcantarillas D=36" En La Red Vial De Segundo Y Tercer Orden A Cargo Del Departamento Del Huila: Zonas Centro Y Sur.

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL		CORTE Nº:	2	FECHA :	29/10/2022
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO					
UBICACIÓN:	ALCANTARILLA D= 36" VÍA 45HL10, TIMANA GALLARDO- CRUCE 20A (8 UND)					
ITEM Nº:	5.1	DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 36" (INCLUYE ANILLADO INTERNOY EXTERNO		UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
ALCANTARILLA # 8 K 25+730						
TUBERIA DE 36"	6			1	6	6
ALCANTARILLA # 7 K 22+770						
TUBERIA DE 36"	6			1	6	6
TOTAL						12,00

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	Gobernación del Huila / HUILA CRECE
	MEMORIA CORTE DE OBRA	

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL	CORTE Nº:	3	FECHA :	30/11/2022	
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO					
UBICACIÓN:						

ITEM Nº:	PAPSO 1	DESCRIPCION ITEM	ALCOHOL GLICERINADO O GEL ANTIBACTERIAL	UND:	BIDON (20 Litros)

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
MES DE NOVIEMBRE				2		2
					0	2
						2

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO MEMORIA CORTE DE OBRA	Gobernación del Huila · HUILA CRECE

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL		CORTE Nº:	3	FECHA :	30/11/2022	
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:							
ITEM Nº:	PAPSO 2	DESCRIPCION ITEM	ALCOHOL ETILICO AL 96%			UND:	BIDON (20 Litros)

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
MES DE NOVIEMBRE				3		3
					0	3
						3

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	Gobernación del Huila / HUILA CRECE
	MEMORIA CORTE DE OBRA	

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL	CORTE Nº:	3	FECHA :	30/11/2022	
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO					
UBICACIÓN:						
ITEM Nº:	PAPSO 5	DESCRIPCION ITEM	Toallas desechables para el secado de las manos		UND:	Rollo x 100 unidades

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
MES DE NOVIEMBRE				3		3
					0	3
						3

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	Gobernación del Huila / HUILA CRECE
	MEMORIA CORTE DE OBRA	

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL		CORTE Nº:	3	FECHA :	30/11/2022	
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:							
ITEM Nº:	PAPSO 6	DESCRIPCION ITEM	Tapabocas reutilizables			UND:	caja por 50

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
MES DE NOVIEMBRE				10		10
					0	10
						10

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	Gobernación del Huila / HUILA CRECE
	MEMORIA CORTE DE OBRA	

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL		CORTE Nº:	3	FECHA :	30/11/2022	
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:							
ITEM Nº:	PAPSO 7	DESCRIPCION ITEM	Guantes de Nitrilo negro (Una por frente de trabajo			UND:	caja por 100

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
MES DE NOVIEMBRE				2		2
					0	2
						2

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL
NIT. 901.601.206-8

OBJETO CONTRATO

MEMORIA CORTE DE OBRA

Gobernación del Huila

HUILA CRECE

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL		CORTE Nº:	3	FECHA :	30/11/2022	
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:							
ITEM Nº:	PAPSO 10	DESCRIPCION ITEM	RELLENO VIBROCOMPACTADO EN RECEBO COMÚN			UND:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
MES DE NOVIEMBRE				1		1
					0	1
						1

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	OBJETO CONTRATO	Gobernación del Huila / HUILA CRECE
	MEMORIA CORTE DE OBRA	

CONTRATO N°:	1181 de 2022	OBJETO:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL		CORTE Nº:	3	FECHA :	30/11/2022	
INTERVENTORIA	CARLOS CHAVARRO						
UBICACIÓN:							
ITEM Nº:	PAPSO 10	DESCRIPCION ITEM	RELLENO VIBROCOMPACTADO EN RECEBO COMÚN			UND:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura			
MES DE NOVIEMBRE				1		1
						1
						1

Elaboró:		Autorizó
DIRECTORA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma		Firma

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO CONTRATO DE OBRA N°1181:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	ELIAS-POTRERILLOS-CRUCE ELIAS
DIRECCIÓN:	45HL11

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL





Descripción: Conformación de calzada existente con adición de material.



Descripción: Conformación de calzada existente con adición de material.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

2. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL

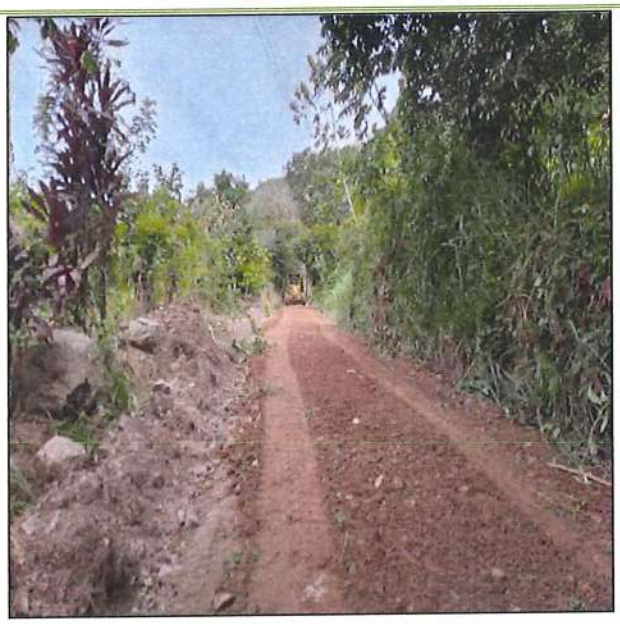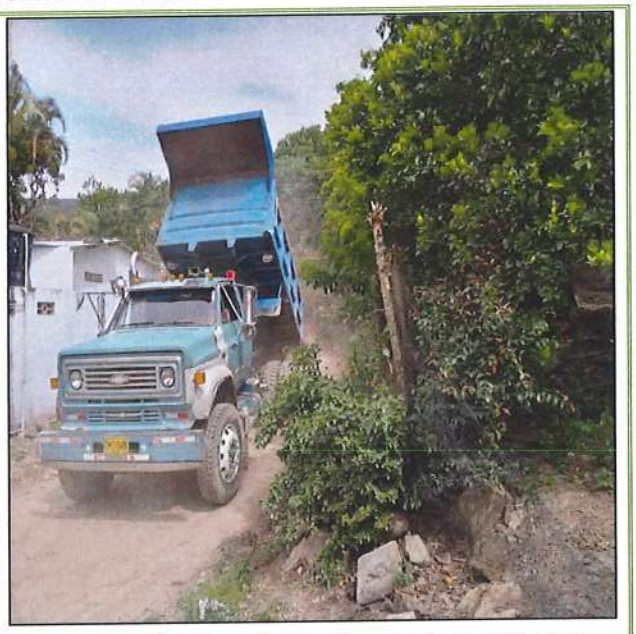	
Descripción: Riego de material extraído de cantera en volqueta.	**Descripción:** Proceso de vibro compactación del suelo instalado.

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	ELIAS-POTRERILLOS-CRUCE ELIAS
DIRECCIÓN:	45HL11

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL

	
Descripción: Conformación de calzada existente con adición de material	**Descripción**: Conformación de calzada existente con adición de material

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	ELIAS-POTRERILLOS-CRUCE ELIAS
DIRECCIÓN:	45HL11

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL



Descripción: Conformación de calzada existente con adición de material.



Descripción: procedimiento de vibro compactación al suelo.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS


CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 25 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	ELIAS-POTRERILLOS-CRUCE ELIAS
DIRECCIÓN:	45HL11

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL



Descripción: Riego de material extraído de cantera local.

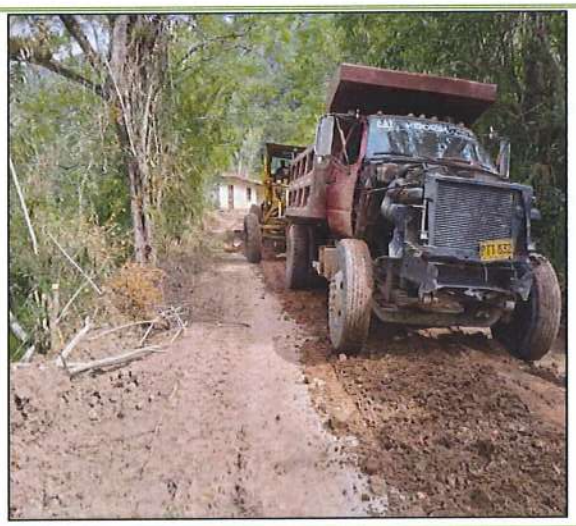

Descripción: procedimiento de conformación de calzada con motoniveladora.


CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1207 DE 2022
OBJETO:	Contrato de obra 1181 de 2022, "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	TIMANA-GALLARDO-CRUCE RUTA 20A
DIRECCIÓN:	RED TERCIARIA 45HL10

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL

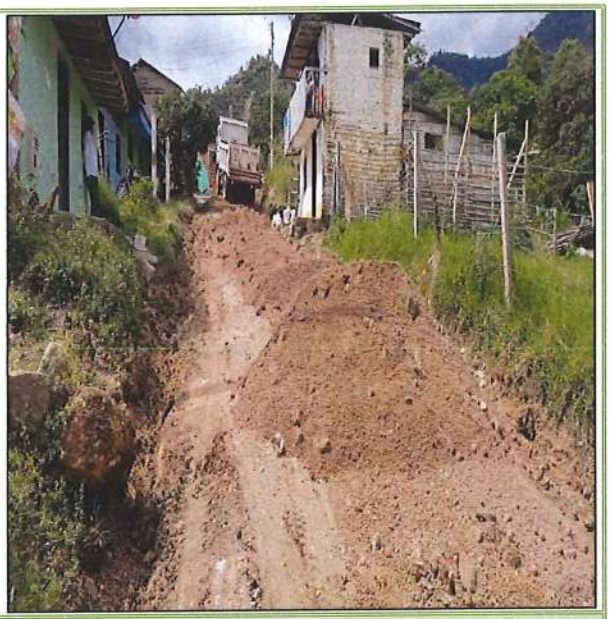	
Descripción: Recolección de material de cantera para afirmado	**Descripción:** Riego de material de afirmado extraído de recebera.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	Contrato de obra 1181 de 2022, "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	TIMANA-GALLARDO-CRUCE RUTA 20A
DIRECCIÓN:	RED TERCIARIA 45HL10

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA

	
Descripción: Construcción de alcantarilla rural	**Descripción: C**onstrucción de alcantarilla rural.

2. ENTREGA DE EPP A TRABAJADORES.

	
Descripción: Se entrega dotación a los trabajadores.	**Descripción:** Entrega de dotación a los trabajadores.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO Nit. 7703837-0 C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	Contrato de obra 1181 de 2022, "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	TIMANA-GALLARDO-CRUCE RUTA 20A
DIRECCIÓN:	RED TERCIARIA 45HL10

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.



Descripción: Se realiza la conformación con máquina motoniveladora.



Descripción: Se realiza la conformación de calzada existente con adición de material.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS


CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	RUTA 45 – PARAISO - ACEVEDO
DIRECCIÓN:	45HL09

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL.



Descripción: Estado del tramo vial después de ser trabajado por el operario en la motoniveladora, detalle de cunetas en material natural.

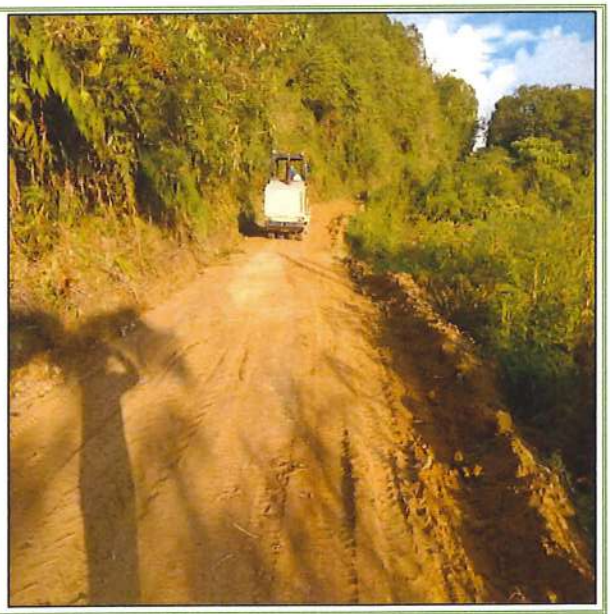

Descripción: Procedimiento de vibro compactación del suelo.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

2. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL.

	
Descripción: Se realiza la conformación de calzada con material de recebera y riego de motoniveladora.	**Descripción:** Se realiza la conformación de calzada con material de recebera y riego de motoniveladora.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	RUTA 45 – PARAISO - ACEVEDO
DIRECCIÓN:	45HL09

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL.



Descripción: Se realiza la conformación de calzada con material de recebera y riego de motoniveladora



Descripción: Se realiza la conformación de calzada con material de recebera y riego de motoniveladora

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 24 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	RUTA 45 – PARAISO - ACEVEDO
DIRECCIÓN:	45HL09

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL.

	
Descripción: Estado del tramo vial después de ser trabajado por el operario en la motoniveladora, detalle de cunetas en material	**Descripción:** Procedimiento de vibro compactación del suelo.

2. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL.

	
Descripción: Se realiza la conformación de calzada con material de recebera y riego de motoniveladora.	**Descripción:** Se realiza la conformación de calzada con material de recebera y riego de motoniveladora.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	TIMANA-POTRERILLOS-CRUCE ELIAS
DIRECCIÓN:	45HL11

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción: evidencia de estancamiento de aguas lluvias en la conformación de calzada, inspección de obra por parte de la interventoría</td>
<td>Descripción: conformación de calzada existente con adición de material .</td>
</tr>
</table>

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	TIMANA- POTRERILLOS- CRUCE ELIAS
DIRECCIÓN:	45HL11

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. SOCIALIZACIÓN



Descripción: Se realiza socialización en el casco urbano de potrerillos.




Descripción: Se realiza socialización en el casco urbano de potrerillos.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	TIMANA – POTRERILLOS - CRUCE ELIAS
DIRECCIÓN:	45HL11

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL

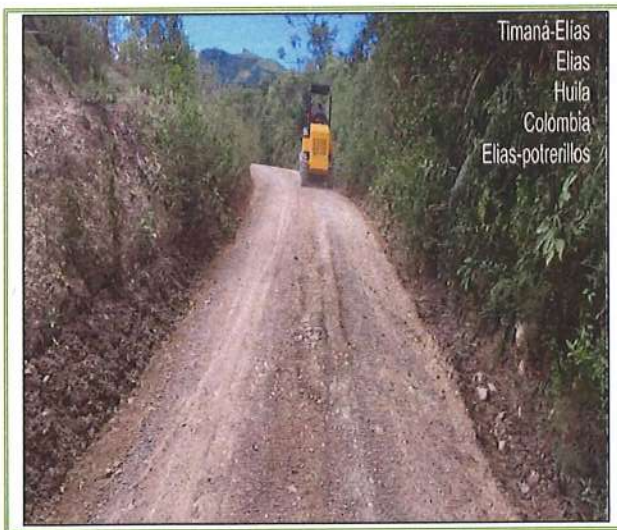	
Descripción: Se realiza vibro compactación a la estructura del suelo en el tramo vial.	**Descripción:** Se realiza riego de la adición del material en la calzada existente para realizar conformación

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	RUTA 45 – POTRERILLOS Y POTRERILLOS - ESTORACAL
DIRECCIÓN:	45HL16

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL.



Descripción: Se realiza inspección de obra por parte de la interventoría, de las actividades de conformación de calzada con adición de material.



Descripción: Registro fotográfico de conformación de calzada existente con adición de material.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H)
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	RUTA 45 – POTRERILLOS Y POTRERILLOS - ESTORACAL
DIRECCIÓN:	45HL16

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL.

	
Descripción: Evidencia de estancamiento de aguas lluvias en la conformación de calzada, inspección de obra por parte de la interventoría	**Descripción:** Conformación de calzada existente con adición de material.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H)
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	RUTA 45 – POTRERILLOS Y POTRERILLOS - ESTORACAL
DIRECCIÓN:	45HL16

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. SOCIALIZACIÓN

	
Descripción: Se realiza socialización en el casco urbano de potrerillos.	**Descripción:** Se realiza socialización en el casco urbano de potrerillos.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	RUTA 45 – POTRERILLOS Y POTRERILLOS - ESTORACAL
DIRECCIÓN:	45HL16

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL



Descripción: Conformación de calzada existente con adición de material.




Descripción: Conformación de calzada existente con adición de material.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	SUBRAMAL ALTO DE LOS IDOLOS
DIRECCIÓN:	20HL02-1

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL

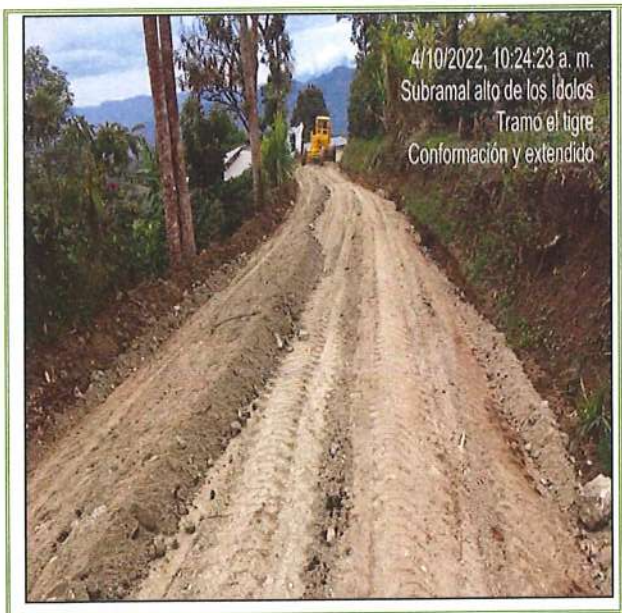



Descripción: Conformación de calzada existente con adición de material.



Descripción: conformación de calzada existente con adición de material.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

2. CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL.

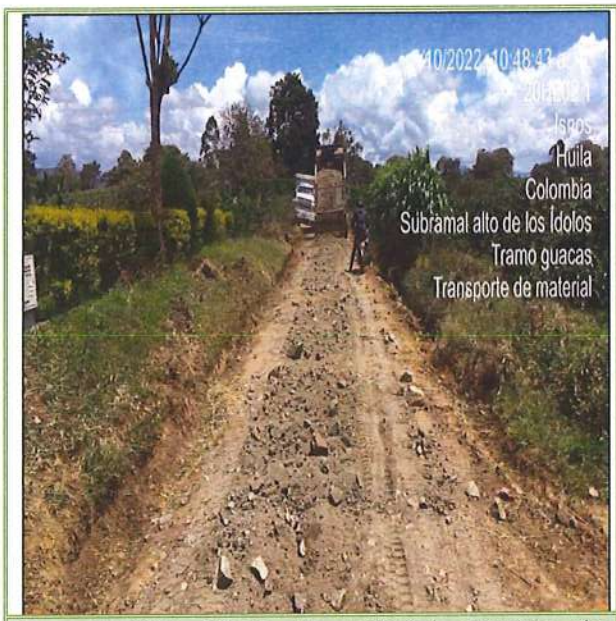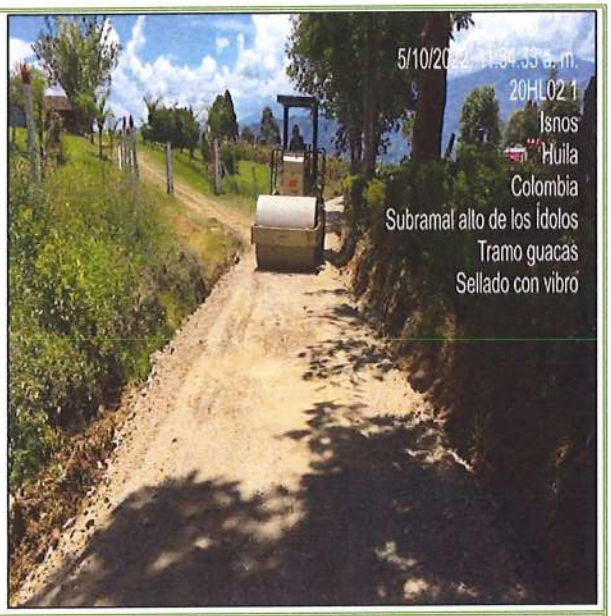	
Descripción: Riego de material extraído de cantera en volqueta.	**Descripción:** Proceso de vibro compactación del suelo instalado.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	SUBRAMAL ALTO DE LOS IDOLOS
DIRECCIÓN:	20HL02-1

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL

	
Descripción: Conformación de calzada existente con adición de material	**Descripción:** Estancamiento de aguas de escorrentía por ola invernal.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	SUBRAMAL ALTO DE LOS IDOLOS
DIRECCIÓN:	20HL02-1

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL



Descripción: Conformación de calzada existente con adición de material.



Descripción: procedimiento de vibro compactación al suelo.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.601.206-8 Rep. Legal: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C. No. 79957561 de Bogotá D.C CONTRATO DE OBRA N°1181 DE 2022
INTERVENTOR:	Nit. 7703837-0 Rep. Legal: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO C.C. 7.703.837 de Neiva (H) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1207 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR"
SEMANA:	DEL 25 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
FRENTE:	SUBRAMAL ALTO DE LOS IDOLOS
DIRECCIÓN:	20HL02-1

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE CON ADICION DE MATERIAL

	
Descripción: Riego de material extraído de cantera local.	**Descripción:** Procedimiento de conformación de calzada con motoniveladora.

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

BITACORA DE OBRA

Carrera 7 No. 16 A 29 Quirinal - Neiva
Email: inter.canchhuila@gmail.com
Cel: 3168747742

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.101.276-3	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima					
seco		Desde	6:00 a. m.	Hasta	6:00pm

Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 81 días

Nombre del Inspector:

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 Inspector de obra,	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
1 operario Retroexcavadora	
1 Maestro	
5 Ayudantes.	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora,
1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
2 Volquetas
1 Martillo demoledor electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Via Timaná- Gallardo - Ruta 20 A
2 En esta via se tienen priorizadas la construccion de 8 alcantarillas
3 Se inicia con la construcción de la alcantarilla N° 7
4 Se inicia la excavación para la construccion de la obra , instalación de tuberia de D=36" , lleno compactado
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Construccion de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO CENTRAL

Contrato No. 1181 DE 2022

Valor Inicial: $ 2,160,234,436.00

Valor Actualizado: $ 2,160,234,436.00

Plazo Inicial: 90

Plazo Actualizado: 90

Fecha de Iniciación: 1/09/2022

Fecha de Vencimiento: 30/11/2022

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima					
seco		Desde	6:00 a. m.	Hasta	6:00pm

Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 81 días

Nombre del Inspector:

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra,	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
1 operario Retroexcavadora	
1 Maestro	
5 Ayudantes.	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora,
1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
2 Volquetas
1 Martillo demoledor electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Via Timaná- Gallardo - Ruta 20 A
2 En esta via se tienen priorizadas la construccion de 8 alcantarillas
3 Se inicia con la construcción de la alcantarilla N° 7
4 Se inicia la excavación para la construccion de la obra , instalación de tuberia de D=36" , lleno compactado
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Construccion de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
lluvias	Desde	4:00 p. m.	Hasta	6:00 p. m.

Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 83 días

Nombre del Inspector:

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra,	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
1 operario Retroexcavadora	
1 Maestro	
5 Ayudantes.	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora,
1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
2 Volquetas
1 Martillo demoledor electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Via Timaná- Gallardo - Ruta 20 A
2 En esta via se tienen priorizadas la construccion de 8 alcantarillas
3 Se realiza vaciado de poceta de encole , en concreto de 21 Mpa según diseños, alcantarilla #7
4 Se realiza figuración e instalación de acero para la construccion, cabezote y aletas de la alcantarilla #7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Construccion de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS FLORES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901401206-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO CENTRAL
Contrato No. 1181 DE 2022
Valor Inicial: $ 2,160,234,436.00
Valor Actualizado: $ 2,160,234,436.00
Plazo Inicial: 90
Plazo Actualizado: 90
Fecha de Iniciación: 1/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov
Nombre del Inspector:

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima				
lluvias	Desde	4:00 p. m.	Hasta	6:00 p. m.

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 83 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra,	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
1 operario Retroexcavadora	
1 Maestro	
5 Ayudantes.	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora,
1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
2 Volquetas
1 Martillo demoledor electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Via Timaná- Gallardo - Ruta 20 A
2 En esta via se tienen priorizadas la construccion de 8 alcantarillas
3 Se realiza vaciado de poceta de encole , en concreto de 21 Mpa según diseños, alcantarilla #7
4 Se realiza figuración e instalación de acero para la construccion, cabezote y aletas de la alcantarilla #7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Construccion de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS FLORES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL Nit. 901.651.290-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
lluvias	Desde	5:00 p. m.	Hasta	6:00 p. m.

Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 85 días

Nombre del Inspector:

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra,	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
1 operario Retroexcavadora	
1 Maestro	
5 Ayudantes.	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora,
1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
2 Volquetas
1 Martillo demoledor electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Via Timaná- Gallardo - Ruta 20 A
2 En esta via se tienen priorizadas la construccion de 8 alcantarillas
3 Se realiza vaciado de descole en concreto de 21 Mpa, según diseños de la alcantarilla #7
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Construccion de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS [illegible]

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL Nit. 901401206-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
lluvias	Desde	5:00 p. m.	Hasta	6:00 p. m.

Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 85 días

Nombre del Inspector:

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra,	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
1 operario Retroexcavadora	
1 Maestro	
5 Ayudantes,	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora,
1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
2 Volquetas
1 Martillo demoledor electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Via Timaná- Gallardo - Ruta 20 A
2 En esta via se tienen priorizadas la construccion de 8 alcantarillas
3 Se realiza vaciado de descole en concreto de 21 Mpa, según diseños de la alcantarilla #7
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Construccion de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS [illegible]

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL
Contrato No.	1181 DE 2022
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00
Plazo Inicial:	90
Plazo Actualizado:	90
Fecha de Iniciación:	1/09/2022
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022
Semana Número:	14 Del: 27-nov Al: 3-dic
Nombre del Inspector:	

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima					
seco		Desde	6:00 a. m.	Hasta	6:00pm

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 88 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra,	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
1 operario Retroexcavadora	
1 Maestro	
5 Ayudantes.	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora,
1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
2 Volquetas
1 Martillo demoledor electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Via Timaná- Gallardo - Ruta 20 A
2 En esta via se tienen priorizadas la construccion de 8 alcantarillas
3 Se instala el acero de refuerzo para poceta de encole, según los diseños de la cartilla de Colombia Rural, encofrado para la alcantarilla #8
4 Se realiza figuración de acero para la construccion cabezote y aletas de la alcantarilla #8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Construccion de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL
Contrato No.	1181 DE 2022
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00
Plazo Inicial:	90
Plazo Actualizado:	90
Fecha de Iniciación:	1/09/2022
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima					
seco		Desde	6:00 a. m.	Hasta	6:00pm

Semana Número: 14 Del: 27-nov Al: 3-dic

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 88 días

Nombre del Inspector:

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra,	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
1 operario Retroexcavadora	
1 Maestro	
5 Ayudantes.	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora,
1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
2 Volquetas
1 Martillo demoledor electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Via Timaná- Gallardo - Ruta 20 A
2 En esta via se tienen priorizadas la construccion de 8 alcantarillas
3 Se instala el acero de refuerzo para poceta de encole, según los diseños de la cartilla de Colombia Rural, encofrado para la alcantarilla #8
4 Se realiza figuración de acero para la construccion cabezote y aletas de la alcantarilla #8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Construccion de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS [illegible] CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
lluvias	Desde	6:00 a. m.	Hasta	7:00 a. m.

Semana Número: 14 Del: 27-nov Al: 3-dic

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 90 días

Nombre del Inspector:

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra,	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
1 operario Retroexcavadora	
1 Maestro	
5 Ayudantes.	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora,
1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
2 Volquetas
1 Martillo demoledor electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Via Timaná- Galiardo - Ruta 20 A
2 En esta via se tienen priorizadas la construccion de 8 alcantarillas
3 Se realiza vaciado de poceta de encole, en concreto de 21 Mpa según diseños de la alcantarilla #8
4 Se reañoza figuración e instalación de acero para la construccion, cabezote y aletas para la alcantarilla #8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Construccion de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
lluvias	Desde	6:00 a. m.	Hasta	7:00 a. m.

Semana Número: 14 Del: 27-nov Al: 3-dic

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 90 días

Nombre del Inspector:

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra,	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
1 operario Retroexcavadora	
1 Maestro	
5 Ayudantes.	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora,
1 Concretadora
1 Vibrador de concreto
2 Volquetas
1 Martillo demoledor electrico

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Via Timaná- Gallardo - Ruta 20 A
2 En esta via se tienen priorizadas la construccion de 8 alcantarillas
3 Se realiza vaciado de poceta de encole, en concreto de 21 Mpa según diseños de la alcantarilla #8
4 Se reañoza figuración e instalación de acero para la construccion, cabezote y aletas para la alcantarilla #8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Construccion de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA

CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.205-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 11 Del: 6-nov Al: 12-nov Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 70 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 Inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarquí:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza excavación para la ubicación de la alcantarilla #1
12 Se realiza fundida de solado de limpieza
13 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #1 de la vía La Jagua - Tarquí
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 891.801.205-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		
Semana Número:	11 Del: 6-nov Al: 12-nov		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 70 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los líderes comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza excavación para la ubicación de la alcantarilla #1
12 Se realiza fundida de solado de limpieza
13 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #1 de la vía La Jagua - Tarqui
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA PESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.396-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 11 Del: 6-nov Al: 12-nov

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 72 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los líderes comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza instalación de tubería de 36"
12 Se instala relleno y se compacta
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.602.305-6	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO CENTRAL
Contrato No. 1181 DE 2022
Valor Inicial: $ 2,160,234,436.00
Valor Actualizado: $ 2,160,234,436.00
Plazo Inicial: 90
Plazo Actualizado: 90
Fecha de Iniciación: 1/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Semana Número: 11 Del: 6-nov Al: 12-nov

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 72 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza instalación de tubería de 36"
12 Se instala relleno y se compacta
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.691.200-4	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 12 Del: 13-nov Al: 19-nov Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 76 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza figurado de acero #2
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA ESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.051.200-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO CENTRAL
Contrato No. 1181 DE 2022
Valor Inicial: $ 2,160,234,436.00
Valor Actualizado: $ 2,160,234,436.00
Plazo Inicial: 90
Plazo Actualizado: 90
Fecha de Iniciación: 1/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Semana Número: 12 Del: 13-nov Al: 19-nov

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 76 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 Inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza figurado de acero #2
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.801.269-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 12 Del: 13-nov Al: 19-nov

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 78 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoria y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza instalación de tubería de 36"
12 Se instala relleno y se compacta
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.305-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		
Semana Número:	12 Del: 13-nov Al: 19-nov		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 78 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los líderes comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza instalación de tubería de 36"
12 Se instala relleno y se compacta
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA ESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.305-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 81 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #3
12 Se inicia fundida de alcantarilla #3
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA ESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.306-0	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 81 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS


1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #3
12 Se inicia fundida de alcantarilla #3
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO



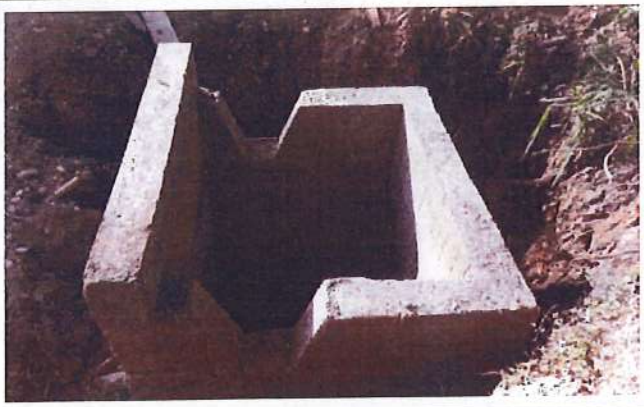

OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA ESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.306-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 83 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza excavación para la ubicación de la alcantarilla #4
12 Se realiza fundida de solado de limpieza
13 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #4
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA TESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.206-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO CENTRAL
Contrato No. 1181 DE 2022
Valor Inicial: $ 2,160,234,436.00
Valor Actualizado: $ 2,160,234,436.00
Plazo Inicial: 90
Plazo Actualizado: 90
Fecha de Iniciación: 1/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 83 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoria y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza excavación para la ubicación de la alcantarilla #4
12 Se realiza fundida de solado de limpieza
13 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #4
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA ESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.204-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 85 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarquí:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza instalación de tubería de 36"
12 Se instala relleno y se compacta
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.205-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO CENTRAL
Contrato No. 1181 DE 2022
Valor Inicial: $ 2,160,234,436.00
Valor Actualizado: $ 2,160,234,436.00
Plazo Inicial: 90
Plazo Actualizado: 90
Fecha de Iniciación: 1/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Semana Número: 13 Del: 20-nov Al: 26-nov

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 85 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza instalación de tubería de 36"
12 Se instala relleno y se compacta
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT.901.601.306-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 14 Del: 27-nov Al: 3-dic

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 88 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador


ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #5
12 Se inicia fundida de alcantarilla #5
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

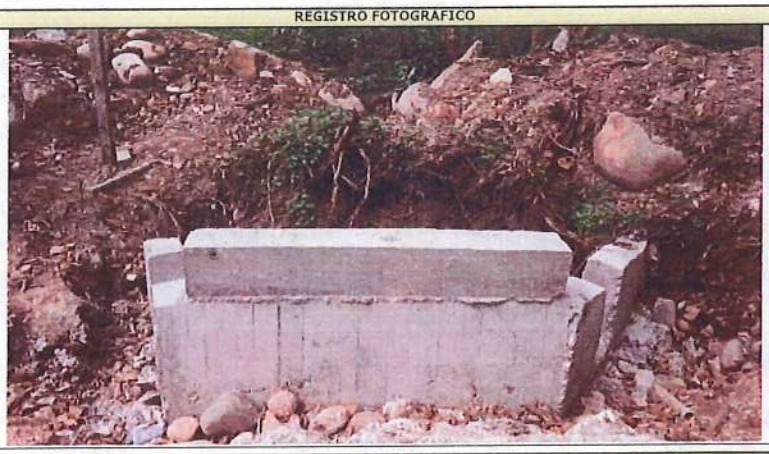

OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT: 901.601.205-6	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO CENTRAL
Contrato No. 1181 DE 2022
Valor Inicial: $ 2,160,234,436.00
Valor Actualizado: $ 2,160,234,436.00
Plazo Inicial: 90
Plazo Actualizado: 90
Fecha de Iniciación: 1/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Semana Número: 14 Del: 27-nov Al: 3-dic

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 88 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador


ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla Nº 1 PR 7+300
4 Alcantarilla Nº 2 PR 8+300
5 Alcantarilla Nº 3 PR 9+200
6 Alcantarilla Nº 4 PR 9+800
7 Alcantarilla Nº 5 PR 11+400
8 Alcantarilla Nº 6
9 Alcantarilla Nº 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #5
12 Se inicia fundida de alcantarilla #5
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

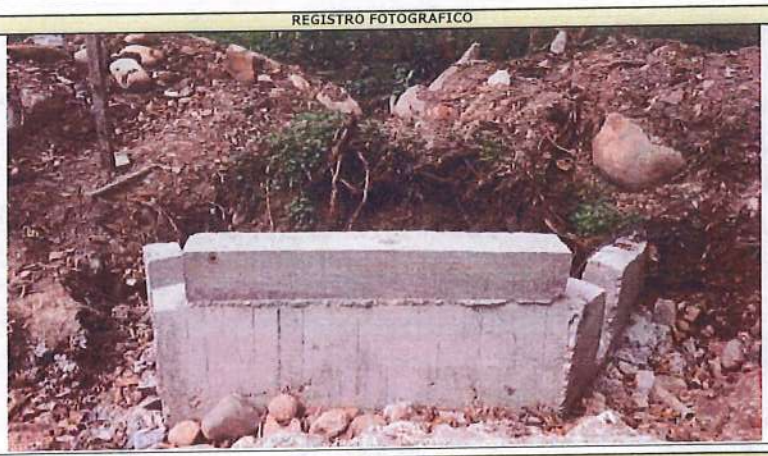

OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.021.206-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 14 Del: 27-nov Al: 3-dic

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 90 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 Inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los líderes comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza excavación para la ubicación de la alcantarilla #6
12 Se realiza fundida de solado de limpieza
13 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #6
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.401.356-6	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 14 Del: 27-nov Al: 3-dic Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 90 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA		INTERVENTORIA
1 Directora de obra		
1 Residente de obra		
1 inspector de obra		
1 Ing Ambiental		
1 Residente SST		
3 Operadores		
1 Maestro		
3 Ayudantes		
2 Conductores		

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoria y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza excavación para la ubicación de la alcantarilla #6
12 Se realiza fundida de solado de limpieza
13 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #6
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.801.106-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 14 Del: 27-nov Al: 3-dic Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 92 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza instalación de tubería de 36"
12 Se instala relleno y se compacta
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES	FIRMAS
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ANDRES CHAVARRO DIRECTORA DE OBRA CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.601.104-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 14 Del: 27-nov Al: 3-dic Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 92 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza instalación de tubería de 36"
12 Se instala relleno y se compacta
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES	FIRMAS
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO
	DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.001.205-6	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00		
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00		
Plazo Inicial:	90		
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Iniciación:	1/09/2022		
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022		

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Semana Número: 15 Del: 4-dic Al: 10-dic Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 95 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los lideres comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #7
12 Se inicia fundida de alcantarilla #7
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.801.206-6	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL
Contrato No.	1181 DE 2022
Valor Inicial:	$ 2,160,234,436.00
Valor Actualizado:	$ 2,160,234,436.00
Plazo Inicial:	90
Plazo Actualizado:	90
Fecha de Iniciación:	1/09/2022
Fecha de Vencimiento:	30/11/2022
Semana Número:	15 Del: 4-dic Al: 10-dic

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima				
Lluvias	Desde	7:00 a. m.	Hasta	9:00 a.m

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 95 días

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Directora de obra	
1 Residente de obra	
1 inspector de obra	
1 Ing Ambiental	
1 Residente SST	
3 Operadores	
1 Maestro	
3 Ayudantes	
2 Conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Retroexcavadora
1 Motoniveladora
1 Vibrocompactador
3 Volquetas
1 Carrotanque irrigador

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Vía La Jagua - Tarqui:
2 En esta vía se tiene priorizada la construcción de 7 alcantarillas ubicadas en los siguientes PR
3 Alcantarilla N° 1 PR 7+300
4 Alcantarilla N° 2 PR 8+300
5 Alcantarilla N° 3 PR 9+200
6 Alcantarilla N° 4 PR 9+800
7 Alcantarilla N° 5 PR 11+400
8 Alcantarilla N° 6
9 Alcantarilla N° 7 PR 13+400
10 Estos puntos fueron viabilizados entre la comunidad en cabeza de los líderes comunales, la Interventoría y el Contratista en recorrido de obra
11 Se realiza figurado de acero y fundición de poceta en la alcantarilla #7
12 Se inicia fundida de alcantarilla #7
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMAR

1 Construcción de alcantarillas en los puntos determinados en recorrido de obra
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 2:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	3/10/2022		

Semana Número: 6 Del: 26-sep Al: 1-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31 días

Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%	Obra Física Ejecutada (%)	5,71%	10,95%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 58.903.775	Valor de la Obra	$ 12.117.348	$ 52.508.508

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-0,16%
Durante el periodo	5,56%	5,71%	
Acumulado actual	11,11%	10,95%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
3 Operadores	
5 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

2 motoniveladoras
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
5 volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Transporte de material de cantera
2. Replanteo y conformacion de cunetas
3. Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
4. Sellado con vibrocompactador
5. El dia de hoy se instalo 432m3, 72 viajes de recebo, conformado y compactado 1,200 m replanteo y conformacion de cunetas se avanzo 2,500 m.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1. Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2. compactar tramo conformado
3. continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4.
5.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.661.304-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO CENTRAL
Contrato No. 1181 DE 2022
Valor Contrato: $ 2.160.234.436,00
Valor tramo: $ 212.053.590,00
Plazo Inicial: 90
Plazo Actualizado: 90
Fecha de Inicio: 1/09/2022
Fecha denicio tramo: 3/10/2022
Semana Número: 6 Del: 2-oct Al: 8-oct
Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

Objeto MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR

Clima lluvias Desde 6:00 a. m. Hasta 10:30am


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 32 días

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 70.684.530
Obra Física Ejecutada (%)	5,71%	10,95%
Valor de la Obra	$ 12.117.348	$ 52.508.508

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-0,16%
Durante el periodo	5,56%	5,71%	
Acumulado actual	11,11%	10,95%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
3 Operadores	
5 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

2 motoniveladoras
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
5 volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Transporte de material de cantera
2. Replanteo y conformacion de cunetas
3. Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
4. Sellado con vibrocompactador
5. El dia de hoy se instalo 300 m3, 65 viajes de recebo, conformado y compactado 1,200 m replanteo y conformacion de cunetas se avanzo 1,500 m.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1. Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2. compactar tramo conformado
3. continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4. Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA CATALINA ESTRADA OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	3/10/2022		
Semana Número:	6 Del: 2-oct Al: 8-oct	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 33 días	
Nombre del Inspector:	Wilton Geovanny Cuesta Aguilar		


AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 82.465.285

	DIARIO	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	9,52%	14,76%
Valor de la Obra	$ 20.195.580	$ 60.586.740

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	3,65%
Durante el periodo	5,56%	9,52%	
Acumulado actual	11,11%	14,76%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
3 Operadores	
5 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

2 motoniveladoras
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
5 volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Transporte de material de cantera
2. Replanteo y conformacion de cunetas
3. Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
4. Sellado con vibrocompactador
5. El dia de hoy se instalo 390m3, 65 viajes de recebo, conformado y compactado 2,000 m replanteo y conformacion de cunetas se avanzo 1,500 m
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1. Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2. compactar tramo conformado
3. continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4. Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.093.264-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	3/10/2022		

Semana Número: 6 Del: 2-oct Al: 8-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 34 días


Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 94.246.040
Obra Física Ejecutada (%)	13,33%	18,57%
Valor de la Obra	$ 28.273.812	$ 68.664.972

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	7,46%
Durante el periodo	5,56%	13,33%	
Acumulado actual	11,11%	18,57%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES

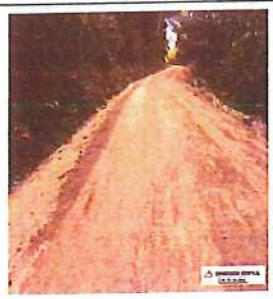

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
3 Operadores	
5 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

2 motoniveladoras
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
5 volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Transporte de material de cantera
2. Replanteo y conformacion de cunetas
3. Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
4. Sellado con vibrocompactador
5. El dia de hoy se instalo 1097m3, 183 viales de recebo, conformado y compactado 2,800 mreplanteo y conformacion de cunetas se avanzo 3500 m
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS


1. Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2. compactar tramo conformado
3. continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4.
5.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

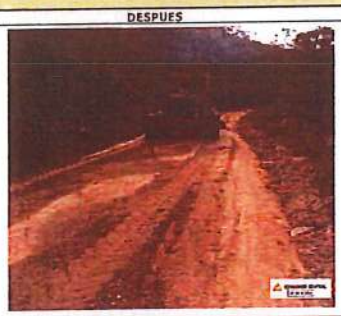

OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA CATALINA REYNES OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima lluvias**	Desde 7:00 a. m. Hasta 9:30am
Plazo Actualizado:	90		
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	3/10/2022		

Semana Número: 6 Del: 2-oct Al: 8-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 35 días


Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%	Obra Física Ejecutada (%)	7,62%	12,86%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 106.026.795	Valor de la Obra	$ 16.156.464	$ 163.584.198

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	1,75%
Durante el periodo	5,56%	7,62%	
Acumulado actual	11,11%	12,86%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
4 Operadores	
5 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

2 motoniveladoras
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
5 volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Transporte de material de cantera
2 Replanteo y conformacion de cunetas
3 Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
4 Sellado con vibrocompactador
5 El dia de hoy se instalo 624m3, 104 viajes de recebo
6 Conformacion y compactado de material 1,600 m
7 Replanteo y conformacion de cunetas se avanzo 2,600 m
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4 Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

El material de cantera esta llegando granular muy fino.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES NAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OBRA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	**Lluvias**	Desde 7:00 a. m. Hasta 2:30am
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	3/10/2022		
Semana Número:	6 Del: 2-oct Al: 8-oct	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	36 días
Nombre del Inspector:	Wilton Geovanny Cuesta Aguilar		

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%	Obra Física Ejecutada (%)	1,43%	6,67%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 117.807.550	Valor de la Obra	$ 3.029.337	$ 166.613.535

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-4,44%
Durante el periodo	5,56%	1,43%	
Acumulado actual	11,11%	6,67%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES

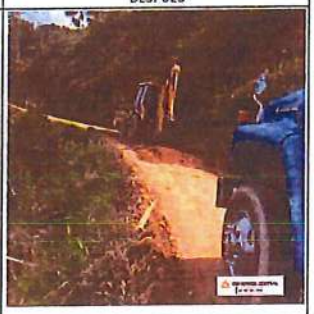

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
3 Operadores	
2 Conductores de volqueta	
2 Auxiliares de transito	

EQUIPO DE OBRA

2 motoniveladoras
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
2 volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Transporte de material de cantera
2. Conformacion de material recebo, sacando fallos en via ya intervenida
3. Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
4. Sellado de material
5. El dia de hoy se instalo 36m3, 6 viajes de recebo en 300 m, atencion de punto critico
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1. Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2. compactar tramo conformado
3. continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4. Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

El material de cantera esta llegando granular muy fino.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ALEJANDRO CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.634.109-9	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	**lluvias**	Desde 6:00 a. m. Hasta 11:30am
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	3/10/2022		

Semana Número: 6 Del: 2-oct Al: 8-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 37 días


Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%	Obra Física Ejecutada (%)	0,48%	5,71%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 129.588.305	Valor de la Obra	$ 1.009.779	$ 167.623.314


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-5,40%
Durante el periodo	5,56%	0,48%	
Acumulado actual	11,11%	5,71%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES

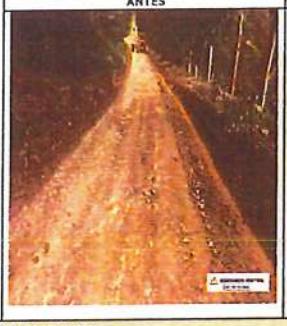

DESPUES

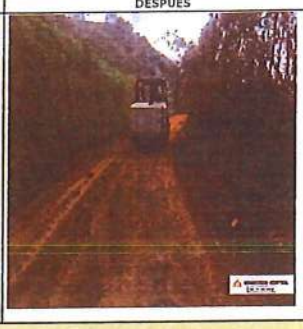

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
3 Operadores	
2 Conductores de volqueta	
2 Auxiliares de transito	

EQUIPO DE OBRA

2 motoniveladoras
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
2 volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Transporte de material de cantera
2. Replanteo y conformacion de cunetas
3. Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
4. Sellado con vibro compactador
5. El dia de hoy se instalo 30 m3, 5 viajes de recebo
6. Conformacion y compactado de material 100 m
7. Replanteo y conformacion de cunetas se avanzo 400 m
8. Ampliacion de via y arreglo de cunetas en parte ya intervenida 100 m
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1. Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2. compactar tramo conformado
3. continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4. Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5.

REGISTRO FOTOGRAFICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

El material de cantera llego con mucha arcilla y granular fino.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO [illegible]

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	lluvias	Desde 6:00 a. m. Hasta 5:30pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	3/10/2022		

Semana Número: 6 Del: 2-oct Al: 8-oct Tiempo transcurrido desde la Iniciación del contrato: 38 días


Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	5,24%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 141.369.060	Valor de la Obra	$ -	$ 167.623.314

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-5,87%
Durante el periodo	5,56%	0,00%	
Acumulado actual	11,11%	5,24%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
4 Operadores	
2 Conductores de volqueta	
2 Auxiliares de transito	

EQUIPO DE OBRA

2 motoniveladoras
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
2 volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Se suspenden labores por motivos de lluvia, no se pudo trabajar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4 Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBSERVACIONES

Dia con presencia de lluvia.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CONTRATISTA RESTREPO ALZATE

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.091.306-2	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	10/10/2022		
Semana Número:	7 Del: 10-oct Al: 15-oct	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 días	
Nombre del Inspector:	Wilton Geovanny Cuesta Aguilar		

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%	Obra Física Ejecutada (%)	7,38%	12,62%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 153.149.815	Valor de la Obra	$ 15.651.575	$ 183.274.869


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	1,51%
Durante el periodo	5,56%	7,38%	
Acumulado actual	11,11%	12,62%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES

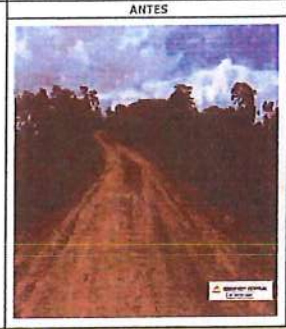

DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
4 Operadores	
2 Conductores de volqueta	
2 Auxiliares de transito	

EQUIPO DE OBRA

2 motoniveladoras
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
2 volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Transporte de material de cantera
2 conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
3 Sellado con vibrocompactador
4 El dia de hoy se instalo 605 m3 100 viajes de recebo
5 conformacion y compactado de material 1,550 m
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA [illegible]

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	Clima	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	10/10/2022		

Semana Número: 7 Del: 10-oct Al: 15-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 39 días


Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 164.930.570
Obra Física Ejecutada (%)	7,14%	12,38%
Valor de la Obra	$ 15.146.685	$ 198.421.574

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	1,27%
Durante el periodo	5,56%	7,14%	
Acumulado actual	11,11%	12,38%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES

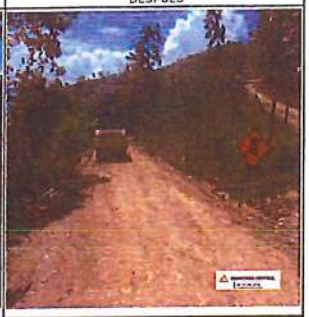

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
3 Operadores	
8 conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
8 volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Transporte de material de cantera
2 Replanteo y conformacion de cunetas
3 Sellado con vibrocompactador
4 El dia de hoy se instalo 585 m3, 98 viajes de recebo
5 conformacion y compactado de material 1,500 m
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

El material de cantera llego granular fino, se requiere de 2 controladores de trafico via muy estrech

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA CATALINA ESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	10/10/2022		

Semana Número: 7 Del: 10-oct Al: 15-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 40 días

Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar


AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 176.711.325

	DIARIO	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,76%	10,00%
Valor de la Obra	$ 10.097.790	$ 203.519.364


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-1,11%
Durante el periodo	5,56%	4,76%	
Acumulado actual	11,11%	10,00%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES

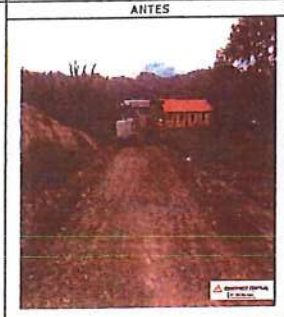

DESPUES

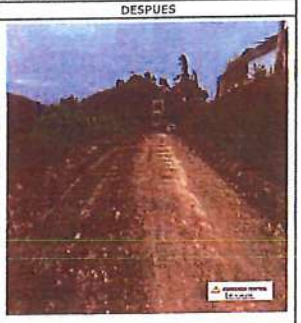

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
2 Operadores	
6 conductores	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
6 Volquetas
1 retroexcavadora

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Transporte de material de cantera
2 Replanteo y conformacion de cunetas
3 Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
4 Sellado con vibrocompactador
5 El dia de hoy se instalo 429 m3, 72 viajes de recebo
6 conformacion y compactado de material 1,100 m
7 Replanteo y conformacion de cunetas se avanzo 2,000 m
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4 Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	10/10/2022		

Semana Número: 7 Del: 10-oct Al: 15-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 41 días


Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%	Obra Física Ejecutada (%)	4,29%	9,52%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 188.492.080	Valor de la Obra	$ 9.088.011	$ 217.607.375

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-1,59%
Durante el periodo	5,56%	4,29%	
Acumulado actual	11,11%	9,52%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
2 Operadores	
6 conductores	
2 Auxiliares de transito	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
6 Volquetas
1 retroexcavadora

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Transporte de material de cantera
2 Replanteo y conformacion de cunetas ya intervenida
3 Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
4 Sellado con vibrocompactador
5 El dia de hoy se instalo 351 m3, 59 viajes de recebo
6 conformacion y compactado de material 900 m
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	10/10/2022		

Semana Número: 7 Del: 10-oct Al: 15-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 42 días

Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar


AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 200.272.835

	DIARIO	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	5,24%
Valor de la Obra		$ 217.607.375

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-5,87%
Durante el periodo	5,56%	0,00%	
Acumulado actual	11,11%	5,24%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
1 Controlador de trafico	
2 operadores	
2 Auxiliares de transito	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
6 conductores

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Se cumple horario pero actividades se suspende por motivo de lluvia.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4 Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBSERVACIONES

el dia de hoy se suspenden labores por lluvias

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS JAIMES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	10/10/2022		

Semana Número: 7 Del: 10-oct Al: 15-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 43 días

Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar


AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 212.053.590

	DIARIO	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	5,24%
Valor de la Obra		$ 217.607.375

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-5,87%
Durante el periodo	5,56%	0,00%	
Acumulado actual	11,11%	5,24%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
1 Controlador de trafico	
2 operadores	
2 Auxiliares de transito	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
6 conductores

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Se cumple horario pero actividades se suspende por motivo de lluvia.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBSERVACIONES

el dia de hoy se suspenden labores por lluvias

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES NAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	17/10/2022		
Semana Número:	8 Del: 17-oct Al: 22-oct	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 44 días	
Nombre del Inspector:	Wilton Geovanny Cuesta Aguilar		

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	5,56%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	5,24%
Valor de la Obra		$ 212.053.590	Valor de la Obra		$ 217.607.375

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-0,32%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	
Acumulado actual	5,56%	5,24%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES

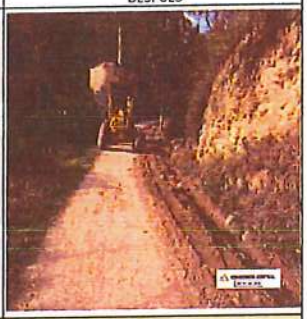

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
1 Controlador de trafico	
2 operadores	
2 Auxiliares de transito	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
6 conductores

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Replanteo y conformacion de cunetas, se avanzo 2,000 m
2 No se puede instalar material debido a que la rasante se encuentra saturada
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se requiere de otra controladora de trafico via estrecha.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CAMILA RESTREPO

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	17/10/2022		
Semana Número:	8 Del: 17-oct Al: 22-oct	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 días	
Nombre del Inspector:	Wilton Geovanny Cuesta Aguilar		

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO	
Obra programada (%)	5,56%	11,11%	Obra Física Ejecutada (%)	2,38%	7,62%	
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 223.834.345	Valor de la Obra	$ 5.048.895	$	222.656.270

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-3,49%
Durante el periodo	5,56%	2,38%	
Acumulado actual	11,11%	7,62%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
5 Conuctores	
2 Operadores	
5 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
5 Volquetas
1 retroexcavadora

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Trasporte de material de cantera
2 Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
3 Sellado con vibrocompactador
4 En el transcurso del dia se instalo 351 m3, 59 viajes de recebo
5 Conformacion y compactado de material 900 m
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4 Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES NAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ NATALIA MARES

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	**lluvias**	Desde 11:00 a. m. Hasta 4:30pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	17/10/2022		
Semana Número:	8 Del: 17-oct Al: 22-oct	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 46 días	
Nombre del Inspector:	Wilton Geovanny Cuesta Aguilar		

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 235.615.100
Obra Física Ejecutada (%)	10,48%	15,71%
Valor de la Obra	$ 22.215.138	$ 244.871.408


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	4,60%
Durante el periodo	5,56%	10,48%	
Acumulado actual	11,11%	15,71%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES

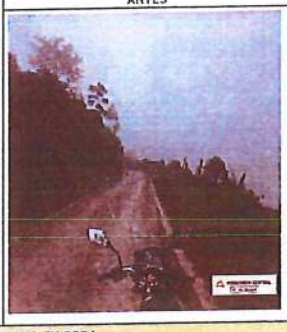

DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
2 Controladora de trafico	
2 Operadores	
6 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
6 Volquetas
1 retroexcavadora

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Trasporte de material de cantera
2. Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento
3. Sellado con vibrocompactador
4. En el transcurso del dia se instalo 72m3, 12 viajes de recebo, ya que el punto es critico y estaba con fallo
5. Conformacion y compactado de material 300 mts
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1. Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2. compactar tramo conformado
3. continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4. Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

El material recebo extendido de ayer no se alcanzo a compactar solo se sello, por motivo de lluvia ademas el punto donde estamos es muy, pendiente donde tocaba esperar que seque pero la lluvia continuo.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA ESTRADA OSSA

CONSORCIO CENTRAL NIT. 901.834.200-8	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	**lluvias**	Desde 6:00 a. m. Hasta 2:30pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	17/10/2022		

Semana Número: 8 Del: 17-oct Al: 22-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 47 días


Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	5,24%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 247.395.855	Valor de la Obra		$ 244.871.408

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-5,87%
Durante el periodo	5,56%	0,00%	
Acumulado actual	11,11%	5,24%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES

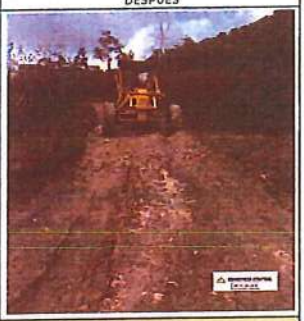

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
2 Controladora de trafico	
2 Operadores	
6 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
6 Volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Se cumple horario pero actividades se suspenden por motivo de lluvia.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4 Se espera alcanzar un avance diario de 2 km
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBSERVACIONES

El dia de hoy se suspenden labores por lluvia.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES NAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	**lluvias**	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	17/10/2022		

Semana Número: 8 Del: 17-oct Al: 22-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 días


Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	5,56%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	5,24%
Valor de la Obra		$ 247.395.855	Valor de la Obra		$ 244.871.408

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-0,32%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	
Acumulado actual	5,56%	5,24%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
2 Controladora de trafico	
2 Operadores	
6 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
6 Volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se hace limpieza de sub rasante ya que por motivo de lluvia, material se contamina con barro.
2. Se realiza visita a la vía en compañía del Alcalde del Municipio de Acevedo, Comunicadora de la Alcaldía, Concejal , Supervisor de la Gobernación del Huila e interventoría para verificar el avance de obra, problemas en los avances y hablar con la comunidad sobre la intervención que se esta realizando con el mantenimiento de la vía.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1. Dar avance en actividades de limpieza y conformación de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2. compactar tramo conformado
3. continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4.
5.

REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBSERVACIONES

El día de hoy se deja que se seque un poco, la vía por motivo de lluvia para volver a intervenir.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES OCHARRO

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	**lluvias**	Desde 6:00 a. m. Hasta 6:30pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	17/10/2022		
Semana Número:	8 Del: 17-oct Al: 22-oct	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 49 días	
Nombre del Inspector:	Wilton Geovanny Cuesta Aguilar		

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	5,56%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	5,24%
Valor de la Obra		$ 247.395.855	Valor de la Obra		$ 244.871.408

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-0,32%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	
Acumulado actual	5,56%	5,24%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
2 Controladora de trafico	
2 Operadores	
6 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
6 Volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 No se ejecutan labores por motivos de lluvia fuertes
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES



20

OBSERVACIONES

Se suspenden actividades por lluvia, se cumple horario.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	24/10/2022		
Semana Número:	9 Del: 24-oct Al: 29-oct	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 50 días	
Nombre del Inspector:	Wilton Geovanny Cuesta Aguilar		


AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 259.176.610

	DIARIO	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,33%	8,57%
Valor de la Obra	$ 7.068.453	$ 251.939.861


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-2,54%
Durante el periodo	5,56%	3,33%	
Acumulado actual	11,11%	8,57%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES

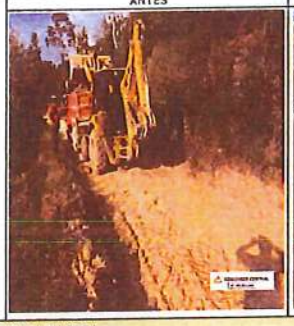

DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
2 Controladora de trafico	
3 Operadores	
5 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
1 retroexcavadora
5 Volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Transporte de material de cantera
2 Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento.
3 Sacando fallo en la via, cargue de material contaminado.
4 Sellado con vibro compactador
5 En el transcurso del dia se instalo 174m3, 29 viajes de recebo.
6 Conformacion y compactado de material 1,000 m los cuales 700 m son de avance y 300 m ya intervenidos se saca fallos y se carga material contaminado
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se sacan fallos con retroexcavadora, y cargue de material contaminado.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____
CARLOS ANDRES CIVICARROS

DIRECTORA DE OBRA _____
CATALINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	Clima	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	24/10/2022		
Semana Número:	9 Del: 24-oct Al: 29-oct	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	51 días
Nombre del Inspector:	Wilton Geovanny Cuesta Aguilar		

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%	Obra Física Ejecutada (%)	2,38%	7,62%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 270.957.365	Valor de la Obra	$ 5.048.895	$ 256.988.756

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-3,49%
Durante el periodo	5,56%	2,38%	
Acumulado actual	11,11%	7,62%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES

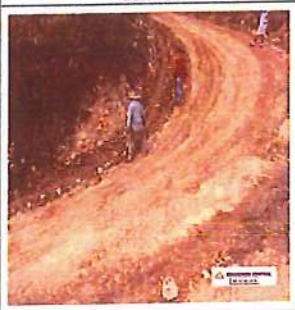

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
2 Controladora de trafico	
2 Operadores	
5 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrecompactador
5 Volquetas
1 retroexcavadora

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Transporte de material de cantera
2. Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o mejoramiento.
3. Sellado con vibro compactador
4. En el transcurso del dia se instalo 300 m3, 50 viajes de recebo
5. Conformacion y compactado de material 500 m
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1. Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2. compactar tramo conformado
3. continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4.
5.


REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES

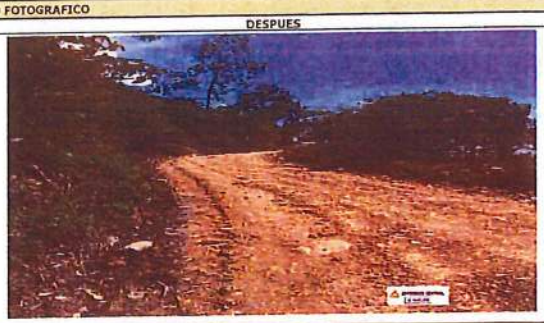

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBSERVACIONES

Material de cantera, recebo esta llegando granular grueso

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES [illegible]

DIRECTORA DE OBRA _____ CAROLINA RESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	24/10/2022		

Semana Número: 9 Del: 24-oct Al: 29-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 52 días

Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar


AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,56%	11,11%
Valor de la Obra	$ 11.780.755	$ 282.738.120

	DIARIO	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,95%	6,19%
Valor de la Obra	$ 2.019.558	$ 259.008.314

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-1,92%
Durante el periodo	5,56%	0,95%	
Acumulado actual	11,11%	6,19%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES



PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
2 Controladora de trafico	
2 Operadores	
5 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 vibrocompactador
5 Volquetas
1 retroexcavadora

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Transporte de material de cantera
2 Conformacion de rasante y extendido de material, recebo o meloramiento.
3 Sellado con vibro compactador
4 En el transcurso del dia se instalo 186 m3, 31 viajes de recebo
5 Conformacion y compactado de material 500 m y se reconformo 100 m, metros ya intervenidos
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1 Dar avance en actividades de limpieza y conformacion de cunetas, conformar rasante con material granular tipo recebo
2 compactar tramo conformado
3 continuar con actividades de corte y transporte de recebo
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBSERVACIONES

Material de cantera, recebo esta llegando granular grueso, un tramo se encuentra muy critico por motivo de obras de tuberia, donde se requiere de mas material.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES CHAPARRO

DIRECTORA DE OBRA

CATALINA ESTREPO OSSA

CONSORCIO CENTRAL	Formato	Ejecución de Proyectos
	BITACORA	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CENTRAL	**Objeto**	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÍAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS D=36" EN LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: ZONAS CENTRO Y SUR
Contrato No.	1181 DE 2022		
Valor Contrato:	$ 2.160.234.436,00		
Valor tramo:	$ 212.053.590,00		
Plazo Inicial:	90	**Clima**	
Plazo Actualizado:	90	seco	Desde 6:00 a. m. Hasta 4:30pm lluvia hasta las 6:00 pm
Fecha de Inicio:	1/09/2022		
Fecha denicio tramo:	24/10/2022		

Semana Número: 9 Del: 24-oct Al: 29-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 días


Nombre del Inspector: Wilton Geovanny Cuesta Aguilar

AVANCE DEL CONTRATO

	DIARIO	ACUMULADO		DIARIO	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	5,56%	Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	5,24%
Valor de la Obra		$ 282.738.120	Valor de la Obra		$ 259.008.314

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,56%	5,24%	-0,32%
Durante el período	0,00%	0,00%	
Acumulado actual	5,56%	5,24%	




REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



DESPUES

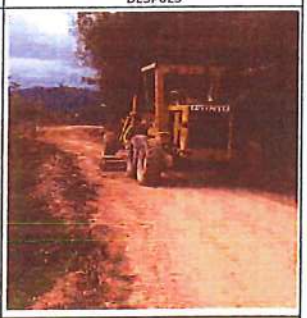

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1 Inspector.	
2 Controladora de trafico	
1 Operadores	
5 Conductores de volqueta	

EQUIPO DE OBRA

1 Motoniveladora
1 retroexcavadora
5 Volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

1 Sacando fallos, arreglo y conformacion
2 Se termina la intervencion de las actividades en la via Ruta 45- Paraiso - Acevedo seaún las especificaciones dadas por el contratante.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ACTIVIDADES A PROGRAMADAS

1
2
3
4
5

REGISTRO FOTOGRAFICO

1

ANTES



DESPUES



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OBSERVACIONES

Se conforman dos de fallos, que salieron durante el desarrollo de las actividades y se finaliza mantenimiento de via.

FIRMAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA _____ CARLOS ANDRES CHAVARRO

DIRECTORA DE OBRA _____ CATALINA ARISTIZABAL OSSA
