1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Tipo de Contrato: OBRA	X	INTERVENTORÍA	
Informe Número: 1		Periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2022 hasta el 17 de diciembre de 2022	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4152.010.26.1.690.2022	
Nombre Completo del Contratista: CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CIA LTDA	
Documento de identificación del contratista: 900.065.196-9	
Nombre (s) del Supervisor (es): María del Mar Solanilla Arango	
Organismo: Secretaría de Movilidad	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 30%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 30%
Objeto del contrato: "Adquisición e instalación de señales verticales y demarcación en las vías de las comunas 3, 16, 17, 18 y 54 del Distrito de Santiago de Cali."	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
31/octubre/2022	31/diciembre/2022
Modificación del contrato :Modificación N°1 mediante la cual MODIFICAR: El plazo del contrato No. 4152.010.26.1.690.2022 en la plataforma electrónica secop II y en el complemento al contrato así: CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022 , contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ejecución de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones y se MODIFICA las fechas de las garantías de cumplimiento y responsabilidad Civil extracontractual conforme a este modificatorio de las pólizas Nos. CBC-100039295 / CBC-100006323 de Seguros Mundial.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada:

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de TRESCIENTOS DOS MIILLONES NOVECIENTOS OCHENTA UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 302.981.939),

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$302.981.939	$122.186.679	$0	$180.795.260

PERSONA JURÍDICA: ALIADOS DE COLOMBIA SAS con NIT 900.354.406-0

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 1 de diciembre de 2022, firmada por CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES representante legal y MARIA MERCEDES VILLADA JAIME Contador Público de CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CIA LTDA.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de pago:

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

1. El contratista asistió a los comités técnicos citados por la Secretaría de Movilidad, consignados en las actas de reunión de mesas de trabajo número 17, 16, 18 y Buitrera en las actas No. 4173.418.3.62.39.
2. Realizó la visita técnica con el personal de la Secretaría de Movilidad para reconocer y localizar los puntos de intervención.
3. Entrego el Plan de Calidad exigido por el Organismo como parte de los compromisos contractuales.
4. Entregó el cronograma estimado de obra como parte integral del contrato. Además, el contratista presentó un plan de trabajo y su respectivo cronograma de ejecución (EDT – estructura de desglose de trabajo) en el que se incluyó los recursos, las actividades a desarrollar, los horarios y tiempos asignados por actividad y las asignaciones temporales y/o semanales para revisión e inspección de la obra.
5. Designó y contrató el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los cuales están protegidos por el Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera acreditó el pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
6. El contratista presentó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) asociado a las obras, el cual fue aprobado por la Secretaría de Movilidad y posteriormente implementado por el contratista.
7. Elaboró, suscribió y presentó bajo su responsabilidad, las respectivas actas parciales de obra (informes semanales No 1, 2, 3, 4 y 5), con registro fotográfico se estableció el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso de la obra.
8. El contratista por medio del personal contratado para el desarrollo de actividades de socialización realizó una reunión de presentación del equipo técnico ante el equipo de Participación Ciudadana

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

y el equipo de la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, con el fin de presentar el programa de información y divulgación de la comunidad del área de influencia directa e indirecta del proyecto, además del cronogramas de ejecución del proyecto; En compañía del área de Participación Social de la Secretaría de Movilidad, se presentó el proyecto y el cronograma de ejecución al Comité de Planificación de la respectiva comuna y corregimiento, en este espacio se tomó los soportes como la convocatoria, acta de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico; realizó jornadas de divulgación e información puerta a puerta del proyecto, con él apoyó del área Participación ciudadana de la Secretaría de Movilidad en los tramos y/o cuadras donde se vaya a intervenir con el debido registro fotográfico de las jornadas. Además, realizó la elaboración de piezas publicitarias para tener en cuenta en la socialización de obras.

9. Atendió las recomendaciones que la entidad le hizo con el fin de lograr una adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones.
10. Abrió un libro (bitácora de obra) desde el día que se inició las actividades de obra, en el ha venido consignando todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones e instrucciones que el supervisor de la obra consideró necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones.
11. Inició con la fabricación del Lote 1 y 2 de señales verticales.
12. Suministró, transportó e instaló todos los materiales requeridos para la ejecución del item de construcción de reductores, los cuales fueron nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones, cuando éstas se especifiquen.

13. Inició de actividades de construcción de reductores de velocidad Construcción de resalto parabólico, elaborado en mezcla asfáltica densa en calienta (MD-19) en las siguientes ubicaciones, carrera 50 entre calle 42ª y diagonal 60 (2) .
14. Continuó con las actividades de implementación de reductores de velocidad en mezcla asfáltica en los ID 3106(1un),3111(2UN),3115(1UN) 3119(2UN),3120(2UN),3145(2UN) Y 3126(2UN).
15. Realizó la instalación de señales verticales en las siguientes ubicaciones en la carrera 4 con calle 73, carrera 53 entre calle 11 y calle 11a.
16. Realizó la implementación de señalización horizontal en M2 en las siguientes ubicaciones carrera 4 con calle 73, carrera 53 entre calle 11ª y calle 11, calle 3 con carrera 12, calle 19 con carrera 2, carrera 13 entre calle 2 y calle 2a.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas por el contratista para este periodo, de acuerdo con las disposiciones contractuales:

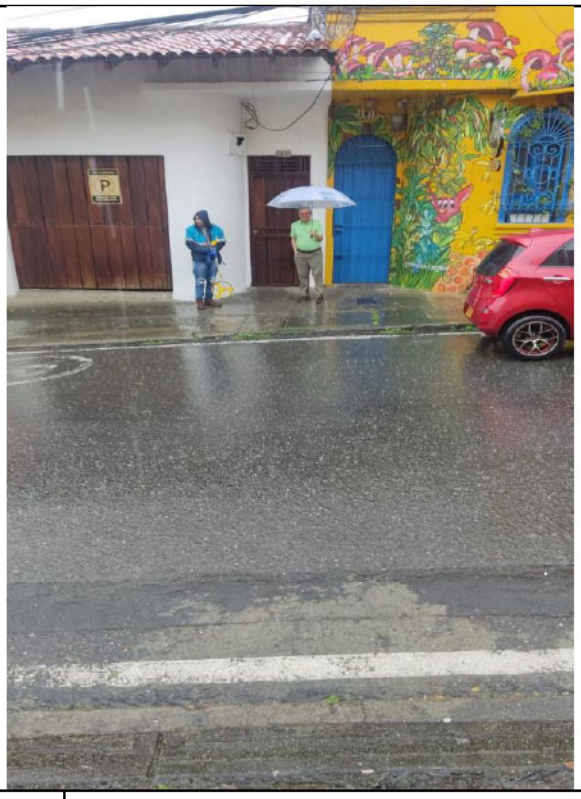
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
		Contratar la instalacion de cicloparquaderos en Santiago de Cali		
		1. PRELIMINARES		
1	1.1	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto	UND.	10
3	1.3	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SR-01)	UND.	30
4		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SR-28)	UND.	
5		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SR-30 (30KPH))	UND.	18
7		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto	UND.	10

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	10		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 75 cm, con plaqueta (alto mínimo de 37,7 cm), Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 2000 psi (SR 17P)	UND.	12
	12		Construcción de dispositivos de reducción de velocidad tipo resalto parabólico, elaborado en mezcla asfáltica densa en caliente (MD-19) colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en la norma para ensayos (ASTM C295, INV E-218-07, INV E-238-07, INV E-224-07, INV E-749-07, INV E-220-07, AASHTO T-304, el elemento tendrá las dimensiones y profundidad contenidas en el manual de señalización vial 2015, Pintado según NTC 1360-1. Dimensiones 90% del ancho del carril aproximadamente 7 metros, pendiente longitudinal al 2%, un ancho	UND	12
	13		Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente para tráfico para marcas viales - cumplimiento normas NTC 1360-1, 4744 y resolución 1885 de 2015.	M2	420
	18		Construcción de resalto parabólico, elaborado en mezcla asfáltica densa en caliente (MD-19) colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en la norma para ensayos (ASTM C295, INV E-218-07, INV E-238-07, INV E-224-07, INV E-749-07, INV E-220-07, AASHTO T-304), el elemento tendrá las dimensiones y profundidad contenidas en el Manual de Señalización Vial, 2015, pintado según NTC-1360-1. Dimensiones 90% del ancho del carril aproximadamente 7 metros, pendiente longitudinal al 2%, un largo de 3.7 metros con pendiente transversal de 3.5%, altura máxima de 0.10 metros. Incluye predemarcado en pintura acrílica de franjas amarillas en proceso constructivo de 0.5 m de ancho y 7 m de largo en ambos costados longitudinales del elemento y demarcación final del elemento en pintura plástico en	UND	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


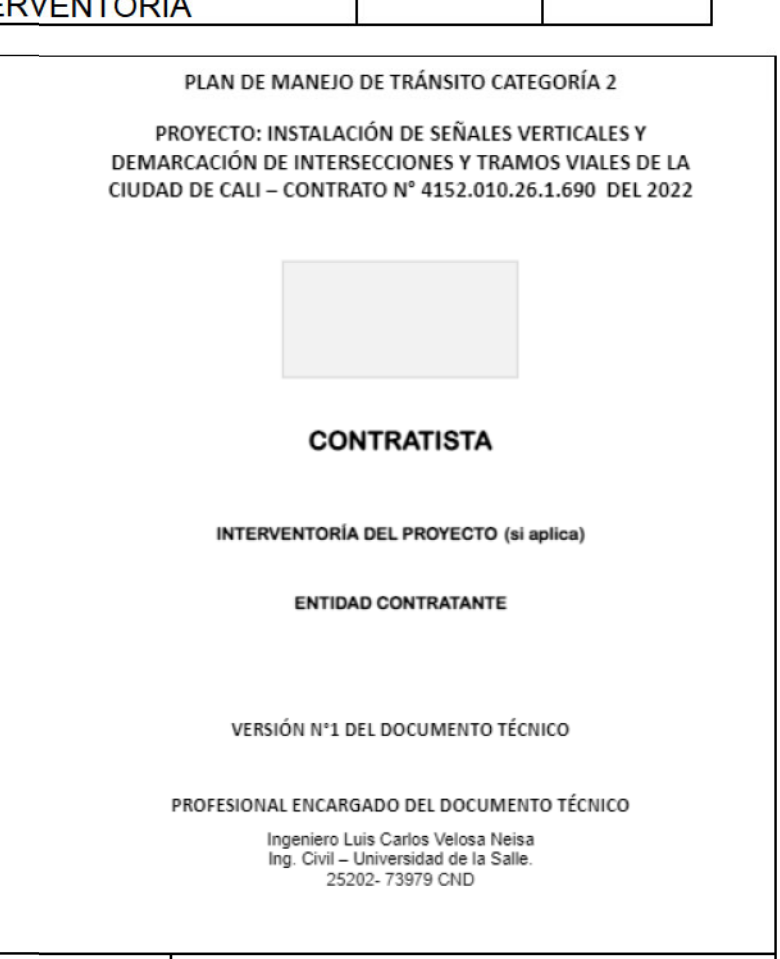
<table>
<tr>
<td>  </td>
<td> 
Santiago de Cali 17 de noviembre del 2022

Señores
Secretaría de Movilidad del Distrito
William Mauricio Vallejo Caicedo
Santiago de Cali
La ciudad

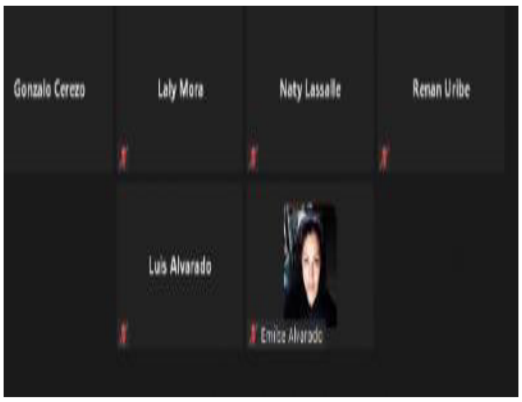
Referencia CONTRATO N° 4152.010.26.1.690 DEL 2022

Descripción del proyecto
El presente proyecto tiene por objeto el suministro, mantenimiento, construcción y reconstrucción, de elementos constitutivos de la señalización vial vertical, horizontal, elevada y las obras menores que se requieren en el Distrito de Santiago de Cali en las Comunas 1, 16, 17, 18 y en el Corregimiento la Buitrera, dentro de los proyectos "Realizar suministro, instalación, de señales verticales y demarcación en las vías de la comuna 1 de Cali" BP-26008114; -"Realizar suministro, instalación, de señales verticales y demarcación en las vías de la comuna 16 de Cali" BP 26008108; "Realizar suministro, instalación, de señales verticales y demarcación en las vías de la comuna 17 de Cali" BP-26008171; -"Realizar suministro, instalación, de señales verticales y demarcación en las vías de la comuna 18 de Cali" BP-26009088; -"Realizar suministro, instalación, de señales verticales y demarcación en las vías de la Buitrera de Santiago de Cali" BP-26008497. Cuya ubicación se encuentra delimitada por el perímetro del Distrito Santiago de Cali. Consistente en la intervención de lugares propuestos por la comunidad mediante el ejercicio participativo del situado fiscal (POAI 2022) en el cual la comunidad priorizo necesidades según las tipologías más comunes de intervención y las cuales se ejecutarán según los recursos dispuestos por la alcaldía.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Foto No. 1</td>
<td>Descripción: Recorrido de ubicación de reductores a construir.</td>
<td>Foto No. 2</td>
<td>Descripción: Plan de divulgaciòn.</td>
</tr>
</table>

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	Foto No. 3	Descripción: Entrega del Plan de Calidad.		Foto No. 4	Descripción: Entrega del Plan de Manejo de Tránsito.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 5	Descripción: Reunión con el equipo de participación ciudadana para coordinación de actividades de socialización.	Foto No. 6	Descripción: Fabricación de ángulos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

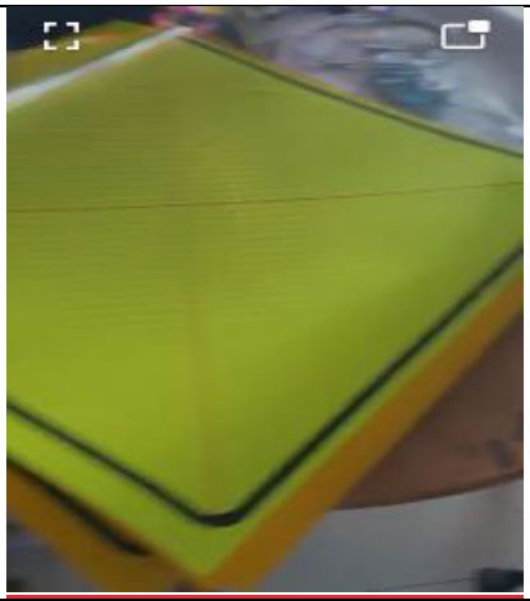


Figura 12. Volante de divulgación.



Fuente. Elaboración propia.

Foto No. 7	Descripción: Fabricación de tableros de señales verticales.	Foto No. 8	Volantes para socialización con la comunidad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 9	Descripción: Fabricación de tableros de señales verticales.	Foto No. 10	Descripción: Despacho de pedestales a la ciudad de Cali desde Bogotá.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Foto No. 11	Descripción: Preparación de mezcla asfáltica para instalación de reductores de velocidad



Foto No. 12	Descripción: Instalación de señales verticales SP-25 de proximidad a la ubicación de reductores.





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Foto No. 13	Descripción: Preparación de tramo vial para realizar la demarcación vial.	Foto No. 14	Descripción: Compactación de mezcla asfáltica para la elaboración de reductores de velocidad.
			
Foto No. 15	Descripción: Demarcación de tramo vial comuna 18.	Foto No. 16	Descripción: Construcción de dispositivo de control de tránsito tipo reductor.

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Hace parte integral de este informe los INFORMES SEMANALES DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA CON CORTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ESTA SUPERVISIÓN.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

MARÍA DEL MAR SOLANILLA ARANGO
Nombre y firma del Supervisor

Iván Darío López Pérez - Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 17 de diciembre de 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA

OBRAS DE CONTRUCCION Y URBANISMO

NIT. 900,065,196-8
CARRERA 17 89-31 OF 601
TELS 9260705

CEL. 3206869505
BOGOTA-COLOMBIA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE IVA
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4220
Resolución DIAN No 18764041461180 de 16 dic. 2022 - Prefijo FCCA Numerada Desde 19 al 1000 Autorizada.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FCCA 19

SEÑORES	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORT, CUL, TUR, EMPR Y
NIT	890,399,011 - 3
TELEFONO	(602) 6531063
DIRECCION	AV 2 NORTE 10-70
CIUDAD	Cali
OBRA	CONTRATO No 4152.010.26.1.690.2022

FECHA			**VENCIMIENTO**		
16	12	2022	15	01	2023

FORMA DE PAGO
Credito

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SP-25)	10.00	374,302.00	3,743,020.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SR-01)	30.00	374,302.00	11,229,060.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SR-30 (30KPH))	18.00	374,302.00	6,737,436.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (DUPLEX) (SP-47A/SR-30(30KPH))	10.00	631,586.00	6,315,860.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria o informativa de 75 cm, con plaqueta (alto mínimo de 37,7 cm), Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16,	12.00	442,615.00	5,311,380.00

CIENTO VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS . M/CTE - . -

SUBTOTAL	121,453,266.00
Amortizacion Ant.	0.00
I.V.A Sobre Utilidad	733,413.00
TOTAL	122,186,679.00

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FIRMA ELECTRONICA: zJPjg8lIBs/0tS5pU3FSVWUbG6WrW2zLMBhNZDWi6ApW2ygPD0901eY3PY+BL6pHt3l8rLTnm
OlC/jZ3Y+v9jR0Ik6OqUj1INxFpBXYvVad3cugWrZIMBGp5bkRfyUr6o/2clBSeLUvO9NuSAs3iB
Dd1OKsiXTVzfwk8OwR0qkUhHQIKsNrU0u0D9Nxsx9STHPP+BU3lSHiWOhMFu/UhZz9UaVRM
Zpku9+VK7Var7iTpZXL06dtxRzdvvdKn39267lmzQiAIbqVsSS0AUXhhizv6YGLqLVbKC1qo8gS6

Hora y Fecha Vlidacion DIAN
16/12/2022 6:34:57 p. m.

CUFE: d879c362ae0b3eeee5722b106c2c388e9268247a9dd9c904e55ba5bb9052e6ca985eb5d3070e0ed5a7ee50807d43c416

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
- -

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA

OBRAS DE CONTRUCCION Y URBANISMO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE IVA
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4220
Resolución DIAN No 18764041461180 de 16 dic. 2022 - Prefijo FCCA Numerada
Desde 19 al 1000 Autorizada.

NIT. 900,065,196-8
CARRERA 17 89-31 OF 601
TELS 9260705

CEL. 3206869505
BOGOTA-COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FCCA 19

SEÑORES	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORT, CUL, TUR, EMPR Y		
NIT	890,399,011 - 3		
TELEFONO	(602) 6531063	**DIRECCION**	AV 2 NORTE 10-70
CIUDAD	Cali	**OBRA**	CONTRATO No 4152.010.26.1.690.2022

FECHA			**VENCIMIENTO**		
16	12	2022	15	01	2023

FORMA DE PAGO
Credito

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SP-47B)			
Construcción de dispositivos de reducción de velocidad tipo resalto parabólico, elaborado en mezcla asfáltica densa en caliente (MD-19) colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en la norma para ensayos (ASTM C295, INV E-218-07, INV E-238-07, INV E-224-07, INV E-749-07, INV E-220-07, AASHTO T-304, el elemento tendrá las dimensiones y profundidad contenidas en el manual de señalización vial 2015, Pintado según NTC 1360-1. Dimensiones 90% del ancho del carril aproximadamente 7 metros, pendiente longitudinal al 2%, un ancho 3,7 metros con pendiente transversal de 3.5%, altura máxima 0.10 metros	12.00	3,021,023.00	36,252,276.00
Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente para tráfico para marcas viales - cumplimiento normas NTC 1360-1, 4744 y resolución 1885 de 2015.	420.00	36,263.00	15,230,460.00
Construcción de resalto parabólico, elaborado en mezcla asfáltica densa en calienta (MD-19) colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en la norma para ensayos (ASTM C295, INV E-218-07, INV E-238-07, INV E-224-07, INV E-749-07, INV E-220-07, AASHTO T-304), el elemento tendrá las dimensiones y profundidad contenidas en el Manual de Señalización Vial, 2015, pintado según NTC-1360-1. Dimensiones 90% del ancho del carril aproximadamente 7 metros, pendiente longitudinal al 2%, un largo de 3.7 metros con pendiente transversal de 3.5%, altura máxima de 0.10 metros. Incluye predemarcado en pintura acrílica de franjas amarillas en proceso constructivo de 0.5 m de ancho y 7 m de largo en ambos costados longitudinales del elemento	2.00	3,525,096.00	7,050,192.00

CIENTO VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS . M/CTE - . -

SUBTOTAL	121,453,266.00
Amortizacion Ant.	0.00
I.V.A Sobre Utilidad	733,413.00
TOTAL	122,186,679.00

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FIRMA ELECTRONICA:

zJPjg8lIBs/0tS5pU3FSVWUbG6WrW2zLMBhNZDWi6ApW2ygPD0901eY3PY+BL6pHt3l8rLTnm
OlC/jZ3Y+v9jR0Ik6OqUj1INxFpBXYvVad3cugWrZIMBGp5bkRfyUr6o/2clBSeLUvO9NuSAs3iB
Dd1OKsiXTVzfwk8OwR0qkUhHQIKsNrU0u0D9Nxsx9STHPP+BU3lSHiWOhMFu/UhZz9UaVRM
Zpku9+VK7Var7iTpZXL06dtxRzdvvdKn39267lmzQiAIbqVsSS0AUXhhizv6YGLqLVbKC1qo8gS6

Hora y Fecha Vlidacion DIAN
16/12/2022 6:34:57 p. m.

CUFE:

d879c362ae0b3eeee5722b106c2c388e9268247a9dd9c904e55ba5bb9052e6ca985eb5d3070e0ed5a7ee50807d43c416

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
- -

IMPRESO POR: MaGister Software LTDA NIT: 900.284.185-7 PBX:7444175

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA

OBRAS DE CONTRUCCION Y URBANISMO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE IVA
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4220
Resolución DIAN No 18764041461180 de 16 dic. 2022 - Prefijo FCCA Numerada Desde 19 al 1000 Autorizada.

NIT. 900,065,196-8
CARRERA 17 89-31 OF 601
TELS 9260705

CEL. 3206869505
BOGOTA-COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FCCA 19

SEÑORES	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORT, CUL, TUR, EMPR Y
NIT	890,399,011 - 3
TELEFONO	(602) 6531063
DIRECCION	AV 2 NORTE 10-70
CIUDAD	Cali
OBRA	CONTRATO No 4152.010.26.1.690.2022

FECHA			VENCIMIENTO		
16	12	2022	15	01	2023

FORMA DE PAGO
Credito

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
y demarcación final del elemento en pintura plástico en frio de larga duración tanto del elemento como líneas de canalización de carriles de 6 metros.			
ADMINISTRACION	1.00	22,048,724.00	22,048,724.00
IMPREVISTOS	1.00	3,674,787.00	3,674,787.00
UTILIDAD	1.00	3,860,071.00	3,860,071.00

CIENTO VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS . M/CTE - . -

SUBTOTAL	121,453,266.00
Amortizacion Ant.	0.00
I.V.A Sobre Utilidad	733,413.00
TOTAL	122,186,679.00

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FIRMA ELECTRONICA: zJPjg8llBs/0tS5pU3FSVWUbG6WrW2zLMBhNZDWi6ApW2ygPD0901eY3PY+BL6pHt3l8rLTnm
OlC/jZ3Y+v9jR0Ik6OqUj1INxFpBXYvVad3cugWrZIMBGp5bkRfyUr6o/2clBSeLUvO9NuSAs3iB
Dd1OKsiXTVzfwk8OwR0qkUhHQIKsNrU0u0D9Nxsx9STHPP+BU3lSHiWOhMFu/UhZz9UaVRM
Zpku9+VK7Var7iTpZXL06dtxRzdvvdKn39267lmzQiAIbqVsSS0AUXhhizv6YGLqLVbKC1qo8gS6

Hora y Fecha Vlidacion DIAN
16/12/2022 6:34:57 p. m.

CUFE: d879c362ae0b3eeee5722b106c2c388e9268247a9dd9c904e55ba5bb9052e6ca985eb5d3070e0ed5a7ee50807d43c416

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
- -

IMPRESO POR: MaGister Software LTDA NIT: 900.284.185-7 PBX:7444175

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS CIA LTDA
CARLOS CORDOBA AVILES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES identificado con CC 13.010.352 Y MARIA MERCEDES VILLADA JAIME TP 203506-T Representante legal y Contador Público de CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑÍA LIMITADA identificada con NIT 900.065.196-9, bajo la gravedad de juramento, certificamos que nos encontramos al día con el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar al instituto colombiano de bienestar familiar pagados por la compañía durante el término de la ejecución del con trato Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo Nacional de Formación Profesional para la industria de construcción, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada el día 16 de diciembre de 2022

Atentamente,

CARLOS CORDOBA AVILES
C.C. 13.010.352 de Ipiales
CCA Ingenieros Contratistas y Cia Ltda
Nit 900.065.196-9

MARIA MERCEDES VILLADA JAIME
Contador Público
TP 203.506-T

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS CIA LTDA
CARLOS CORDOBA AVILES
Edificio Gaia Carrera 17 No. 89-31 Oficina 602
Tel. (57-1) 926 0705 Cel: 320 686 9452 - 320 686 9505
gerencia@ccaingenieros.co
carloscordoba1312@hotmail.com
licitaciones@ccaingenieros.co
Bogotá D.C. - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

00A5F129C3D9ED4B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA MERCEDES VILLADA JAIME** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52911802 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 203506-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52911802

VILLADA JAIME
APELLIDOS

MARIA MERCEDES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1982
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-AGO-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500110-43085922-F-0052911802-20010221 18875 01040A 01 095323174

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

203506-T



MARIA MERCEDES
VILLADA JAIME
C.C. 52911802
RESOLUCION INSCRIPCION 347 **FECHA 30/06/2015**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 216633

205692

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13010352		CORDOBA AVILES CARLOS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 17 89 31 OF 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9260705	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	52578390	9443589917	I	2022/12/14	2022/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13010352	CORDOBA AVILES CARLOS FERNANDO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0	No	$290,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0		$290,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13010352		CORDOBA AVILES CARLOS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 17 89 31 OF 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9260705	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	52578390	9443589917	I	2022/12/14	2022/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900065196	9	CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCA LTDA	Carrera 89 No 17 - 81 Of 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9260705	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	47871291	9444110979	E	2022/12/23	2022/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,314,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CCA LTDA (4 Afiliados)																						$4,350,000	$696,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000		$186,100		$0	$0		$1,314,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																						$2,950,000	$472,000			$2,950,000	$118,000			$2,950,000	$118,000			$2,950,000		$15,500		$0	$0		$723,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$2,950,000	$472,000			$2,950,000	$118,000			$2,950,000	$118,000			$2,950,000		$15,500		$0	$0		$723,500
1	CC	1116862880	VEGA BETANCOURT CINDY NAIROBY																		230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS008	30	$1,750,000	$70,000	CCF22	30	$1,750,000	$70,000	14-7	30	$1,750,000	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,200
2	CC	1013663938	ZAPATA REYES SHIRLEY																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	0.522%	$6,300	30	$0	$0	Si	$294,300
Centro de Trabajo: CCA LTDA (2 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$2,450,000	$98,000			$2,450,000	$98,000			$2,450,000		$170,600		$0	$0		$590,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$2,450,000	$98,000			$2,450,000	$98,000			$2,450,000		$170,600		$0	$0		$590,600
3	CC	79104357	ROJAS JAIRO																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,050,000	$42,000	CCF22	30	$1,050,000	$42,000	14-7	30	$1,050,000	6.960%	$73,100	30	$0	$0	Si	$157,100
4	CC	79593397	VELOSA NEISA LUIS CARLOS																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
Total			**Afiliados(4)**																				$4,350,000	$696,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000		$186,100		$0	$0		$1,314,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900065196	9	CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCA LTDA	Carrera 89 No 17 - 81 Of 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9260705	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	47871291	9444110979	E	2022/12/23	2022/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,314,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$696,000	$0	$0	$696,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$696,000	$0	$0	$696,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$186,100	$0	$0	$186,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	4	$186,100	$0	$0	$186,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$216,000	$0	$0	$216,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$216,000	$0	$0	$216,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$216,000	$0	$0	$216,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$126,000	$0	$0	$126,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$42,000	$0	$0	$42,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$48,000	$0	$0	$48,000
TOTAL				4	$1,314,100	$0	$0	$1,314,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900798782	0	SERNA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBREROS	CALLE 18 56 114	CALI-VALLE	3884011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1786538445	9443169315	E	2022/11/22	2022/12/01	BANCOLOMBIA	9	$1,987,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBREROS (8 Afiliados)																							$5,600,000	$896,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000		$464,700		$0	$0		$1,968,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (7 Afiliados)																							$4,600,000	$736,000			$6,600,000	$264,000			$6,600,000	$264,000			$6,600,000		$459,400		$0	$0		$1,723,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)																							$4,600,000	$736,000			$6,600,000	$264,000			$6,600,000	$264,000			$6,600,000		$459,400		$0	$0		$1,723,400
1	CC	1034281821	ARCHILA JHONNY	X																	230201	24	$800,000	$128,000	EPS005	24	$800,000	$32,000	CCF57	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	6.960%	$55,700	24	$0	$0	Si	$247,700
2	CC	9990876	CARDONA EDILBERTO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	16800940	RAMIREZ FERNANDO	X																	230201	24	$800,000	$128,000	EPS018	24	$800,000	$32,000	CCF57	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	6.960%	$55,700	24	$0	$0	Si	$247,700
4	CC	1144046013	SERNA ASDRUBAL																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
5	CC	16626917	SERNA ASDRUVAL																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$149,600
6	PT	5112186	URBINA JOSE																			0	$0	$0	EPS012	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$149,600
7	CC	1077172453	URREGO WILVER																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$245,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$245,300
8	CC	1130637857	SERNA DIANA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
Total			**Afiliados(8)**																				$5,600,000	$896,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000		$464,700		$0	$0		$1,968,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900798782	0	SERNA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBREROS	CALLE 18 56 114	CALI-VALLE	3884011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1786538445	9443169315	E	2022/11/22	2022/12/01	BANCOLOMBIA	9	$1,987,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$896,000	$8,300	$0	$904,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$1,500	$0	$161,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$480,000	$4,400	$0	$484,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$256,000	$2,400	$0	$258,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$464,700	$4,300	$0	$469,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$464,700	$4,300	$0	$469,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$304,000	$2,800	$0	$306,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$304,000	$2,800	$0	$306,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$304,000	$2,900	$0	$306,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$40,000	$400	$0	$40,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$400	$0	$40,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$72,000	$700	$0	$72,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$152,000	$1,400	$0	$153,400
TOTAL				8	$1,968,700	$18,300	$0	$1,987,000

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-08, 07:54:05 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 60000933

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 07/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGEVIAL PYM SAS				
Documento	NI900985618	**Dirección**	CR 1 #15 - 102 ENTRADA A VILLAMARIA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8774300		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS		
Representante Legal	OROZCO PUERTA FLOR MARIA	**Identificación**	CC24324719		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79459482	GOMEZ ARIZA REINALDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMPENSAR CCF	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 80006957	MORENO BUITRAGO JORGE EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMPENSAR CCF	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 80137796	MORENO BUITRAGO SERGIO DAVID	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMPENSAR CCF	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 80142648	PERDOMO PARRAGA EDGAR FABIAN	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMPENSAR CCF	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1012465961	TORRES TENJO JOSE ALEJANDRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMPENSAR CCF	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1032513299	GONZALEZ PATIÑO YONATHAN JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMPENSAR CCF	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1073677603	GALVIS GUERRERO MICHAEL JAIR	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	ARL SURA	$ 1.000.000	$ 69.600	COMPENSAR CCF	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
PT 1125151	GUAIMARE CANELON FERNANDO JOSE	01	00		X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 33.334	$ 5.400	SALUD TOTAL EPS	$ 33.334	$ 1.400	ARL SURA	$ 33.334	$ 2.400	COMPENSAR CCF	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 7.033.334	$ 7.033.334	$ 7.033.334	$ 7.033.334	$ 1.125.400	$ 0	$ 0	$ 281.400	$ 489.600	$ 281.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.177.800	$ 7.600	$ 2.185.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
