
Contrato N° 2723-2022	**Periodo del reporte:** Noviembre-diciembre de 2022	**Fecha:** Diciembre de 2022
Nombre del contratista: Jorge Mario Villamizar Meneses		**CC:** 1.094.240.370
Objeto del contrato: 2022W-125 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE LAS TIC DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		

Obligaciones del contrato	Actividades realizadas por el contratista
1. Gestionar, monitorear y evaluar los procesos, procedimientos y actividades que le sean asignados de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente	• Atención a todos los casos creados de la mesa de ayuda donde se atendieron casos tales como: configuración de puntos de acceso, adecuaciones de áreas de trabajo, solicitud de internet wifi, • Respuesta a los casos de la plataforma de Orfeo que me son asignados. • Se realizo visitas a las sedes de la alcaldía para hacer la verificación de las instalaciones de la fibra óptica y equipos que dan internet a cada una de estas sedes. • Se realizo visitas a las Bibliotecas y salas de lectura del municipio para hacer la verificación de las instalaciones de la fibra óptica y equipos que dan internet a cada una de estas sedes • Se realizo visitas a las nuevas zonas wifi de la alcaldía para hacer la verificación de las instalaciones de la fibra óptica y equipos que dan internet a cada una de estas zonas wifi.
2. Realizar seguimiento y velar por el correcto funcionamiento de los servidores, equipos de telecomunicación y activos de red de la alcaldía de San José de Cúcuta.	• Constante monitoreo a través de los servidores donde se encuentran los softwares para el monitoreo de las zonas WiFi y de las talanqueras. • Monitoreo de las cámaras en el momento que lo solicite el jefe inmediato.
3. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo.	• Siembra de árboles No 129 (Lo juro un voto un árbol) en el malecón frente al molinito.

Anexos:

1.

Mesa de ayuda

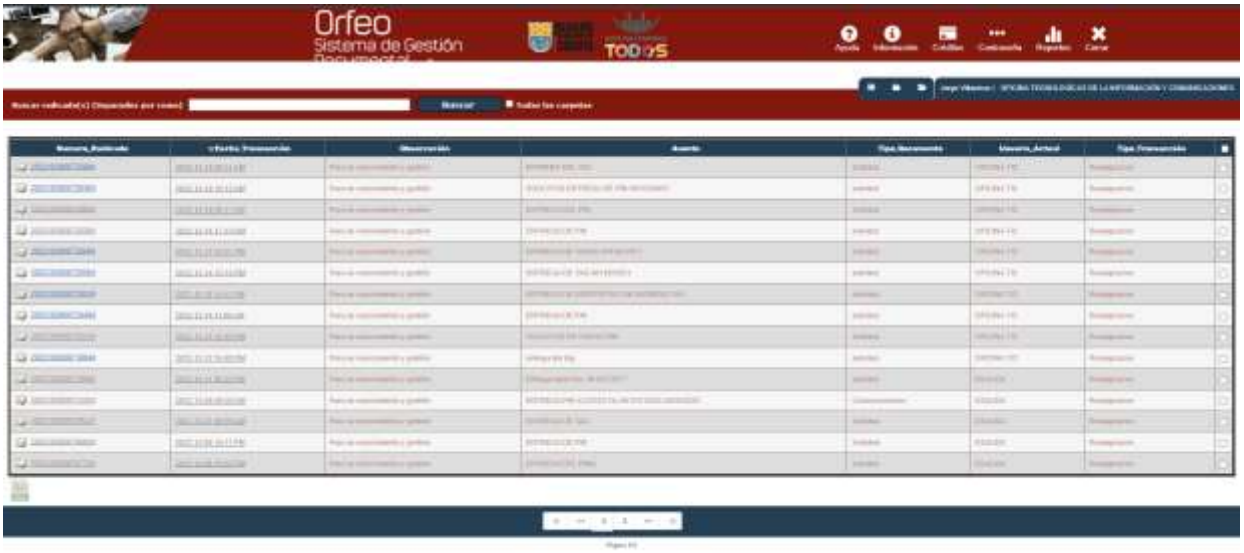



Visitas de verifiacion de instalacion de fibra optica y equipos de todas las sedes de la alcaldia, zonas wifi, bibliotecass y salas de lectura.



ACTA DE VISITA

1.

Fecha	14 DE DICIEMBRE DE 2022
Dependencia	BIENESTAR SOCIAL

Se realiza visita técnica con el fin de auditar la instalación realizada y pruebas de transmisión en cada una de las dependencias de la alcaldía bajo contrato No. 2300 de 2022 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA EL ACCESO A INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS Y LUDOTECAS URBANAS QUE PERTENEZCAN AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA."

ITEM	ELEMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Fibra Óptica	Si cumple con las especificaciones	X	
2	Switch	Si cumple con las especificaciones	X	
3	Transceiver/tipo SFP	Si cumple con las especificaciones	X	
4	Router	Si cumple con las especificaciones	X	
5	Gabinete de Comunicaciones tipo Rack de 9RU	• Gabinete si cumple con las especificaciones • Si cuenta con PDU de 8 salidas eléctricas • No cuenta con bandeja intermedia • No cuenta con 06 2 tomas corriente dobles tipo NEMA. • No cuenta con unidad de enfriamiento.		X
6	Acometida eléctrica	• La acometida eléctrica no cuenta con las especificaciones establecidas en el concepto técnico. • No cuenta con acometida eléctrica independiente con instalación de breaker 2 circuitos • El cable eléctrico que usaron es duplex # 14		X



		• La acometida eléctrica no fue instalada con tubería EMT. • No cuenta con polo a tierra.		
7	Item de Obra	• No se instala la acometida eléctrica de acuerdo a las especificaciones técnicas		X
8	UPS	• La UPS Si cumple con las especificaciones	X	

1.1. Evidencia fotográfica

Gabinete de 9 unidades de rack



3.

Fecha	14 DE DICIEMBRE DE 2022
Dependencia	SM CUMBUAMARCA

Se realiza visita técnica con el fin de auditar la instalación realizada y pruebas de transmisión en cada una de las dependencias de la Alcaldía bajo contrato No. 2300 de 2022 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA EL ACCESO A INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS Y LUDOTECAS URBANAS QUE PERTENEZCAN AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA."

ITEM	ELEMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Fibra Óptica	Si cumple con las especificaciones	X	
2	Switch	Si cumple con las especificaciones	X	
3	Transceiver/tipo SFP	Si cumple con las especificaciones	X	
4	Router	Si cumple con las especificaciones	X	
5	Gabinete de comunicaciones tipo Rack de 9RU	• Gabinete si cumple con las especificaciones • Si cuenta con PDU de 8 salidas eléctricas • No cuenta con bandeja intermedia • No cuenta con 06 2 tomas corriente dobles tipo NEMA. • No cuenta con unidad de enfriamiento.		X
6	Acometida eléctrica	• La acometida eléctrica no cuenta con las especificaciones establecidas en el concepto técnico. • No cuenta con acometida eléctrica independiente con instalación de breaker 2 circuitos • El cable eléctrico que usaron es duplex # 14		X



		• La acometida eléctrica no fue instalada con tubería EMT. • No cuenta con polo a tierra.		
7	Item de Obra	• No se instala la acometida eléctrica de acuerdo a las especificaciones técnicas		X
8	UPS	• La UPS Si cumple con las especificaciones	X	

1.1. Evidencia fotográfica

Gabinete de 9 unidades de rack

c.

Fecha	14 DE DICIEMBRE DE 2022
Dependencia	SM DOÑA NIDIA

Se realiza visita técnica con el fin de auditar la instalación realizada y pruebas de transmisión en cada una de las dependencias de la Alcaldía bajo contrato No. 1580 de 2022 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA EL ACCESO A INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS Y LUDOTECAS URBANAS QUE PERTENEZCAN AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA."

ITEM	ELEMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Fibra Óptica	Si cumple con las especificaciones	X	
2	Switch	Si cumple con las especificaciones	X	
3	Transceiver tipo SFP	Si cumple con las especificaciones	X	
4	Router	Si cumple con las especificaciones	X	
5	Gabinete de Comunicaciones tipo Rack de 9RU	• Gabinete si cumple con las especificaciones • Si cuenta con PDU de 8 salidas eléctricas • No cuenta con bandeja intermedia. • No cuenta con (2) tomas corriente dobles tipo NEMA. • No cuenta con unidad de enfriamiento.		X
6	Acometida eléctrica	• La acometida eléctrica no cuenta con las especificaciones establecidas en el concepto técnico. • No cuenta con acometida eléctrica independiente con instalación de breaker 2 circuitos • El cable eléctrico que usaron es dúplex # 14		X

		• La acometida eléctrica no fue instalada con tubería EMT. • No cuenta con polo a tierra.		
7	Item de Obra	• No se instala la acometida eléctrica de acuerdo a las especificaciones técnicas		X
8	UPS	• La UPS SI cumple con las especificaciones	X	

6.1. Evidencia fotográfica

Gabinete de 9 unidades de rack



b.

Fecha	14 DE DICIEMBRE DE 2022
Dependencia	CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Se realiza visita técnica con el fin de auditar la instalación realizada y pruebas de transmisión en cada una de las dependencias de la Alcaldía bajo contrato No. 1580 de 2022 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA EL ACCESO A INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS Y LUDOTECAS URBANAS QUE PERTENEZCAN AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA."

ITEM	ELEMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Fibra Óptica	Si cumple con las especificaciones	X	
2	Switch	Si cumple con las especificaciones	X	X
3	Transceiver tipo SFP	Si cumple con las especificaciones	X	
4	Router	No hay instalado		X
5	Gabinete de comunicaciones tipo rack de 9RU	• gabinete si cumple con las especificaciones • Si cuenta con PDU de 8 salidas eléctricas • No cuenta con bandeja intermedia. • No cuenta con (2) tomas corriente dobles tipo NEMA. • no cuenta con unidad de enfriamiento.		X
6	Acometida eléctrica	• La acometida eléctrica no cuenta con las especificaciones establecidas en el concepto técnico. • No cuenta con acometida eléctrica independiente con instalación de breaker 2 circuitos • El cable eléctrico que usaron es dúplex # 14		X


		• La acometida eléctrica no fue instalada con tubería EMT. • No cuenta con polo a tierra.		
7	Item de Obra	• No se instala la acometida eléctrica de acuerdo a las especificaciones técnicas		X
8	UPS	• No hay instalada UPS		X

6.1. Evidencia fotográfica


Gabinete de 9 unidades de rack



Monitores ZW y sedes

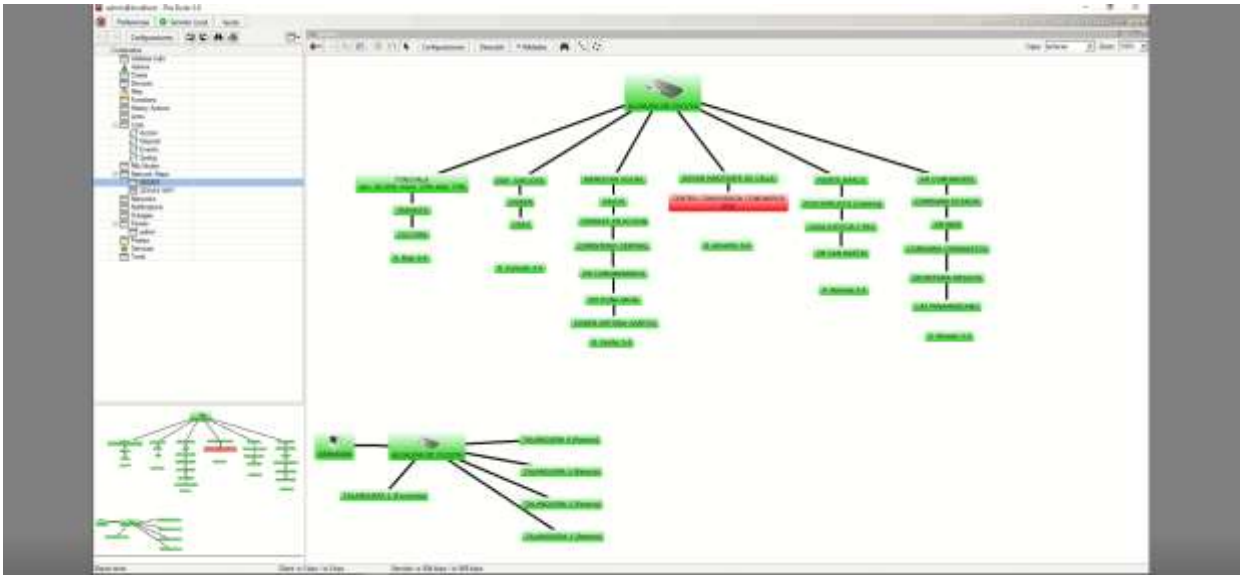

Monitoreo de lasTalanqueras

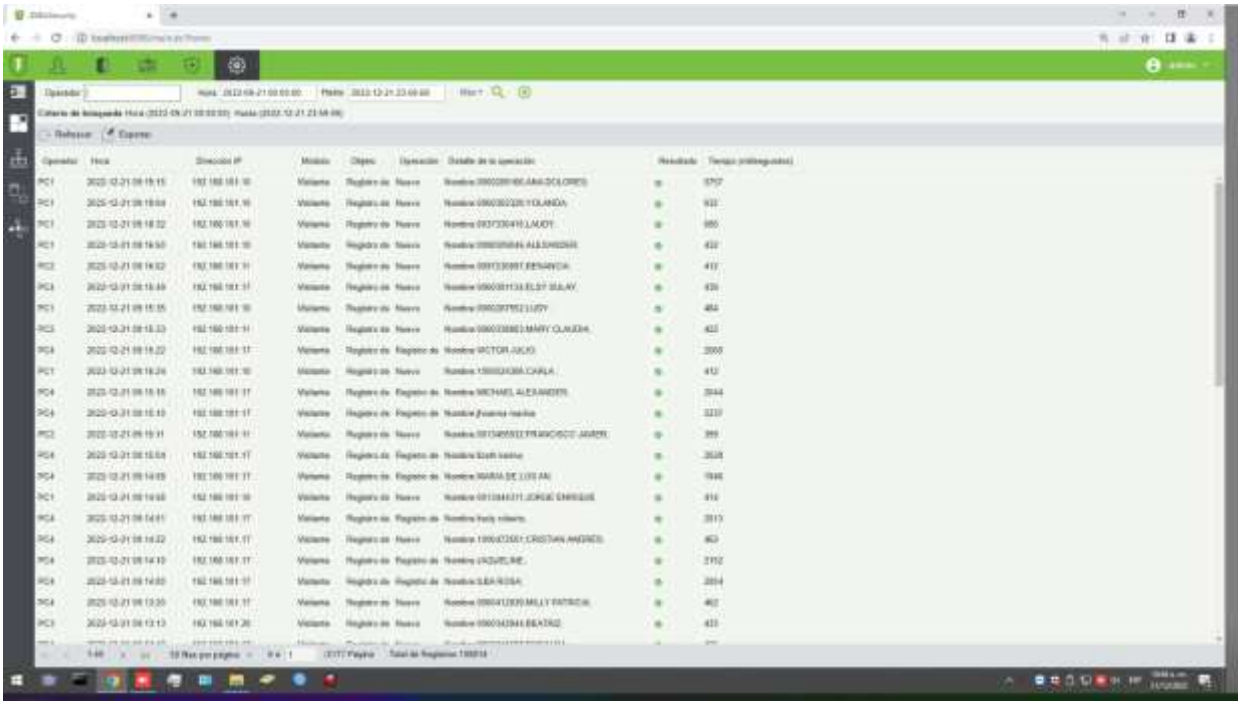

Siembra de árboles e Izada de bandera



Observaciones de Mejora:

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Jorge M. Villamizar.

Firma del Contratista
Jorge Mario Villamizar Meneses
1.094.240.370 de Pamplona

Firma del Supervisor
Mónica María Fonseca Vigoya
60.360.270

REVISO: Christian Saravia – Asesor T.I– OFICINA TIC
