INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
EMPRESA: EDIFICIO ENTRECEIBAS	
DIRECCIÓN: CALLE 8 # 1-16	
CONTACTO: YAMID FARID ESPINOSA OLAYA	CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EMAIL: gmstdesajvalle2@cendoj.ramajudicial.gov.co	CELULAR: 3173207533
FECHA DE ELABORACIO: 10/12/2022	RESPONSABLE: CRISTIAN RUIZ

Referencia: Informe Técnico sobre la evaluación del estado actual del sistema de video vigilancia, mantenimiento preventivo, soporte técnico del sistema de seguridad electrónica (CCTV).

EDIFICIO ENTRECEIBAS

- Se realiza mantenimiento preventivo al edificio entreciebas en el cual se intervienen las cámaras externas e internas y los equipos que componen el sistema de cctv realizando limpieza interna y externa de cada equipo, esto con el fin de conservar la vida útil de cada equipo y de esta manera garantizar un buen funcionamiento en el sistema de CCTV.

ACTIVIDADES REALIZADAS A CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Limpieza externa de las cámaras y protectores, utilizando insumos apropiados.
- Limpieza interna de lentes de las cámaras, con insumos apropiados.
- verificación del conexionado de las distintas cámaras ubicado en sala de monitoreo.
- Ajuste de tornillería a cada uno de los equipos
- Calibración, enfoque de cámaras.
- Mantenimiento preventivo a los equipos de almacenamiento, revisión de los discos, puesta en funcionamiento

- **REGISTRO FOTOGRAFICO CAMARAS**

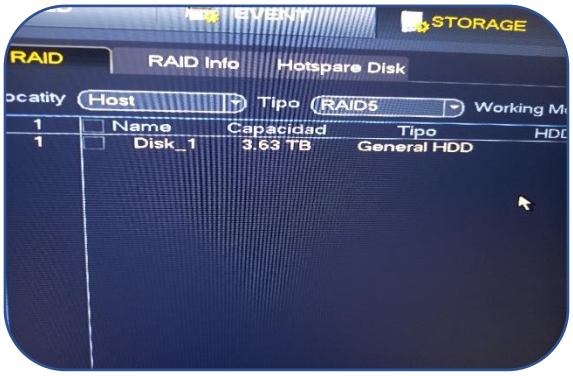
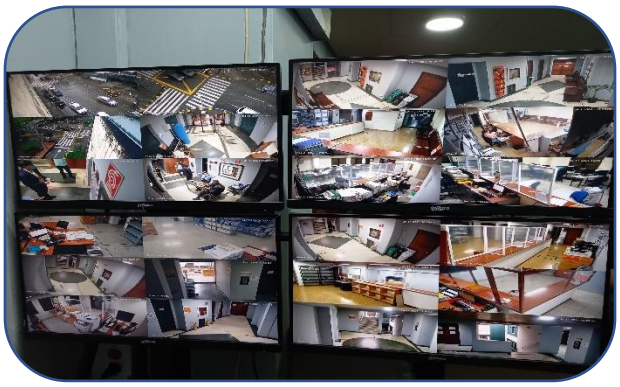




- **REGISTRO FOTOGRAFICO RACK DE EQUIPOS**



REGISTRO FOTOGRAFICO VISUAL Y GRABACION DE DVR

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

CONCLUSIONES FINALES
• **Se recomienda el constante mantenimiento del rack y de los equipos que se encuentran en el mismo ya que su ubicación genera que se acumule bastante polvo y esto puede ocasionar daños en los disipadores y ventiladores de las fuentes de poder de los equipos.** • **Se recomienda la adquisición de un disco duro de 8TB para prolongar la grabación del sistema ya que solo está quedando registro de 20 días aproximadamente, al momento de su mantenimiento de encuentra su estado de grabación correctamente y se encuentran eventos de grabación desde el día viernes 11 de noviembre hasta el día 1 de diciembre.** • **El sistema queda operando correctamente con un total de 24 cámaras en visual, se realiza la entrega al personal encargado.**

A&A INGENIERIA

Elaborado: CRISTIAN RUIZ

SOPORTE TECNICO

A&A Ingeniería S.A.S
