INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 05 al 10 de diciembre de 2022 - Semana 22

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
17	65,56%	16,39%	47,40%	0,00%
18	69,44%	17,36%	50,74%	0,00%
19	73,33%	18,32%	52,36%	0,00%
20	77,22%	19,29%	55,03%	0,00%
21	81,11%	20,26%	58,16%	0,00%
22	85,00%	45,58%	62,10%	0,00%
23				
24				

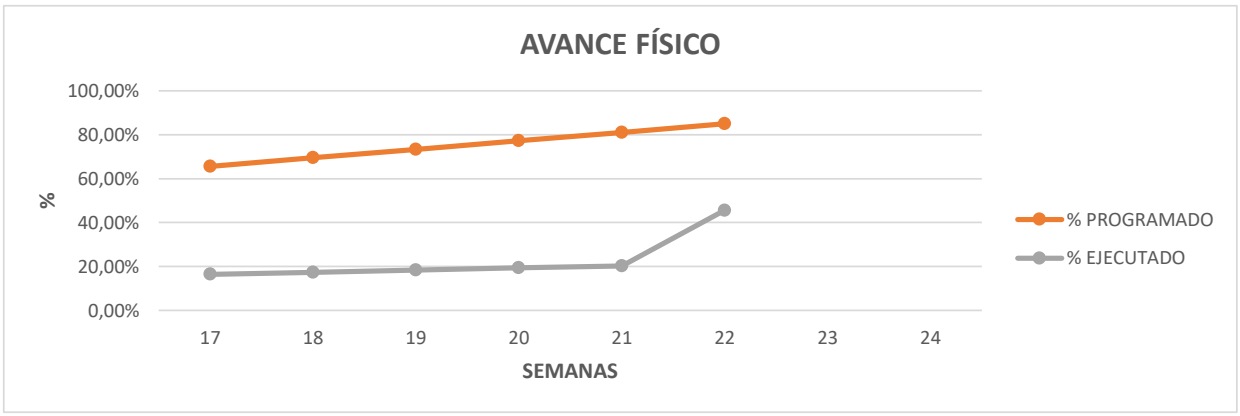

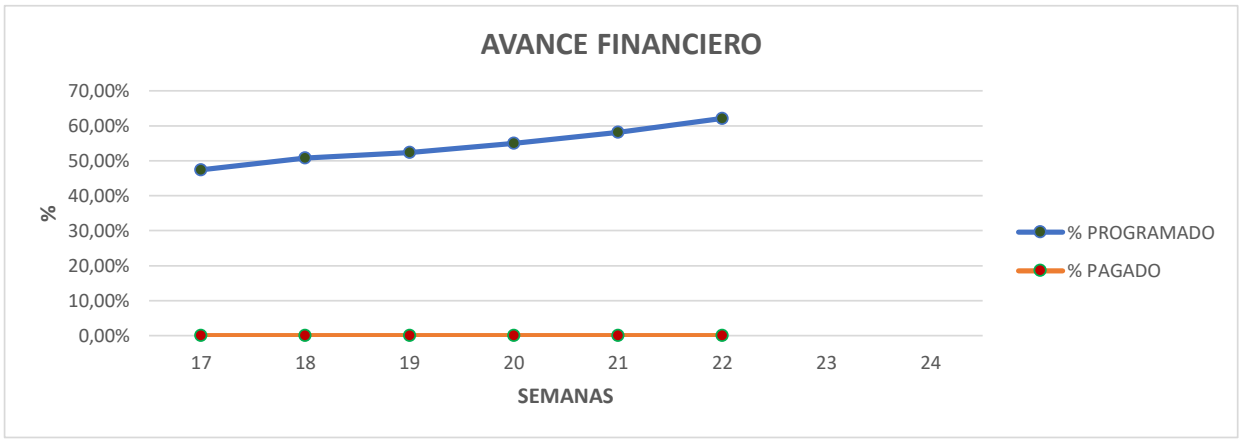

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:
Se realiza una reunión para poder aclarar temas respecto al atraso de la presentación final del balance financiero, ya que es de suma importancia presentarlo totalmente terminado para poder pasar la cuenta de las actividades ejecutadas a la supervisión del proyecto para su respectiva revisión.
En obra ya se encuentra la planta electrica y la Ups powest 15 KVA para continuar con su instalación.
3. ESTADO DEL TIEMPO :
El estado del tiempo en la categoria nublado tuvo un total de 23 horas, seco 19 horas y tiempo lluvioso 8 horas.
Las lluvias han disminuido considerablemente, pero han sido fuertes.
4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:
No se trabajo en obra.
5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:
No se trabajo en obra.
6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:
En la semana del 05 al 10 de diciembre no se realizo ninguna actividad en obra.
Se pide al contratista de obra contestar los llamados de atención que se les ha enviado y presentar documenación faltante.
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
