INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 12 al 17 de diciembre de 2022 - Semana 23

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
17	65,56%	16,39%	47,40%	0,00%
18	69,44%	17,36%	50,74%	0,00%
19	73,33%	18,32%	52,36%	0,00%
20	77,22%	19,29%	55,03%	0,00%
21	81,11%	20,26%	58,16%	0,00%
22	85,00%	45,58%	62,10%	0,00%
23	88,89%	46,55%	70,03%	0,00%
24				

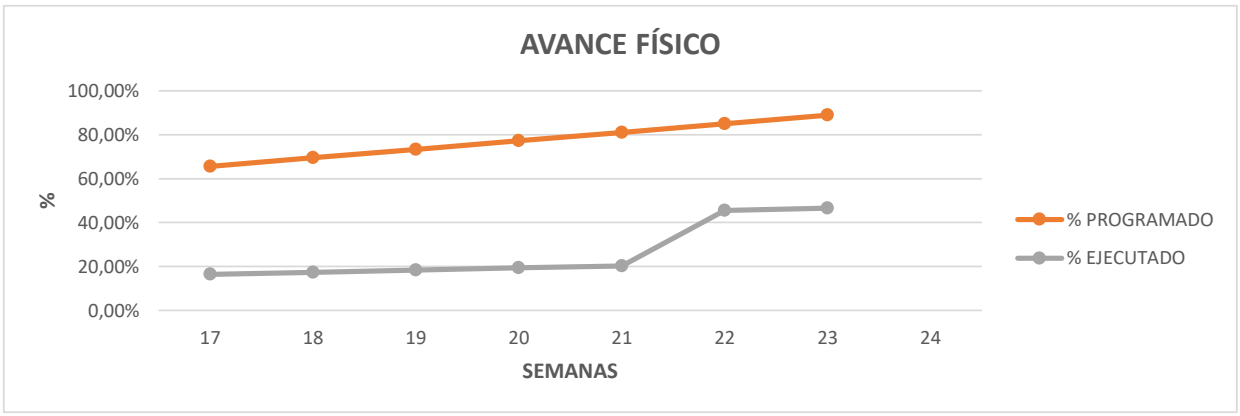

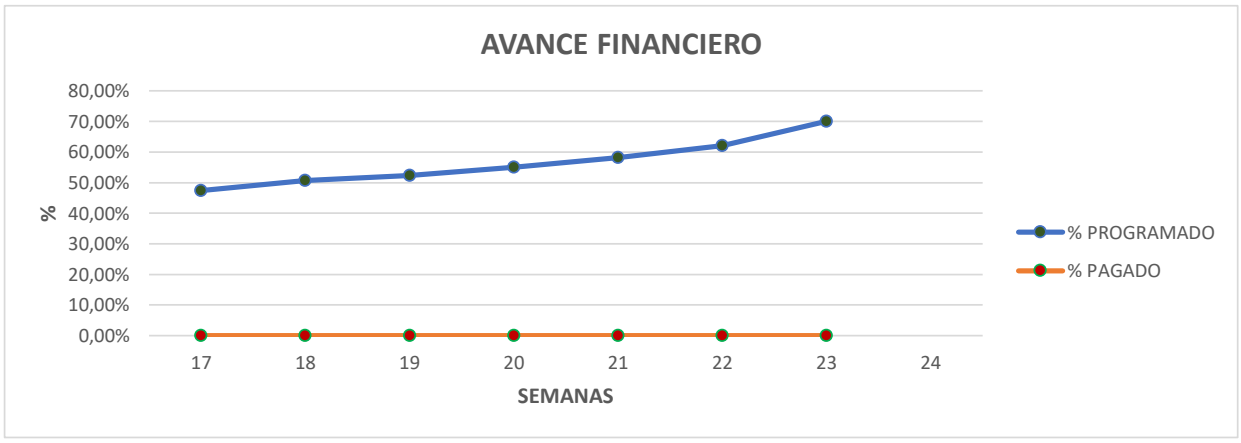

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:
Se trabajo en los documento requeridos para poder pasar la cuenta de obra a La Supervisión, con el fin de que sean revisados y aprobados, se presentarón las respuestas a las observaciones emitidas al oficio SI 1447-22 como tambien los documentos faltantes, los cuales se corregieron y se presentaron nuevamente a La Supervisión.
Por otro lado, se presento el balance financiero finalizado con los items de obra adicionales no contemplados, cada uno de ellos justificados con los precios del ICCU y los que no con los soportes de las tres cotizaciones.
3. ESTADO DEL TIEMPO :
El estado del tiempo en la categoria seco tuvo un total de 35 horas, nublado 14 horas y tiempo lluvioso 1 horas.
Las lluvias han disminuido en todo el mes de diciembre.
4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:
No se trabajo en obra.
5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:
No se trabajo en obra.
6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:
En la semana del 12 al 17 de diciembre no se realizo ninguna actividad en obra, se trabajo en temas administrativos.
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
