CONSORCIO HADES

CH-A-2022-24

Bogotá, 28 de noviembre de 2022

Señores,

CONSORCIO INT.GQQI
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Director de interventoría.
e-mail: ggg1@grupoquimbaya.com

Referencia: CONTRATO NÚMERO 1291 DE 2022 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP – PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LAS REGIÓN AMAZÓNICA"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar una prórroga del contrato 1291 de 2022, cuyo objeto se relaciona en la referencia, hasta el día 31 de marzo del 2023. Teniendo en cuenta que la fecha de inicio de este fue el 25 de octubre del 2022 y que se contempló un mes para la ejecución de estudios y diseños, se evidencia que el tiempo restante hasta la ficha final inicial, 31 de diciembre de 2022, no es suficiente para la ejecución de las obras requeridas.

Adicionalmente, es de tener en cuenta que para la realización de los estudios y diseños de los tramos a intervenir se requiere desplazamiento multimodal aéreo y fluvial, lo cual limita en cierta manera la programación de estos, ya que requieren horarios y días específicos, además que la distancia y desplazamientos a cada uno de los frentes pueden requerir hasta 14 horas, lo que implica mayor complicación para el traslado de personal y materiales. En cuanto a la gestión social, es importante resaltar que los proyectos se ubican en territorio de jurisdicción de comunidades NARP y el proceso de socialización y construcción puede ser más complejo, convirtiéndose de igual forma en una limitante.

Sin más que agregar, adjunto al presente oficio los formatos MEPI-MN1-IN-6-FR-1 para el programa de inversión inicial y la reprogramación del mismo, así como las respectivas programaciones de obra, inicial y actualizada, y el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 para la solicitud de prórroga.

Quedamos atentos a sus requerimientos.

HÉCTOR ALFONSO CORREA RANGEL
Consorcio Hades
Director de Obra

Armenia (Quindío), 28 de Noviembre de 2022
CIGQQI-1279-2022, C-039-2022

Ingeniera
PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirección Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
pmorales@invias.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO N°1279 DE 2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS NARP – PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGIÓN AMAZÓNICA – LOTE 2"

Asunto: Solicitud Adición y prorroga contrato 1279-2022

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Contratista de obra mediante oficio CH-A-2022-24 de fecha Noviembre 28 de 2022 solicito prorroga al contrato 1291-2022 sustentando en:

- El plazo de revisión, ajuste y/o elaboración de estudios y diseños en cada vía, con desplazamientos en transporte multimodal, y en municipios en los cuales el acceso es aéreo, lo cual obliga que la programación para realización de ensayos de campo, caracterización de materiales granulares de la zona, entre otras se deban programar con las limitaciones del acceso en determinados días de la semana.
- La ubicación de las 8 vías priorizadas por el Ministerio del Interior, objeto de la inversión contratada, en jurisdicción de comunidades Indígenas y NARP, exige un proceso de socialización y manejo social especializado con las comunidades vecinas, lo cual genera mayores tiempos y dedicación del personal profesional a cargo.
- La distancia y desplazamiento entre las vías priorizadas, con tiempos superiores a 14 horas por recorrido, requiere mayores tiempos para el personal y equipo técnico que se comparte en el proyecto, lo cual repercute en el rendimiento de las actividades programadas.

La interventoría considera que los argumentos expuestos por el contratista justifican su solicitud y por lo tanto con el fin de garantizar el seguimiento y control a la obra antes mencionada se requiere prorrogar y adicionar al contrato de la referencia, sustentado con el plan de cargas, la dedicación y necesidades requeridas en cuanto a personal profesional, técnico y a otros costos directos requeridos para la adecuada realización del seguimiento y control.

Tal como se plantea en los documentos contractuales, se observa que se deben realizar actividades en ocho (8) vías en igual número de municipios, ubicados en cinco (5) Departamentos, cuya ubicación geográfica en el territorio nacional, obliga a realizar desplazamientos por vía aérea y en algunos casos esta movilización se debe realizar en transporte intermodal, como es el caso particular de Carurú (Vaupés) y Milán (Caquetá), desplazamientos que requieren recorrido largos, lo anterior implica que para atender algunos puntos del proyecto se debe contar con personal exclusivo para cada obra.

En el siguiente el cuadro se relacionan los municipios y departamentos a intervenir:

REGION AMAZÓNICA	AMAZONAS	Leticia
	CAQUETÁ	Florencia
		Milán
	GUAINÍA	Inírida
	PUTUMAYO	Santiago
		Villagarzón
		Orito
	VAUPÉS	Carurú

Es asi como para atender, se debe contar mínimo de un inspector de interventoría por vía, un ingeniero residente por grupo de municipios que estén ubicados con desplazamientos máximos de (4) horas, para que el tiempo dedicado al control y seguimiento resulte efectivo; así mismo se requiere un Ingeniero auxiliar con dedicación 100% que atienda el tema de informes en forma permanente para las 8 vías; si bien es cierto, que contar con un inspector por vía en cada una de las obras en ejecución permite un control de las cantidades ejecutadas, no garantiza la calidad del proceso constructivo y la efectiva resolución de posibles inquietudes que surjan en el desarrollo de las obras, ya que el perfil exigido no requiere la formación y experiencia suficiente para este alcance; por lo anterior es necesario garantizar mayor dedicación por parte del ingeniero residente, lo que permita designar un profesional por cada zona geográfica, a fin de que este realice control periódico por semana e imparta los lineamientos de seguimiento requeridos por frente y por actividad.

Por otro lado, y de acuerdo con el manual de interventoría del instituto, el interventor debe realizar informes semanales, mensuales y específicos cuando se requieran, así como la actualización de la plataforma CIFRA por vía, consolidación de información financiera, técnica y ambiental del proyecto, y teniendo en cuenta que el presente contrato se ejecuta en jurisdicción de tres (3) Direcciones Territoriales con la supervisión del mismo número de profesionales en cada jurisdicción, situación que si bien es cierto optimiza los tiempos en la revisión y trámite de los documentos, por cuanto cada uno revisa lo que se ejecuta en su jurisdicción, también se hace necesario presentar informes semanales por vía y en el informe mensual hacer una clasificación de un capítulo para cada uno de los (8) frentes que hacen parte del contrato de obra objeto de la interventoría.

Así mismo, es importante tener en cuenta que por tratarse de obras en resguardos indígenas y en zonas de eventual manejo especial ambiental se requiere contar con el acompañamiento permanente de los profesionales social y ambiental que garanticen el cumplimiento de los planes PAGA, entregados por el contratista, que para el caso particular se deben realizar de manera independiente, es decir ocho documentos, los cuales previamente deben ser revisados y aprobados por la interventoría.

En consecuencia, a los expuesto anteriormente y considerando que la reprogramación de obra presentado por el contratista plantea que durante los meses de Octubre y Noviembre se llevara a cabo el ajuste a estudios y diseños y que la ejecución de las actividades se llevara a cabo durante los meses de Diciembre de 2022 a marzo de 2023 de manera simultánea en los ocho (8) frentes de trabajo, se requiere disponer del siguiente personal:

- Para el segundo y el último mes de ejecución se prevé la utilización de Un (1) ingeniero residente con dedicación 100% y, para los meses tres, cuatro y cinco dado que se estará laborando en todos los frentes de obra se proyecta contar con Dos (2) Ingenieros Residentes con dedicación 100% cada uno.

- Un (1) ingeniero Auxiliar con dedicación 100%, durante todo el proyecto.

- Un (1) director de Interventoría, con una dedicación del 60% durante el primero y segundo mes, es decir la etapa inicial de ajustes a estudios y diseños, y el 80% una vez iniciadas las obras en los ocho (8) frentes, teniendo en cuenta que en esta etapa se debe realizar control y vigilancia de cada uno de los procesos, además de impartir los lineamientos técnicos y de coordinación a los inspectores de las obras ubicadas en los municipios de Carurú, Leticia e Inírida, las cuales no cuentan con la presencia de ingeniero residente.

- Un (1) Profesional social dedicación 50%.

- Un (1) Profesional ambiental dedicación 100% durante todo el contrato.

En cuanto a la movilización de los inspectores a los diferentes frentes de trabajo debe realizarse a diariamente y el medio de transporte más efectivo para realizar este desplazamiento es la moto, razón por la cual se solicita incrementar el alquiler a quince (15) motocicletas hombre/mes, para garantizar la movilidad durante el tiempo que dure la ejecución de las obras.

Para el desplazamiento de los Ingenieros residentes y teniendo en cuenta la sectorización realizada para el desarrollo del proyecto, se solicita disponer de ocho (8) vehículos/mes.

Por último, los recursos asignados para viáticos y transporte aéreos y terrestres del ingeniero director y de los diferentes especialistas, son insuficientes teniendo en cuenta las distancias, los tiempos de desplazamiento y el alto costo de los tiquetes aéreos, razón por la cual se deben ampliar los recursos asignados para tal fin. En el anexo al Plan de cargas se discriminan mes a mes los tramos intervenir, las actividades a realizar y el personal requerido para realizar el adecuado seguimiento al proyecto.

Considerando todo lo expuesto anteriormente y en aras de garantizar un adecuado seguimiento a las obras a ejecutar solicitamos adición del contrato de interventoría por valor de DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS ($206.669.061.oo) y prórroga del mismo hasta el 31 de marzo de 2023.

Atentamente,

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INT. GQQI
CELULAR: (314) 7814680
E-MAIL: gqqi@grupoquimbaya.com
Archivo: Correspondencia Enviada
Proyecto: M.M.G.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2022 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vias regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Caquetá, Meta y Putumayo

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1291 de 2022 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO HADES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGIÓN AMAZÓNICA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1279 de 2022 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INT.GQQI

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA 31 DE DICIEMBRE (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10//2022 (Dia / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2022**
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.160.582.816,00 **50% EN SMMLV:** $ 2.080,29
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.160.582.816,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. **CH-A-2022-24 de fecha 28 de noviembre de 2022**, el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Próroga del contrato 1291 de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, a fin de garantizar la ejecución de las obras de mejoramiento y mantenimiento contratadas en 8 vias, ubicadas en 8 municipios y 5 departamentos,en (3) de los cuales el acceso es vía aérea.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Construcción de placahuellas, alcantarillas y box coulvert en los municipios de Orito, Villagarzón. Santiago del departamento de **Putumayo**, Florencia y Milan, del departamento de **Caquetá**, Leticia del departamento de **Amazonas**, Inírida en el departamento de **Guainia** y Carurú en el departamento de **Vaupés**.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
TRAMO 1 RESGUARDO INDÍGENA SAN JUAN DE LOS PARENTES-LETICIA-AMAZONAS	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 2.147.552	$ -	$ -	$ 2.147.552
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 1.374.500	$ -	$ -	$ 1.374.500
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 8.235.328	$ -	$ -	$ 8.235.328
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 821.183	$ -	$ -	$ 821.183
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 6.202.827	$ -	$ -	$ 6.202.827
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diámetro interior	$ 5.760.000	$ -	$ -	$ 5.760.000
Demolición de estructuras	$ 141.212	$ -	$ -	$ 141.212
SUBTOTAL	**$ 24.682.602**	$ -	$ -	$ 24.682.602
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	$ -	$ -	$ -	$ -
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 2.803.980	$ -	$ -	$ 2.803.980
Excavaciones Varias sin Clasificar	$ 5.320.072	$ -	$ -	$ 5.320.072
Suelo-cemento clase SC-D, gradación tipo A (no incluye	$ 10.764.720	$ -	$ -	$ 10.764.720
cemento hidráulico para suelo cemento	$ 42.926.400	$ -	$ -	$ 42.926.400
Sello de Juntas con material bituminoso	$ 17.376.800	$ -	$ -	$ 17.376.800
Concreto Resistencia 21MPa (D) para placa huella	$ 222.129.096	$ -	$ -	$ 222.129.096
Concreto clase 14 Mpa (60% concreto + 40% Piedra para	$ 54.941.544	$ -	$ -	$ 54.941.544
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 111.158.088	$ -	$ -	$ 111.158.088
SUBTOTAL	**$ 467.420.700**	$ -	$ -	$ 467.420.700
SUBTOTAL OBRA TRAMO 1-RESGUARDO INDÍGENA SAN JUAN DE LOS PARENTES-LETICIA-AMAZONAS	**$ 492.103.302**	$ -	$ -	$ 492.103.302
TRAMO 2-RESGUARDO INDÍGENA HONDURAS-FLORENCIA-CAQUETA	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 3.915.252	$ -	$ -	$ 3.915.252
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 2.366.100	$ -	$ -	$ 2.366.100
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 16.728.480	$ -	$ -	$ 16.728.480
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 1.657.488	$ -	$ -	$ 1.657.488
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 14.163.498	$ -	$ -	$ 14.163.498
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de	$ 17.280.000	$ -	$ -	$ 17.280.000
Demolición de estructuras	$ 128.758	$ -	$ -	$ 128.758
SUBTOTAL	**$ 56.239.576**	$ -	$ -	$ 56.239.576
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		$ -	$ -	$ -
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 1.892.880	$ -	$ -	$ 1.892.880
Excavaciones Varias sin Clasificar	$ 4.004.235	$ -	$ -	$ 4.004.235
Subbase Granular Clase C	$ 61.758.760	$ -	$ -	$ 61.758.760
Sello de Juntas con material bituminoso	$ 20.300.000	$ -	$ -	$ 20.300.000
Concreto Resistencia 21MPa (D) para placa huella	$ 195.555.100	$ -	$ -	$ 195.555.100
Concreto clase 14 Mpa (60% concreto + 40% Piedra para	$ 43.502.694	$ -	$ -	$ 43.502.694
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 105.463.836	$ -	$ -	$ 105.463.836
SUBTOTAL	**$ 432.477.505**	$ -	$ -	$ 432.477.505
SUBTOTAL OBRA TRAMO 2-RESGUARDO INDÍGENA HONDURAS-FLORENCIA-CAQUETA	$ 488.717.081	$ -	$ -	$ 488.717.081
TRAMO 3-ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETA CRIOMC-MILAN-CAQUETA	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 5.562.304	$ -	$ -	$ 5.562.304
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 3.248.400	$ -	$ -	$ 3.248.400
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 13.524.464	$ -	$ -	$ 13.524.464
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 1.385.588	$ -	$ -	$ 1.385.588
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 11.018.370	$ -	$ -	$ 11.018.370
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de	$ 13.560.000	$ -	$ -	$ 13.560.000
SUBTOTAL	**$ 48.299.126**	$ -	$ -	$ 48.299.126
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 12.957.640	$ -	$ -	$ 12.957.640
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 3.833.112	$ -	$ -	$ 3.833.112
Concreto Resistencia 28MPa (D)	$ 61.882.327	$ -	$ -	$ 61.882.327
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 3.463.970	$ -	$ -	$ 3.463.970
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 41.685.215	$ -	$ -	$ 41.685.215
SUBTOTAL	**$ 123.822.264**	$ -	$ -	$ 123.822.264
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	$ -	$ -	$ -	$ -
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 2.338.848	$ -	$ -	$ 2.338.848
Excavaciones Varias sin Clasificar	$ 9.165.160	$ -	$ -	$ 9.165.160
Suelo-cemento clase SC-D, gradación tipo A (no incluye	$ 14.153.670	$ -	$ -	$ 14.153.670
cemento hidráulico para suelo cemento	$ 34.610.400	$ -	$ -	$ 34.610.400
Sello de Juntas con material bituminoso	$ 12.390.000	$ -	$ -	$ 12.390.000
Concreto Resistencia 21MPa (D) para placa huella	$ 131.457.378	$ -	$ -	$ 131.457.378
Concreto clase 14 Mpa (60% concreto + 40% Piedra para	$ 38.399.744	$ -	$ -	$ 38.399.744

Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 70.525.180	$ -	$ -	$ 70.525.180
SUBTOTAL	**$ 313.040.380**	$ -	$ -	$ 313.040.380
SUBTOTAL OBRA TRAMO 3-ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL ORTEGUAZA MEDIO CAQUETA CRIOMC-MILAN-CAQUETA	**$ 485.161.770**	$ -	$ -	$ 485.161.770
TRAMO 4-ASOCIACION AUTORIDADESTRADICIONALES INDIGENAS PUEBLO PUINAVE-INIRIDA-GUAINIA	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 1.735.272	$ -	$ -	$ 1.735.272
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 1.167.975	$ -	$ -	$ 1.167.975
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 13.431.520	$ -	$ -	$ 13.431.520
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 1.075.210	$ -	$ -	$ 1.075.210
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 6.214.120	$ -	$ -	$ 6.214.120
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de	$ 5.850.000	$ -	$ -	$ 5.850.000
SUBTOTAL	**$ 29.474.097**			
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 20.507.760	$ -	$ -	$ 20.507.760
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 6.774.255	$ -	$ -	$ 6.774.255
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 182.668.672	$ -	$ -	$ 182.668.672
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 11.827.310	$ -	$ -	$ 11.827.310
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 124.743.102	$ -	$ -	$ 124.743.102
SUBTOTAL	**$ 346.521.099**	$ -	$ -	$ 346.521.099
SUBTOTAL OBRA TRAMO 4-ASOCIACION AUTORIDADESTRADICIONALES INDIGENAS PUEBLO PUINAVE-INIRIDA-GUAINIA	**$ 375.995.196**	$ -	$ -	$ 375.995.196
TRAMO 5-RESGUARDO INGA SAN ANDRES-SANTIAGO-PUTUMAYO	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 6.388.668	$ -	$ -	$ 6.388.668
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 3.801.975	$ -	$ -	$ 3.801.975
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 18.588.936	$ -	$ -	$ 18.588.936
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 1.928.244	$ -	$ -	$ 1.928.244
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 16.480.656	$ -	$ -	$ 16.480.656
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de	$ 18.720.000	$ -	$ -	$ 18.720.000
SUBTOTAL	**$ 65.908.479**	$ -	$ -	$ 65.908.479
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	$ -	$ -	$ -	$ -
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 2.585.343	$ -	$ -	$ 2.585.343
Excavaciones Varias sin Clasificar	$ 9.873.396	$ -	$ -	$ 9.873.396
Subbase Granular Clase C	$ 77.796.516	$ -	$ -	$ 77.796.516
Sello de Juntas con material bituminoso	$ 17.676.400	$ -	$ -	$ 17.676.400
Concreto Resistencia 21MPa (D) para placa huella	$ 169.249.212	$ -	$ -	$ 169.249.212
Concreto clase 14 Mpa (60% concreto + 40% Piedra para	$ 44.825.445	$ -	$ -	$ 44.825.445
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 98.646.736	$ -	$ -	$ 98.646.736
SUBTOTAL	**$ 420.653.048**	$ -	$ -	$ 420.653.048
SUBTOTAL OBRA TRAMO 5-RESGUARDO INGA SAN ANDRES-SANTIAGO-PUTUMAYO	$ 486.561.527	$ -	$ -	$ 486.561.527
TRAMO 6-RESGUARDO PIEDRA SAGRADA-VILLAGARZON-PUTUMAYO	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 5.541.712	$ -	$ -	$ 5.541.712
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 3.263.400	$ -	$ -	$ 3.263.400
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 12.455.904	$ -	$ -	$ 12.455.904
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 1.288.434	$ -	$ -	$ 1.288.434
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 11.098.272	$ -	$ -	$ 11.098.272
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de	$ 11.400.000	$ -	$ -	$ 11.400.000
Demolición de estructuras	$ 884.982	$ -	$ -	$ 884.982
SUBTOTAL	**$ 45.932.704**	$ -	$ -	$ 45.932.704
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	$ -	$ -	$ -	$ -
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 2.153.844	$ -	$ -	$ 2.153.844
Excavaciones Varias sin Clasificar	$ 18.199.486	$ -	$ -	$ 18.199.486
Subbase Granular Clase C	$ 100.247.070	$ -	$ -	$ 100.247.070
Sello de Juntas con material bituminoso	$ 19.989.200	$ -	$ -	$ 19.989.200
Concreto Resistencia 21MPa (D) para placa huella	$ 105.034.734	$ -	$ -	$ 105.034.734
Concreto clase 14 Mpa (60% concreto + 40% Piedra para	$ 53.536.184	$ -	$ -	$ 53.536.184
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 102.711.728	$ -	$ -	$ 102.711.728
SUBTOTAL	**$ 401.872.246**	$ -	$ -	$ 401.872.246
SUBTOTAL OBRA TRAMO 6-RESGUARDO PIEDRA SAGRADA-VILLAGARZON-PUTUMAYO	**$ 447.804.950**	$ -	$ -	$ 447.804.950
TRAMO 7-CONSEJO COMUNITARIO ALTO PARAISO-ORITO-PUTUMAYO	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 15.228.180	$ -	$ -	$ 15.228.180
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 8.939.125	$ -	$ -	$ 8.939.125
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 26.983.320	$ -	$ -	$ 26.983.320
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 2.184.268	$ -	$ -	$ 2.184.268
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 27.745.680	$ -	$ -	$ 27.745.680
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de	$ 27.450.000	$ -	$ -	$ 27.450.000
Demolición de estructuras	$ 884.982	$ -	$ -	$ 884.982
SUBTOTAL	**$ 109.415.555**	$ -	$ -	$ 109.415.555
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	$ -	$ -	$ -	$ -
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 4.076.241	$ -	$ -	$ 4.076.241
Excavaciones Varias sin Clasificar	$ 13.290.048	$ -	$ -	$ 13.290.048
Subbase Granular Clase C	$ 45.160.972	$ -	$ -	$ 45.160.972
Sello de Juntas con material bituminoso	$ 17.772.600	$ -	$ -	$ 17.772.600
Concreto Resistencia 21MPa (D) para placa huella	$ 165.833.112	$ -	$ -	$ 165.833.112
Concreto clase 14 Mpa (60% concreto + 40% Piedra para	$ 21.436.650	$ -	$ -	$ 21.436.650

Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	$ 106.152.384	$ -	$ -	$ 106.152.384
SUBTOTAL	**$ 373.722.007**	$ -	$ -	$ 373.722.007
SUBTOTAL OBRA TRAMO 7-CONSEJO COMUNITARIO ALTO PARAISO-ORITO-PUTUMAYO	**$ 483.137.562**	$ -	$ -	$ 483.137.562
TRAMO 8-ASOCIACION DE AUTORIDADES DEL ALTO VAUPÉS ASATAV-CARURU-VAUPES	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 9.029.480	$ -	$ -	$ 9.029.480
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 1.239.656	$ -	$ -	$ 1.239.656
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 13.740.950	$ -	$ -	$ 13.740.950
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 1.112.868	$ -	$ -	$ 1.112.868
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 2.429.209	$ -	$ -	$ 2.429.209
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de	$ 5.790.000	$ -	$ -	$ 5.790.000
SUBTOTAL	**$ 33.342.163**	$ -	$ -	$ 33.342.163
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT	$ -	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar	$ 25.380.160	$ -	$ -	$ 25.380.160
Rellenos para Estructuras con Suelo	$ 7.606.980	$ -	$ -	$ 7.606.980
Concreto Resistencia 21MPa (D)	$ 186.876.920	$ -	$ -	$ 186.876.920
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$ 11.128.680	$ -	$ -	$ 11.128.680
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 157.993.582	$ -	$ -	$ 157.993.582
SUBTOTAL	**$ 388.986.322**	$ -	$ -	$ 388.986.322
SUBTOTAL OBRA TRAMO 8-ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DEL ALTO VAUPÉS ASATAV-CARURU-VAUPES	**$ 422.328.485**	$ -	$ -	$ 422.328.485
SUBTOTAL DE OBRAS AMAZONAS, GUAINIA, VAUPES =(1)	$ 1.290.426.983	$ -	$ -	$ 1.290.426.983
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES AMAZONAS, GUAINIA, VAUPES= (2)	$ 225.248.111	$ -	$ -	$ 225.248.111
SUBTOTAL DE OBRAS AMAZONAS, GUAINIA, VAUPES INCLUYE AIU (30%) (1)+(2)=(A)	$ 1.515.675.094	$ -	$ -	$ 1.515.675.094
SUBTOTAL DE OBRAS PUTUMAYO, CAQUETA =(3)	$ 2.391.382.890	$ -	$ -	$ 2.391.382.890
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES PUTUMAYO, CAQUETA =(4)	$ 85.229.589	$ -	$ -	$ 85.229.589
SUBTOTAL DE OBRAS PUTUMAYO, CAQUETA INCLUYE AIU (30%) (3+(4)=(B)	$ 2.476.612.479	$ -	$ -	$ 2.476.612.479
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA PUTUMAYO, CAQUETA = (C)	$ 18.098.322	$ -	$ -	$ 18.098.322
SUBTOTAL DE OBRAS PUTUMAYO, CAQUETA INCLUYE AIU (30%) INCLUYE IVA (B+(C)=(D)	$ 2.494.710.801	$ -	$ -	$ 2.494.710.801
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)+(D)= (E)	**$ 4.010.385.895**	$ -	$ -	$ 4.010.385.895
SUBTOTALTOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, GUAINIA Y VAUPES =(F)	$ 25.500.000	$ -	$ -	$ 25.500.000
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ = (5)	$ 42.500.000	$ -	$ -	$ 42.500.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ =(5) * (19%) =(6)	$ 8.075.000	$ -	$ -	$ 8.075.000

FECHA 28/11/2022
(Día / Mes / Año)

SUBTOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ =(5)+(6)=(G)	$ 50.575.000	$ -	$ -	**$ 50.575.000**
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL =(F)+(G)=(H)	**$ 76.075.000**	$ -	**$ -**	**$ 76.075.000**
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA) DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, GUAINIA Y VAUPES= (7)	$ 18.917.395	$ -	**$ -**	**$ 18.917.395**
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%) DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ=(8)	$ 31.460.813	$ -	**$ -**	**$ 31.460.813**
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL(Incluye PAGA e IVA 19%)=(7)+(8)=(I)	**$ 50.378.208**	$ -	**$ -**	**$ 50.378.208**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, GUAINIA Y VAUPES=(9)	$ 8.903.893	$ -	**$ -**	**$ 8.903.893**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ=(10)	$ 14.839.820	$ -	**$ -**	**$ 14.839.820**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) = (9)+(10)=(J)	**$ 23.743.713**	$ -	**$ -**	**$ 23.743.713**
Valor Total	**$ 4.160.582.816**	$ 1	**$ -**	**$ 4.160.582.816**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Octubre (mes anterior a la presente solicitud) de 2022 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 0% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 0,00%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 0,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ 0,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 0,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 2.030.143.787,00 (mes anterior a la presente solicitud)
$ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar: $ 2.030.143.787,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Octubre (mes anterior a la presente solicitud) de 2022 (año) $ 0,00
Último mes facturado: N/A (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 4.160.582.816,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N.A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28/11/2022
	(Día / Mes / Año)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

La interventoria considera viable la solicitud de prorroga, teniendo en cuenta el numero de vias a intervenir, la ubicación de estas en 8 municipios y 5 departamentos, asi como las condiciones de acceso en transporte multimodal, que requiere incluir tiempos representativos de desplazamientos, asi como el trabajo social especializado en comunidades NARP, que obliga socializaciones periódicas, y disminuye el rendimiento efectivo en la ejecución de los trabajos.

JURÍDICA:

Se considera viable jurídicamente la presente solicitud de prórroga, con fundamento en el Estatuto Geneal de Contratación de la Administración Pública.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

No se está comprometiendo recursos adicionales.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

N. A.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

En ejecución del contrato 1291-22 se atienden los compromisos ambientales pactados contractualmente para la intervención de mejoramiento y mantenimiento de las 8 vías, en los 8 municipios y 5 departamentos.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N.A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Oficio de solicitud No. CH-A-2022-23 de fecha 28 de noviembre de 2022.
Programa de inversión de los recursos actualizado con el plazo de prorroga.

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
ALBERTO SÁNCHEZ SOLANO
Representante legal
CONSORCIO HADES
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-24426

Firma
HUGO HERNÁN HERRERA GONZALEZ
Apoderado
CONSORCIO INT.GQQI
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.:63202-83145 QND

Vo.Bo. Firma
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
DIRECTOR TERRITORIAL CAQETÁ
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Vo.Bo. Firma:
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Supervisor del contrato de interventoria
Territorial Putumayo
Matrícula Profesional No.: 19202-05518 CAU

Vo.Bo Firma
CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
Supervisor del contrato de interventoria
Territorial Meta
Matrícula Profesional No.: 26202-250038 CND

Vo.Bo.Firma
ROSA NIRMA SÁNCHEZ MUJICA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-59341 CND

Vo.Bo.Firma
HECTOR HUGO BERMUDEZ ALVARADO
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON
Firma
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTORA VIAS REGIONALES
Jefe unidad ejecutora
Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
JOSE RICARDO BURBANO
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRN

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
ORLANDO ORTÍZ GOMEZ
DIRECTOR TERRITORIAL META
Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CPC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA-PUTUMAYO-META

CONTRATO DE OBRA No. 1291-22 **CONTRATISTA:** CONSORCIO HADES

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS NARP – PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION AMAZONICA

FECHA DE INICIO: 25/10/2022

PLAZO INICIAL: hasta 31 de diciembre de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.160.582.816,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.160.582.816,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 76.075.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 76.075.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1279-22 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GQQI,

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 416.058.281,60	22	8	2022	6	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 2.080.291.408,00	22	8	2022	6	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 832.116.563,20	22	8	2022	6	1	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 22.822.500,00	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.248.174.844,80	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101002843

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/10/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	22	8	2022	31	12	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101001209 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	


FECHA	30	11	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/10/2022

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-83145 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS**	CÓDIGO			
	DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES	VERSIÓN			
	GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES					

CONTRATO No. 1291 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO HADES identificado con numero de NIT. 901.616.950-5

OBJETO DEL CONTRATO: *"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LAS REGION AMAZÓNICA"*

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 22 de agosto del 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre del 2022

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.160.582.816

VALOR ADICIONAL: N/A	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** 949522 de fecha 25 de agosto del 2022 por valor de $ 4.160.582.816 de la vigencia 2022.

DOCUMENTO QUE AMPARA

- Contrato principal número 1291 de fecha 22 de agosto del 2022.

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

1. Póliza Única de Cumplimiento No: 57-44-101002843	**Anexo No:** 3		**FECHA: 13/09/2022**		**Aseguradora:**	**SEGUROS DEL ESTADO**
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	DESDE:	22/08/2022	HASTA:	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	VALOR:	$ 416.058.281,60
b). El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR	DESDE:	22/08/2022	HASTA:	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO	VALOR:	$ 2.080.291.408
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	DESDE:	22/08/2022	HASTA:	31/12/2027	VALOR:	$ 832.116.563,20
d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría				VALOR:	$ 1.248.174.844,80
e). Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.				VALOR:	$22.822.500

2. Póliza Única de Cumplimiento No: 57-40-101001209		**Anexo No:** 5		**FECHA: 27/09/2022**			**Aseguradora:**	**SEGUROS DEL ESTADO**	
2.1. Predios, Labores y Operaciones	DESDE:	22/08/2022	HASTA:	31 /12 / 2022	VALOR:	$ 400.000.000.00			
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	Perjuicios por daño emergente y lucro cesante		SI		Perjuicios Extrapatrimoniales		SI		
Contratistas y Subcontratistas	SI		Vehículos propios y no propios		SI	Amparo patronal		SI	

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS D

DETALLE DE LA GARANTÍA

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usu

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fech
.1	Revisor	Aprobado	SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA	SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA	5 día trans (20/1 AM(U Bogot
.2	Aprobación Subdirector de Procesos de Selección Contractuales	Aprobado	Edwin Javier Galvis Acevedo	Edwin Javier Galvis Acevedo	5 día trans (20/1 AM(U Bogot

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de

FLUJOS D

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Coordinador	Aprobado	SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA	SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA	22/08/2022 9:30:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	Ordenador del Gasto	Aprobado	Edwin Javier Galvis Acevedo	Edwin Javier Galvis Acevedo	22/08/2022 12:07:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor

Volver

Iniciar ejecución < >

Documentos Tipo

Documentos Tipo: Sí — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS D

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Nivel 1 - C

Flujos de aprobación 1

Asunto

MOSTRAR DETALLES

.1 Coordin

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usu

.2 Ordenac

FLUJOS DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 2

Aprobar garantía

MOSTRAR DETALLES

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fech
.1	Revisor	Aprobado	SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA	SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA	5 día trans (20/1 AM(U Bogot
.2	Aprobación Subdirector de Procesos de Selección Contractuales	Aprobado	Edwin Javier Galvis Acevedo	Edwin Javier Galvis Acevedo	5 día trans (20/1 AM(U Bogot

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de a

FLUJOS D

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Coordinador	Aprobado	SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA	SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA	22/08/2022 9:30:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	Ordenador del Gasto	Aprobado	Edwin Javier Galvis Acevedo	Edwin Javier Galvis Acevedo	22/08/2022 12:07:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor

Volver

Iniciar ejecución < >

Documentos Tipo

Documentos Tipo: Sí — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte

5 Documentos del contrato
6
Información presupuestal 7
Ejecución del Contrato 8
Modificaciones del Co… 9
Incumplimientos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado Sí No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías

Garantías por lote grupos o etapa

Seriedad de ofer

Cumplimien

Responsabilidad civil ext contractu

Fecha límite pa entrega de garantía

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usu

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fech
.1	Revisor	Aprobado	SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA	SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA	5 día trans (20/1 AM(U Bogot
.2	Aprobación Subdirector de Procesos de Selección Contractuales	Aprobado	Edwin Javier Galvis Acevedo	Edwin Javier Galvis Acevedo	5 día trans (20/1 AM(U Bogot

Quito)

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
28. Garantias.docx	-	28. Garantias.docx	Descargar	Detalle

Buscar en la biblioteca | Borrar seleccionado | Anexar documento

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Est
CO1.WRT.10129030	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	400.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	4/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Apr
CO1.WRT.10061277	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	4.599.463.597,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	4/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Apr
CO1.WRT.10049702	Cumplimiento - Buen manejo y correcta	Garantía bancaria	4.991.463.597,60 COP	CONSORCIO HADES	31/12/2027 *((UTC-05:00)*	Per

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ-META-PUTUMAYO

PROGRAMA DE INVERSIONES | |

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1291 de 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGIÓN AMAZÓNICA.

CONTRATISTA: CONSORCIO HADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1279 de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO INT.GQQI

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 5,16 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/10/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.160.582.816,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: N/A

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 nov-22	2 dic-22	3 ene-23	4 feb-23	5 mar-23	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
LETICIA AMAZONAS - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$24.682.602	0,67%		% P	0,25%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%					
				$ P	$9.379.389	$0	$15.303.213	$0	$0					
				$ E										
				% E										
LETICIA AMAZONAS - CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA	$467.420.700	12,70%		% P	0,51%	0,00%	7,87%	4,32%	0,00%					
				$ P	$18.696.828	$0	$289.800.834	$158.923.038	$0					
				$ E										
				% E										
FLORENCIA CAQUETÁ - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$56.239.576	1,53%		% P	0,14%	1,25%	0,14%	0,00%	0,00%					
				$ P	$5.061.562	$46.116.452	$5.061.562	$0	$0					
				$ E										
				% E										
FLORENCIA CAQUETÁ - CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA	$432.477.505	11,75%		% P	0,00%	1,41%	5,76%	4,58%	0,00%					
				$ P	$0	$51.897.301	$211.913.977	$168.666.227	$0					
				$ E										
				% E										
MILÁN CAQUETÁ - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$48.299.126	1,31%		% P	0,21%	0,00%	0,98%	0,12%	0,00%					
				$ P	$7.727.860	$0	$36.224.345	$4.346.921	$0					
				$ E										
				% E										
MILÁN CAQUETÁ - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT	$123.822.264	3,36%		% P	0,00%	0,00%	0,77%	2,02%	0,57%					
				$ P	$0	$0	$28.479.121	$74.293.358	$21.049.785					
				$ E										
				% E										
MILÁN CAQUETÁ - CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA	$313.040.380	8,50%		% P	0,00%	0,00%	0,68%	4,42%	3,40%					
				$ P	$0	$0	$25.043.230	$162.780.998	$125.216.152					
				$ E										
				% E										
INÍRIDA GUAINA - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$29.474.097	0,80%		% P	0,18%	0,00%	0,62%	0,00%	0,00%					
				$ P	$6.484.301	$0	$22.989.796	$0	$0					
				$ E										
				% E										
INÍRIDA GUAINÍA - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT	$346.521.099	9,41%		% P	0,00%	0,00%	4,05%	5,36%	0,00%					
				$ P	$0	$0	$149.004.073	$197.517.026	$0					
				$ E										
				% E										
SANTIAGO PUTUMAYO - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$65.908.479	1,79%		% P	0,21%	1,58%	0,00%	0,00%	0,00%					
				$ P	$7.909.017	$57.999.462	$0	$0	$0					
				$ E										
				% E										
SANTIAGO PUTUMAYO - CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA	$420.653.048	11,43%		% P	0,00%	3,31%	5,94%	2,17%	0,00%					
				$ P	$0	$121.989.384	$218.739.585	$79.924.079	$0					
				$ E										
				% E										
VILLAGARZÓN PUTUMAYO - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$45.932.704	1,25%		% P	0,14%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%					
				$ P	$5.052.597	$40.880.107	$0	$0	$0					
				$ E										
				% E										
VILLAGARZÓN PUTUMAYO - CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA	$401.872.246	10,92%		% P	0,00%	1,42%	7,20%	2,29%	0,00%					
				$ P	$0	$52.243.392	$265.235.682	$84.393.172	$0					
				$ E										
				% E										
ORITO PUTUMAYO - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$109.415.555	2,97%		% P	0,18%	2,05%	0,74%	0,00%	0,00%					
				$ P	$6.564.933	$75.496.733	$27.353.889	$0	$0					
				$ E										
				% E										
ORITO PUTUMAYO - CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA	$373.722.007	10,15%		% P	0,00%	0,51%	6,19%	3,45%	0,00%					
				$ P	$0	$18.686.100	$227.970.424	$127.065.482	$0					
				$ E										
				% E										
CARURÚ VAUPÉS - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO	$33.342.163	0,91%		% P	0,02%	0,00%	0,89%	0,00%	0,00%					
				$ P	$666.843	$0	$32.675.320	$0	$0					
				$ E										
				% E										
CARURÚ VAUPÉS - CONSTRUCCIÓN DE BOX	$388.986.322	10,57%		% P	0,00%	0,00%	2,64%	6,87%	1,06%					
				$ P	$0	$0	$97.246.581	$252.841.109	$38.898.632					

100%

50%

COULVERT				$ E								
				% E								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 3.681.809.873,00**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,83%**	**12,64%**	**44,90%**	**35,60%**	**5,03%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$67.543.332**	**$465.308.930**	**$1.653.041.631**	**$1.310.751.411**	**$185.164.569**					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**1,83%**	**14,47%**	**59,37%**	**94,97%**	**100,00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$67.543.332**	**$532.852.262**	**$2.185.893.893**	**$3.496.645.304**	**$3.681.809.873**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
VALOR IVA OBRA 19% SOBRE UTILIDAD OBRAS PUTUMAYO Y CAQUETÁ	$ 18.098.322,00 /	$ -	%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES AMAZONAS, GUAINIA, VAUPES	$ 225.248.111,00 / $ -	$ -	%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES PUTUMAYO, CAQUETA	$ 85.229.589,00 / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, GUAINIA Y VAUPES	$ 25.500.000,00 / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ	$ 42.500.000,00 / $ -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ	$ 8.075.000,00 /	$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA) DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, GUAINIA Y VAUPES	$ 18.917.395,00 / $ -	$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ	$ 31.460.813,00 / $ -	$ -	%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, GUAINIA Y VAUPES	$ 8.903.893,00 / $ -	$ -	%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ	$ 14.839.820,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 478.772.943,00 /	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ - /		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.160.582.816,00** /		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -** /		

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
ALBERTO SÁNCHEZ SOLANO
Representante legal
CONSORCIO HADES
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
HUGO HERNÁN HERRERA GONZALEZ
Representante legal o apoderado del Interventor
CONSORCIO INT.GQQI
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.:63202-83145 QND

Revisó Firma: Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Supervisor del contrato de interventoria
Territorial Putumayo
Matrícula Profesional No.: 19202-05518 CAU

Revisó Firma:
CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
Supervisor del contrato de interventoria
Territorial Meta
Matrícula Profesional No.: 26202-250038 CND

Aprueba Firma: Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTORA VIAS REGIONALES
Jefe unidad ejecutora
Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL

Revisó Firma: Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
DIRECTOR TERRITORIAL CAQETÁ
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Revisó Firma: Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
ORLANDO ORTÍZ GOMEZ
DIRECTOR TERRITORIAL META
Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CPC

Revisó Firma: Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
JOSE RICARDO BURBANO
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRN

Revisó Firma:
ROSA NIRMA SÁNCHEZ MUJICA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-59341 CND

Grupo Qulmbaya

Armenia, octubre 10 de 2022

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

Asunto: Poder de representación.

FABIAN VIVI MORALES, identificado con cedula de ciudadanía número 7.554.871 de Armenia, actuando en representación del **CONSORCIO INT. GQQI** identificado con NIT 901.618.241-0, por medio del presente otorgo:

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE

Al señor **HUGO HERNAN HERRERA GONZALES,** identificado con cedula de ciudadanía número 89.006.321 de Armenia, para que me represente con facultades amplias y suficientes como apoderado ante el INVIAS en cualesquiera de las actuaciones relacionadas con el Contrato de Interventoría Nº 1279 de 2022.

FABIAN VIVI MORALES
C.C. 7.554.871 de Armenia
Representante Legal
CONSORCIO INT. GQQI

HUGO HERNAN HERRERA GONZALES
C.C. 89.006.321 de Armenia
Apoderado

607

Brasilia Nueva Mz 9 No.16 Armenia Quindío || **e-mail:** info@grupoqulmbaya.com || **Cel:** 311 347 1324 || www.grupoqulmbaya.com

Powered by CamScanner

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

13771647

En la ciudad de Armenia, Departamento de Quindío, República de Colombia, el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Cuarta (4) del Círculo de Armenia, compareció: FABIAN VIVI MORALES, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 7554871 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



x7md57y0drle
29/10/2022 - 11:48:47

- - - - - Firma autógrafa - - - - -

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se vincula al documento de PODER signado por el compareciente, en el que aparecen como partes FABIAN VIVI MORALES.

NOTARIA CUARTA NA GILBERTO RAMIREZ ARCILA NOTARIO ARMENIA QUINDIO

Notaría Cuarta de Armenia - Quindío

GILBERTO RAMIREZ ARCILA

Notario Cuarto (4) del Círculo de Armenia, Departamento de Quindío

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: x7md57y0drle

NOTARÍA NA GILB RAMIREZ N NOTA ARMENIA

NOTARIA CUARTA ARMENIA QUINDIO
CALLE 20 No. 15-35
DILIGENCIA Y COTEJO QUE SE ADELANTO POR
SOLICITUD EXPRESA DEL USUARIO
TELEFONOS: 7411560 - 7445361

Powered by CamScanner

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1291 de 2022

Objeto: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS NARP – PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LAS REGION AMAZONICA.*".*

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	x	
SICO:	x	
SEPRO:	X	
CIFRA:	X	
GESPROY:		x

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 30 días del mes de noviembre año 2022.

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON.
Ordenador del Pago
Subdirección: vías regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Florangela Parra
Coordinador del Proyecto
Subdirección: vías regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: ROSA NIRMA SANCHEZ
Gestor del Proyecto
Subdirección: : vías regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3835182
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/07/2022 7:42:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1291-2022
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LAS REGION AMAZONICA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	136 Días
Fecha de inicio de contrato	25/10/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	◉ Sí ○ No
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO HADES

Cuenta bancaria del proveedor

○ Cuentas bancarias distintas por proveedor ◉ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO HADES	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	047626676

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALBERTO SOLANO* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2022 2:39:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2022 12:07:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3835182_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3835182_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	Subdirección de Estructuración de Proyectos
Proceso de Contratación	LP-DTE-SEP-005-2022.
Título de la oferta	INVIAS COMUNIDADEDS INDIGENAS
Cuantía del contrato	4.160.582.816 COP

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cam

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	4.160.582.816,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.160.582.816,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	4.160.582.816,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Anexo Tecnico Obra Lote 2 - Region Amazonica.pdf	Anexo Tecnico Obra Lote 2 - Region Amazonica.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP cto 1291-22.pdf	CDP cto 1291-22.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	Cto 1291-22 Agost22-22 Obra Lote2-Reporte Secopii.pdf	Cto 1291-22 Agost22-22 Obra Lote2-Reporte Secopii.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Legalizacion.zip	Legalizacion.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Resol 2644 Jul22-22 Adjudica LP-005-22.pdf	Resol 2644 Jul22-22 Adjudica LP-005-22.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 949522 Agost25-22 c-1291-22 (1).pdf	RP 949522 Agost25-22 c-1291-22 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SVR 65794 oct25-22 Orden Inicio C-1291-22 (1).pdf	SVR 65794 oct25-22 Orden Inicio C-1291-22 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. Contrato Fiduciario firmado- Cto 1291-22.pdf	3. Contrato Fiduciario firmado- Cto 1291-22.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DOCUMENTOS 1 Anticipo Cto1291-22 Lote2.pdf	DOCUMENTOS 1 Anticipo Cto1291-22 Lote2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Radicado Glosa No.126314 Nov21-22.pdf	Radicado Glosa No.126314 Nov21-22.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Radicado No. 122834 Nov11-22.pdf	Radicado No. 122834 Nov11-22.pdf	Comprador	Descargar	Detalle


Borrar Cargar nuevo

Volver


Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

AMAZONAS

Programado

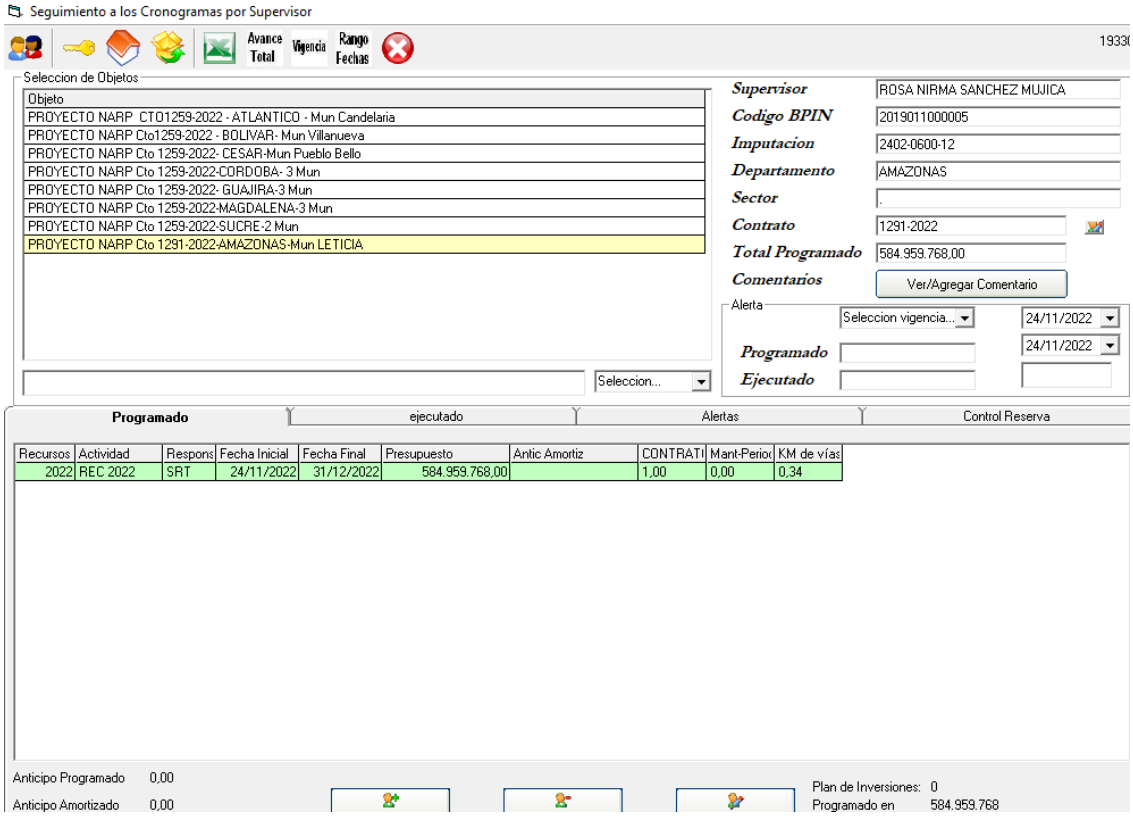


Ejecutado

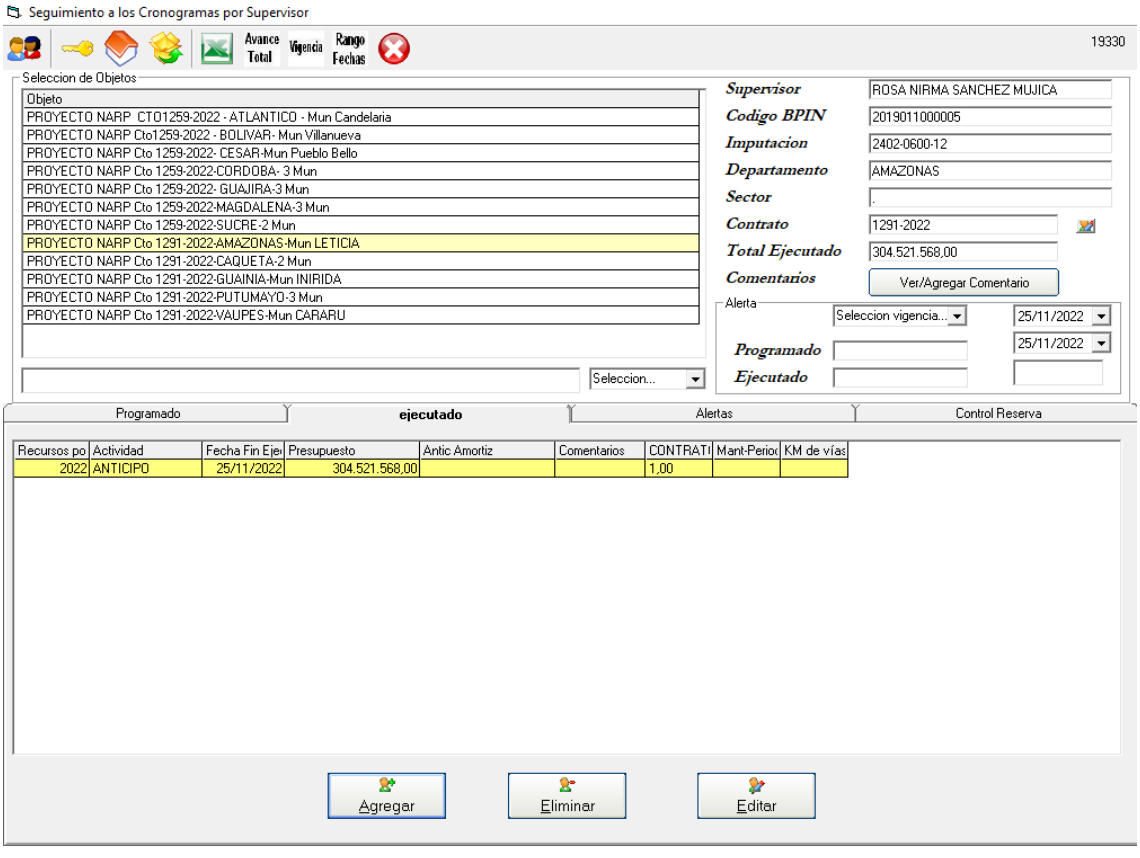


CAQUETÁ


Programado

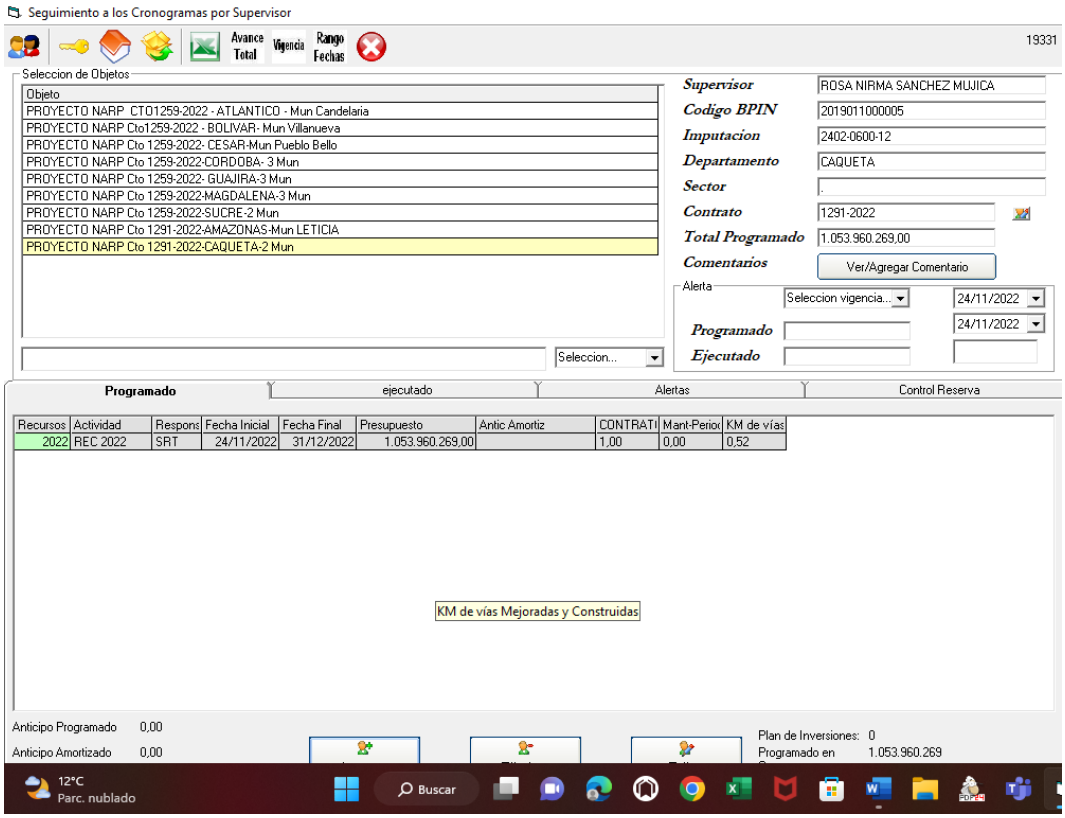


Ejecutado

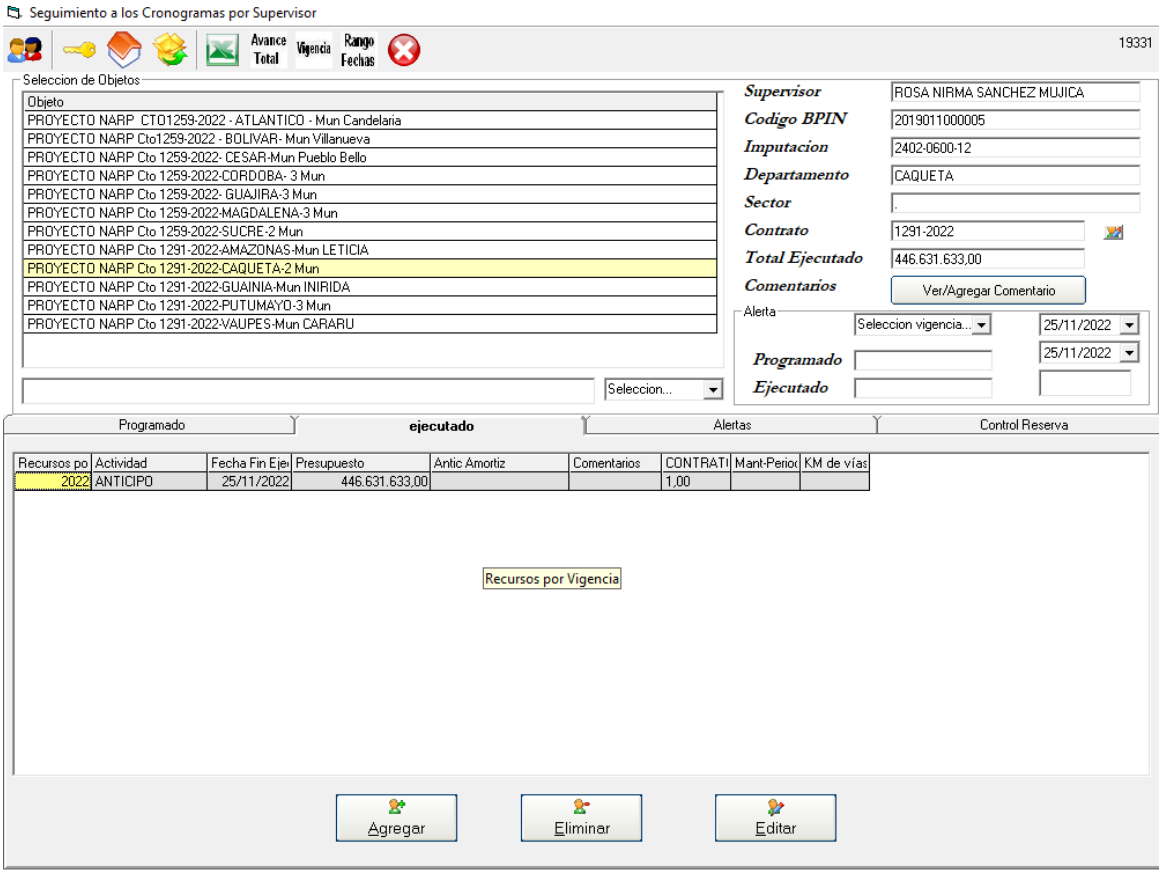

GUAINÍA

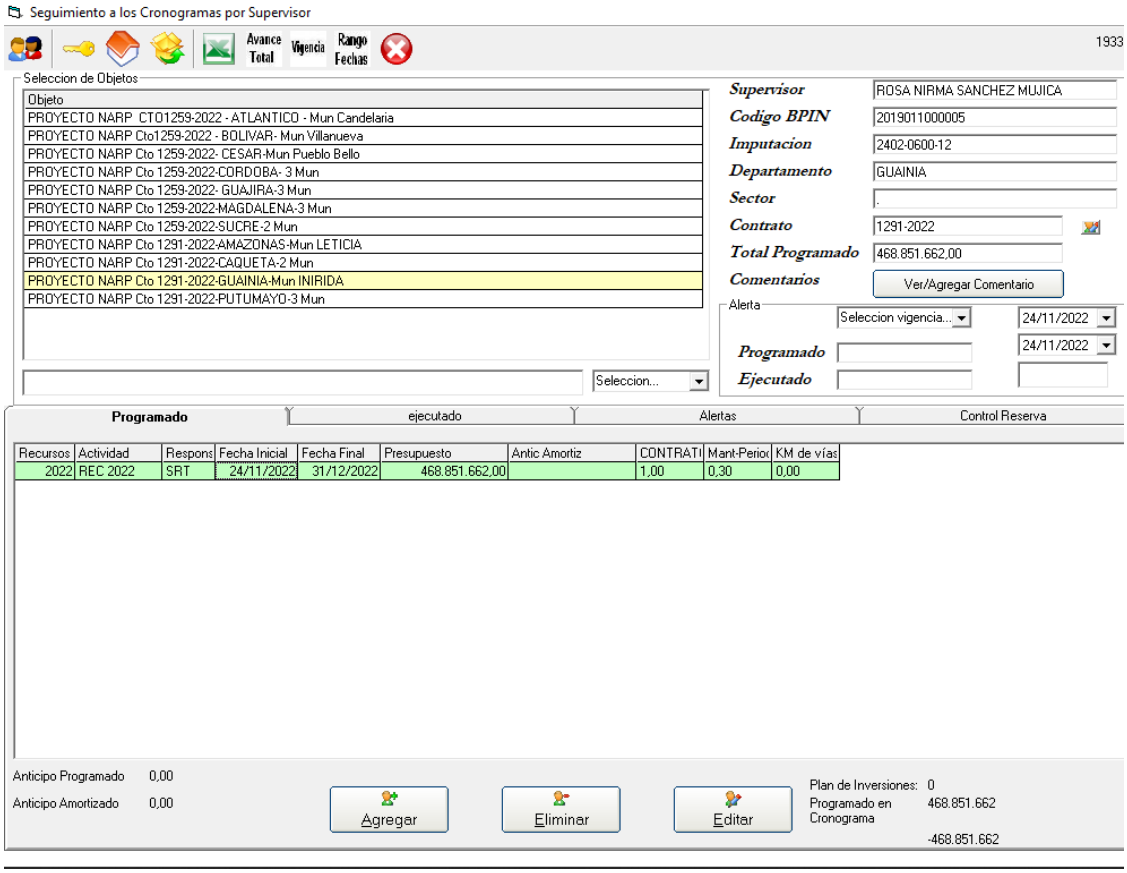


Ejecutado

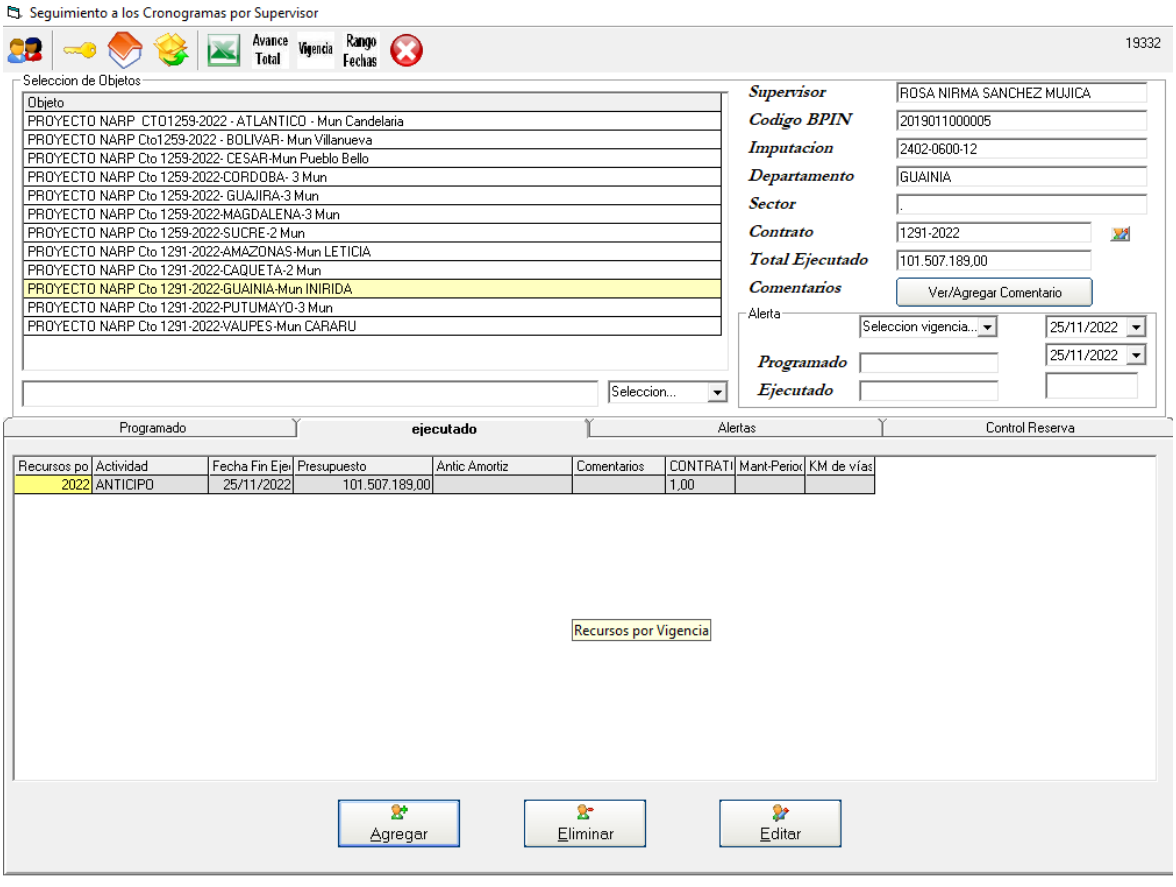


PUTUMAYO

Programado

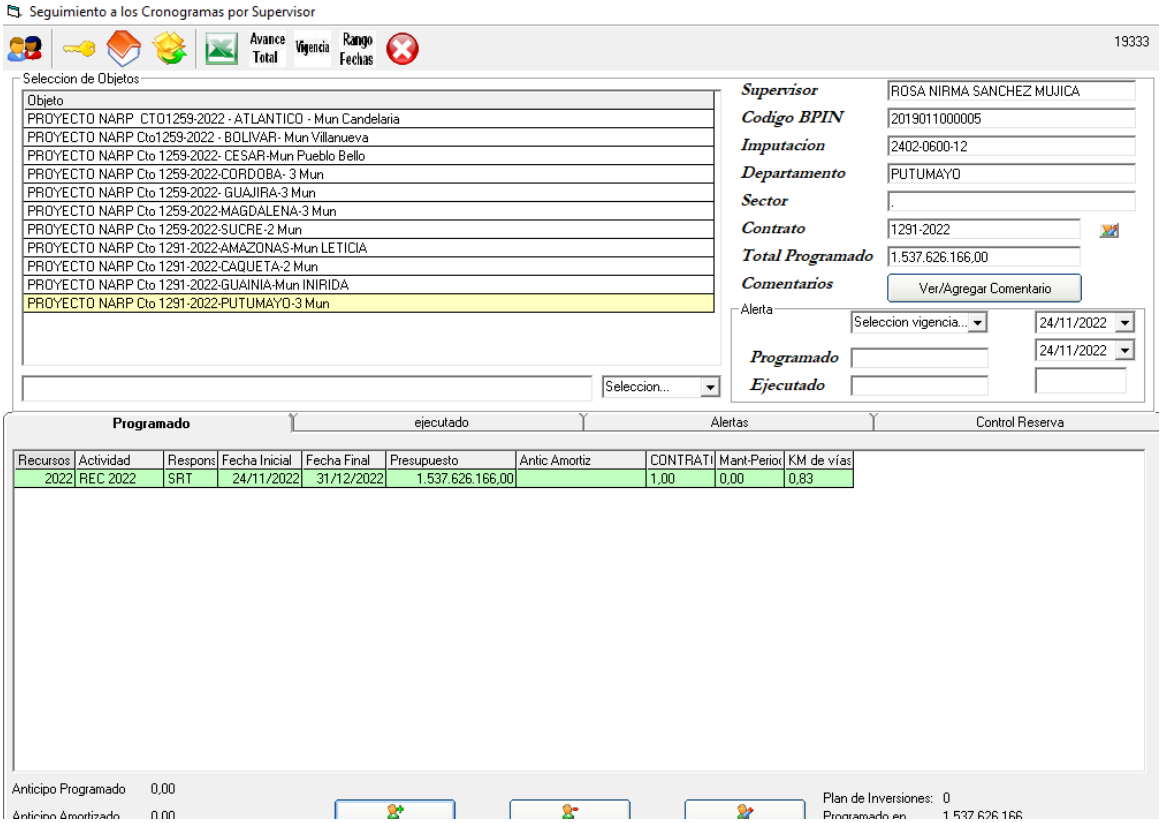


Ejecutado

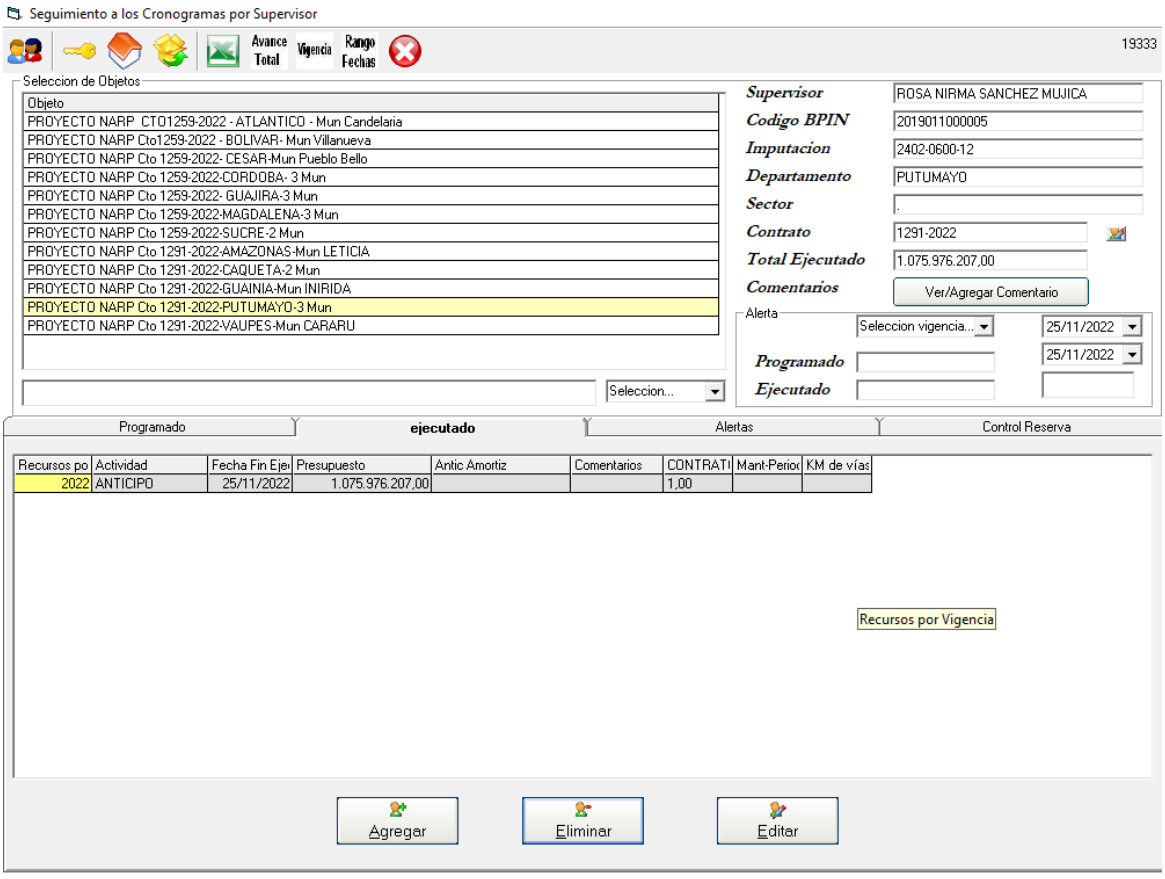


VAUPÉS

Programado

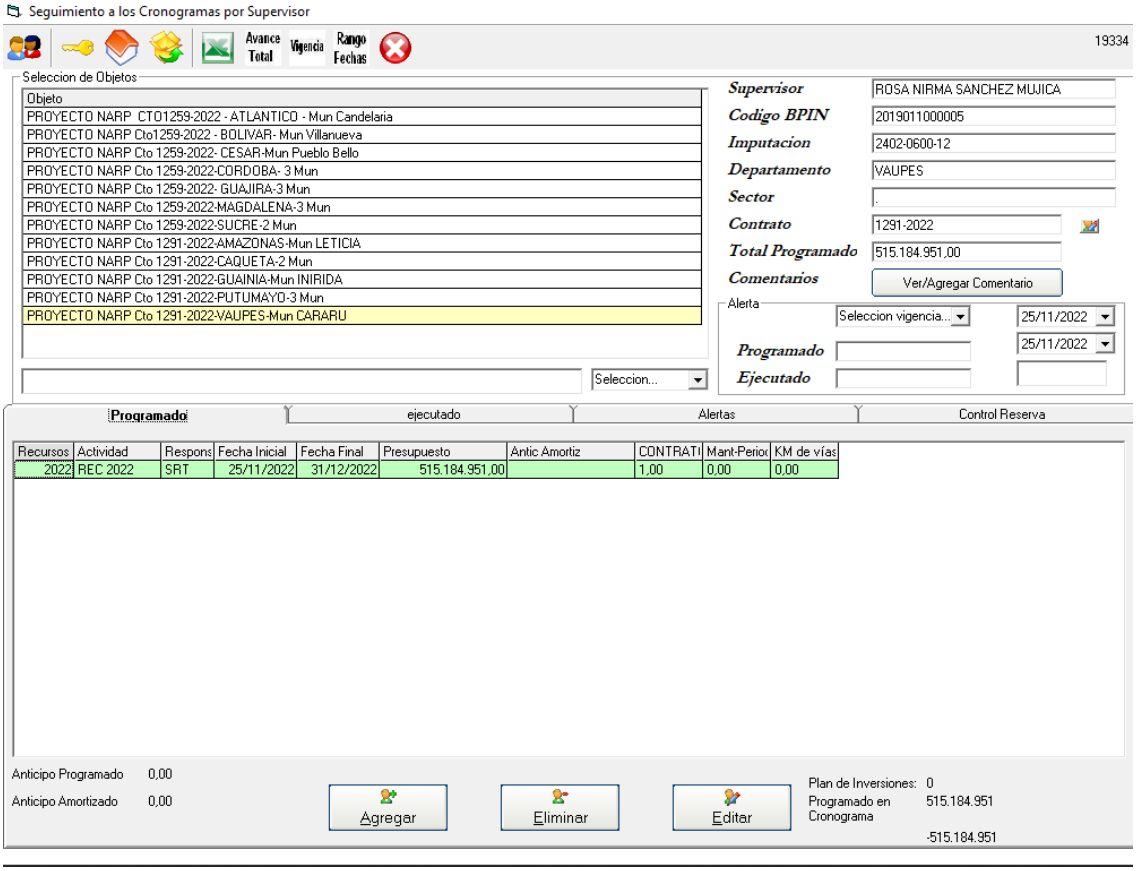

Ejecutado

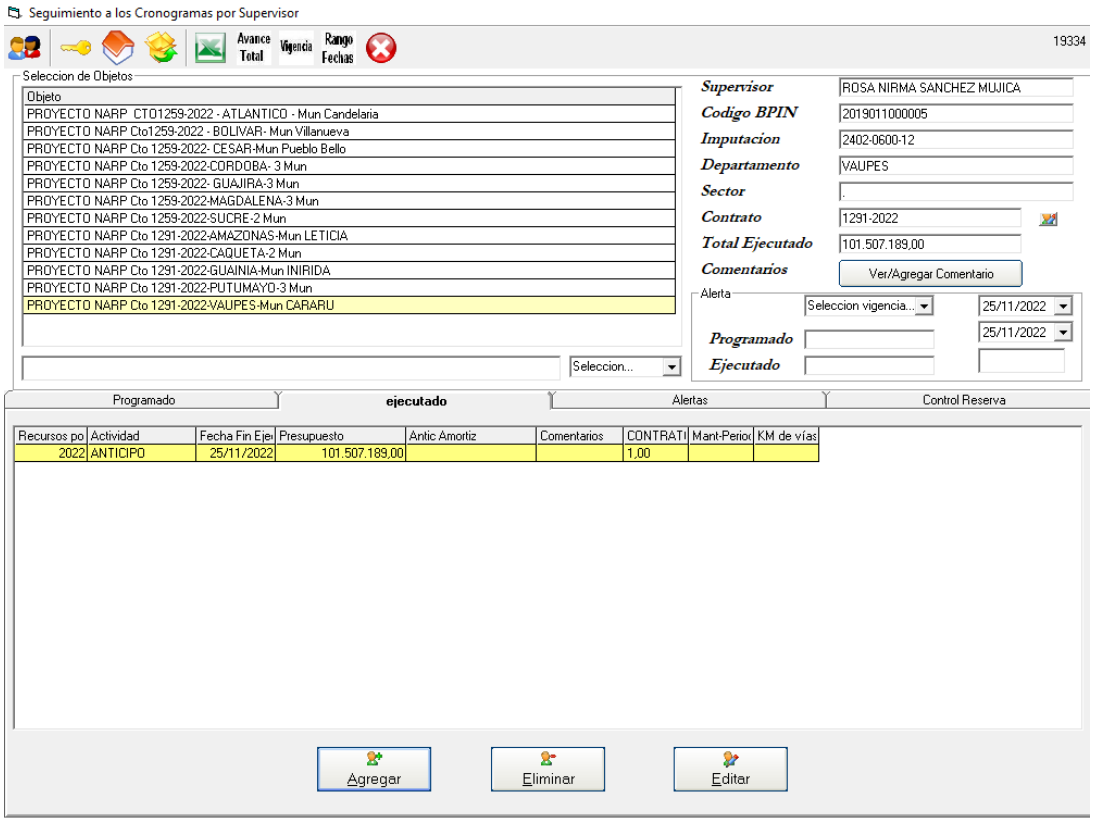


Para: Rosa Nirma Sanchez
CC: Florangela Parra Chanchi
Asunto: RE: SOLICITUD REPORTES Y CERTIFICADOS DE ACTUALIZACION SICO: Contratos de obra: 1259-22, 1291-22, 1178-22, 1187-22

Buen día Ingeniera:

Dando respuesta a su solicitud le informo que una vez revisado el contrato

1291 de 2022 se encuentra el aplicativo al día, por tal motivo tiene mi Vo.Bo.

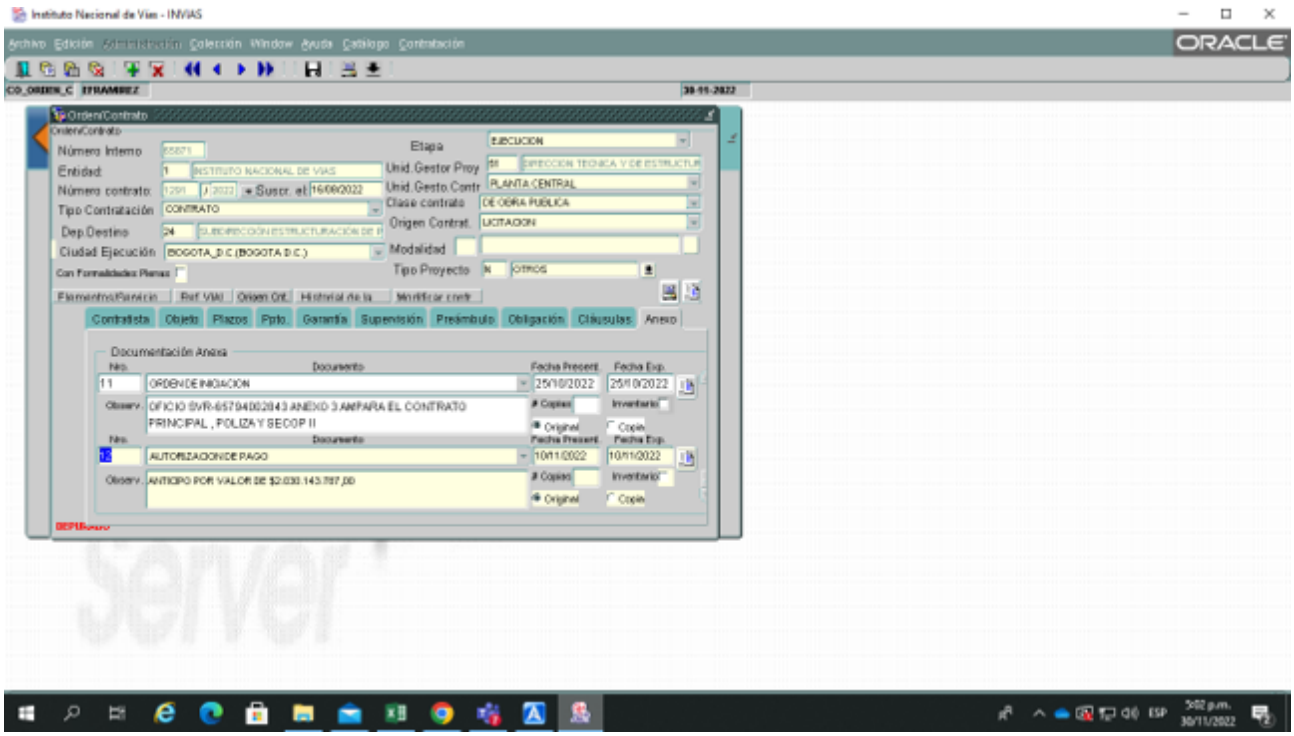

EDISON RAMIREZ GARCIA
CONTRATISTA
Subdirección de Vías Regionales
Calle 25g # 73b 90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Bogotá D.C.

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

De: Rosa Nirma Sanchez
Enviado: miércoles, 30 de noviembre de 2022 12:45 p. m.
Para: Edison Francisco Ramirez Garcia
CC: Florangela Parra Chanchi
Asunto: SOLICITUD REPORTES Y CERTIFICADOS DE ACTUALIZACION SICO: Contratos de obra: 1259-22, 1291-22, 1178-22, 1187-22

Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No OAP 95443

Fecha
25/11/2022
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1754328

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES PATRICIA INES MORALES PADRON
De	GERMAN PEÑA MATEUS
De Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	GUILLERMO TORRES HERNANDEZ

Información del Documento

■ **Referencia**	Respuesta del Memorando Individual No. SVR 94785 24/11/2022

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Ing. Patricia, cordial saludo.

En atención al memorando del asunto, a través del cual solicita tramitar Vigencias Futuras de contratos en ejecución, de manera atenta le informo que para dicho trámite se debe surtir la siguiente gestión:

No.	Actividad	Duración Estimada (Días Hábiles)
1	Remisión de información por parte de la unidad ejecutora respectiva a través de memorando.	1
2	Revisión, análisis y cargue de la información a través del módulo Banco de Proyectos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) por parte de OAP del Invias.	2
3	Revisión y análisis de la información remitida a través del módulo Banco de Proyectos del SUIFP y emisión de Control de Viabilidad Técnico por parte de la OAP del Ministerio de Transporte (MT)	2
4	Revisión y análisis de la información remitida a través del módulo Banco de Proyectos del SUIFP y emisión de Control Posterior de Viabilidad Técnico por parte de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible (DIES) revisó la	2
5	Solicitud de Concepto Técnico-Económico y de la solicitud de Concepto Previo al MT por parte de la OAP del Invias.	1
6	Emisión del Concepto Técnico-Económico de la Solicitud de Concepto Previo por parte del MT	3

7	Solicitud de Concepto Previo Favorable a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP) del DNP por parte de la OAP de Invias.	1
8	Emisión del Concepto Previo Favorable por parte de la DIFP-DNP.	1
9	Solicitud de la Autorización de la Vigencia Futura al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) por parte de la OAP de Invias.	1
10	Emisión de la Autorización de la Vigencia Futura por parte del MHCP.	1
Duración Total Estimada		**15**

En ese sentido, y teniendo en cuenta la Circular No. 033 del 18 de noviembre de 2022, mediante la cual la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece los criterios que se deben tener en cuenta para el cierre de la vigencia 2022 e inicio de la ejecución de la vigencia 2023, se definió como fecha límite para presentar solicitudes autorizaciones de Vigencias Futuras el día viernes 9 de diciembre de 2022.

Por lo mencionado, esta Oficina considera que los tiempos son muy justos para cumplir con las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda

Atentamente,

German Peña Mateus
Jefe Oficina Asesora de Planeación

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Historia de Correcciones

Fecha	Creador
25/11/2022 03:48:16 pm	GERMAN PEÑA MATEUS
25/11/2022 03:47:51 pm	GERMAN PEÑA MATEUS
25/11/2022 03:48:24 pm	GERMAN PEÑA MATEUS

Documento Origen

Documento Origen No. SVR 94785

Historia del documento
