Bogotá, 26 de octubre de 2022

CSJ-ENT-PC-14-2022

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Unidad de Infraestructura Física - DEAJ
Atn: ARQ.JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS
Supervisor del contrato
jpinerop@deaj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Contrato 103 DE 2022 Cuyo objeto es "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la Entidad con el objeto de "Realizar la construcción de la sede judicial del municipio de Puerto Carreño –Vichada"

CUMPLIDO TECNICO

CONTRATO DE OBRA Nº. 084 DE 2022

OBJETO: "Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada).

El suscrito Director de Interventoría GERMAN GARZON SALCEDO, CERTIFICA que el contratista BERMUDEZ SAS, identificado con NIT. 816.000.531-1, quien ejecuta el mencionado contrato, ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales y, de todas las funciones técnicas, financieras, administrativas, jurídicas y contables exigidas en el contrato, por lo cual se autoriza el pago del ACTA PARCIAL N° 01, correspondiente a SESENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE INCLUIDO IVA ($60.111.793), valor en el cual ya está amortizado el anticipo, de acuerdo a la Factura de Venta

El presente cumplido se expide a los 26 días del mes de octubre de 2022.



ARQ. GERMÁN GARZÓN SALCEDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGEALDEIC
CONTRATO 103 DE 2022

Realizo: GGS
Reviso: DR
Aprobó: DR

Bermudez SAS
Nit. 816.000.531-1

BER-133-22
26 de Octubre de 2022

SRS
CONSORCIO INGEALDEIC
Atn. ARQ. GERMAN GARZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
csj.interventoria@ingeplan.co

ASUNTO: REMISION ACTA 1 PARA TRAMITE

Para su respectiva autorización remitimos el Acta Parcial de obra N° 01 de fecha 26 de octubre de 2022, descontando la amortización del anticipo, resultando un valor de SESENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE INCLUIDO IVA ($60.111.793).

Se anexan los siguientes documentos :

1 Factura de venta
2 Resolución de facturación
3 Acta de recibo obra con memorias anexas
4 Certificación de consignación de rendimientos
5 Informe de inversión y amortización del anticipo
6 Certificado representante legal pago seguridad social
7 Certificación bancaria
8 Informe de Laboratorio

Atentamente,

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Director de Obra
BERMUDEZ SAS

116-420. Teléfono 57 2 3765950. Cali, Valle del Cauca, Colombia.
Email: gerencia@bermudezycia.com



BERMUDEZ SAS
NIT: 816000531-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Tel. 3765950
Email. bermudezycia@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764038465438 válida desde 2022-10-25 hasta 2023-10-25 rango desde FEL1 hasta FEL20.
No grandes contribuyentes - No autorretenedores
Agente de retencion a titulo de renta

Cliente: RAMA JUDICIAL
NIT: 800093816
Dirección: CL 72796, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6012127389
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 24/11/2022
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEL3
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:31:49
FECHA FIRMADO: 23/11/2022 12:31:50

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	11	2022	23	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$97.945.692,00		0,00	$97.945.692,00
2	N/A	IMPREVISTOS 3%	WSD	1,00	$2.938.371,00		0,00	$2.938.371,00
3	N/A	ADMINISTRACION 17%	WSD	1,00	$16.650.768,00		0,00	$16.650.768,00
4	04	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$4.897.285,00	19,00	0,00	$4.897.285,00

Notas:
#$27-01-02-000;CONTRATO084-2022;jpinerop@deaj.ramajudicial.gov.co#$

Anticipos:
Monto: $63.250.807,00 **Fecha:** 20/09/2022, **Fecha de recepción:** 20/09/2022, **No. Pago:** 1, **Instrucciones de pago:** AMORTIZACION DE ANTICIPOACTA 1 CONT-084-2022

SON: (ciento veintitres millones trescientos sesenta y dos mil seiscientos pesos)
CUFE **: abb9863c41ab5bc477a6ae5810920023e7baeff8ee470396b66686723e5adc075644f4568d64002322a4a7d8b4a285d9**

Subtotal:	$122.432.116,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$930.484,00
Total:	$123.362.600,00
Anticipos:	$63,250,807.00
Neto Factura:	$60.111.793,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.897.285,00	19,00%	$930.484,00

Firma Digital: VJkKMm7ibfH+EOOhlAhoea7cCbtOcXK+0jd9k+AVUA/h1MCaVcAEHXnR+gejlrTL
6GQSYemOzV+mAEeuB3/nJpaAaRiR1UnBsuyhSt+1IKATzCsWrA
qF//2LCABP+UZc aUrAjzguniqHu6Ta06yMyNbyR9PP365Ob4jYhPbsdb578sz5W/RCUHy0u7Rq0g6G o1qOchG37JsmN9o1GZ3qK8oYCQHXjg/lXap
6U905JEbyOctq6Qj77SNTWFm9XMBf 25IPAHe2n7Yh677HP1INCLerbgP1ROdry8xrHby4zW1Dr9hYkpasr+5dQpzYpCmQ mUnWdM7Yo/1R8GoCDyin
0A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764038465438

(415)7707212489984(8020) 001876403846543 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 6 0 0 0 5 3 1	1				

11. Razón social
BERMUDEZ S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CL 2 116 420 CA 55

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-10-25 / 05:42:08 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BERMUDEZ OSORIO CARLOS EDUARDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 16363838 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización BERMUDEZ S.A.S.

997. Fecha formalización 2022-10-25 17:42:08

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764038465438

(415)7707212489984(8020) 001876403846543 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 6 0 0 0 5 3 1	1				

11. Razón social
BERMUDEZ S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	BERMUDEZ S.A.S. VICHADA CL 23 6 35	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEL	1	20	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

RAMA JUDICIAL

CONTRATO DE OBRA No. 084 DE 2022

OBJETO: REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

ACTA DE OBRA	1	**VR.INICIAL OBRA**	$ 4.929.242.188	**ANTICIPO**	**50%**	**$ 2.464.621.094**	**FECHA INICIACIÓN**	19 - JULIO- 2022
DEL MES DE	AGOSTO DE 2022	**VR. ADICIONAL No. 01**	$ -	AMORTIZACIÓN ACTA No.1		$ 70.898.993	**PLAZO INICIAL**	HASTA 31 DIC 2022
		VR. ADICIONAL No. 02		AMORTIZACIÓN ACTA No.2		$ -	**ADICIONAL EN PLAZO No.**	
CONTRATISTA	BERMUDEZ SAS	**VR. ADICIONAL No. 03**		AMORTIZACIÓN ACTA No.3		$ -	**ADICIONAL EN PLAZO No.**	
NIT	816.000.531-1			AMORTIZACIÓN ACTA No.4		$ -	**PLAZO TOTAL**	HASTA 31 DIC 2022
				AMORTIZACIÓN ACTA No.5		$ -	**FECHA SUSPENSIÓN No.**	
INTERVENTOR	CONSORCIO INGEALDEIC			AMORTIZACIÓN ACTA No.6		$ -	**FECHA REINICIACIÓN No.**	
NIT	901.605.438-8			AMORTIZACION ACTA No.7		$ -		
LOCALIZACION	PUERTO CARREÑO	**VR. TOTAL**	**$ 4.929.242.188**	**SALDO POR AMORTIZAR**		**$ 2.393.722.101**	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL**	HASTA 31 DIC 2022

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			OBRA EJECUTADA							
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
OBRAS PRELIMINARES	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (EJES, ABSCISADO Y DETALLES, COTAS). ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.	M2	525,00	$ 2.913	$ 1.529.325	0	525,00	$ 1.529.325	525,00	$ 1.529.325	0	$ -	525,00	$ 1.529.325	100%	
OBRAS PRELIMINARES	CERRAMIENTO PROVISIONAL TIPO 2: TUBOS RECTANGULARES Y COLUMNAS DE 50 X 25 MM CALIBRE 16, PINTADOS CON UNA MANO DE ANTICORROSIVO NEGRO. LÁMINA EN TEJA METÁLICA GALVANIZADA, TRAPEZOIDAL 2.44 M X 0.86 M, ESPESOR CALIBRE 28 O 30, PINTADA EN EL EXTERIOR CON UNA MANO DE IMPRIMANTE Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCA BRILLANTE, ALTURA 2.44 M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE).	M2	228,00	$ 110.981	$ 25.303.668	0	228,00	$ 25.303.668		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%	
OBRAS PRELIMINARES	DESMONTE, DESCAPOTE, EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CMS DE SUELO INCLUYE CARGUE Y RETIRO HASTA SITIO AUTORIZADO. INCLUYE DESMONTE DE CUALQUIER ESPECIE VEGETATIVA (MALEZA) MENOR A 2 METROS Y RETIRO DE TOCONES. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE). NO INCLUYE TALA DE ÁRBOLES MAYORES DE 2 METROS.	M2	525,00	$ 11.528	$ 6.052.200	0	525,00	$ 6.052.200	525,00	$ 6.052.200	0	$ -	525,00	$ 6.052.200	100%	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD HASTA 1.5 M. INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE MATERIAL Y ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MANEJO DE AGUAS. NO INCLUYE ENTIBADO O TABLESTACADO. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE).	M3	443,10	$ 33.362	$ 14.782.702	0	443,10	$ 14.782.702	177,57	$ 5.924.090	0	$ -	177,57	$ 5.924.090	40%	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	RELLENO EN RECEBO CON LA ESPECIFICACIÓN B-200 INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN. INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO.	M3	165,02	$ 69.850	$ 11.526.647	0	165,02	$ 11.526.647	162,75	$ 11.368.088	0	$ -	162,75	$ 11.368.088	99%	
CIMENTACIÓN	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =2.000 PSI/13.79 MPA, PARA SOLADO, COMO SUPERFICIE PROTECTORA ENTRE EL SUELO Y LOS HIERROS DE LAS ESTRUCTURAS EN CONTACTO CON ÉL. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN.	M3	5,05	$ 420.954	$ 2.125.818	0	5,05	$ 2.125.818	1,38	$ 580.917	0	$ -	1,380	$ 580.917	27%	
CIMENTACIÓN	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA, PARA ZAPATAS Y PEDESTALES DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	9,35	$ 795.041	$ 7.433.633	0	9,35	$ 7.433.633	8,80	$ 6.996.361	0	$ -	8,80	$ 6.996.361	94%	
CIMENTACIÓN	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =3.000 PSI/20.68 MPA, CICLÓPEO, (60%) CONCRETO Y (40%) ROCAS TAMAÑO MAXIMO 10" INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	31,88	$ 518.120	$ 16.517.666	0	31,88	$ 16.517.666	27,50	$ 14.248.300	0	$ -	27,50	$ 14.248.300	86%	
CIMENTACIÓN	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA, PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	23,42	$ 820.838	$ 19.224.026	0	23,42	$ 19.224.026		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%	
ESTRUCTURAS	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA PARA CONTRAPISO. INCLUYE POLIETILENO CALIBRE NO. 4 NEGRO EN DOBLE CAPA EN TODA EL ÁREA, COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN.	M3	40,35	$ 723.536	$ 29.194.678	0	40,35	$ 29.194.678		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%	
ESTRUCTURAS	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA COLUMNAS. TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2". INCLUYE FORMALETA DE MADERA Y RETIRO DE ESTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	29,55	$ 902.738	$ 26.675.908	0	29,55	$ 26.675.908		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%	
ESTRUCTURAS	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA VIGAS AÉREAS. INCLUYE CASETÓN DE FIBRA DE VIDRIO O METÁLICO, NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.	M3	72,09	$ 840.384	$ 60.583.283	0	72,09	$ 60.583.283		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%	

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
ESTRUCTURAS	CONCRETO DE 3.000 PSI/20,68 MPA PARA VIGA CINTA INCLUYE FORMALETA DE MADERA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE FORMALETA.	M3	3,92	$ 805.002	$ 3.155.608	0	3,92	$ 3.155.608		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ESTRUCTURAS	CONCRETO DE 4.000 PSI/27,58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA. SIN IMPERMEABILIZAR.NO SE ACEPTA CASETÓN DE ICOPOR, NO SE ACEPTA CASETÓN DE MADERA, NO SE ACEPTA CASETÓN DE GUADUA. INCLUYE FORMALETA EXTERIOR CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE CASETÓN.	M3	140,59	$ 796.990	$ 112.048.824	0	140,59	$ 112.048.824		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ESTRUCTURAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V - 15 PARA JUNTAS PARA TANQUE	ML	41,71	$ 40.009	$ 1.668.775	0	41,71	$ 1.668.775		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
TANQUES DE AGUA POTABLE	CONCRETO DE 4.000 PSI/27,58 MPA PARA PLACA MACIZA DE CONTRAPISO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	28,87	$ 727.355	$ 20.998.739	0	28,87	$ 20.998.739		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
TANQUES DE AGUA POTABLE	CONCRETO DE 4.000 PSI/27,58 MPA PARA PANTALLAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	20,03	$ 884.654	$ 17.719.620	0	20,03	$ 17.719.620		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
TANQUES DE AGUA POTABLE	CONCRETO DE 4.000 PSI/27,58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	4,33	$ 817.142	$ 3.538.225	0	4,33	$ 3.538.225		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ESTRUCTURAS	CONCRETO DE 3.000 PSI/20,68 MPA PARA COLUMNAS. TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2". INCLUYE FORMALETA DE MADERA Y RETIRO DE ESTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	26,51	$ 859.783	$ 22.792.847	0	26,51	$ 22.792.847		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
POZOS SEPTICOS	CONCRETO DE 4.000 PSI/27,58 MPA PARA PLACA MACIZA DE CONTRAPISO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	3,52	$ 727.355	$ 2.560.290	0	3,52	$ 2.560.290		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
POZOS SEPTICOS	CONCRETO DE 4.000 PSI/27,58 MPA PARA PANTALLAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	9,01	$ 884.654	$ 7.970.733	0	9,01	$ 7.970.733		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
POZOS SEPTICOS	CONCRETO DE 4.000 PSI/27,58 MPA PARA PLACA MACIZA AÉREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, LLUVIAS Y SÉPTICAS. IMPERMEABILIZADO. . TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2 ". INCLUYE FORMALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	2,11	$ 817.142	$ 1.724.170	0	2,11	$ 1.724.170		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ESCALERAS	CONCRETO DE 3.000 PSI/20,68 MPA PARA MESONES Y PASOS DE ESCALERAS. INCLUYE FORMALETA EN CUALQUIER MATERIAL. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE FORMALETA.	M3	3,35	$ 792.079	$ 2.653.465	0	3,35	$ 2.653.465		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ESTRUCTURAS	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	35047,39	$ 7.267	$ 254.689.383	0	35047,39	$ 254.689.383	6009,32	$ 43.669.728	0	$ -	6.009,32	$ 43.669.728	17%
ESTRUCTURAS	REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN CIMENTACIÓN, PANTALLAS, PLACA CONTRAPISO Y PLACA CUBIERTA. INCLUYE ALAMBRE, CORTE Y FIJACIÓN CON SEPARADORES Y CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL ADICIONAL DONDE SE REQUIERA.	KG	930,01	$ 7.355	$ 6.840.224	0	930,01	$ 6.840.224		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
CARPINTERÍA METÁLICA -VIDRIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN PANEL PERFORADO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18. SEGÚN DISEÑO	m2	248,44	$ 308.526	$ 76.650.199	0	248,44	$ 76.650.199		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ESCALERAS	ESTRUCTURA METALICA PARA ESCALERA VER DETALLE	KG	8651,44	$ 12.447	$ 107.684.474	0	8651,44	$ 107.684.474		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
CARPINTERÍA METÁLICA -VIDRIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VEHICULAR EN TUBERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 40X20MM ESP. 2,5MM, INCLUYE CHAPA PARA EXTERIOR Y PORTACANDADO . ACABADO SEGÚN DISEÑO	m2	12,40	$ 197.350	$ 2.447.140	0	12,40	$ 2.447.140		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
CARPINTERÍA METÁLICA -VIDRIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100X40MM ESP. 2,5MM . ACABADO SEGÚN DISEÑO	M2	1,80	$ 275.678	$ 496.220	0	1,80	$ 496.220		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
CARPINTERÍA METÁLICA -VIDRIO	PUERTA METALICA EN PERSIANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE MARCO METALICO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 GALVANIZADO EN COLOR NEGRO MATE, CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE. CERROJO DE SEGURIDAD CON PASADORES EN ACERO. LLAVE EN EL EXTERIOR E INTERIOR DIMENSIONES ACABADO SEGÚN DETALLE.	M2	24,80	$ 339.199	$ 8.412.135	0	24,80	$ 8.412.135		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
MUROS Y DIVISIONES	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 5. INCLUYE MORTERO DE PEGA, REPLANTEO DE UBICACIÓN, CIMBRADO. EL VALOR INCLUYE LINEALES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.	M2	1077,69	$ 41.735	$ 44.977.392	0	1077,69	$ 44.977.392		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PAÑETES, ENCHAPES Y MESONES	PAÑETE PARA MUROS, NO IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 3 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.	M2	1413,21	$ 28.238	$ 39.906.224	0	1413,21	$ 39.906.224		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PAÑETES, ENCHAPES Y MESONES	PAÑETE PARA MUROS, IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 3 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.	M2	780,13	$ 30.330	$ 23.661.343	0	780,13	$ 23.661.343		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ESTUCOS Y PINTURAS	PINTURA PARA MUROS INTERIORES SOBRE PAÑETE, ESTUCO, PLACA DE YESO, FIBROCEMENTO. 2 MANOS + 1 MANO FINAL DE ENTREGA, CUMPLE NTC PARA PINTURA DE INTERIORES. NO INCLUYE ESTUCO. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PINTADA.	M2	702,39	$ 9.017	$ 6.333.451	0	702,39	$ 6.333.451		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
ESTUCOS Y PINTURAS	ESTUCO PARA MUROS NO IMPERMEABLE LISO EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE ESTUCADA.	M2	702,39	$ 10.770	$ 7.564.740	0	702,39	$ 7.564.740		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ESTUCOS Y PINTURAS	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES).	m2	54,96	$ 37.980	$ 2.087.381	0	54,96	$ 2.087.381		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ESTUCOS Y PINTURAS	PINTURA PARA MUROS EXTERIORES SOBRE PAÑETE, ESTUCO, PLACA DE YESO, FIBROCEMENTO. 2 MANOS + 1 MANO FINAL DE ENTREGA, CUMPLE NTC PARA PINTURA DE FACHADAS. NO INCLUYE ESTUCO. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PINTADA.	M2	1030,84	$ 9.482	$ 9.774.425	0	1030,84	$ 9.774.425		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
CIELO RASOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL. DIMENSIONES APROXIMADAS (60 CM X 60 CM), ESPESOR APROXIMADO DE LA LÁMINA= 5.0 A 6.5 MM. INCLUYE PERFILERIA AUTOENSAMBLE Y ANGULO PERIMETRAL AUTOENSAMBLE.	M2	787,79	$ 77.010	$ 60.667.708	0	787,79	$ 60.667.708		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PISOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MORTERO AFINADO CON LLANA DE MADERA, RELACIÓN 1:3. INCLUYE ALISTADO DE SUPERFICIE Y NIVELACIÓN. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL VALOR DE MEDIDA SERÁ EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO.	M3	34,87	$ 620.154	$ 21.624.770	0	34,87	$ 21.624.770		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PISOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MORTERO AFINADO CON LLANA DE MADERA, IMPERMEABILIZADO EN RELACIÓN 1:3. INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO TOXEMENT 1A O SIKA 1 O SIMILAR. INCLUYE ALISTADO DE SUPERFICIE Y NIVELACIÓN. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL VALOR DE MEDIDA SERÁ EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO.	M3	4,90	$ 647.434	$ 3.172.427	0	4,90	$ 3.172.427		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PISOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MORTERO AFINADO CON LLANA METÁLICA Y/O ALLANADORA METÁLICA, RELACIÓN 1:3. INCLUYE ALISTADO DE SUPERFICIE Y NIVELACIÓN. NO INCLUYE ENDURECEDOR. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL VALOR DE MEDIDA SERÁ EL VOLUMEN EFECTIVAMENTE CONSTRUIDO.	M3	12,03	$ 664.453	$ 7.993.370	0	12,03	$ 7.993.370		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PISOS	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =3.000 PSI/20.68 MPA, PARA ANDEN. INCLUYE ESCOBILLADO, FILOS Y Y DILATACIONES. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN.	M3	9,81	$ 654.155	$ 6.417.261	0	9,81	$ 6.417.261		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PISOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO (ESPESOR ENTRE 8,0 MM Y 10 MM). TRÁFICO PESADO. INCLUYE MORTERO PARA INSTALACIÓN TIPO PEGACOR O SIMILAR Y BOQUILLA. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES E INSTALACION DE WIN METALICO EN DONDE SE REQUIERA. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.	M2	766,34	$ 88.438	$ 67.773.577	0	766,34	$ 67.773.577		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	79,20	$ 45.142	$ 3.575.246	0	79,20	$ 3.575.246		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 3". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	79,20	$ 34.238	$ 2.711.650	0	79,20	$ 2.711.650		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA LLUVIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	15,50	$ 18.790	$ 291.245	0	15,50	$ 291.245		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	CAJA DE INSPECCIÓN, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE DE DIMENSIONES INTERIORES 80X80X80 CM, SOBRE SOLADO DE CONCRETO SIMPLE F´C=210 KG/CM² (21 MPA), PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE CONCRETO, PAÑETADA Y PULIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN OBRA, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, DOSIFICACIÓN 1:3 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON UNA TAPA EN CONCRETO F´C=210 KG/CM² (21 MPA), ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y SELLADA HERMÉTICAMENTE CON MORTERO DE CEMENTO. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN	UNIDAD	1,00	$ 394.802	$ 394.802	0	1,00	$ 394.802		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA POTABLE	REGISTRO TIPO RED WHITE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UNIDAD	5,00	$ 138.740	$ 693.700	0	5,00	$ 693.700		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA POTABLE	REGISTRO RED WHITE 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UNIDAD	2,00	$ 168.944	$ 337.888	0	2,00	$ 337.888		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA POTABLE	REGISTRO RED WHITE 1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UNIDAD	4,00	$ 228.564	$ 914.256	0	4,00	$ 914.256		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 3". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	10,80	$ 34.238	$ 369.770	0	10,80	$ 369.770		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA LLUVIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUAS SANITARIAS DE 2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	66,60	$ 18.790	$ 1.251.414	0	66,60	$ 1.251.414		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 9 DE 1/2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ARENA, RELLENO COMPACTADO.	ML	28,50	$ 7.851	$ 223.754	0	28,50	$ 223.754		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
INSTALACIONES AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 3/4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	6,80	$ 10.401	$ 70.727	0	6,80	$ 70.727		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 1 1/4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	34,00	$ 17.222	$ 585.548	0	34,00	$ 585.548		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 1 1/2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	13,60	$ 14.785	$ 201.076	0	13,60	$ 201.076		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	38,00	$ 19.644	$ 746.472	0	38,00	$ 746.472		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA POTABLE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 3". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	ML	50,00	$ 38.487	$ 1.924.350	0	50,00	$ 1.924.350		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - CONEXIÓN EXTERNA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-276 (EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE O ZONA DURA, BASE EN RECEBO COMÚN, PLACA EN CONCRETO, LADRILLO COMÚN, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, MARCO Y TAPA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	3,00	$ 2.203.762	$ 6.611.286	0	3,00	$ 6.611.286		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - CONEXIÓN EXTERNA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 4" NORMA CODENSA CS 400. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 735.916	$ 735.916	0	1,00	$ 735.916		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - RED INTERNA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO INTERIOR PARA CALIBRES DE CABLES ENTRE 2 - 3/0 - JUEGO X 3 UNIDADES MARCA 3M O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 739.532	$ 739.532	0	1,00	$ 739.532		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - CONEXIÓN EXTERNA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLES ENTRE 2 - 3/0 - JUEGO X 3 UNIDADES MARCA 3M O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 1.313.899	$ 1.313.899	0	1,00	$ 1.313.899		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - CONEXIÓN EXTERNA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS - PARA CANALIZACIÓN DE 6 Ø 6" TIPO TDP- EN ZONA DURA (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA DE PEÑA, RELLENO BASE GRANULAR B-600, BANDA PLÁSTICA Y CONCRETO PARA PAVIMENTO). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	50,00	$ 228.115	$ 11.405.750	0	50,00	$ 11.405.750		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - CONEXIÓN EXTERNA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION AISLADA CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR XLPE, 15 KV, 120 MM2, PANTALLA EN HILOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	210,00	$ 46.298	$ 9.722.580	0	210,00	$ 9.722.580		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO- AISLADA EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC 62271-1 Y 62271-200, TIPO 8DJH EN CALIDAD SIEMENS O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES, VN: 17.5 KV, IN: 630 A, ICC: MIN 25KA (1S), FRECUENCIA 60 HZ, CLASIFICACIÓN IAC-AFLR, METAL CLAD, CUBA EN ACERO INOXIDABLE, TIPO INTERIOR, OPERACIÓN MANUAL Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE TENSIÓN, CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE TRES POSICIONES (CONECTADO, DESCONECTADO-TIERRA), ACONDICIONADO CON ENCLAVAMIENTOS LÓGICOS MECÁNICOS Y DISPOSITIVOS DE INMOVILIZACIÓN, GRADO DE PROTECCIÓN DE MEDIA TENSIÓN IP65, BAJA TENSIÓN IP3X Y ENVOLVENTE CELDAS PROTECCIÓN MÍNIMO IP2X, TERMINALES CONECTADORES TIPO T ACORDE AL OR PARA EL MEDIDOR PARA LOS CABLES EN 17.5 KV, PUESTA A TIERRA DE LA CELDA, ELEMENTOS CALEFACTORES CONTROLADOS POR TERMOSTATO, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO ALAMBRADO, MANUALES DE OPERACIÓN DE LA CELDA, MANUALES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBESTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS TÉCNICOS EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	2,00	$ 33.762.841	$ 67.525.682	0	2,00	$ 67.525.682		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 4" NORMA CODENSA CS 400. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 405.219	$ 405.219	0	1,00	$ 405.219		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 4, TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H DE 75 KVA, (VPRIM 11.4 KV - VSEC 208/120 V) INCLUYE CELDA PARA TRANSFORMADOR, NORMA NTC, 60 HZ, TRES (3) DPS 12 KV – 10 KA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 26.128.298	$ 26.128.298	0	1,00	$ 26.128.298		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 6, GRUPO DE MEDIDA DE TRES ELEMENTOS NORMA CODENSA AE319 (MEDIDA RED NORMAL), INCLUYE 3 TC'S Y 3 TP'S, CLASE 0.5, RANGO 300/5A A 25 VA, MEDIDOR ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA DE 3X300A CON O SIN UNIDAD DE DISPARO SEGÚN LO INDICADO EN PLANOS, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ICC:10KA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	1,00	$ 7.644.875	$ 7.644.875	0	1,00	$ 7.644.875		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 7, GRUPO DE MEDIDA DE TRES ELEMENTOS NORMA CODENSA AE319 (MEDIDA RED NORMAL), INCLUYE 3 TC'S Y 3 TP'S, CLASE 0.5, RANGO 400/5A A 25 VA, MEDIDOR ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA DE 3X400A CON O SIN UNIDAD DE DISPARO SEGÚN LO INDICADO EN PLANOS, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ICC:10KA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 4.511.459	$ 4.511.459	0	1,00	$ 4.511.459		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA STAND-BY 75 KVA, ALTURA DE OPERACIÓN 2600 MSNM APROX, TANQUE PARA COMBUSTIBLE, CABINA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 69.012.778	$ 69.012.778	0	1,00	$ 69.012.778		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESFOGUE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KAV, AISLAMIENTO TÉRMICO, CODOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	10,00	$ 98.442	$ 984.420	0	10,00	$ 984.420		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA (C-EMER), CELDA DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA PARA SISTEMA RCI DE FABRICACIÓN ESPECIAL, EL TABLERO DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA (NO SITIO), PRUEBAS DE ARCO, VER DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	UNIDAD	1,00	$ 71.184.373	$ 71.184.373	0	1,00	$ 71.184.373		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - SUBESTACIÓN ELECTRICA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGD, PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 3X300A, ICC 10KA, NIVEL DE TENSIÓN 208/120V, PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LOS TABLEROS (TN-1, TN-2, TN-3, T-AA, T-AA*, T-UPS-P1, T-UPS-P2, T-UPS-P3),CON MARCA DE TABLERO EN PLACA DE POLICARBONATO CON EL NOMBRE DE LA CELDA Y MARCACIÓN INTERIOR DEL EQUIPO ELÉCTRICO QUE LA COMPONE, PRUEBAS DE ARCO EN TABLERO, EL TABLERO DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA (NO EN SITIO), VER DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 86.423.535	$ 86.423.535	0	1,00	$ 86.423.535		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30X30 CM, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	4,00	$ 398.210	$ 1.592.840	0	4,00	$ 1.592.840		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" X 2.40 M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	4,00	$ 171.867	$ 687.468	0	4,00	$ 687.468		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE NO. 2/0 AWG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	90,00	$ 37.616	$ 3.385.440	0	90,00	$ 3.385.440		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA DE 60 CM, PARARRAYO PUNTA FRANKLIN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	14,00	$ 143.461	$ 2.008.454	0	14,00	$ 2.008.454		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO NO. 1/0 EN ALUMINIO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	350,00	$ 8.704	$ 3.046.400	0	350,00	$ 3.046.400		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ACOMETIDAS CELDAS PRINCIPALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (TRANSFORMADOR-CELDA DE MEDIDA NO. 6-TGD) (2X(3N°250(F) + 1N°250(N)) + 1N°6(T)) THHN-AWG, CANALIZACIÓN POR CÁRCAMO, VER DETALLE EN PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20,00	$ 496.126	$ 9.922.520	0	20,00	$ 9.922.520		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ACOMETIDAS CELDAS PRINCIPALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (PLANTA-C-EMER-TGD) (2X(3N°250(F) + 1N°250(N)) + 1N°6(T)) THHN-AWG, CANALIZACIÓN POR CÁRCAMO, VER DETALLE EN PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20,00	$ 496.126	$ 9.922.520	0	20,00	$ 9.922.520		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ACOMETIDAS CELDAS PRINCIPALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (TRANSFORMADOR-CELDA DE MEDIDA NO. 7-C-EMER) (3N°1/0 (F) + 1N°1/0 (N) + 1N°6(T)) THHN-AWG, CANALIZACIÓN DUCTO PVC 2", VER DETALLE EN PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	20,00	$ 158.045	$ 3.160.900	0	20,00	$ 3.160.900		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1,00	$ 773.141	$ 773.141	0	1,00	$ 773.141		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	6,00	$ 622.458	$ 3.734.748	0	6,00	$ 3.734.748		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS TRIFASICO, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	2,00	$ 258.661	$ 517.322	0	2,00	$ 517.322		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	65,00	$ 16.290	$ 1.058.850	0	65,00	$ 1.058.850		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	10,00	$ 94.022	$ 940.220	0	10,00	$ 940.220		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	2,00	$ 65.005	$ 130.010	0	2,00	$ 130.010		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X40A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1,00	$ 76.739	$ 76.739	0	1,00	$ 76.739		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X50A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1,00	$ 100.181	$ 100.181	0	1,00	$ 100.181		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X60A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1,00	$ 100.253	$ 100.253	0	1,00	$ 100.253		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X63A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1,00	$ 100.253	$ 100.253	0	1,00	$ 100.253		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	3,00	$ 157.820	$ 473.460	0	3,00	$ 473.460		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X25A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	8,00	$ 157.820	$ 1.262.560	0	8,00	$ 1.262.560		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X40A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	2,00	$ 157.820	$ 315.640	0	2,00	$ 315.640		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X50A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	2,00	$ 157.820	$ 315.640	0	2,00	$ 315.640		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X80A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1,00	$ 157.820	$ 157.820	0	1,00	$ 157.820		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X125A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1,00	$ 349.135	$ 349.135	0	1,00	$ 349.135		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ALIMENTADORES Y TABLEROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X150A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UNIDAD	1,00	$ 349.135	$ 349.135	0	1,00	$ 349.135		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ACOMETIDAS CELDAS PRINCIPALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO, INCLUYE: - ACOMETIDA 3N°4(F) + 1N°4(N) + 1N°10(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERÍA EMT 1 X Ø 2". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	25,00	$ 294.281	$ 7.357.025	0	25,00	$ 7.357.025		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ACOMETIDAS CELDAS PRINCIPALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO, INCLUYE: - ACOMETIDA 3N°6(F) + 1N°6(N) + 1N°10(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERÍA EMT 1 X Ø 1 ". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	100,00	$ 52.841	$ 5.284.100	0	100,00	$ 5.284.100		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ACOMETIDAS CELDAS PRINCIPALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO , INCLUYE: - ACOMETIDA 3N°8(F) + 1N°8(N) + 1N°10(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERIA EMT 1 X Ø 1 ". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	100,00	$ 42.180	$ 4.218.000	0	100,00	$ 4.218.000		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ACOMETIDAS CELDAS PRINCIPALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO, INCLUYE: - ACOMETIDA 3N°2(F) + 1N°2(N) + 1N°8(T), HF-FR-LS-CT, DUCTERIA EMT 1 X Ø 2 ". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	15,00	$ 113.882	$ 1.708.230	0	15,00	$ 1.708.230		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN EN CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1Ø1/2" (10 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	19,00	$ 148.877	$ 2.828.663	0	19,00	$ 2.828.663		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN EN CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Ø1/2" (10 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	294,00	$ 191.812	$ 56.392.728	0	294,00	$ 56.392.728		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES ULTRASÓNICOS PARA MONTAJE EN TECHO, COBERTURA180° - 46.45 M² MÍNIMO, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 40 KHZ MÍNIMO, CALIDAD LEVITON O SUPERIOR, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1Ø1/2" (1 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	23,00	$ 357.654	$ 8.226.042	0	23,00	$ 8.226.042		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN SENCILLO EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1@1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	19,00	$ 98.834	$ 1.877.846	0	19,00	$ 1.877.846		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN DOBLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1@1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	7,00	$ 144.858	$ 1.014.006	0	7,00	$ 1.014.006		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN TRIPLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1@1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	7,00	$ 192.004	$ 1.344.028	0	7,00	$ 1.344.028		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN DOBLE CONMUTABLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1@1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	2,00	$ 149.751	$ 299.502	0	2,00	$ 299.502		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN TRIPLE CONMUTABLE EN CALIDAD LEGRAND O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, CABLE NO. 12 AWG CABLE DE COBRE HFFR LS CT AWG EN TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT DE 1@1/2" (5 MTS). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	4,00	$ 192.004	$ 768.016	0	4,00	$ 768.016		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED DE EMERGENCIA, 2 FAROS, AUTONOMÍA DE ENERGÍA POR 3 HORAS, MÍNIMO 200 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP 20. INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE	UNIDAD	85,00	$ 121.214	$ 10.303.190	0	85,00	$ 10.303.190		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO PANEL REDONDO DE 18W, PARA INCRUSTAR, CHASIS EN ALUMINIO+ PC, MÓDULO LED DE 3W 3000K, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 100-277VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	15,00	$ 95.832	$ 1.437.480	0	15,00	$ 1.437.480		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO PANEL REDONDO DE 18W, PARA INCRUSTAR, CHASIS EN ALUMINIO+ PC, MÓDULO LED DE 18W 4000K, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 100-240VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	21,00	$ 81.281	$ 1.706.901	0	21,00	$ 1.706.901		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED 60 CM X 60 CM +- 1CM, INCRUSTAR O SUSPENDER, CHASIS DE ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO (PMMA) OPAL, MÓDULO LED DE 40W, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 100-277VAC. DURACIÓN 25 MIL A 40 MIL HORAS	UNIDAD	47,00	$ 192.887	$ 9.065.689	0	47,00	$ 9.065.689		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ILUMINACIÓN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO LINEAL 7.5CMX.25CMX1240CM (ANCHOXALTOXLARGO) 32W, PARA DESCOLGAR,CHASIS EN ALUMINIO+ PC, DIFUSOR OPAL EN ACRÍLICO (PMMA), MÓDULO LED DE 32W 4000K, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 85-265VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	79,00	$ 55.906	$ 4.416.574	0	79,00	$ 4.416.574		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - RESPALDO DE ENERGÍA UPS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS TRIFÁSICA DE 10 KVA ONLINE, AUTONOMÍA DE 10 MINUTOS, 60 HZ, NIVEL DE TENSIÓN 208V/110V, ONLINE, MANUALES DE OPERACIÓN, CAPACITACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 54.046.271	$ 54.046.271	0	1,00	$ 54.046.271		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - RED INTERNA	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT PVC 3/4" (INCLUYE TOMA DE LA LINEA BASICA DE LEVITON) PROM 10 M	UNIDAD	83,00	$ 180.075	$ 14.946.225	0	83,00	$ 14.946.225		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - RED INTERNA	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE COLOR NARANJA CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT PVC 3/4" (INCLUYE TOMA DE LA LINEA BASICA DE LEVITON) PROM 10 M	UNIDAD	54,00	$ 180.095	$ 9.725.130	0	54,00	$ 9.725.130		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - RED INTERNA	SALIDA TOMACORRIENTE 4H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 10 AWG. SIN APARATO PROM 4M	UNIDAD	20,00	$ 82.850	$ 1.657.000	0	20,00	$ 1.657.000		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 300X150 MM ACABADO ELECTROZINCADO, BANDEJA CON MALLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS. ACABADO ELECTROZINCADO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	100,00	$ 126.678	$ 12.667.800	0	100,00	$ 12.667.800		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE DATOS, CATEGORIA 6, TUBERIA EMT DE 1/2", CAJA METALICA 5800, FACEPLATE RJ45, DOS PUERTOS, AJUSTE SENCILLO, 2 TOMAS (OUTLETS) JACK RJ45, SUMINISTRO Y ENSAMBLE DE 4 JACKS (EN PUESTO DE TRABAJO Y PATCH PANEL). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (NO INCLUYE CABLE)	UNIDAD	29,00	$ 270.276	$ 7.838.004	0	29,00	$ 7.838.004		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE DATOS DOBLE CATEGORIA 6, TUBERIA EMT DE 1/2", CAJA METALICA 5800, FACEPLATE RJ45, DOS PUERTOS, AJUSTE SENCILLO, 2 TOMAS (OUTLETS) JACK RJ45, SUMINISTRO Y ENSAMBLE DE 4 JACKS (EN PUESTO DE TRABAJO Y PATCH PANEL). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (NO INCLUYE CABLE)	UNIDAD	10,00	$ 522.158	$ 5.221.580	0	10,00	$ 5.221.580		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, 4 PARES, CARACTERIZADO HASTA 650 MHZ MÍN. MONOMARCA, COLOR SEGÚN USO, EN CALIDAD ORTRONICS, PANDUIT O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	2949,00	$ 3.079	$ 9.079.971	0	2949,00	$ 9.079.971		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CERRADO DE PISO 42 UR, DIMENSIÓN ALTO X FRENTE X FONDO (210X61X67) CM APROX., UNA (1) PUESTA TIERRA BARRAJE EN COBRE PARA PUESTA A TIERRA EN "L" 3X3CM DE LONGITUD EN PLATINA DE COBRE DE 1/2"X1/8"- REMACHADO AL PISO DEL GABINETE, EN CALIDAD TRIPPLITE O SUPERIOR. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	63,00	$ 7.382.600	$ 465.103.800	0	63,00	$ 465.103.800		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL CAT6A U/UTP 24 PORTS 1U ANGULADO, EN CALIDAD COMMSCOPE SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	6,00	$ 2.028.186	$ 12.169.116	0	6,00	$ 12.169.116		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DE TV, CABLE BLINDADO RG-59U TV, CERCO ORDINARIO EN CALIDAD 3M O SUPERIOR, SUPLEMENTO CAJA DOBLE REF: 2400 GALV, TOMA COAXIAL TV AMERICANA+DERIV. 75 OHM, TUBO EMT ¾". INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	3,00	$ 64.854	$ 194.562	0	3,00	$ 194.562		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANTENA EXTERNA DE TV DE 10 ELEMENTOS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 164.003	$ 164.003	0	1,00	$ 164.003		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOMETIDA PARA ANTENA EXTERNA DE TV EN TUBERÍA DE 3/4", CABLE BLINDADO RG-59U TV. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 80.599	$ 80.599	0	1,00	$ 80.599		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH POE+ ADMINISTRABLE CAPA 3, 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS, 4 SFP GIGABIT, POTENCIA 370 W, NIVEL DE TENSIÓN 100-240 VAC, FRECUENCIA 50-60HZ, CORRIENTE 2.4 A, DIMENSIÓN 1 U RACK 44X440X290 MM. APROX., MONITOREO SNMP V1, V2C & V3, REF: AT-X230-28GP-10 O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, SOPORTE TÉCNICO POR 3 AÑOS O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	2,00	$ 4.909.662	$ 9.819.324	0	2,00	$ 9.819.324		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE O ZONA DURA, BASE EN RECEBO COMÚN, PLACA EN CONCRETO, LADRILLO COMÚN, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, MARCO Y TAPA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	4,00	$ 1.506.843	$ 6.027.372	0	4,00	$ 6.027.372		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE STRIP TELEFÓNICO DE 100 PARES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 1.802.307	$ 1.802.307	0	1,00	$ 1.802.307		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA (IP-ANALOGA), 4 LINEAS DE COBRE, 8 EXTENSIONES ANALOGAS Y 6 TRONCALES IP, 24 EXTENSINES IP (LICENCIAMIENTO INCLUIDO), CAPACIDAD DE CRECIMIENTO ANALOGO HASTA 8 LINEAS DE COBRE Y 24 EXTENSIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1,00	$ 1.645.173	$ 1.645.173	0	1,00	$ 1.645.173		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO DE PATCH CORD DE UTP, CATEGORÍA 6A, S/STP, 10G, RJ45, COLOR AZUL, LONGITUD DE 3 MTRS, EN CALIDAD AMP, LEVITON, PANDUIT SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES.	UNIDAD	39,00	$ 111.052	$ 4.331.028	0	39,00	$ 4.331.028		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TELEVISOR 4K-UHD DE 60 PULGADAS TIPO LED, POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS O SUPERIOR, VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL TELEVISOR DE 60 HZ O SUPERIOR, SMART TV, CON SISTEMA DE CONECTIVIDAD TIPO WIFI, BLUETOOTH, CONTROL REMOTO (INFRARROJO), PUERTOS USB, HDMI, LAN/ETHERNET. INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR EN PARED.	UNIDAD	6,00	$ 3.281.373	$ 19.688.238	0	6,00	$ 19.688.238		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - VOZ Y DATOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS TIPO INDOOR, OM3+OM4. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	100,00	$ 15.028	$ 1.502.800	0	100,00	$ 1.502.800		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PAÑETES, ENCHAPES Y MESONES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA DE CERÁMICA PARA PARED, (ESPESOR ENTRE 4MM Y 6MM). INCLUYE ADHESIVO EN POLVO TIPO PEGACOR O SIMILAR, BOQUILLA Y WIN. EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS, DILATACIONES . EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.	M2	105,81	$ 64.218	$ 6.794.907	0	105,81	$ 6.794.907		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PAÑETES, ENCHAPES Y MESONES	CONCRETO DE 3.000 PSI/20.68 MPA PARA MESONES Y PASOS DE ESCALERAS. INCLUYE FORMALETA EN CUALQUIER MATERIAL. NO INCLUYE REFUERZO. INCLUYE RETIRO DE FORMALETA.	M3	0,41	$ 792.079	$ 324.752	0	0,41	$ 324.752		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PAÑETES, ENCHAPES Y MESONES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN QUARZTONE NEGRO, ESPESOR 1.5 CM, COMPUESTO POR 93% DE CUARZO Y 7% DE RESINA DE CALIDAD. INCLUYE SALPICADERO ENTRE 7 A 10 CM Y FALDERO DE 25CM. INCLUYE SELLANTE POLIURETANO Y SILICONA FRÍA TRANSPARENTE. VER ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	ML	6,76	$ 637.967	$ 4.312.657	0	6,76	$ 4.312.657		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
CARPINTERÍA METÁLICA -VIDRIO	ESPEJO 4 MM. BISELADO Y PULIDO CUATRO LADOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	m2	6,12	$ 128.345	$ 785.471	0	6,12	$ 785.471		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
CARPINTERÍA METÁLICA -VIDRIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS (1,6M*0,8M)	UNIDAD	6,00	$ 3.507.483	$ 21.044.898	0	6,00	$ 21.044.898		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
CARPINTERÍA METÁLICA -VIDRIO	SUMINTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD CURVA CROMO	UNIDAD	2,00	$ 106.084	$ 212.168	0	2,00	$ 212.168		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERÍA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN).	UNIDAD	6,00	$ 269.663	$ 1.617.978	0	6,00	$ 1.617.978		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	SANITARIO CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDOS + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO, PARA ALTA PRESION.	UNIDAD	2,00	$ 969.013	$ 1.938.026	0	2,00	$ 1.938.026		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE ORINAL, GRIFERÍA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN).	UNIDAD	2,00	$ 932.779	$ 1.865.558	0	2,00	$ 1.865.558		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN).	UNIDAD	2,00	$ 179.101	$ 358.202	0	2,00	$ 358.202		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMNISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	8,00	$ 199.266	$ 1.594.128	0	8,00	$ 1.594.128		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMNISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA ORINAL INSTITUCIONAL ANTIVANDALICA TIPO PUSH INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	1,00	$ 187.720	$ 187.720	0	1,00	$ 187.720		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ANTIVANDALICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO COMBI, INCLUYE KIT DE FLUXOMETRO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UNIDAD	1,00	$ 2.906.066	$ 2.906.066	0	1,00	$ 2.906.066		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PREENSAMBLADO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO END SUCTION CON MOTOR ELECTRICO, BOMBA 100 GPM A 85 PSIG, BOMBA AUXILIAR JOCKEY DE 10 GPM A PRESIÓN DE 90 PSGI, INCLUYE ACCESORIOS Y TABLERO ELECTRICO	UNIDAD	1,00	$ 110.524.935	$ 110.524.935	0	1,00	$ 110.524.935		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 1 1/2" RANURADA	ML	3,50	$ 42.229	$ 147.802	0	3,50	$ 147.802		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 2" RANURADA	ML	6,00	$ 55.120	$ 330.720	0	6,00	$ 330.720		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN C/C SHC 40 4" RANURADA	ML	1,70	$ 151.705	$ 257.899	0	1,70	$ 257.899		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC C900 4" ENTERRADA	ML	31,00	$ 393.945	$ 12.212.295	0	31,00	$ 12.212.295		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA ACERO NEGRO - 1 1/2"	UNIDAD	3,00	$ 16.354	$ 49.062	0	3,00	$ 49.062		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA ACERO NEGRO - 2"	UNIDAD	3,00	$ 22.497	$ 67.491	0	3,00	$ 67.491		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA ACERO NEGRO - 4"	UNIDAD	1,00	$ 57.074	$ 57.074	0	1,00	$ 57.074		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERÍA PVC C900 4"	UNIDAD	3,00	$ 317.594	$ 952.782	0	3,00	$ 952.782		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLNG HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 2"	UNIDAD	6,00	$ 7.347	$ 44.082	0	6,00	$ 44.082		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLNG HIERRO DUCTIL RANURADO FLEXIBLE 4"	UNIDAD	2,00	$ 26.432	$ 52.864	0	2,00	$ 52.864		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II	UNIDAD	3,00	$ 761.779	$ 2.285.337	0	3,00	$ 2.285.337		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4"X2.1/2" (2)	UNIDAD	1,00	$ 926.592	$ 926.592	0	1,00	$ 926.592		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4"X2.1/2"X2.1/2"	UNIDAD	1,00	$ 899.123	$ 899.123	0	1,00	$ 899.123		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
CARPINTERÍA METÁLICA -VIDRIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERÍA EN ALUMINIO MONTANTE FIJA VP 3831 VIDRIO DE 3 MM + 3 MM CAL 6, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DETALLE.	m2	185,11	$ 266.692	$ 49.367.356	0	185,11	$ 49.367.356		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
CARPINTERÍA METÁLICA -VIDRIO	VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR ALUMINIO CRUDO + ALFAJIA TIPO PESADO (INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN PERFILERIA PB 6038 O EQUIVALENTE). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	m2	30,46	$ 311.140	$ 9.477.324	0	30,46	$ 9.477.324		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PLAZOLETAS, OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO MACIZO PREFABRICADO CON FORMALETA METALICA, CONCRETO 3000 PSI H=35 CM, B=20 CM, L=75 CM. DEBIDAMENTE ALINEADO, INCLUYE MORTERO DE PEGA, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NO INCLUYE CAMA DE RECEBO.	M3	9,23	$ 587.325	$ 5.421.010	0	9,23	$ 5.421.010		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
PLAZOLETAS, OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM, MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	m2	105,69	$ 92.881	$ 9.816.593	0	105,69	$ 9.816.593		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
PLAZOLETAS, OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA BERMUDA GRASS INCLUYE TIERRA NEGRA	m2	60,81	$ 16.796	$ 1.021.365	0	60,81	$ 1.021.365		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA POTABLE	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO DE AGUA 2 BOMBAS USO ALTERNO CADA UNA 100% DEL CAUDAL CADA BOMBA; CAUDAL 77 GPM, PRESIÓN:59 PSI, HIDROACUMULADOR 500 LITROS, INCLUYE TABLEROS Y ACCESORIOS	UNIDAD	1,00	$ 38.236.948	$ 38.236.948	0	1,00	$ 38.236.948		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
INSTALACIONES AGUA POTABLE	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS; BOMBAS 1; PRESIÓN 15 PSI, CAUDAL 14 GPM, HIDROACUMULADOR 50 LITROS	UNIDAD	1,00	$ 10.426.136	$ 10.426.136	0	1,00	$ 10.426.136		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ELECTRICOS - ENERGIA ALTERNATIVA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 30 KW, CONSTA DE 96 PANELES SOLARES AMORFOS DE 330 VATIOS, 2 INVERSORES DE 15 KW TRIFÁSICOS Y UN SISTEMA DE RESPALDO COMPUESTO POR 32 BATERÍAS	UNIDAD	1,00	$ 386.736.778	$ 386.736.778	0	1,00	$ 386.736.778		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ESCALERAS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SILLA SALVA ESCALERAS PARA ASCENSO CURVO, CAPACIDAD DE CARGA 135 KG, APOYA PIES, CINTURÓN DE SEGURIDAD DE ACUERDO A CADA NECESIDAD, ONTROLES EN LA SILLA, BOTONERAS EN CADA NIVEL PARA LLAMAR LA SILLA SI NO ESTÁ EL PISO REQUERIDO, LLAVE DE SEGURIDAD QUE PERMITE TENER EL CONTROL DE LA SILLA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	1,00	$ 47.140.192	$ 47.140.192	0	1,00	$ 47.140.192		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
ASEO DE OBRA	ASEO GENERAL FINO PARA ENTREGA DE OBRA (LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA EDIFICACIÓN). INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO, NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE). EL VALOR A PAGAR ES POR METRO CUADRADO EN PLANTA.	M2	1103,98	$ 3.410	$ 3.764.572	0	1103,98	$ 3.764.572		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
AIRE ACONDICIONADO	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE 11 UNIDAD TIPO CASSETTE 4 VIAS; 8 UNIDAD TIPO WALLMOUNT, 3 UNIDAD CONDENSADORA, CONTROL REMOTO EQUIPOS, SISTEMA CONTROL CENTRALIZADO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE DE MAQUINAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RUTINAS TRIMESTRALES, HASTA COMPLETAR UN (1) AÑO DE SERVICIO, INCLUYE SOPORTES 7X24. MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL CON PH Y MOVILIZACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO, REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410ª, TUBERÍAS EN COBRE, RUBATEX, ACOMETIDAS DE CONTROL (CONFIGURACIÓN RED LAN POR PISO) Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. SEGUN DISEÑO Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS.	GLB	1,00	$ 161.020.482	$ 161.020.482	0	1,00	$ 161.020.482		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SENSOR DE HUMOFOTO-ELÉCTRICO2HILOS,DIRECCIONABLECERTIFICADO(LISTADO UL Y/O APROBADO FM), INCLUYE BASE PARA DETECTOR	UNIDAD	50,00	$ 482.167	$ 24.108.350	0	50,00	$ 24.108.350		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADORESTACIÓNMANUAL,CERTIFICADANFPA72(ESTACIÓNMANUALDIRECCIONABLE DOBLE ACCIÓN LISTADA UL Y/O APROBADA FM)	UNIDAD	15,00	$ 644.269	$ 9.664.035	0	15,00	$ 9.664.035		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DETECTOR TÉRMICO, 2 HILOS DIRECCIONABLE, CERTIFICADO, NFPA72,12-24 VDC (LISTADO UL Y/O APROBADO FM) INCLUYE BASE PARA DETECTOR)	UNIDAD	2,00	$ 452.098	$ 904.196	0	2,00	$ 904.196		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE, 4 LAZOS, 99 ZONAS (PROGRAMACIÓN), CERTIFICADA NFPA72, INCLUYE FUENTE DE VOLTAJE Y BATERÍA 12 AMP/H (LISTADO UL Y/O APROBADO FM) 125 DETECTORES, 125 MODULOS POR CADA LAZO DE CONTROL	UNIDAD	1,00	$ 14.553.665	$ 14.553.665	0	1,00	$ 14.553.665		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANUNCIADOR PARA SISTEMA DE INCENDIO, CERTIFICADO ALISTADA NFPA 72 (LISTADO UL, APROBADO FM)	UNIDAD	3,00	$ 11.110.238	$ 33.330.714	0	3,00	$ 33.330.714		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN TELEFÓNICA PARA EMERGENCIA Y PARA SERVICIO DE INCENDIO CON COMUNICACIÓN A BOMBEROS	UNIDAD	3,00	$ 3.939.720	$ 11.819.160	0	3,00	$ 11.819.160		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE GAS MONÓXIDO DE CARBONO CO2	UNIDAD	1,00	$ 1.228.583	$ 1.228.583	0	1,00	$ 1.228.583		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO Y/O DERIVACIÓN DE 20X20X15 MS, CON CHAPA	UNIDAD	4,00	$ 244.624	$ 978.496	0	4,00	$ 978.496		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓ Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CORNETA CON LUZ ESTROBO 12-24 VDC (LISTADA UL APROBADA FM)	UNIDAD	14,00	$ 422.214	$ 5.910.996	0	14,00	$ 5.910.996		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULO DE MONITOREO GPRS PARA CONEXIÓN A BOMBEROS.	UNIDAD	1,00	$ 2.728.997	$ 2.728.997	0	1,00	$ 2.728.997		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA TIPO IMC DE 1-1/4" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO	ML	50,00	$ 136.651	$ 6.832.550	0	50,00	$ 6.832.550		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA TIPO IMC DE 1" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO	ML	40,00	$ 105.657	$ 4.226.280	0	40,00	$ 4.226.280		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA TIPO IMC DE 3/4" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO	ML	660,00	$ 65.872	$ 43.475.520	0	660,00	$ 43.475.520		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL BAJO EN HALÓGENOS FPRL 2X18	ML	660,00	$ 7.871	$ 5.194.860	0	660,00	$ 5.194.860		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL BAJO EN HALÓGENOS FPRL 4X18	ML	2600,00	$ 9.336	$ 24.273.600	0	2600,00	$ 24.273.600		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECLADO DIGITAL PARA SISTEMA DE DETECCIÓN CERTIFICADO, CONCONEXIÓN A PANEL DE INCENDIOS (ANUNCIADOR REMOTO LISTADO UL Y/O APROBADO FM)	UNIDAD	1,00	$ 3.636.332	$ 3.636.332	0	1,00	$ 3.636.332		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DETECTOR DE METALES 18 ZONAS - ARCO	UNIDAD	1,00	$ 4.716.890	$ 4.716.890	0	1,00	$ 4.716.890		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO VARIFOCAL, TECNOLOGÍA IP DE 5 MEGAPÍXEL, TECNOLOGÍA INFRAROJO, LENTE DE 2.8MM-12MM, TIPO DOMO INTERIOR, ANTIVANDÁLICA, 1/3" CMOS, POE IP65, H2.65+SD. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UNIDAD	26,00	$ 666.816	$ 17.337.216	0	26,00	$ 17.337.216		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	CÁMARA TIPO DOMO PTZ IP 1080P@60FPS H.265+ DARKFIGHTER 32X IR 150M WDR 120DB RASTREO Y DETECCIÓN INTELIGENTE. 2 MP. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UNIDAD	4,00	$ 4.092.555	$ 16.370.220	0	4,00	$ 16.370.220		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR 12 MEGAPIXEL (4K) / 64 CANALES IP / 16 BAHÍAS DE DISCO DURO / 2 TARJETAS DE RED / SOPORTA RAID CON HOT SWAP / HDMI EN 4K / SOPORTA POS - CUATRO DISCOS DURO SATA CON CAPACIDAD DE 4 TB CADA UNO. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UNIDAD	1,00	$ 7.047.952	$ 7.047.952	0	1,00	$ 7.047.952		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA EXTERIOR BALA VARIFOCAL TECNOLOGÍA IP 4 MEGAPIXELES D/N VF 2.8-12MM IR 50M 120DB METAL H265+ IP67 TIPO HIKVISION O SIMILAR. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UNIDAD	8,00	$ 1.475.275	$ 11.802.200	0	8,00	$ 11.802.200		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TELEVISOR 4K-UHD DE 60 PULGADAS TIPO LED, POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS O SUPERIOR, VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL TELEVISOR DE 60 HZ O SUPERIOR, SMART TV, CON SISTEMA DE CONECTIVIDAD TIPO WIFI, BLUETOOTH, CONTROL REMOTO (INFRARROJO), PUERTOS USB, HDMI, LAN/ETHERNET, MARCA TIPO SAMSUMG O SIMILAR. INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR EN PARED.	UNIDAD	1,00	$ 3.281.373	$ 3.281.373	0	1,00	$ 3.281.373		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MONITOR WQHD (2560X1440) DE 32 PULGADAS TIPO LCD, TECNOLOGÍA HDR, PUERTOS HDMI, DISPLAY PORT, SALIDA DE AUDIFONOS, TASA DE REFRESCO DE 144 HZ, VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL MONITOR DE 1 MILISEGUNDO, MARCA TIPO SAMSUMG O SIMILAR.	UNIDAD	1,00	$ 2.007.923	$ 2.007.923	0	1,00	$ 2.007.923		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADORA PARA PTZ IP JOYSTICK DE 4 EJES, PANTALLA DE 128 X 64 PIXELES. INCLUYE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	UNIDAD	1,00	$ 1.171.350	$ 1.171.350	0	1,00	$ 1.171.350		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	BANDEJA PORTACABLES DE 30X10 CMS TIPO CABLO FILL, CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	220,00	$ 89.513	$ 19.692.860	0	220,00	$ 19.692.860		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	TUBERÍA METÁLICA TIPO EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS, UNIONES, CURVAS Y ADAPTADOR RECTO, CAJAS TIPO RAD WELD	ML	360,00	$ 11.619	$ 4.182.840	0	360,00	$ 4.182.840		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	CABLE DE PAR TRENZADO UTP CATEGORÍA 6ª, 100% COBRE, CERTIFICADO	ML	2600,00	$ 13.022	$ 33.857.200	0	2600,00	$ 33.857.200		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
SEGURIDAD Y CONTROL	RACK DE COMUNICACIONES TIPO GABINETE DE 1,80X0.60X0.50 M, CERTIFICADO, CON CHAPA LLAVE Y VENTILADORES, INCLUYE MULTITOMA DE 6 TOMA-CORRIENTES REGULADOS Y 2 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CERTIFICADO ´CABLE UTP CAT 6ª, CON 74 PATCH CORD 6ª DE 1 MT	UNIDAD	1,00	$ 1.519.168	$ 1.519.168	0	1,00	$ 1.519.168		$ -	0	$ -	0,00	$ -	0%
	ITEMS NO PREVISTOS														
ADICIONAL	TALA DE ARBOL R1 - PERIMETRO 1,0 M; GUARATARO H=11 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	1,00	$ 538.047	$ 538.047	0	1,00	$ 538.047	1,00	$ 538.047	0	$ -	1,00	$ 538.047	100%
ADICIONAL	TALA DE ARBOL R2 - PERIMETRO 1,2 M; TAMARINDO H=14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	1,00	$ 538.047	$ 538.047	0	1,00	$ 538.047	1,00	$ 538.047	0	$ -	1,00	$ 538.047	100%
ADICIONAL	TALA DE ARBOL R3 - PERIMETRO 1,2 M; GUARATARO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	1,00	$ 538.047	$ 538.047	0	1,00	$ 538.047	1,00	$ 538.047	0	$ -	1,00	$ 538.047	100%
ADICIONAL	TALA DE ARBOL R4 - PERIMETRO 2,0 M; ALMENDRO H=15 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	1,00	$ 1.076.094	$ 1.076.094	0	1,00	$ 1.076.094	1,00	$ 1.076.094	0	$ -	1,00	$ 1.076.094	100%
ADICIONAL	TALA DE ARBOL R5 - PERIMETRO 1,90 M; HOBO H=18 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	1,00	$ 1.076.094	$ 1.076.094	0	1,00	$ 1.076.094	1,00	$ 1.076.094	0	$ -	1,00	$ 1.076.094	100%
ADICIONAL	TALA DE ARBOL R6 - PERIMETRO 1,70 M; MANGO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	1,00	$ 635.059	$ 635.059	0	1,00	$ 635.059	1,00	$ 635.059	0	$ -	1,00	$ 635.059	100%
ADICIONAL	TALA DE ARBOL A1 - PERIMETRO 1,3 M; MANGO H= 10 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	1,00	$ 635.059	$ 635.059	0	1,00	$ 635.059	1,00	$ 635.059	0	$ -	1,00	$ 635.059	100%

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VR. EJECUTADO	% EJEC.
ADICIONAL	TALA DE ARBOL A2 - PERIMETRO 1,70 M; GUARATARO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	1,00	$ 635.059	$ 635.059	0	1,00	$ 635.059	1,00	$ 635.059	0	$ -	1,00	$ 635.059	100%
ADICIONAL	TALA DE ARBOL A3 - PERIMETRO 2,20 M; TAMARINDO H= 14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	1,00	$ 829.083	$ 829.083	0	1,00	$ 829.083	1,00	$ 829.083	0	$ -	1,00	$ 829.083	100%
ADICIONAL	TALA DE ARBOL A4 - PERIMETRO 2,90 M; MANGO H= 14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	UNIDAD	1,00	$ 1.076.094	$ 1.076.094	0	1,00	$ 1.076.094	1,00	$ 1.076.094	0	$ -	1,00	$ 1.076.094	100%
ADICIONAL	EXCAVACION MANUAL	M3		$ 65.843	$ -			$ 65.843	0	$ -			0,00	$ -	0%
ADICIONAL	VALLA LICENCIA DE CONSTRUCCION NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	UNIDAD	1	$ 240.183	$ 240.183	0	1	$ 240.183	0	$ -			0,00	$ -	0%
ADICIONAL	CERRAMIENTO PROVISIONAL PARALES MADERA 5 CM X 10 CM. LAMINA EN TEJA METALICA GALVANIZADA , ESPESOR CALIBRE 26 A 30. PINTADA EN EL EXTERIOR CON PINTURA BLANCA, ALTURA 2,44 M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICION POR RECIBIR EL MATERIAL (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE)	M2	231,8	$ 110.981	$ 25.725.396	0	231,8	$ 25.725.396	0	$ -			0,00	$ -	0%
														$ -	
COSTO DIRECTO TOTAL DEL CONTRATO					**$ 3.600.611.299**			**$ 3.600.677.142**		**$ 97.945.692**		**$ -**		**$ 97.945.692**	
ADMINISTRACIÓN				17,00%	$ 612.103.921			$ 612.115.114		$ 16.650.768		$ -		$ 16.650.768	
IMPREVISTOS				3,00%	$ 108.018.339			$ 108.020.314		$ 2.938.371		$ -		$ 2.938.371	
UTILIDAD				5,00%	$ 180.030.565			$ 180.033.857		$ 4.897.285		$ -		$ 4.897.285	
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 34.205.807			$ 34.206.433		$ 930.484		$ -		$ 930.484	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 934.358.632**			**$ 934.375.718**		**$ 25.416.908**		**$ -**		**$ 25.416.908**	
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					$ 336.518.736			$ 326.975.904							
PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN Y TRÁMITE DE VISITA Y CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS					$ 100.000.000			$ 100.000.000							
VALOR TOTAL					**$ 4.971.488.667**			**$ 4.962.028.764**		**$ 123.362.600**		**$ -**		**$ 123.362.600**	2,49%
AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO															
ANTICIPO ENTREGADO										$ 2.485.744.334		$ 0		$ 2.485.744.334	
SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS										$ 4.848.126.067		$ 0		$ 4.848.126.067	
AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO										**$ 63.250.807**		**$ 0**		**$ 63.250.807**	
VALOR A PAGAR EN ACTA										**$ 60.111.793**		**$ 0**		**$ 60.111.793**	

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Representante Legal Contratista
BERMUDEZ SAS

GERMAN GARZON
Representante Interventoria
CONSORCIO INGEALDEIC

JUAN MANUEL PIÑERES
Supervisor del Proyecto
Profesional Universitario G-17
RAMA JUDICIAL

YEISSON EDUARDO GÓMEZ SUAREZ
Coordinador del Proyecto
Director Administrativo División Construcciones
RAMA JUDICIAL

CONSORCIO INGEALDEIC	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No _____ (Número de Contrato) **DE** _____ (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No _____ **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** _____ **HASTA** _____

ÍTEM N° _____ **UNIDAD** _____ **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (EJES, ABSCISADO Y DETALLES, COTAS). ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.

CONTRATISTA BERMUDEZ SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INGEALDEIC

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN MANUEL PIÑERES

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
En la totalidad del lote	30,00	17,50			525,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					525,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS ALBERTO ESPAÑA CORDOBA
Residente de Obra.

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO SALAZAR VALENCIA
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) GERMAN GARZON SALCEDO
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

Escriba el texto aquí

CONSORCIO INGEALDEIC	**FORMATO** MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No _____ (Número de Contrato) **DE** _____ Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No _____ **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** _____ **HASTA** _____

ÍTEM N° _____ **UNIDAD** _____ **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DESMONTE, DESCAPOTE, EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CMS DE SUELO INCLUYE CARGUE Y RETIRO HASTA SITIO AUTORIZADO. INCLUYE DESMONTE DE CUALQUIER ESPECIE VEGETATIVA (MALEZA) MENOR A 2 METROS Y RETIRO DE TOCONES. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE). NO INCLUYE TALA DE ÁRBOLES MAYORES DE 2 METROS.

CONTRATISTA BERMUDEZ SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INGEALDEIC

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN MANUEL PIÑERES

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
En la totalidad del lote	30,00	17,50			525,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					525,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS ALBERTO ESPAÑA CORDOBA
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO SALAZAR VALENCIA
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) GERMAN GARZON SALCEDO
Director de Interventoría

Escriba el t

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO INGEALDEIC	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No _____ (Número de Contrato) **DE** _____ Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No _____ **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** _____ **HASTA** _____

ÍTEM N° _____ **UNIDAD** _____ **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD HASTA 1.5 M. INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE MATERIAL Y ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MANEJO DE AGUAS. NO INCLUYE ENTIBADO O TABLESTACADO. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL

CONTRATISTA BERMUDEZ SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INGEALDEIC


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN MANUEL PIÑERES

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EJE A	20,52	0,80	0,70		11,49
EJE B	20,52	0,80	0,70		11,49
EJE C	12,24	0,80	0,70		6,85
EJE D	8,90	0,80	0,70		4,98
EJE E	20,52	0,80	0,70		11,49
EJE 1	8,08	0,80	0,70		4,52
EJE 6	7,95	0,80	0,70		4,45
EXCAVACION MECANICA RAICES					122,28
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					177,57
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

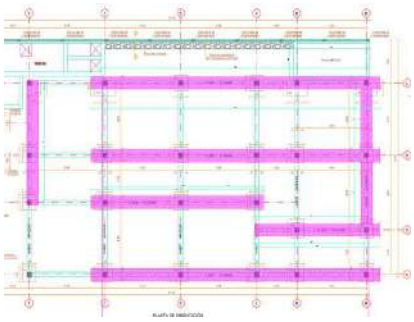

FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS ALBERTO ESPAÑA CORDOBA
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO SALAZAR VALENCIA
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) GERMAN GARZON SALCEDO
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO INGEALDEIC	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No _____ (Número de Contrato) **DE** _____ Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No _____ **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** _____ **HASTA** _____

ÍTEM N° _____ **UNIDAD** _____ **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN RECEBO CON LA ESPECIFICACIÓN B-200 INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN. INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO.

CONTRATISTA BERMUDEZ SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INGEALDEIC

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN MANUEL PIÑERES

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	525,00		0,31		162,75
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					162,75
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS ALBERTO ESPAÑA CORDOBA
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO SALAZAR VALENCIA
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) GERMAN GARZON SALCEDO
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO INGEALDEIC	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No _____ (Número de Contrato) **DE** _____ Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No _____ **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** _____ **HASTA** _____

ÍTEM N° _____ **UNIDAD** _____ **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =2.000 PSI/13.79 MPA, PARA SOLADO, COMO SUPERFICIE PROTECTORA ENTRE EL SUELO Y LOS HIERROS DE LAS ESTRUCTURAS EN CONTACTO CON ÉL. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN.


CONTRATISTA BERMUDEZ SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INGEALDEIC
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN MANUEL PIÑERES
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ZAPATA TIPO 1	1,00	1,00	0,05	22,00	1,100
ZAPATA TIPO 2	1,50	1,00	0,05	3,00	0,225
ZAPATA TIPO 3	1,00	1,00	0,05	1,00	0,050
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,38
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

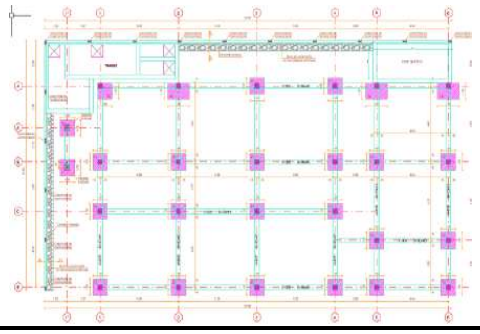

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS ALBERTO ESPAÑA CORDOBA
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO SALAZAR VALENCIA
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) GERMAN GARZON SALCEDO
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO INGEALDEIC	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No _____ (Número de Contrato) **DE** _____ Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No _____ **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** _____ **HASTA** _____

ÍTEM N° _____ **UNIDAD** _____ **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA, PARA ZAPATAS Y PEDESTALES DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.

CONTRATISTA BERMUDEZ SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INGEALDEIC


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN MANUEL PIÑERES

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ZAPATA TIPO 1	1,00	1,00	0,30	22,00	6,60
ZAPATA TIPO 2	1,50	1,00	0,40	3,00	1,80
ZAPATA TIPO 3	1,00	1,00	0,40	1,00	0,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					8,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

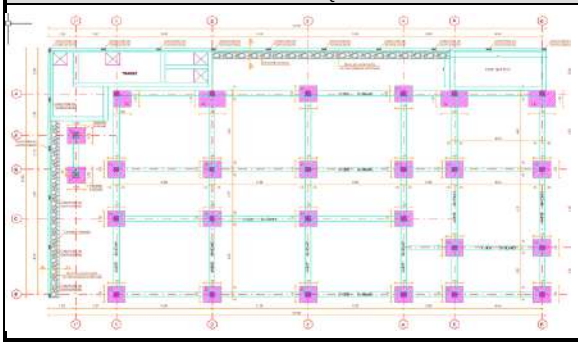

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS ALBERTO ESPAÑA CORDOBA
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO SALAZAR VALENCIA
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) GERMAN GARZON SALCEDO
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO INGEALDEIC	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No _____ (Número de Contrato) **DE** _____ Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No _____ **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** _____ **HASTA** _____

ÍTEM N° _____ **UNIDAD** _____ **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =3.000 PSI/20.68 MPA, CICLÓPEO, (60%) CONCRETO Y (40%) ROCAS TAMAÑO MAXIMO 10" INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.

CONTRATISTA BERMUDEZ SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INGEALDEIC


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN MANUEL PIÑERES

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ZAPATA TIPO 1	1,00	1,00	1,00	22,00	22,00
ZAPATA TIPO 2	1,50	1,00	1,00	3,00	4,50
ZAPATA TIPO 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					27,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

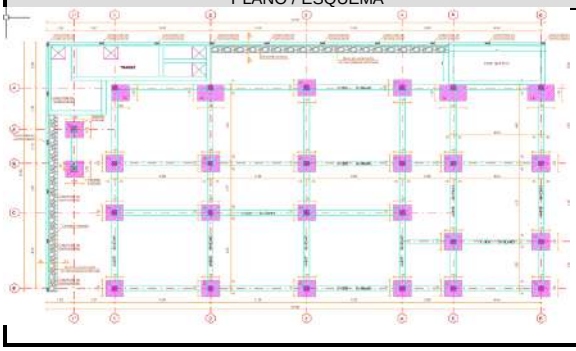

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS ALBERTO ESPAÑA CORDOBA
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO SALAZAR VALENCIA
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) GERMAN GARZON SALCEDO
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO INGEALDEIC	**FORMATO** MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No _____ (Número de Contrato) **DE** _____ (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No _____ **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** _____ **HASTA** _____

ÍTEM N° _____ **UNIDAD** _____ **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.

CONTRATISTA BERMUDEZ SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INGEALDEIC


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN MANUEL PIÑERES

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	CANTIDAD	PESO		TOTAL
ZAPATA VARILLAS No. 4	1,25	355,00	1,00		443,75
	1,75	21,00	1,00		36,75
INICIO COLUMNA VARILLA No. 5	38,00	24,00	1,55		1.415,42
ESTRIBOS DE COLUMNAS COLUMNAS	91,39	24,00	0,56		1.228,28
VIGAS DE CIMENTACION	5,40	3,00	2,25		2.885,11
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					6.009,32
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

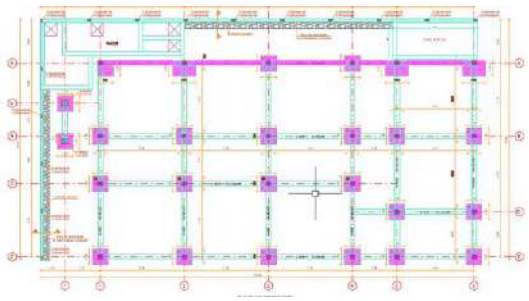

FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS ALBERTO ESPAÑA CORDOBA
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO SALAZAR VALENCIA
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) GERMAN GARZON SALCEDO
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO INGEALDEIC	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No _____ (Número de Contrato) **DE** _____ (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No _____ **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** _____ **HASTA** _____

ÍTEM N° _____ **UNIDAD** _____ **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TALA DE ARBOLES INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES

CONTRATISTA BERMUDEZ SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INGEALDEIC
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) JUAN MANUEL PIÑERES
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TALA DE ARBOL R1 - PERIMETRO 1,0 M; GUARATARO H=11 MT				1,00	1,00
TALA DE ARBOL R2 - PERIMETRO 1,2 M; TAMARINDO H=14 MT				1,00	1,00
TALA DE ARBOL R3 - PERIMETRO 1,2 M; GUARATARO H=12 MT				1,00	1,00
TALA DE ARBOL R4 - PERIMETRO 2,0 M; ALMENDRO H=15 MT				1,00	1,00
TALA DE ARBOL R5 - PERIMETRO 1,90 M; HOBO H=18 MT				1,00	1,00
TALA DE ARBOL R6 - PERIMETRO 1,70 M; MANGO H=12 MT				1,00	1,00
TALA DE ARBOL A1 - PERIMETRO 1,3 M; MANGO H= 10 MT				1,00	1,00
TALA DE ARBOL A2 - PERIMETRO 1,70 M; GUARATARO H=12 MT				1,00	1,00
TALA DE ARBOL A3 - PERIMETRO 2,20 M; TAMARINDO H= 14 MT				1,00	1,00
TALA DE ARBOL A4 - PERIMETRO 2,90 M; MANGO H= 14 MT				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					10,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

Escriba el texto aquí

ELABORÓ

(Firma) _____

(Nombre) CARLOS ALBERTO ESPAÑA CORDOBA
Residente de Obra

(Firma) _____

(Nombre) LUIS FERNANDO SALAZAR VALENCIA
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma) _____

(Nombre) CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO
Director de Obra

(Firma) _____

(Nombre) GERMAN GARZON SALCEDO
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2022/10/13
Rango de fechas: 2022/09/01 - 2022/09/30 | HORA: 10:07

15513 | P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S. | PAGINA: 1

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505510	CUENTAS DE AHORRO				
111505510838	AHO 82900008104 P.A. ANT BERMU				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,467,008,076.57	531,605,712.61	1,935,402,363.96
TOTAL	AHO 82900008104 P.A. ANT BERMU	0.00	2,467,008,076.57	531,605,712.61	1,935,402,363.96
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO	0.00	2,467,008,076.57	531,605,712.61	1,935,402,363.96
TOTAL	BANCOS NACIONALES	0.00	2,467,008,076.57	531,605,712.61	1,935,402,363.96
TOTAL	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	0.00	2,467,008,076.57	531,605,712.61	1,935,402,363.96
TOTAL	EFECTIVO	0.00	2,467,008,076.57	531,605,712.61	1,935,402,363.96
TOTAL	ACTIVO	0.00	2,467,008,076.57	531,605,712.61	1,935,402,363.96
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001091	RENDIMIENTOS PARA TERCEROS S/C				
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	471,082.57	471,082.57
TOTAL	RENDIMIENTOS PARA TERCEROS S/C	0.00	0.00	471,082.57	471,082.57
299040001161	INTERESES CUENTA DE AHORROS				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	942,165.14	942,165.14	0.00
TOTAL	INTERESES CUENTA DE AHORROS	0.00	942,165.14	942,165.14	0.00
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	0.00	942,165.14	1,413,247.71	471,082.57
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	0.00	942,165.14	1,413,247.71	471,082.57
TOTAL	DIVERSOS	0.00	942,165.14	1,413,247.71	471,082.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2022/10/13
Rango de fechas: 2022/09/01 - 2022/09/30 | HORA: 10:07

15513 | P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S. | PAGINA: 2

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	OTROS PASIVOS	0.00	942,165.14	1,413,247.71	471,082.57
TOTAL	PASIVO	0.00	942,165.14	1,413,247.71	471,082.57
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	0.00	2,464,621,094.00	2,464,621,094.00
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,464,621,094.00	2,464,621,094.00	0.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	0.00	2,464,621,094.00	4,929,242,188.00	2,464,621,094.00
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	0.00	1,915,900.00	1,915,900.00
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	1,915,900.00	1,915,900.00	0.00
TOTAL	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID	0.00	1,915,900.00	3,831,800.00	1,915,900.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	0.00	2,466,536,994.00	4,933,073,988.00	2,466,536,994.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	0.00	2,466,536,994.00	4,933,073,988.00	2,466,536,994.00
TOTAL	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	2,466,536,994.00	4,933,073,988.00	2,466,536,994.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001009	REEMBOLSOS				
816000531	BERMUDEZ Y CIA S EN C	0.00	50,717,419.00	0.00	50,717,419.00
TOTAL	REEMBOLSOS	0.00	50,717,419.00	0.00	50,717,419.00
351010001025	GIRO A TERCEROS				
900824997	DISTRIBUIDORA LA UNION VICHADA SAS	0.00	204,564,503.00	0.00	204,564,503.00

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
41794470	ALVAREZ ROJAS MARIA CONCEPCION	0.00	64,506,603.00	0.00	64,506,603.00
800130426	G Y J FERRETERIAS SA	0.00	209,901,298.00	0.00	209,901,298.00
TOTAL	GIRO A TERCEROS	0.00	478,972,404.00	0.00	478,972,404.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	0.00	529,689,823.00	0.00	529,689,823.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	0.00	529,689,823.00	0.00	529,689,823.00
TOTAL	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	0.00	529,689,823.00	0.00	529,689,823.00
TOTAL	PATRIMONIO ESPECIALES	0.00	2,996,226,817.00	4,933,073,988.00	1,936,847,171.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61DB
TOTAL	GANANCIAS O PÉRDIDAS	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61DB
TOTAL	PATRIMONIO	0.00	2,998,142,706.61	4,933,073,988.00	1,934,931,281.39
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61
TOTAL	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2022/10/13
Rango de fechas: 2022/09/01 - 2022/09/30 | HORA: 10:07

15513 | P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S. | PAGINA: 4

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61
TOTAL	GASTOS DE OPERACIONES	0.00	1,915,889.61	0.00	1,915,889.61
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	0.00	1,915,889.61	1,915,889.61CR
TOTAL	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.	0.00	0.00	1,915,889.61	1,915,889.61CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	1,915,889.61	1,915,889.61CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	1,915,889.61	1,915,889.61CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	1,915,889.61	1,915,889.61CR
TOTAL	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	0.00	0.00	1,915,889.61	1,915,889.61CR
TOTAL	GASTOS	0.00	1,915,889.61	1,915,889.61	0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-JUN-20 **Hasta:** 12-OCT-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1035520536
Fecha: 12-OCT-2022

Producto: 15513 P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S.

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS


Cuenta Bancaria # : 82900008104 **Emisor:** BANCOLOMBIA **Cuenta Contable:** 111505510838

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
07-OCT-22	323	13	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN		GIRO DE RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRG_2022_3204039.xlsb	471,082.57	.00	Pagado		1540489

Total Tipo de Egreso:	471,082.57	.00
Total por Cuenta:	471,082.57	.00
Total por Moneda:	471,082.57	.00

CUADRO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO				
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			**FECHA : 25 octubre 2022**	
15513 P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S.			**ACTA 1 - PERIODO SEPTIEMBRE**	
ANTICIPO		**VALOR**		
MATERIALES		$ 1.779.621.094		
EQUIPO		$ 125.000.000		
MANO DE OBRA		$ 440.000.000		
COSTOS INDIRECTOS		$ 120.000.000		
VALOR ANTICIPO		**$ 2.464.621.094**		
ACTA	**FECHA**	**VALOR**	**AMORTIZACION**	**SALDO POR AMORTIZAR**
1	25-oct-22	$ 137.865.746	$ 70.898.993	$ 2.393.722.101
2				
3				
4				
5				
6				
7				



CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
BERMUDEZ SAS

CUADRO DE INVERSION DEL ANTICIPO				
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			**FECHA : 25 octubre 2022**	
15513 P.A. ANT BERMUDEZ S.A.S.			**ACTA 1 - PERIODO SEPTIEMBRE**	
ANTICIPO		**VALOR**		
MATERIALES		$ 1.779.621.094		
EQUIPO		$ 125.000.000		
MANO DE OBRA		$ 440.000.000		
COSTOS INDIRECTOS		$ 120.000.000		
VALOR ANTICIPO		**$ 2.464.621.094**		
1 MATERIALES	**FECHA**	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**DESCRIPCION**	**EGRESO**
ORDEN GIRO 1	27-sep-22	MARIA CONCEPCION ALVAREZ	PETREOS	$ 64.506.603
ORDEN GIRO 1	27-sep-22	DISTRIBUIDORA LA UNION VICHADA S.A.S.	CEMENTO	$ 204.564.503
ORDEN GIRO 1	27-sep-22	GYJ FERRETERIAS	ACEROS	$ 209.901.298
ORDEN GIRO 2	27-sep-22	BERMUDEZ SAS	REEMBOLSO	$ 16.000.000
TOTAL ITEM 1				**$ 494.972.404**
2 EQUIPO	**FECHA**	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**DESCRIPCION**	**EGRESO**
ORDEN DE GIRO 2	27-sep-22	FERRETERIA DEMACO	EQUIPOS	$ 14.000
				$ 14.000
TOTAL ITEM 2				
3 MANO DE OBRA	**FECHA**	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**DESCRIPCION**	**EGRESO**
TOTAL ITEM 3				**$ -**
4 COSTOS INDIRECTOS	**FECHA**	**NOMBRE DEL PROVEEDOR**	**DESCRIPCION**	**EGRESO**
ORDEN DE GIRO 2	27-sep-22	BERMUDEZ SAS	REEMBOLSO	$ 34.703.419
TOTAL ITEM 4				**$ 34.703.419**
TOTAL GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEL PATRIMONIO AUTONOMO				**$ 529.689.823**

SALDO DEL ANTICIPO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	**$ 1.934.931.271**

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
BERMUDEZ SAS

Bermudez SAS

Nit. 816.000.531-1

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARP Y OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

SRS
RAMA JUDICIAL
Santiago de Cali

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que BERMUDEZ SAS, identificado con el Nit 816.000.531-1, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de Seguridad Social cuando ello ha habido lugar en cuanto a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cala caja de compensación familiar, durante los últimos 6 meses.

Para constancia de lo anterior firmo en Cali, a los veinticinco (25) días del mes octubre de 2022.

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
Representante Legal
CC 16.363.838

Bermudez SAS

Nit. 816.000.531-1

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARP Y OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

SRS
RAMA JUDICIAL
Santiago de Cali

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que BERMUDEZ SAS, identificado con el Nit 816.000.531-1, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de Seguridad Social cuando ello ha habido lugar en cuanto a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cala caja de compensación familiar, durante los últimos 6 meses.

Para constancia de lo anterior firmo en Cali, a los veinticinco (25) días del mes octubre de 2022.

MARTHA INES PAREDES
Contador Externo
T.P. 88406-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.910.124**

PAREDES TRIANA

APELLIDOS

MARTHA INES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1964**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

31-AGO-1982 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00342681-F-0031910124-20111019 **00283**30579A 1 2811498999



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

88406-T

MARTHA INES
PAREDES TRIANA
C.C. 31910124
RESOLUCION INSCRIPCION 141
UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA 05/09/02

PRESIDENTE
ELKIN DIES SANCHEZ CORTES

97745



IDEBS

FIRMA DEL TITULAR

006782

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional -- Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3309B8372962E502

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA INES PAREDES TRIANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31910124 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 88406-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado Bancario

Viernes, 27 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BERMUDEZ Y CIA S EN C identificado(a) con NIT 816000531, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	80600259123	1998/11/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO CARREÑO – VICHADA

INFORME DE LABORATORIO O2

BERMUDEZ SAS

INENIERO JOSE VARGAS CRUZ

OCTUBRE 25 DE DE 2022

Puerto Carreño, 25 octubre de 2022

Señores

BERMUDEZ SAS

Atención:

Ingeniero

CARLOS EDUARDO BERMUDEZ

REF Obra construcción palacio de justicia de puerto Carreño – Vichada

Asunto: informe resistencia de concreto

Respetado ingeniero:

Se hicieron dos fallas de cilindros a la compresión inconfinada asi:

- El dia 15 de octubre cilindro N° 1, para concreto ciclópeo, edad 7 dias resistencia 151,7 kg/cm2 proyectado a los 28 dias 216,7 mayor a los 212 kg/cm2
- El dia 19 de octubre cilindro N° 2 para zapatas , edad 7 dias resistencia 198,9 kg/cm2 proyectado a los 28 dias 284,2 kg/cm2, mayor a los 280 kg/cm2
- El dia 20 de octubre cilindro 3 para zapatas , edad 7 dias resistencia 196,1 kg/cm2 proyectado a 28 dia 280,2 kg/cm2, mayor a los 280 kg/ cm2
-

Atentamente



Ing José Vargas Cruz

Mp 2520228013 CND

José Vargas C  Ingeniero Civil	Informe laboratorio 02	octubre 2022

INFORME DE LABORATORIO

ENSAYO DRESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (INV E-410/07)

ASIC SAS

F01-IL-22

Carrera 14 N° 26 B 46 s Bta tel 3112112871

CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA PUERTO CARREÑO | **B ERMUDEZ SAS** | **LUGAR** | **PUERTO CARREÑO**

	Cilindro No.	Localización	Fecha Toma	Fecha Rotura	Edad días	Diametro (mm)	Asentamiento (pulg)	kilonewton	Carga Máxima (Kg)	Resistencia			carga esperada a los 28 dias kg/cm2	Observaciones
										7 dias	14 dias	28 dias		
1	IC	CICLOPEO	2022-10-08	2022-10-15	7	10,1	3,1	119,2	12.155	151,7		**216,7**	212,0	OK
2	1Z	ZAPATA	2022-10-12	2022-10-19	7	10	3,2	153,2	15.622	198,9		**284,2**	280,0	OK
3	2Z	ZAPATA	2022-10-13	2022-10-20	7	10,1	3,1	154,1	15.714	196,1		**280,2**	280,0	OK
														OK
5														OK
														OK

OBSERVACIONES: TODOS LOS ELEMENTOS TRAIDOS , FUERON FALLADOS A LOS SIETE DIAS Y PROYECTADOS A LOS 28

Ejecutó: 

Revisó y aprobó: 
