INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2022

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 UNICO

CONTRATO No.	**015-MC-2022**
CONTRATANTE	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR – **FONVISOCIAL-**
REPL LEGAL	SOL MARIA LIÑAN PANA
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA - OBRA
CONTRATISTA	**IMB INGENIERIA APLICADA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	NIT 901156103
REPRESENTANTE LEGAL	ISAIAS DAVID MOLINA BERMUDEZ
CEDULA	1065573943
OBJETO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE OBRAS PRIORIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD DE FONVISOCIAL**
VALOR INICIAL	**$23.584.007,46**
VALOR ADICIONAL	**$11’581.324,31**
VALOR FINAL	**$ 35’165.331,77**
PLAZO EJECUCIÓN INCIAL	UN (01) MES
SUPERVISOR	Profesional universitario adscrito a gerencia LENIN ERNESTO LIMA AMARA
FECHA INICIO	21 de noviembre de 2022
N° DE INFORME	001 Y FINAL

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	ADICIÓN
VALOR ADICIONAR	$10.850.300,4
CDP	348 del 13 de septiembre de 2022

ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES - INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001, CONTRATO No. 015-MC-2022

En Valledupar, a los 22 días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se recepcionó por parte del señor **LENIN ERNESTO LIMA AMARA** en su calidad de Supervisor del contrato No. 015-MC de 2022, informe de ejecución de obras, remitido por el señor **ISAIAS DAVID MOLINA BERMUDEZ,** identificado con cédula de ciudadanía № 1.065.573.943 actuando como representante legal de IMB INGENIERIA APLICADA con NIT.: 901.156.103 en calidad de CONTRATISTA, informe que contempla las actividades

desarrolladas y cuenta de cobro N.º 001 presentado por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato No. 015-MC-2022, durante el periodo de ejecución.

La firma **IMB INGENIERIA APLICADA** expone informe de actividades desarrolladas durante el periodo señalado en el párrafo anterior, en las cuales describe a continuación:

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido, en los siguientes términos:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBJETO CONTRACTUAL:

En cumplimiento con el contrato de obra No. 015-MC DE 2022, relaciono a continuación las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2022 y el 21 de diciembre de 2022, de acuerdo al presupuesto y propuesta presentada:

Descripción de ítems de acuerdo a presupuesto de obra.

Formulario 2 - ACTA DE EJECUCION DE OBRAS

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE OBRAS PRIORIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD DE FONVISOCIAL

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	Menor Cant de Obra	Mayor Cant de Obra	Total Cant de Obra ejecutada	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1 FACHADA							
1.1	EST PROT - 01 Persiana en aluminio color anonizado natura con marco en tubular de 1" 1/2" x 1" 1/2" y persiana tipo ovalada en T-237 según medidas y diseño suministrado por el cliente, Dimensiones 1 (2.50 m x 1.00 m) Dimensiones 2 (1.50 m x 1.00 m) y Dimensiones 3 (0.50 m x 1.00 m)	1	1		0	UN	$ 2.547.334,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 0,00**
	2 HALL - RECIBIDO							
2.1	Tapa de Toma Doble Normal 110V, incluye instalacion	2	2	0	0	PTO	$ 18.578,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 0,00**
	3 BAÑO GERENCIA							
3.1.	Espejos en cristal frotado 4mm y borde pulido en baños privados 0.70 m x 0.50 M, Incluye instalacion.	1	0	0	1	UN	$ 58.442,00	$ 58.442,00
3.2.	Desmonte de Combos de aparatos sanitarios	1	0	0	1	UN	$ 34.141,00	$ 34.141,00
3.3.	Combo Laguna Balta Blanco: sanitario, lavamanos con pedestal, grifería y accesorios, Color Blanco	1	0	0	1	UN	$ 323.559,00	$ 323.559,00
3.4	Demolicion de enchape de pared y piso	17,69	0	0	17,69	M2	$ 18.559,00	$ 328.308,71
3.5	Enchape Pared Arena Blanco 24.5x50cm o equivalente, instalado a junta perdida para baños o equivalente	17,69	0	0	17,69	M2	$ 68.944,00	$ 1.219.619,36
3.6	Enchape de piso en porcelanato Nuevo Boss Gris Claro Caras Diferenciadas 0.60X0.60 o equivalente, para baños	3,14	0	0	3,14	M2	$ 75.222,00	$ 236.197,08
3.7.	Tapa de Toma Doble Normal 110V, incluye instalacion	1	1	0	0	PTO	$ 20.578,00	$ 0,00
3.8.	Salida de panel Led Circular de empotrar o equivalente	1	0	0	1	PTO	$ 39.450,00	$ 39.450,00
Subtotal								**$ 2.239.717,15**

	4 BAÑO MUJER							
4.1.	Espejos en cristal frotado 4mm y borde pulido en baños privados 0.70 m x 0.50 M, Incluye instalacion.	1	0	0	1	UN	$ 58.442,00	$ 58.442,00
4.2	MTTO-05 Mantenimiento de pintura para puertas metalicas en esmalte blanco	2	0	0	2	UN	$ 86.059,00	$ 172.118,00
4.3	Desmonte de Combos de aparatos sanitarios	1	0	0	1	UN	$ 34.141,00	$ 34.141,00
4.4.	Combo Laguna Balta Blanco: sanitario, lavamanos con pedestal, grifería y accesorios, Color Blanco	1	0	0	1	UN	$ 323.559,00	$ 323.559,00
4.5	Demolicion de enchape de pared y piso	37,09	1,54	0	35,55	M2	$ 18.559,00	$ 659.772,45
4.6	Enchape Pared Arena Blanco 24.5x50cm o equivalente, instalado a junta perdida para baños o equivalente	31,5	0	0	31,5	M2	$ 68.944,00	$ 2.171.736,00
4.7	Enchape de piso en porcelanato Nuevo Boss Gris Claro Caras Diferenciadas 56.6X56.6 o equivalente, para baños	5,59	0	0	5,59	M2	$ 75.222,00	$ 420.490,98
4.8	Tapa de Toma Doble Normal 110V, incluye instalacion	1	0	0	1	PTO	$ 18.578,00	$ 18.578,00
4.9	Salida de panel Led Circular de empotrar o equivalente	1	0	0	1	PTO	$ 39.450,00	$ 39.450,00
Subtotal								**$ 3.898.287,43**
	5 BAÑO HOMBRE							
5.1	Espejos en cristal frotado 4mm y borde pulido en baños privados 0.70 m x 0.50 M, Incluye instalacion.	1	0	0	1	UN	$ 58.442,00	$ 58.442,00
5.2	MTTO-05 Mantenimiento de pintura para puertas metalicas en esmalte blanco	2	0	0	2	UN	$ 86.059,00	$ 172.118,00
5.3	Desmonte de Combos de aparatos sanitarios	1	0	0	1	UN	$ 34.141,00	$ 34.141,00
5.4	Combo Laguna Balta Blanco: sanitario, lavamanos con pedestal, grifería y accesorios, Color Blanco	1	0	0	1	UN	$ 323.559,00	$ 323.559,00
5.5	Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco o equivalente, incluye instalacion	1	0	0	1	UN	$ 444.501,00	$ 444.501,00
5.6	Demolicion de enchape de pared y piso	38,45	1,12	0	37,33	M2	$ 18.559,00	$ 692.807,47
5.7	Enchape Pared Arena Blanco 24.5x50cm o equivalente, instalado a junta perdida para baños o equivalente	32,79	0,75	0	32,04	M2	$ 68.944,00	$ 2.208.965,76
5.8	Enchape de piso en porcelanato Nuevo Boss Gris Claro Caras Diferenciadas 56.6X56.6 o equivalente, para baños	5,66	0,37	0	5,29	M2	$ 75.222,00	$ 397.924,38
5.9	Tapa de Toma Doble Normal 110V, incluye instalacion	1	0	0	1	PTO	$ 18.578,00	$ 18.578,00
5.10	Salida de panel Led Circular de empotrar o equivalente	1	0	0	1	PTO	$ 39.450,00	$ 39.450,00
Subtotal								**$ 4.390.486,61**
	6 GENERAL							
6.1	Pintura a una mano, pintura tipo 1 Viniltex o equivalente	140,8	0	6,15	146,95	M2	$ 19.738,00	$ 2.900.499,10
6.2	Pintura a dos manos, pintura tipo 1 Viniltex o equivalente	14,69	0	11	25,69	M2	$ 33.367,00	$ 857.198,23
6.3	Bloqueador de humedades, Sika Impur	34,27	0	10	44,27	M2	$ 19.820,00	$ 877.431,40
6.4	Tapa de Toma Doble Normal 110V, incluye instalacion	12	0	0	12	PTO	$ 20.578,00	$ 246.936,00
6.5	Salida de panel Led Circular de empotrar o equivalente (18w)	9	0	6	15	PTO	$ 39.450,00	$ 591.750,00
6.6	Salida de panel Led Cuadrado de empotrar o equivalente (18w)	3	0	2	5	PTO	$ 42.450,00	$ 212.250,00
6.7	arreglo de cubierta en Fibrocemento, laminas No. 6 y caballetes	1	0	0	1	UNIDAD	$ 295.222,00	$ 295.222,00
Subtotal								**$ 5.981.286,73**
	7 ITEMS NO PREVISTOS							
7.1	Desmonte de reja de hierro y estructura puerta ventana de fachada e instalación de VT - 01 Ventana piso a techo Dim:(4.90 m x 2.25 m) - Medida a rectificar en sitio - Fachada fija estructural en vidrio de seguridad 10MM Transparente: Consta de 2 puertas, 1 con pibote y con 1 con Bisagra, Spedin hidraulica con sus respectivas manijas de 60 cm, niquelada, portacerradura, cerradura y contracerradura. Zocalo en aluminio para ambas puertas. Puerta fija con su respectivo pibote y falleba. 3 vidrios fijos con zocalos y perfil F en la parte de arriba. con perfileria en 3x1, adaptador, pisavidrio, todo en color negro mate, pintura	1	0	0	0	UN	$ 8.050.000,00	$ 8.050.000,00
7.2	Salida de panel Led Cuadrado de empotrar o equivalente (24w) 0,60x0,60m	0	0	8	8	UN	$ 217.821,00	$ 1.742.568,00
7.3	Salida de panel Led Rectangular de empotrar o equivalente (24w) 1,20x0,30m	0	0	2	2	UN	$ 273.321,00	$ 546.642,00
7.3	Salida de panel Led Circular de empotrar o equivalente (12w)	0	0	7	7	UN	$ 39.450,00	$ 276.150,00
								$ 10.615.360,00
							SUBTOTAL OBRAS TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 27.125.137,92**

ADMINISTRACIÓN	**20%**	$ 5.425.027,58
IMPREVISTOS	**1%**	$ 271.251,38
UTILIDAD	**7%**	$ 1.898.759,65
IVA - SOBRE UTILIDAD	**19%**	**$ 360.764,33**
VALOR TOTAL		**$ 35.080.940,87**

ACTIVIDAD 1

ITEM 1.0

EST PROT - 01 Persiana en aluminio color anonizado natura con marco en tubular de 1" 1/2" x 1" 1/2" y persiana tipo ovalada en T-237 según medidas y diseño suministrado por el cliente, Dimensiones 1 (2.50 m x 1.00 m) Dimensiones 2 (1.50 m x 1.00 m) y Dimensiones 3 (0.50 m x 1.00 m).

DESCRIPCION:

Fabricación, suministro e instalación de persianas en aluminio de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.

FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Unidad (UN), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

Esta actividad no fue ejecutada, dentro del acta de mayores y menores cantidades de obra presentada al comité se definió la no ejecución del presente ítem, quedando aprobado en el mismo.

ACTIVIDAD 2

ITEMS 2.1, 3.7, 4.8, 5.9, 6.4

Tapa de Toma Doble Normal 110V, incluye instalación.

(Este ítem también hace parte de los CAPITULOS: 3. BAÑO GERENCIA, 4. BAÑO MUJER, 5. BAÑO HOMBRE, 6. GENERAL)

DESCRIPCION:

Comprende la mano de obra, herramientas y accesorios, necesarios para el reemplazo de la tapa exterior y el mantenimiento a un toma corriente doble estándar de pared, con el fin de garantizar su correcto anclaje al muro, apariencia estética y su correcto funcionamiento.

FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Unidad (UN), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 3

ITEMS 3.1, 4.1, 5.1

Espejos en cristal frotado 4mm y borde pulido en baños privados 0.70 m x 0.50 M, Incluye instalación.

DESCRIPCION:
Esta actividad se refiere al suministro y colocación de espejos en cristal biselados de 4 mm de 0.70 m x 0.50 M, instalado mediante perfil metálico o listones de madera entre espejo y muro adherido con pegamento epóxico o chazo según sea el caso, localizado en las unidades de lavamanos y sitios indicados en los planos arquitectónicos. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Unidad (UN), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 4

ITEMS 3.2, 4.3, 5.3

Desmonte de Combos de aparatos sanitarios.

2. DESCRIPCION:

Desmonte de sanitarios, lavamanos, lavaplatos, Lavadero, duchas y accesorios, existentes dentro del predio, que impidan la ejecución de obras ó que no estén contempladas en el área a intervenir.





FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Unidad (UN), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 5

ITEMS 3.3, 4.4, 5.4

Combo Laguna Balta Blanco: sanitario, lavamanos con pedestal, grifería y accesorios, Color Blanco.

DESCRIPCION:

consiste en instalar en un baño un combo el cual incluye sanitario y lavamanos con su grifería que permitan su correcto funcionamiento, canastilla, y juego de incrustaciones de 5 und + acoples.





FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Unidad (UN), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 6

ITEMS 3.4, 4.5, 5.6

Demolición de enchape de pared y piso.

DESCRIPCION:

Consiste en la demolición total o parcial de enchapes, pañetes y muros existentes en el área a intervenir.



FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 7


ITEMS 3.5, 4.6, 5.7

Enchape Pared Arena Blanco 24.5x50cm o equivalente, instalado a junta perdida para baños o equivalente.

2. DESCRIPCION:

Corresponde este ítem al suministro, colocación y ejecución de enchape blanco piso-pared 24.5x50 (Incluye pegacor, y emboquillada) Distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los planos de detalle.



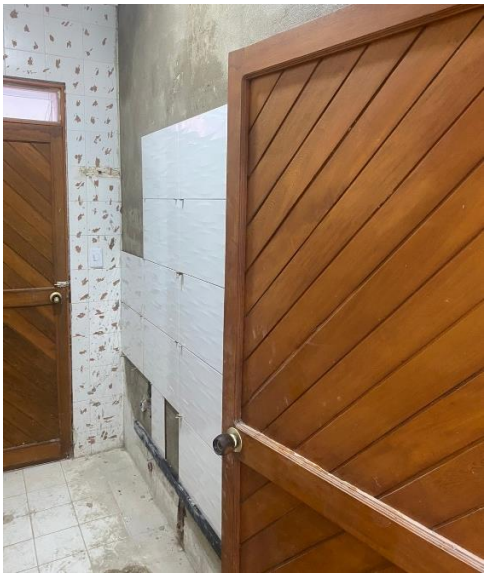

FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.


ACTIVIDAD 8

ITEMS 3.6, 4.7, 5.8

Enchape de piso en porcelanato Nuevo Boss Gris Claro Caras Diferenciadas 56.6 x 56.6 o equivalente, para baños.

DESCRIPCION:

Corresponde este ítem al suministro, y ejecución de Enchape de piso en porcelanato Nuevo Boss Gris Claro Caras Diferenciadas de 56.6 x 56.6 cm (Incluye pegacor y emboquillada Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla) Distribuido de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los planos de detalle.

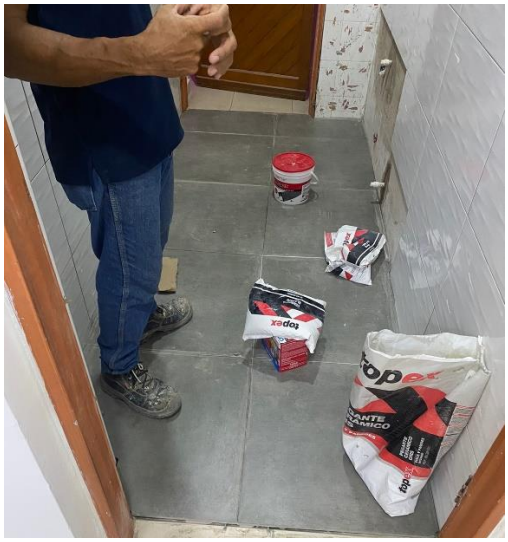



FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 9

ITEMS 3.8, 4.9, 5.10, 6.5, 6.6


Salida de panel Led Circular de empotrar o equivalente.

Salida de panel Led Cuadrado de empotrar o equivalente.

DESCRIPCION:

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarios para la instalación de un panel cuadrado o circular sobre techo con longitud promedio de red de 4.5 ml



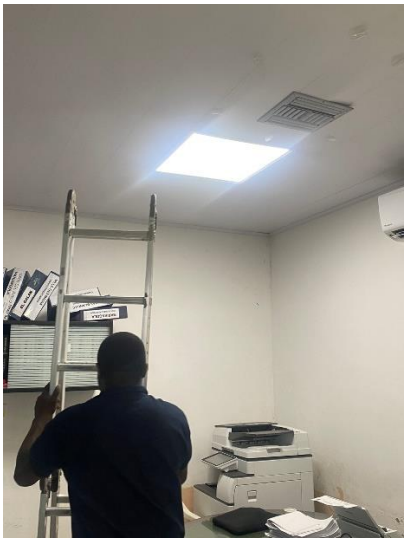


FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Unidad (UN), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 10

ITEMS 4.2, 5.2

MTTO-05 Mantenimiento de pintura para puertas metálicas en esmalte blanco.

2. DESCRIPCION:

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura esmalte puertas para dar una correcta terminación y apariencia a estas, que se requieren para la ejecución de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.



FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Unidad (UN), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 11

ITEM 5.5

Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco o equivalente, incluye instalación.

DESCRIPCION:

Se considera como ítem de obra el montaje de aparatos sanitarios, la mano de obra requerida para la colocación y empalme a las redes tanto de suministro como de desagües de los diferentes aparatos hidrosanitarios según el diseño arquitectónico e hidráulico. Los aparatos a instalar tendrán que contar con la previa aprobación por parte de la dirección arquitectónica.



FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Unidad (UN), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 12

ITEM 6.1

Pintura a una mano, pintura tipo 1 Viniltex o equivalente.

DESCRIPCION:

Este ítem se refiere a los trabajos de aplicación de pinturas sobre muros según indicación de los planos y autorizados por la Interventoría.




FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.


ACTIVIDAD 13

ITEM 6.2

Pintura a dos manos, pintura tipo 1 Viniltex o equivalente.

DESCRIPCION:

Este ítem se refiere a los trabajos de aplicación de pinturas sobre muros según indicación de los planos y autorizados por la Interventoría.

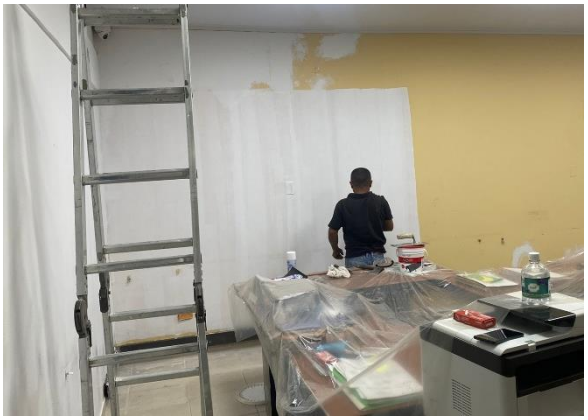


FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 14

ITEM 6.3

Bloqueador de humedades, Sika Imper Mur.

DESCRIPCION:

Este ítem se refiere a la impermeabilización de muros usando el producto Sika Imper Mur el cual es una resina acuosa de impregnación, lista para usar como barrera impermeable en muros con humedad, consolidante de superficies arenosas débiles e imprimante para masillas acrílicas.








FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Metro cuadrado (M2), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

ACTIVIDAD 15

ITEM 6.7

Arreglo de Cubierta en Fibrocemento, laminas N°6 y Caballetes.

DESCRIPCION:

Consiste en el Suministro y montaje de cubiertas en teja tipo eternit #6 perfil 7 para las reparación puntual de cubiertas en el proyecto de acuerdo a lo señalado en los planos arquitectónicos y detalles constructivos.









FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por Unidad (UN), según cantidades medidas en obra debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión o interventoría.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	**$23.584.007,46**
VALOR ADICION N°01	**$11’581.324,31**
VALOR FINAL INICIAL	**$ 35’165.331,77**
VALOR FINAL EJECUCION TOTAL (Ver acta de ejecución final)	**$ 35’080.940,87**
ACTAS DE PAGO	
VALOR ACTA DE PAGO N°01 - PRESENTE	**$ 24’669.875,87**
VALOR ACTA DE PAGO N°02 – FINAL	**$ 10’495.455,90**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**CDP** No. 348 DE SEPTIEMBRE de 2022.
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP** No. 582 de 21 NOV de 2022. **RP** No. 644 de 16 DIC de 2022.

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

- **Periodo:** Anexas

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

POR EL CONTRATISTA	SI	NO
cumple con el objeto del contrato de prestación de servicio profesionales en los términos establecidos	**X**	
cumple con las obligaciones del pago de seguridad social integral	**X**	
cumple con las órdenes y atiende sugerencias propuestas por la Supervisión	**X**	
POR FONVISOCIAL		
cancela oportunamente los pagos	**X**	
vela por el cumplimiento de las obligaciones a través de la Supervisión	**X**	
verifica periódicamente el estado del contrato de prestación de servicios buscando el equilibrio económico del mismo	**X**	

ACTIVIDADES DE SUPERVISION:

Velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios, verificando el estado del mismo, así como también el cumplimiento a cabalidad de la prestación de servicio; se atendió y se resolvieron las consultas hechas por el contratista para la correcta ejecución del contrato.

TECNICAS: durante este periodo, se hizo control y seguimiento de todas las labores correspondientes a la ejecución del contrato, verificando permanentemente la calidad de los servicios, requerido para las labores objeto del contrato; dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato el contratista está cumpliendo con los objetivos y actividades, razón por la cual certifico a satisfacción las actividades realizadas.

Con todo lo anterior se rinde el informe de las actividades desarrolladas para lo cual fui contratado, cumpliendo así con lo estipulado en el contrato Nº. 015-MC de 2022, respecto al cumplimiento de las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022.

Documentos Anexos:

- Informe de Atividades presentado por el contratista
- Acta de justificacion de modificatoria de contrato 015-MC-2022
- Acta de mayores y menores coantidades de obra
- Acta final de ejecucion de obra
- Acta de comitê de contratacion N°003 y 004 – 2022.
- Planilla de Aporte de la Seguridad Social Integral.
- Las comunicaciones enviadas por el contratista y el informe de Supervisión, hacen parte integral de la presente acta, en concordancia con el informe de pago No. 001 y por solicitudes realizadas por el secretario general y Jurídico de Fonvisocial y presentados por el contratista.

En constancia se suscribe en la ciudad de Valledupar, el 22 de diciembre de 2022.

Atentamente;

Arq. LENIN ERNESTO LIMA AMARA
Profesional Universitario Adscrito a Gerencia FONVISOCIAL
Supervisor del contrato

Proyectó: Área Técnica FONVISOCIAL – L/Lima/A
