PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS

En las instalaciones de Parque Natural Tayrona-Sector de Cañaveral, en la ciudad de Santa Marta a los Diez (10) días del mes de Agosto del 2022 se reunieron en el sitio referenciado, los señores PATRICIA SALDAÑA PEREZ, jefe del Parque Nacional Natural Tayrona, y SANDRO DUARTE PALMA en calidad de contratista, para entregar y recibir las obras de infraestructura y reparaciones referenciada con el siniestro 220116902002097 dlm20239372 póliza todo riesgo daños materiales 2201220003240 daños en instalaciones de Parque Natural Tayrona f.s. 15-sep-2020 al interior del Área Protegida en referencia.

Se detallan las obras ejecutadas por el contratista.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA				
RECONSTRUCCION ECOHABS No 7				
GENERAL DETALLADO POR CAPITULOS AJUSTADO FINAL				
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	EJECUCION DE LA OBRA
1,0	**PRELIMINARES**			
1,1	Desmonjte de aparatos sanitarios	UN	1	100%
1,2	Desmonte de lavamanos en vidrio	UN	1	100%
1,3	Desmonte de instalaciones electricas	UN	8	100%
1,4	Desmonte de pasamanos restantes en ruinas.	ML	14	100%
1,5	Desmonte de columnas en ruinas	UND	8	100%
1,6	Limpieza y resande de pisos en piedra laja	M2	50,27	100%
1,7	demolicion de zapatas o rellenos para fijacion de columnas	ML	13	100%
1,8	demolicion de enchape de baño	M2	6,4	100%
1,9	demolicion de piso de baño	M2	1,44	100%
2,0	**COLUMNAS SOPORTES**			
2,2	Suministro e instalacion de columnas en madera inmunizada de 5" redondas H . Prom=6mts, incluye fundida de zapata de 0.40*0.40*0.60 de profundidad, a la vista	ml	78,0	100%
3,0	**PISOS**			
3,1	Vigas riostras en madera tipo zapán o similar de 5"x5", a la vista	ML	18,55	100%
3,2	Piso en tablas laboradas de 1"x20cm inlcuye estructura soporte en madera de 3"x2" tipo zapan o similar, debidamente selladas y pintadas en laca color caramelo	M2	28,27	100%
3,3	decorado de piso en cabuya de fique enrollada de forma cirucular	M2	28,27	100%
4,0	**MUROS**			
4,1	Muro en machimbre en madera pino o sambocedro, entamborada Hprom 1 mts, incluye estructura intema de soporte en madera de 3x2", acabado en laca caramelo	ML	18,85	100%
4,2	remate de muro parte superior en tabla laborada de 20Cm acabado en laca caramelo	ML	18,85	100%

4,3	corniza parte superior de ventanas en machimbre madera pino o sambocedro, debidamente acabadas con pintura laca caramelo	ML	18,85	100%
5,0	**CUBIERTA**			100%
5,1	Cubierta tipo bohío D= 6ms, con parales en madera de en madera inmunizada a la vista de 3", correas de 2"x1" en madera zapan o similar y terminado en palma aguja	M2	48,65	100%
5,2	decorado interno figura volada con madera inmunizada de 3" a la vista, amarres con cabuya de 5/8" fique	UND	1	100%
	Estructura voladizo perimetral en madera inmunizada de 3", nudos de amarre cabulla de fique de 5/8"	ML	18,85	100%
	Cielo raso zona de terraza y baño, en machimbre laborado, acabado en	M2	28,27	100%
6,0	**CARPINTERIA DE MADERA**			
6,1	ventana en madera (0,80X1,10), contiene marco doble ceja de 4"x2" madera laboradas, 2 hojas posteriores de ventana (0.40*1.10) con bastidores de 3"x11/2" laborados y persianas, 2 hojas interiores (0.40x1.10) con bastidores de 3"x11/2 y angeo polietileno micro, fijado con jambas de 2", fallebas y manecillas en acero inoxidable, acabado en pintura en laca caramelo	UN	14,0	100%
6,2	Puerta en madera (2.00x2.00), contiene marco doble ceja de 4"x2" madera laboradas, 2 hojas posteriores de puertas (1.00*2.00) con bastidores de 4"x2" laborados y persianas, 2 hojas interiores (1.00x2.00) con bastidores de 3"x11/2 y angeo polietileno micro, fijado con jambas de 2", cerradura fallebas y manecillas en acero inoxidable, acabado en pintura en laca caramelo	UND	1,0	100%
6,3	Puerta en madera (1.00x2.00), contiene marco doble ceja de 4"x2" madera laboradas, 1 hojas posterior de puertas (1.00*2.00) con bastidores de 4"x2" laborados y persianas, 1 hojas interior (1.00x2.00) con bastidor de 3"x11/2 y angeo polietileno micro, fijado con jambas de 2", cerradura fallebas y manecillas en acero inoxidable, acabado en pintura en laca caramelo	UN	1,0	100%
6,5	escalera de subida al segundo piso madera laborada pino o zapan de 12 huellas tablas (0.30*1.10X2"), 12 contrahuellas tablas de (0.18x1.10x1") soportes laterales tipo guarderas de 0.30*2",	UND	1,0	100%
6,6	pasamanos de balcon salida hacia escalera (4.10x0.90), 9 parales de 31/2"x 2" H_ 1.20, atornillados al muro con tornillos de anclajes de 5/8", 3 lineas de proteccion de 31/2"x11/2"atomillados a los parales con torinillos de 5/8"	GL	1,0	100%

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

6,7	pasamanos de escalera parales de 31/2"x 2" H_ 0 90, atornillados al muro con tornillos de anclajes de 5/8", 3 lineas de proteccion de 31/2"x11/2" atornillados a los parales con torinillos de 5/8"	ML	9	100%
6,8	pasamanos de terraza con parales de madera laborada zapan o pino, parales de 31/2"x31/2", anclados al piso con concreto, 2 lineas de proteccion intermedia con listones de 31/2"x2"	ML	25,13	100%
6,9	escalera de acceso madera laborada pino o zapan de 7 huellas tablas (0.30*1.10X2"), soportes laterales tipo guarderas de 0 30x2",	UND	1	100%
6,1	pasamanos de escalera 2 parales de 31/2"x31/2" H_ 0.90", fijados al terreno natural con zapatas de concreto, 2 lineas de proteccion de 31/2"x11/2" atornillados a los parales con torinillos de 5/8"	ML	4,8	100%
7,0	**BAÑO**			
7,1	Puerta de acceso de 1x2 en madera laborada, incluye marco, jambas y cerradura	UND	1,00	100%
7,2	ventana en madera (1.8x0.90), contiene marco 4"x2" madera laboradas, 3 hojas posteriores de ventana (0.60*0.90) con bastidores de 3"x1 1/2" laborados y persianas, fallebas y acabados en pintura laca caramelo o	UND	1,00	100%
7,3	ventana redonda d_0.60 cm en madera laborada y vidrio fijo	UND	1,00	100%
7,4	sanitario tipo montecarlo, color blanco	UND	1,00	100%
7,5	division de baño en vidno templado de 8mm (1.20x1.80)	UND	1,00	100%
7,6	suministro e instalacion de lavamanos en vidrio templado de 20mm (incluye pozo y meson) (1.00x0.50), base de madera en tabla laborada, y juego de accesorios en acero incrustados al muro	UND	1,00	100%
7,7	piso de baño en ceramica, piedras de 0.20x0.60	M2	4,84	100%
7,8	enchape de muros zona de ducha en ceramica de 0.30*0.40	M2	6,40	100%
8,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			100%
8,10	punto de toma doble	UN	6	100%
8,20	punto de luces	UN	10	100%
9,0	**ACABADOS**			100%
9,1	Restauracion de pintura de muros zona de baño, incuye raspado, resanes y afinados y pintura vinilo	M2	26	100%
9,0	**ACABADOS**			100%
9,1	Aseo general, incluye material sobrante del sitio	GL	1	100%


En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, recibiendo a satisfacción la misma.


PATRICIA SALDAÑA PEREZ
Jefe de AP
PNN Tayrona


SANDRO DUARTE PALMA
Contratista


Anexo: Imágenes fotográficas.



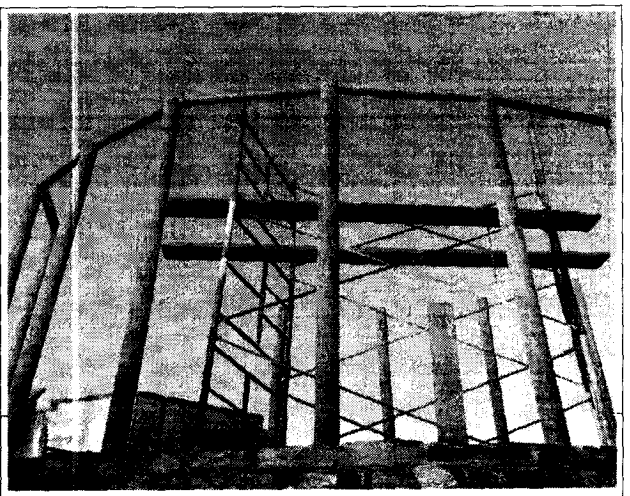

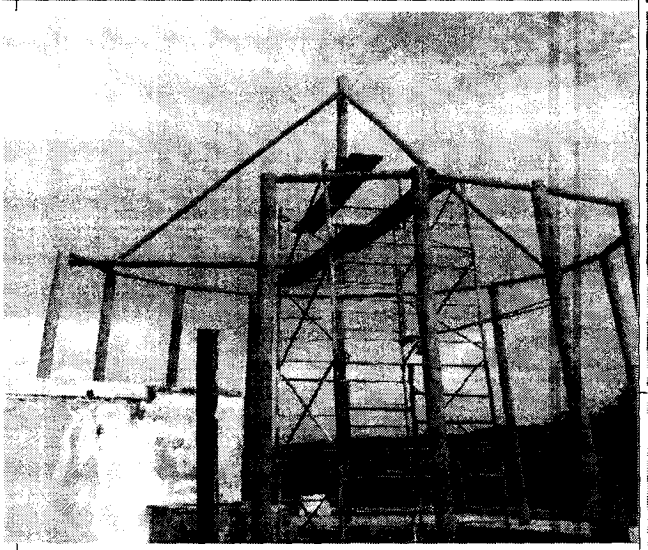


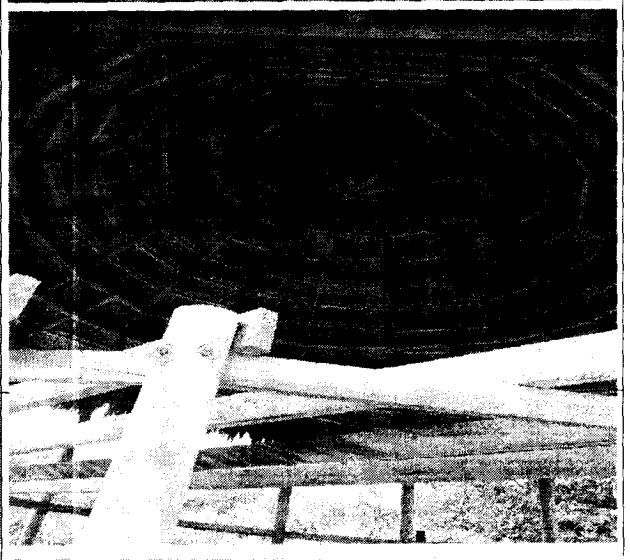

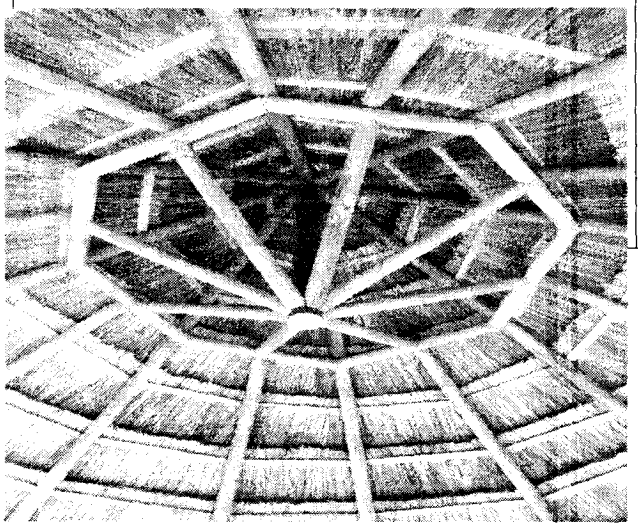






PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

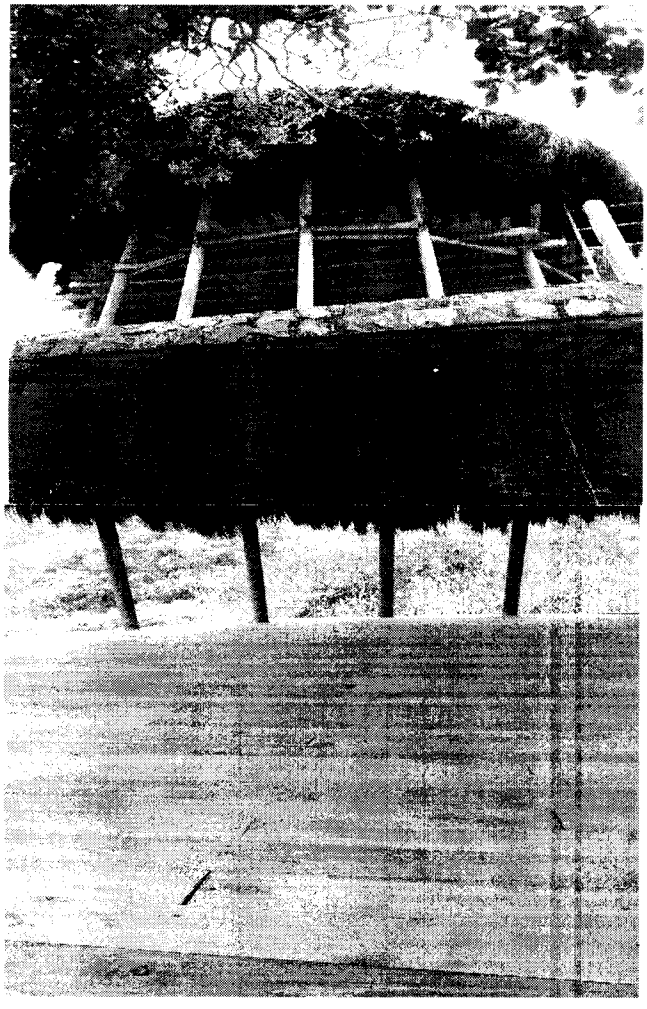



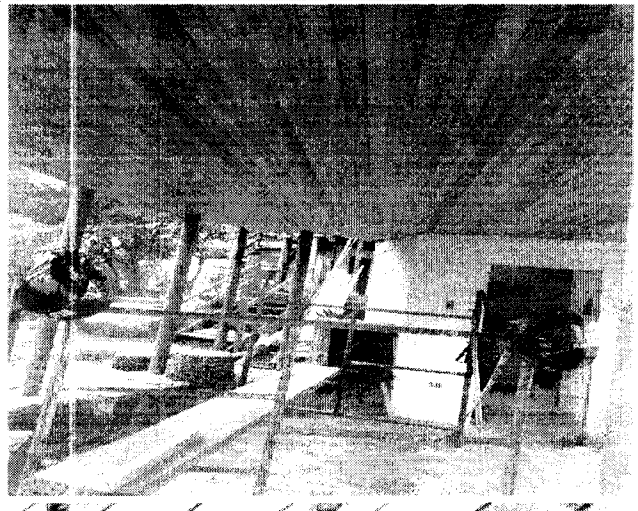

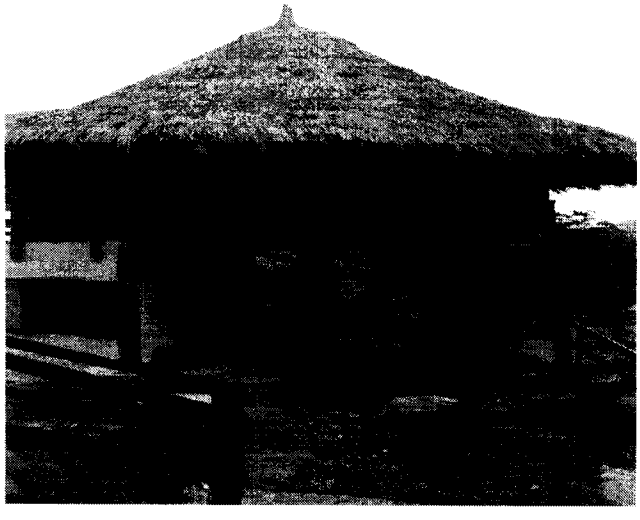

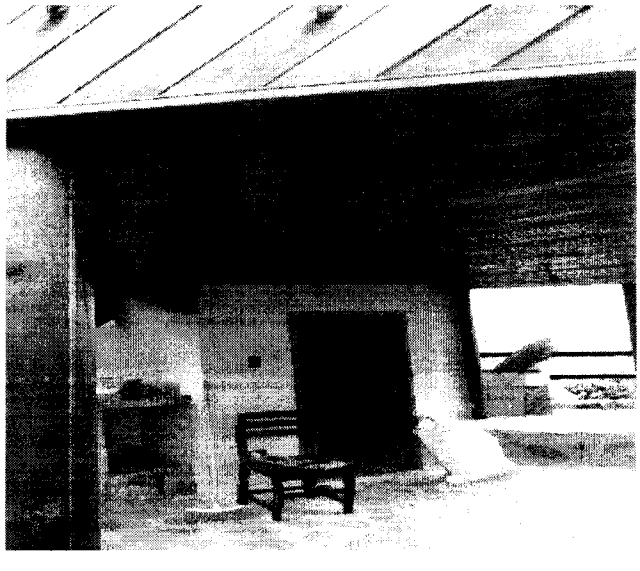

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

