CIUDAD Y FECHA	Duitama, diciembre veintiséis (26) de 2022
No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20220008
ACTA No.	2 (dos) periodo entre 1 de diciembre de 2022 al 26 de diciembre de 2022.
OBJETO	"DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO QUE CONLLEVE A CORREGIR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA O RIESGO EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No 756 DE 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
CONTRATISTA	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
NIT No.	901.482.344-4
REPRESENTANTE LEGAL	YENY ESPERANZA BAEZ GIL
C.C. No.	1.049.641.610 de Tunja
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.45.2.03.1000.07/24 Prevención y atención de desastres (2% SGP otros sectores) / SGP propósito general libre inversión. 2.3.2.45.2.03.1000.07/91 Prevención y atención de desastres (2% SPG otros sectores) / Rendimientos financieros SGP Propósito general libre inversión 2.3.2.45.2.03.1000.08/01 Prevención y atención de desastres (Recurso propio) /RP libre destinación. 2.3.2.45.2.03.1000.08/40 Prevención y atención de desastres (Recurso propio) / Superávit RP libre inversión.
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (246,000,000.00) M/CTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022, en todo caso no supera la vigencia fiscal de 2022.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	20 de octubre 2022
FECHA DE INICIO	21 de octubre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2022
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON DE JESUS PEREZ Oficina Asesora de Planeación y Sistemas MIGUEL ANGEL TORRES Secretario de Infraestructura
CUMPLIMIENTO	(T) 94.657% DE AVANCE

- ***(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)***

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$246,000,000.00
	* APORTE ALCALDÍA	$0.00
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$0.00
2	VALOR ADICIONADO	$0.00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$246,000,000.00
4	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 65,224,506.00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 167,632,443.00
6	VALOR EJECUTADO (4+ 5)	$ 232,856,949.00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 13,143,051.00

Descargar la distribución del rubro presupuestal para la primera acta se realice de la siguiente forma

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	VALOR RUBRO
2.3.2.45.2.03.1000.07/24	Prevención y atención de desastres (2% SPG otros sectores)	SGP propósito general libre inversión	$ 53,274,681.00
2.3.2.45.2.03.1000.07/91	Prevención y atención de desastres (2% SGP otros sectores) Rendimientos financieros	SGP Propósito general libre inversión	$ 00,000,000.00
2.3.2.45.2.03.1000.08/01	Prevención y atención de desastres (Recurso propio)	RP libre destinación	$ 00,000,000.00
2.3.2.45.2.03.1000.08/40	Prevención y atención de desastres (Recurso propio)	Superávit RP libre inversión	$ 11.949,825.00
TOTAL			$ 65,224,506.00

* Aplica solo para convenios.
En constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2022.

CONSULCONSTRUCCUIONES E&E
NIT No 901.482.344-4
R/L YENY ESPERANZA BAEZ GIL
C.C No. 1.049.641.610 de Duitama
CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
C.C. 1.052.384.008 de Duitama
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

EDISON JESUS PEREZ AVELLA
C.C. 74.380.314 de Duitama
JEFE OFICINA DE PLANEACION
SUPERVISOR DEL CONTRATO

SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE CONTRATACION
Recibido por:
Fecha: 28-12-22
Hora: 05:00 pm

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION No 01

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

CONTRATO:	COP- 20220008
OBJETIVO:	PRESUPUESTO DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO QUE CONLLEVE A CORREGIR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA O RIESGO GENERADOS POR LA OLA INVERNAL
CONTRATISTA:	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
NIT:	901.482.344-4
AVANCE DE OBRA:	94,657%

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCION	ORIGEN	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	CORTENo 1		CORTENo 2		ACUMULADO	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. OBRAS DE LIMPIEZA DE ROCAS, SEDIMENTOS Y OTROS MATERIALES SITUADOS BAJO EL AGUA													
1.1	APU	UBICACIÓN E INSPECCION DE PUNTOS CRITICOS PARA REALIZACION DE LIMPIEZA, REMOCION DE ROCAS Y SEDIMIENTOS CON RETROESCABADORA ORUGA	PROPIO	HH	220,00	$ 198.747,95	$ 43.724.549,00	219,00	$ 43.525.801,05	0,00	$ 0,00	219,00	$ 43.525.801,05
1,2	APU	TRANSPORTE DE MAQUINARIA CON CAMABAJA	PROPIO	UND	8,00	$ 1.200.000,00	$ 9.600.000,00	6,00	$ 7.200.000,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 7.200.000,00
						SUB TOTAL	$ 53.324.549,00		$ 50.725.801,05		$ 0,00		$ 50.725.801,05
2. OBRAS NECESARIAS - REPLANTEO LIMPIEZA CONSTRUCCION DE GAVIONES													
2,1	3.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	GOBER 2022	KM	0,25	$ 2.813.077,04	$ 703.269,26	0,25	$ 703.269,26	0,00	$ 0,00	0,25	$ 703.269,26
2,3	3.12.01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	GOBER 2022	M3	130,00	$ 4.902,53	$ 637.328,90	133,55	$ 654.755,43	0,00	$ 0,00	133,55	$ 654.755,43
2,4	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	GOBER 2022	M3	230,54	$ 66.142,29	$ 15.248.437,58	188,00	$ 12.434.750,52	0,00	$ 0,00	188,00	$ 12.434.750,52
2,5	3.02.07	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL CONGLOMERADO	GOBER 2022	M3	350,00	$ 13.438,38	$ 4.703.433,00	351,58	$ 4.724.665,64	3,42	$ 45.959,26	355,00	$ 4.770.624,90
2,6	1,02,29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07MTS 14MPa (2000PSI)	GOBER 2022	M2	225,00	$ 37.250,48	$ 8.381.358,00	220,00	$ 8.195.105,60	0,00	$ 0,00	220,00	$ 8.195.105,60
2,7	3.13.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	GOBER 2022	M2	0,00	$ 6.480,18	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,8	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	GOBER 2022	M3	273,00	$ 280.288,42	$ 76.518.738,66	86,00	$ 24.104.804,12	186,00	$ 52.133.646,12	272,00	$ 76.238.450,24
2,9	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	GOBER 2022	M3	0,00	$ 73.050,70	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,10	APU	MANEJOS DE AGUAS	PROPIO	ML	300,00	$ 80.200,00	$ 24.060.000,00	294,18	$ 23.593.236,00	0,00	$ 0,00	294,18	$ 23.593.236,00
2,11	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	GOBER 2022	ML	80,00	$ 43.536,07	$ 3.482.885,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
						SUB TOTAL	$ 133.735.451,00		$ 74.410.587,00		$ 52.179.605,00		$ 126.590.192,00
3. DIAGNOSTICO ESTADO BOVEDA													
3,1	1.01.32	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL OPERATIVO DEL SISITEMA BOVEDA SANITARIO Y/0 PLUVIAL, ATRAVEZ DE CAMARAS DE INSPECCION DE SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	GOBER 2022	ML	200,00	$ 48.700,00	$ 9.740.000,00	184,18	$ 8.969.566,00	0,00	$ 0,00	184,18	$ 8.969.566,00
						SUB TOTAL	$ 9.740.000,00		$ 8.969.566,00		$ 0,00		$ 8.969.566,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 196.800.000,00		$ 134.105.954,00		$ 52.179.605,00		$ 186.285.559,00
						ADMINISTRACION 20%	$ 39.360.000,00		$ 26.821.190,80		$ 10.435.921,00		$ 37.257.111,80
						IMPREVISTO 1%	$ 1.968.000,00		$ 1.341.059,54		$ 521.796,05		$ 1.862.855,59
						UTILIDAD 4%	$ 7.872.000,00		$ 5.364.238,16		$ 2.087.184,20		$ 7.451.422,36
						TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 49.200.000,00		$ 33.526.489,00		$ 13.044.901,00		$ 46.571.390,00
						COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 246.000.000,00		$ 167.632.443,00		$ 65.224.506,00		$ 232.856.949,00

YENY ESPERANZA BAEZ GIL
R/L CONSUL CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA DE OBRA


ING. EDISON PEREZ AVELLA
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR CONTRATO

ING.MIGUEL ANGEL TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR CONTRATO

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES EJECUTADAS	CONTRATO COP- 2020-0003
		OBJETO: PRESUPUESTO DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO QUE CONLLEVE A CORREGIR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA O RIESGO GENERADOS POR LA OLA INVERNAL
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DUITAMA		CONTRATISTA: CONSULCONSTRUCCIONES SAS — Fecha:
CAPITULO: 2. OBRAS NECESARIAS - REPLANTEO LIMPIEZA CONSTRUCCION DE GAVIONES		Hoja No. 2 de 2

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	RIO CHITICUY/ QUEBRADA EL HATO
2,8	M2	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3		



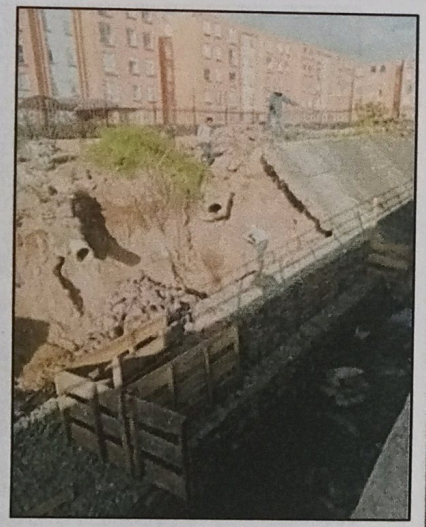

Localización	DIMENSIONES			No Elementos	Total
	Longitud	Ancho	Alto		
BOYACENSE	2,00	1,00	1,00	65,00	130,00
SAN RAFAEL 2 - QUEBRADA EL AROMA	2,00	1,00	1,00	28,00	56,00
CANTIDADES PRESENTE ACTA				Und	
Total				M2	186,00

observaciones_____

Vo.Bo. Contratista

Vo.Bo. Interventoria

información general contratistas

	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES EJECUTADAS	CONTRATO COP- 2020-0003
		OBJETO: PRESUPUESTO DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO QUE CONLLEVE A CORREGIR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA O RIESGO GENERADOS POR LA OLA INVERNAL
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DUITAMA		CONTRATISTA: CONSULCONSTRUCCIONES SAS — Fecha:
CAPITULO: 2. OBRAS NECESARIAS - REPLANTEO LIMPIEZA CONSTRUCCION DE GAVIONES		Hoja No. 1 de 2

ITEM	UND	DESCRIPCION	UBICACIÓN	RIO CHITICUY/ QUEBRADA EL HATO
2,5	M3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL CONGLOMERADO		



Localización	DIMENSIONES			No Elementos	Total
	Longitud	Ancho	Alto		
DEMOLICION DE GAVIONES	3,00	2,00	0,57	1,00	3,42
CANTIDADES PRESENTE ACTA				Und	
Total				M3	3,42

observaciones_____

Vo.Bo. Contratista

Vo.Bo. Interventoria

información general contratistas

Duitama Capital Cívica de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
		Fecha Aprobación: 30-05-2011
NIVEL CENTRAL	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Versión: 1
		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 26 DE DICIEMBRE DE 2022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP -20220008
OBJETO	"DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO QUE CONLLEVE A CORREGIR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA O RIESGO EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No 756 DE 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
CONTRATISTA	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
NIT No.	901.482.344-4
REPRESENTANTE LEGAL	YENY ESPERANZA BAEZ GIL
C.C. No.	1.049.641.610 de Tunja
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**EDISON JESÚS PÉREZ AVELLA** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS **MIGUEL ANGEL TORRES** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

Con el presente informe se deja constancia que el contratista cumple con el 94.65 % del total del contrato y cumplió con el 100% de los aspectos técnicos pactados en el Contrato de Prestación de Servicios para el avance de la Primer Acta Parcial.

ASPECTOS FINANCIEROS:

Con el presente informe se cancelará la segunda (2) acta, en la cual se evidencia el cumplimiento del 94.65 %, del objeto del CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP 202220008, Objeto "DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO QUE CONLLEVE A CORREGIR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA O RIESGO EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No 756 DE 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"., así:

- ACTA PARCIAL de fecha 26 de diciembre de 2022 por un monto de $ 65,224,506.00 m/ct
- Para un valor por ejecutar de $ 13,143,051,00 m/ct

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Para el cumplimiento de contrato cuyo objeto es ""DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO QUE CONLLEVE A CORREGIR O REDUCIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA O RIESGO EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No 756 DE 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA". se realizaron supervisiones constantes sobre las obligaciones pactadas para verificar el avance y cumplimiento de las mismas, y del objeto para lo cual se contrató.

Las obligaciones y actividades se desarrollaron de acuerdo a los parámetros convenidos; a la fecha no se ha presentado ninguna situación que altere o modifique la actividad contractual.

ASPECTOS RELEVANTES

- Para el pago parcial se presentó informe de avance de actividades con fecha 26 de Diciembre del 2022 firmada por el contratista y el supervisor.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS: *No aplica.*

EDISON JESUS PÉREZ AVELLA
SUPERVISOR
C.C No. 74.375.696 de Duitama

MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
SUPERVISOR
C.C No. 1.052.384.008 de Duitama

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901482344	4	CONSUL - CONSTRUCCIONES E&E SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 27 B 6A 10 P3	DUITAMA-BOYACA	7450017	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1000000707	9444098427	E	2022/12/13	2022/12/12	BANCO BOGOTA	0	$784,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049641610	BAEZ YENY																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
2	CC	7222140	CHINOME JOSE	X																231001	6	$200,000	$32,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF10	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0	SI	$62,000
3	CC	1052314431	HERNANDEZ JUAN	X																230301	6	$200,000	$32,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF10	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0	SI	$62,000
4	CC	46453793	MONTAÑA JENNY	X																231001	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF10	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0	SI	$289,200
5	PT	6907474	SUBERO CARLOS	X																230301	6	$200,000	$32,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF10	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0	SI	$62,000
Total	Afiliados(5)																					$2,533,334	$405,400			$2,533,334	$101,400			$2,533,334	$101,400			$2,533,334	$176,600		$0	$0		$784,800
