Santiago de Cali, diciembre 27 de 2022

**CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA**
**SENA REGIONAL ANTIOQUIA**
Dra. Astrid Marín
aemarina@sena.edu.co

**Medellín, Antioquia.**

**Referencia:** Contrato No. C01.PCCNTR.4097771 DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2022, cuyo objeto 5_9204_ 481 CONTRATAR LA ADECUACION DEL CENTRO DE RESIDUOS ACOPIO DEL COMPLEJO NORTE.

**Asunto**: Solicitud de Prorroga para la entrega de las obras contratadas para la construcción del nuevo acopio de residuos ubicado en el complejo norte del SENA Pedregal.

Estimada doctora Astrid Marín, reciba de parte nuestra un cordial saludo.

De la manera más atenta solicitamos a usted mediante el presente oficio sea considerado para la obra que estamos ejecutando a la fecha la ampliación del plazo definitivo para la entrega de la construcción, dicha solicitud nace de las diferentes situaciones presentadas durante la ejecución de la obra, el factor climático, las festividades decembrinas y la escases de algunos de los materiales hizo que el cronograma inicial tuviera retrasos. Como fecha limite y definitiva para la culminación de las obras se propone el ***30 de enero del año 2023*** para así entregar a ustedes el 100% de las obras contratadas y sus respectivas adiciones. A la fecha tenemos un avance del 60% de las actividades concernientes al proyecto en referencia.

Sin más en particular, agradecemos a ustedes la atención prestada.

Atentamente.


**Andrés Restrepo**
Gerente General
RISE CONSTRUCCIONES SAS
Cel: 3164224303

# PROGRAMACION DE OBRA POR SEMANA / RUTA CRITICA Y TIEMPOS DE EJECUCION

CONTRATISTA: **RISE CONSTRUCCIONES SAS**
PROYECTO: **ADECUACION DEL CENTRO DE RESIDUOS ACOPIO DEL COMPLEJO NORTE**
DIRECCION DE LA OBRA: **SENA PEDREGAL MEDELLIN ANTIOQUIA**
CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.4097771**
FECHA: **OCTUBRE 6 DEL 2022**
VALOR CONTRATADO: **$ 395.939.202,65**
FECHA DE ELABORACION: OCTUBRE 29 del 2022
VERSION: V1/ 29102022
FECHADA DE ACTUALIZACION: V2/26122022

**OBSERVACIONES SEMANALES: EN ESTE ESPACIO DEBE LLENARSE CADA SEMANA LOS COMPROMISOS POR PARTE DE LOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA**

| CAPITULO | ACTIVIDAD | DURACION/dias |
|---|---|---|
| PRELIMINARES DE OBRA | Legalizacion del contrato y polizas | 3 |
| | Revision de informacion planimetrica del proyecto | 3 |
| | Afiliacion de personal de obra | 4 |
| | Elaboracion de campamento de obra y provisionales | 5 |
| DESMONTES / DEMOLICIONES / EXCAVACIONES | Desmonte elementos de cubierta, perfiles metalicos y laminas de cerramiento anticua UTB | 2 |
| | Demolicion de muros de cerramiento, placa de contrapiso y otros elementos | 3 |
| | Retiro de instalaciones existentes | 2 |
| | Excavacion manual para cimentacion | 4 |
| | Excavacion manual para instalaciones sanitarias | 5 |
| | Relleno, nivelacion y compactacion de recebo | 3 |
| | Instalacion de filtro Geodren Planar | 3 |
| | TOTAL | 27 |
| CIMENTACION / ACERO DE REFUERZO / MAMPOSTERIA | Fundicion de cimiento corrido tipo ciclopeo | 7 |
| | Fundicion de viga corrida de cimentacion | 8 |
| | Amarre de acero de refuerzo para cimentacion corrida | 8 |
| | Fundicion de placa de contrapiso | 2 |
| | Muro de mamposteria en bloque estructural | 15 |
| | Elaboracion de viga de amarre en concreto | 14 |
| | Fundicion de dovelas | 15 |
| | TOTAL | 30 |
| CUBIERTA / PAÑETES / ENCHAPES / PINTURAS | Estructura metalica para cubierta | 5 |
| | Instalacion de teja termo acustica, canal y bajantes | 3 |
| | Aplicación de alistado de piso | 2 |
| | Aplicación de pañete muros internos | 10 |
| | Aplicación de pañetes muros externos | 8 |
| | Instalacion de enchape de piso tipo porcelanato | 3 |
| | Instalacion de ceramica para muros | 3 |
| | Instalacion de zocalo media caña | 3 |
| | Aplicación de pintura epoxica sobre muros interiores | 6 |
| | Aplicación de estuco y pintura sobre muros exteriores | 8 |
| | TOTAL | 18 |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / INSTALACIONES ELECTRICAS | Puntos sanitarios, puntos hidraulicos y carcamos | 5 |
| | Punto electrico, instalacion de tuberia y cableado | 18 |
| | Instalacion de aparatos electricos | 4 |
| | Instalacion de aparatos sanitarios | 2 |
| | Instalacion de ducha especial | 2 |
| | TOTAL | 28 |
| CARPINTERIA METALICA / OBRAS EXTERIORES / VIAS DE ACCESO / SISTEMA DE EXTRACCION / SUMINISTRO / ASEO | Instalacion de puertas cortafuego | 2 |
| | Instalacion de ventana tipo persiana | 2 |
| | Instalacion de sistema de extraccion | 11 |
| | Instalacion de equipos y dotacion de la UTB | 3 |
| | Andenes y pavimentos exteriores | 13 |
| | Aseo de obra | 2 |
| | TOTAL | 25 |

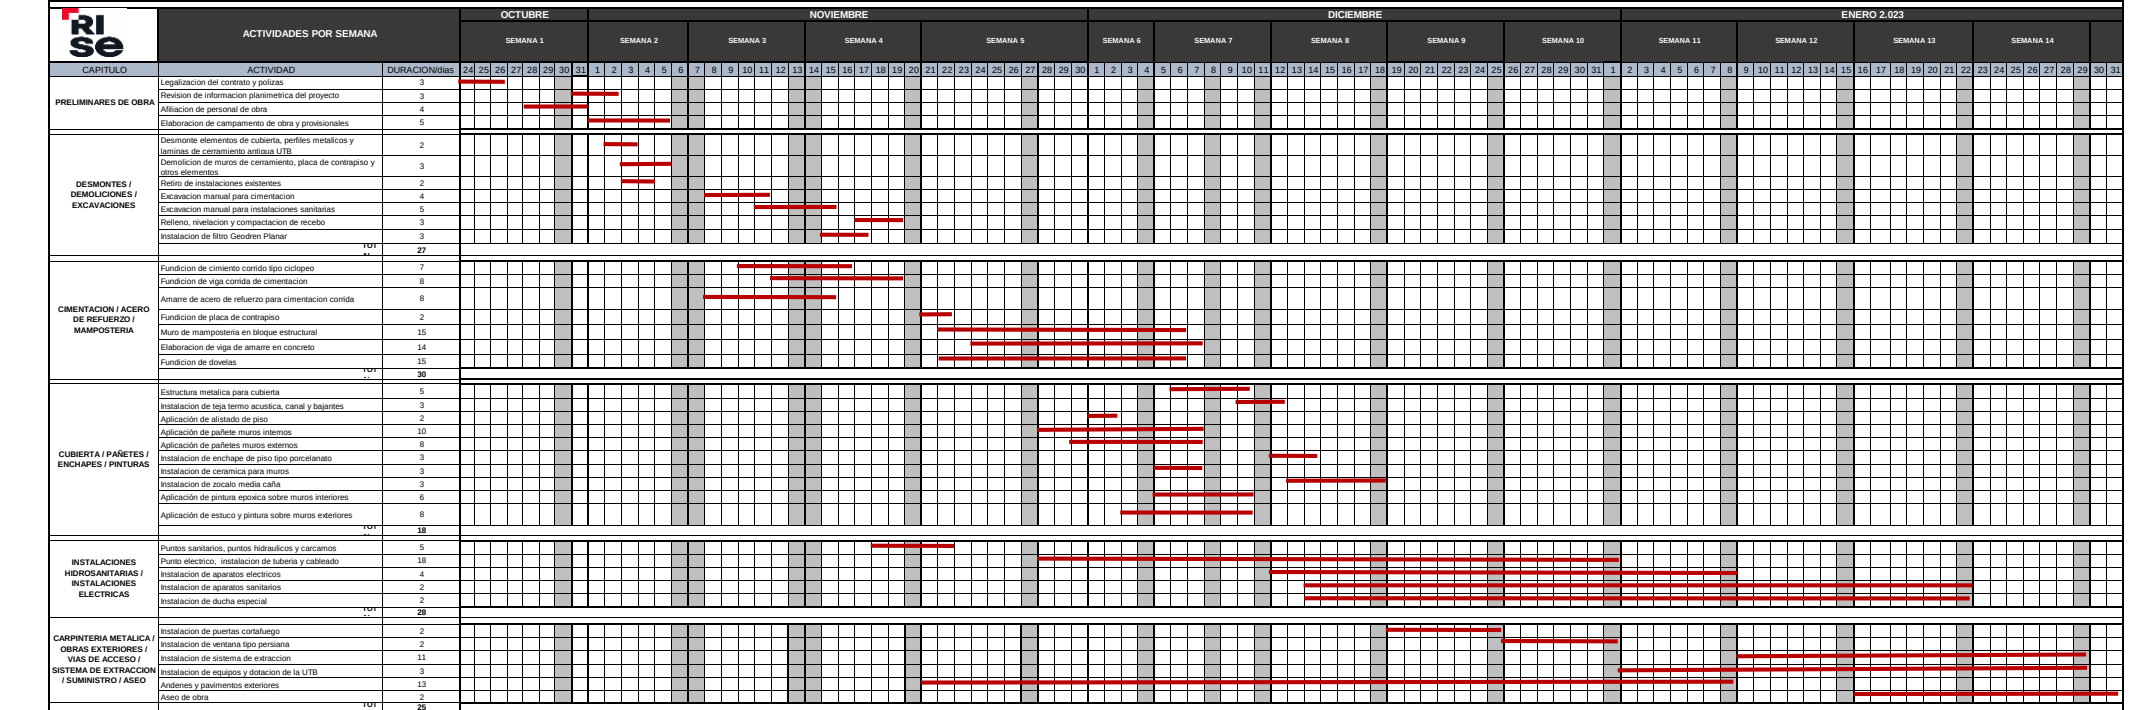


ANDRES RESTREPO
GERENTE GENERAL
RISE CONSTRUCCIONES S.A.S

ARQ. JUAN CAMILO OTALVARO HERNANDEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS
RISE CONSTRUCCIONES S.A.S

Vo.Bo. Por el CONTRATANTE
Nombre:
Cargo:
