PAMICONS. LTDA PAEZ MILTON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	**INFORME PARCIAL No, 2**			
Código	**No**	**Revisión**	**Fecha**	
	02	0	Diciembre 2022	

INFORME PACIAL No.2 DE OBRA

PERIODO: 16 de Noviembre de 2022 / 10 de Diciembre de 2022

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA.

VERSION N.º. 1	**ELABORADO POR:**  **Ing. MARIO ANDRÉS BAHAMON LOSADA**
FECHA: 10 de Diciembre de 2022	

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

NÚMERO DE CONTRATO	**22001311 H4 DE 2022**
CLASE DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	PAEZ MILTON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LTDA “PAMICONS LTDA)
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA.
VALOR	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 54.036.580,00)
PLAZO	DOS (2) MESES sin exceder el 10 de diciembre de 2022.
CDP	15522 DE FECHA 2022/08/26
RP	64922 DE FECHA 2022/09/23
FECHA LEGALIZACIÓN	2022/10/11
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Ing. JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR DIRECTOR DRCS

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

Contenido

1. INTRODUCCIÓN....4
2. OBJETO....5
3. ALCANCE....5
4. UBICACIÓN....5
5. POLIZAS....6
5.1. SEGURO DE CUMPLIMIENTO....6
5.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO....6
6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO....6
7. PRESUPUESTO....7
8. ACTIVIDADES....7
9. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN....9
9.1. 16 de Noviembre de 2022....9
9.2. 17 de Noviembre de 2022....10
9.3. 18 de Noviembre de 2022....11
9.4. 19 de Noviembre de 2022....12
9.5. 21 de Noviembre 2022....13
- Observación:....13
9.6. 22 de Noviembre de 2022....13
9.7. 23 de Noviembre de 2022....14
9.8. 24 de Noviembre de 2022....15
9.9. 25 de Noviembre de 2022....15
9.10. 26 de Noviembre de 2022....16
9.11. 28 de Noviembre de 2022....17
- Observación:....17
9.12. 29 de Noviembre de 2022....18
- Observación:....18
9.13. 30 de Noviembre de 2022....19
9.14. 01 de Diciembre de 2022....20
9.15. 02 de Diciembre de 2022....20
9.16. 03 de Diciembre de 2022....22
9.17. 05 de Diciembre de 2022....23
9.18. 06 de Diciembre de 2022....24
9.19. 07 de Diciembre de 2022....25
9.20. 09 de Diciembre de 2022....25
9.21. 10 de Diciembre de 2022....26
10. PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL....27
10.1. VINCULACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL....27
10.2. REGISTRO DE PERSONAL....27
11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD....27
11.1. MANEJO DEL PERSONAL Y SEGURIDAD....27
12. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS....27
13. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO....28

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se establece el análisis de las actividades, recursos y equipos que se usaron, y que desembocan en una programación de trabajos que, a modo indicativo, refleja la secuencia de las diversas actividades que componen la totalidad de la obra, así como sus duraciones parciales, a fin de obtener su duración total.

Habiendo echo los análisis pertinentes en base a los volúmenes de obra, los equipos óptimos a disponer, y los rendimientos esperados de los mismos, se establecieron las duraciones de las diferentes actividades, y el plazo total de ejecución.

El desarrollo de todas las actividades acordadas y programadas para este periodo se hizo a satisfacción, presentando inconvenientes de manera esporádica, sin embargo, se deba una rápida solución a estos para poder continuar con el cronograma de actividades sin afectarlo.
El objetivo de este informe es dar a conocer las actividades desarrolladas durante este periodo de tiempo y el avance parcial de la obra el 15 de noviembre de 2022.

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

2. OBJETO

Realizar el mantenimiento de franjas de seguridad, zonas verdes y lado tierra del aeropuerto Benito Salas de Neiva.


3. ALCANCE

Para dar cumplimiento al objeto del contrato “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA”, se plantea realizar la rocería sobre el área acordada en el contrato, que corresponde a zonas verdes y otras secciones dentro del aeropuerto, donde se realizarán las siguientes actividades:

- Rocería y limpieza manual y/o con equipo, control de maleza y crecimiento de material vegetal (incluye retiro y disposición final).
- Limpieza manual del cerramiento (incluye retiro y disposición final)
- Limpieza de canales (incluye retiro y disposición final)
- Bolsa de monto agotable para reparaciones, instalaciones y atención ante cualquier eventualidad surgida en el aeropuerto.

4. UBICACIÓN

Este proyecto se está desarrollando en el municipio de Neiva, capital del departamento del Huila, en el aeropuerto Benito Salas, el cual se encuentra ubicado dentro de la zona urbana de

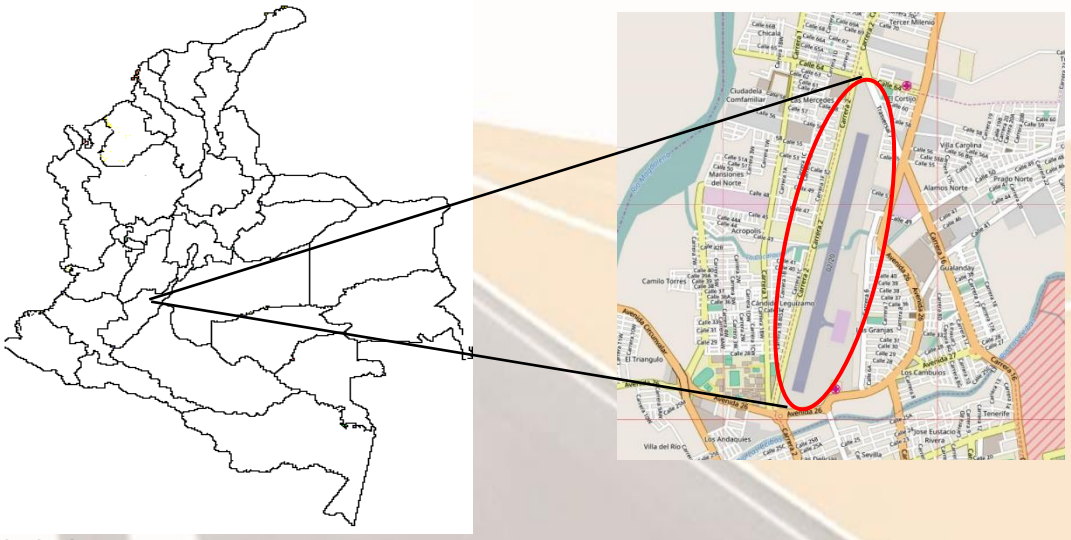

la ciudad.

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

5. POLIZAS

5.1. SEGURO DE CUMPLIMIENTO

		VIGENCIA DE PÓLIZAS	
Aseguradora	N° POLIZAS	DESDE	HASTA
Aseguradora Solidaria de Colombia	480-74-994000045798	10/10/2022	10/10/2022
Tipo de Garantía	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Manejo del Anticipo			
Cumplimiento	$ 10.807.316	21/09/2022	10/04/2022
Estabilidad y Calidad Obra	$ 10.807.316	1 Año a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra.	
Prestaciones Sociales	$ 10.807.316	21/09/2022	10/12/2022

5.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	N° PÓLIZA	TIPO	
Aseguradora Solidaria de Colombia	480-74-994000007624	Contrato Inicial	
TIPO DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS DE PÓLIZAS	
		DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$200.000.000	10/10/2022	10/12/2022

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	VALOR	ACTAS	AMORTIZACION	DESEMBOLSOS
CONTRATO INICIAL	$ 54.036.580			
EJECUTADO		$ 41.485.058		
SALDO		$ 12.551.522		
SUMAS IGUALES	**$54.036.580**	**$54.036.580**		

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

7. PRESUPUESTO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,1		1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	HA	112,00	$ 360.000,00	$ 40.320.000,00
2	1,2		1.2	LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	4.120,00	$ 1.200,00	$ 4.944.000,00
3	1,3		1.3	LIMPIEZA DE CANALES (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	1.300,00	$ 1.050,00	$ 1.365.000,00
4	1,4		1,4	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPARACIONES, INSTALACIONES Y ATENCIÓN ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD SURGIDA EN EL AEROPUERTO.	BMA	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 53.629.000,00**
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 54.036.580,00**
							VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 54.036.580,00**

8. ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se puede evidenciar el estado de cada actividad, es decir, si se encuentra pendiente, en ejecución o ya ejecutada.

Actividad	Estado
Rocería y limpieza manual y/o con equipo, control de maleza y crecimiento de material vegetal (incluye retiro y disposición final).	En ejecución
Limpieza manual del cerramiento (incluye retiro y disposición final)	Terminado
Limpieza de canales (incluye retiro y disposición final)	Terminado
Bolsa de monto agotable para reparaciones, instalaciones y atención ante cualquier eventualidad surgida en el aeropuerto.	Por ejecutar

Tabla 1. Estado de Actividades.

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

De igual manera se muestra el estado de cada actividad en porcentaje de ejecución, la cual se realiza a partir de un balance de cantidades analizado por la supervisión y el contratista en la etapa de diagnóstico.

Item	Actividad	Cantidad a Ejecutar	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
1.1	Rocería y limpieza manual y/o con equipo, control de maleza y crecimiento de material vegetal (incluye retiro y disposición final).	112HA	86HA	76,78%
1.2	Limpieza manual del cerramiento (incluye retiro y disposición final)	3800ML	3800ML	100%
1.3	Limpieza de canales (incluye retiro y disposición final)	5383ML	5383ML	100%
1.4	Bolsa de monto agotable para reparaciones, instalaciones y atención ante cualquier eventualidad surgida en el aeropuerto.	1BMA	0BMA	0,0%

Tabla 2. Porcentaje de ejecución por actividad

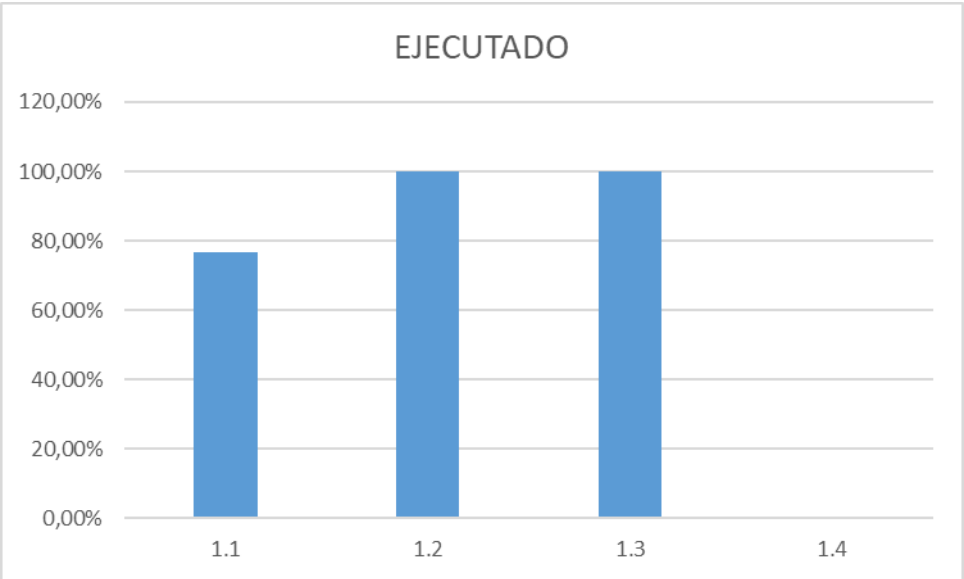


Ilustración 1. Grafica porcentaje de ejecución

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

9. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

Durante el periodo contractual del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades, las cuales estarán descritas con su fecha de ejecución y su registro fotográfico:

9.1. 16 de Noviembre de 2022

Siguiendo con las actividades del cronograma se da inicio a las labores de limpieza de canales. Para esto se pide a todo el equipo de rocería que apoye a la limpieza de canales.
Se intervino una longitud total de **360ML**. Los canales intervenidos corresponden al canal que se encuentra del lado Eco de la pista sobre la Cabecera Sur, el cual mide **175ML**; de igual maneta de limpia el canal ubicado en la cabecera Sur que conecta con el lado Whisky que mide **185ML**.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.









Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

9.2. 17 de Noviembre de 2022

Se continua con las actividades de limpieza de canales.
Este día se realiza limpieza del canal ubicado en el lado Eco de la pista sobre la cabecera Sur.
Este canal cuenta con una longitud de **250ML**, los cuales fueron limpiados en su totalidad.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.







Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

9.3. 18 de Noviembre de 2022

Se continua con las actividades de limpieza de canales.
Este día se inicia la limpieza del canal que se encuentra en el lado Eco de la pista, por la parte Norte de la plataforma.
Este canal consta de **315ML** los cuales fueron limpiados en su totalidad.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.









Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

9.4. 19 de Noviembre de 2022

Se continua con las actividades de limpieza de canales.
Este día se inicia la limpieza del canal La Cucaracha que se encuentra ubicado al lado Eco de la pista, en la parte Norte de la torre de control. Este canal consta de **160ML**, los cuales fueron limpiados en su totalidad.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.










Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

9.5. 21 de Noviembre 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.
Este día se intervino una longitud de **115ML**.
El canal intervenido se encuentra ubicado sobre la cabecera Norte al lado Eco de la pista.

- ***Observación:***

El día lunes 21 de noviembre a las 11 am la supervisión del proyecto en cabeza del profesional de apoyo ingeniero Juan Carlos Ramírez le solicita al Representante Legal de la Empresa PAMICONS LTDA de manera verbal que el **Ítem 1.1** correspondiente a la actividad de rocería de la segunda frecuencia se dé inicio el día 4 de diciembre del año en curso, para lo cual se está adelantando una prórroga hasta el 21/12/2022 para la culminación de actividades, ya que el mantenimiento de las zonas verdes del Aeropuerto Benito Salas se ajusta hasta la vigencia del PAA 2023 (Próximo contrato de mantenimiento de zonas verdes saldría al rededor del mes de febrero 2023).

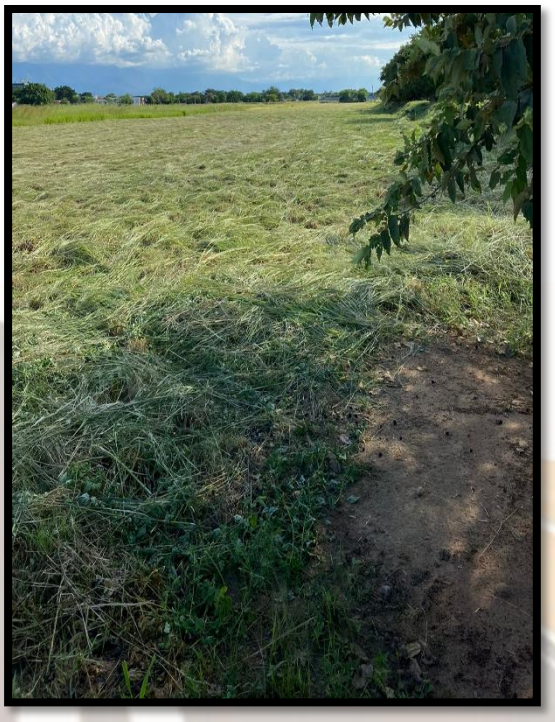



9.6. 22 de Noviembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com


Este día se intervienen **280ML** en los canales que se encuentran ubicados el lado Whisky de la pista, laterales al canal La Cucaracha. Se intervienen **90ML** del canal La Cucaracha hacia el Sur y **190ML** hacia el Norte.





9.7. 23 de Noviembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.
Este día se intervienen **450ML** del canal La Cucaracha hacia el Norte del lado Whisky.

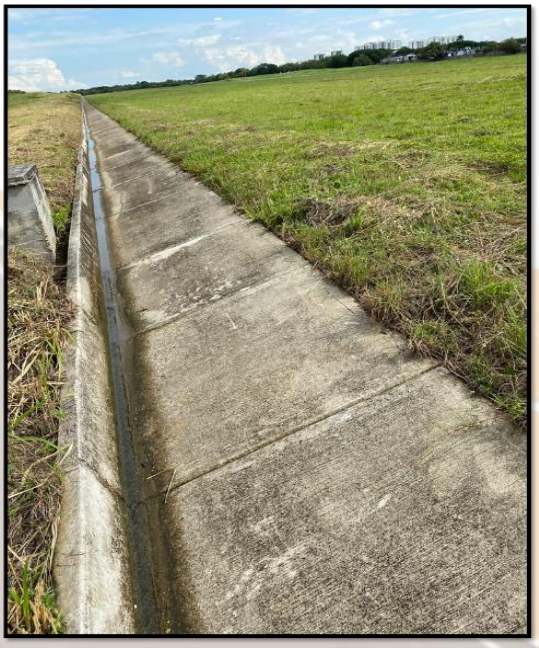

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

9.8. 24 de Noviembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales. Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar. Este día se intervienen **440ML** del canal La Cucaracha hacia el Norte del lado Whisky terminándolo a totalidad.





9.9. 25 de Noviembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.
Este día se intervienen **100ML** del canal La Cucaracha del lado Whisky terminándolo a totalidad junto a dos canales que se encuentran en los laterales de la parte final de este canal, los cuales se encontraban llenos de escombros y troncos.

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com









9.10. 26 de Noviembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.
Este día se intervienen **100ML** del canal lateral que apunta hacia el sur del canal La Cucaracha del lado Whisky.

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com





9.11. 28 de Noviembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales.
Las condiciones climáticas de este día no fueron óptimas para trabajar, esto debido a que durante la madrugada se presentaron fuertes lluvias en la ciudad, y durante la jornada laboral llovió durante 1 hora, causando retrasos en el inicio de las labores. Los canales se encuentran con un alto nivel de agua, lo cual dificulta la visibilidad de estos para la limpieza lo cual afecta el rendimiento para esta actividad.
Este día se intervienen **412ML** del canal lateral que apunta hacia el sur del canal La Cucaracha del lado Whisky.

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com



9.12. 29 de Noviembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales.
Este día se intervienen **412ML** del canal lateral que apunta hacia el sur del canal La Cucaracha del lado Whisky.

- ***Observación:***

Las condiciones climáticas este día no fueron óptimas para trabajar, esto debido a que durante la madrugada se presentaron fuertes lluvias en la ciudad, y durante la jornada laboral llovió durante 2 horas, causando retrasos en el inicio de las labores. Los canales se encuentran con un alto nivel de agua lo cual dificulta la visibilidad de estos para la limpieza lo cual afecta el rendimiento para esta actividad.

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com





9.13. 30 de Noviembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales.
Las condiciones climáticas este día fueron óptimas para trabajar. Se presentó una ligera lluvia alrededor de las 8am hasta las 9am, pero el resto de día el cielo se mantuvo despejado.
Este día se intervienen **362ML** del canal lateral que apunta hacia el sur del canal La Cucaracha del lado Whisky.





Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

9.14. 01 de Diciembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales. Este día se intervienen **372ML** del canal lateral que apunta hacia el sur del canal La Cucaracha del lado Whisky.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.





9.15. 02 de Diciembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales. Este día se intervienen **370ML** del canal lateral que apunta hacia el sur del canal La Cucaracha del lado Whisky.
De igual manera se da inicio a la fumigación y limpieza de cerramiento donde se interviene una longitud de **2,500ML** de cerramiento. Inicialmente se procede con la fumigación del cerramiento para luego limpiarlo manualmente. Esto se hace con la intención de que las ramas o enredaderas que se encuentran en la malla sean más fáciles de arrancar.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com












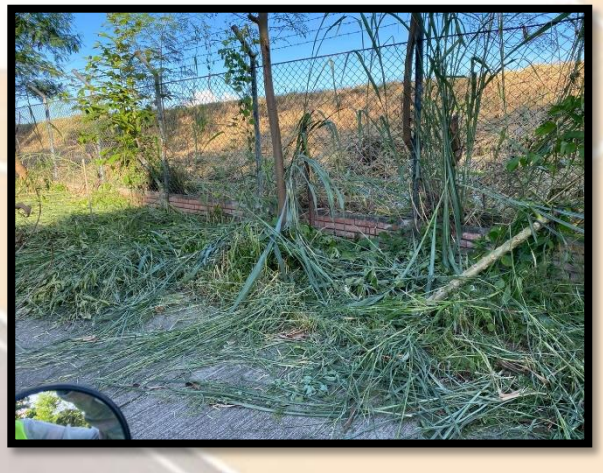

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

9.16. 03 de Diciembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales. Este día se intervienen **302ML** del canal lateral que apunta hacia el sur del canal La Cucaracha del lado Whisky.
Se continua con la limpieza de cerramiento y se interviene una longitud de **1,300ML**, terminando a totalidad esta actividad de limpieza.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.









Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com



9.17. 05 de Diciembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales. Este día se intervienen **150ML**.
Se continúan con las actividades de rocería para la segunda frecuencia. Este día se interviene un área de **6HA** por el lado Eco.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.





Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com





9.18. 06 de Diciembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales. Este día se intervienen **180ML**
Se continúan con las actividades de rocería para la segunda frecuencia. Este día se interviene un área de **6,5HA** del lado Eco.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.





Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

9.19. 07 de Diciembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales. Este día se intervienen **170ML.**
Se continua con las actividades de rocería para la segunda frecuencia. Este día se interviene un área de **5,9HA** del lado Eco alrededor del canal La Cucaracha avanzando hacia el Norte del aeropuerto.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.





9.20. 09 de Diciembre de 2022

Se continua con las labores de limpieza de canales. Este día se intervienen **83ML** con lo que se termina esta actividad.
Se continua con las actividades de rocería para la segunda frecuencia. Este día se interviene un área de **6,5HA** por el lado Eco.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.





Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

9.21. 10 de Diciembre de 2022

Se retoman actividades de rocería para la segunda frecuencia. Este día se interviene un área de **5,1HA** en Rocería sobre la cabecera Norte.
Las condiciones climáticas de este día fueron óptimas para trabajar.





En esta imagen se puede observar el avance de ejecución sobre las actividades pactadas dentro del contrato:



Ilustración 2. Avance Limpieza Canales

Se evidencia que se ha avanzado lo correspondiente a 30HA en rocería, 5.383ML en limpieza de canales y 3.800ML de limpieza de cerramiento

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

10. PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

10.1. VINCULACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista tiene como prioridad que todo el personal que esté involucrado, cuente con un Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, con el fin de dar cubrimiento de los riesgos por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, a través del Sistema de Riesgos Profesionales y la prestación de servicios sociales de salud y pensión.

10.2. REGISTRO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades se ha contado con la presencia de:

- 3 Guadañadores
- 3 Obreros
- 1 Residente de Obra

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Se mantiene el control de este aspecto durante la ejecución de todas las actividades del contrato, como son Rocería y/o Poda.

Para el control de calidad de los materiales y equipos que se utilizan, se hacen inspecciones oculares de cada uno de ellos y se constata que cumplan con los requisitos exigidos en las normas y especificaciones de diseño vigentes.

11.1. MANEJO DEL PERSONAL Y SEGURIDAD

Se realiza control de la asistencia y comportamiento del personal dentro de la obra en cada lugar de trabajo, calidad de la mano de obra en la ejecución de los trabajos, destreza de los encargados de las actividades de rocería, dotación de los elementos de protección y seguridad necesarios en la ejecución de cada actividad.

12. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

La supervisión de los trabajos ejecutados se realiza a diario. Se mantiene inspección de la rocería, con relaciones claras, esto con el objeto de velar porque la ejecución de los trabajos que se adelantan se realice de acuerdo con las especificaciones técnicas consignadas en el contrato, es por esto que se ha garantizado un proceso constructivo donde esta rocería se ajusta a las especificaciones y las instrucciones impartidas por los profesionales. Además, se garantizaron las normas y buenas prácticas, para asegurar su correcto uso de las herramientas

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com

utilizadas en estas actividades; es por esto que dichas herramientas corresponden a la calidad necesaria y en el número que se necesita.

13. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

Vigencia	Año 2022
Plazo de Ejecución del Contrato	2 meses sin exceder el 10 de diciembre
Fecha de Iniciación del Contrato	12 de Octubre de 2022
Fecha de Terminación	10 de Diciembre de 2022

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
NOMBRE: MARIO ANDRES BAHAMON LOSADA	**NOMBRE:** MARIO ANDRES BAHAMON LOSADA	**NOMBRE:** MILTON PAEZ
CARGO: RESIDENTE	**CARGO:** RESIDENTE	**CARGO:** GERENTE
FIRMA: 	**FIRMA:** 	**FIRMA:** 

Nit. 844002731- Movil. 3228857554 - 317-8788093 Direccion. Carrera 23 No 15-47 Yopal- Casanare Em@il. pamicons@hotmail.com
